



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO  
COMUNITARIO, AGUA Y  
SANEAMIENTO

**FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL  
(IDECOAS/FHIS)**

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan  
Operativo Anual POA-Presupuesto

**IV Trimestre 2017**

## Contenido

Introducción .....	2
Antecedentes .....	2
Misión: .....	3
Visión: .....	3
Valores: .....	3
Resumen Ejecutivo.....	4
Proyectos FHIS .....	7
Ejecución Presupuestaria por Programas 2017 .....	8
Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2017.....	9
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2017.....	10
Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2017 .....	11
CARTERA BANCO MUNDIAL .....	15
❖ Proyecto Municipios más Seguros.....	15
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	
❖ Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC).....	20
❖ Programa de Integración y Convivencia Urbana.....	26
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA .....	34
❖ Proyecto de Infraestructura Rural BCIE.....	34
CARTERA KfW Entwicklungsbank .....	41
❖ Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local SE-FHIS KfW VIII (PROMINE) FASE III.....	41
❖ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR).....	45
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID).....	52
❖ Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP).....	52
❖ Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías Renovables (PODER) .....	52
CARTERA PROYECTOS VARIOS .....	60
DECRETO No. 045-2013 .....	60

## **Introducción**



El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el IDECOAS/FHIS durante el cuarto trimestre de 2017.

## **Antecedentes**

De acuerdo al Artículo 3, Numeral 4, Artículo 13 y 20 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-001-2014 se crea el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, mismo que se encuentra integrado por el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), que fue creado mediante el Decreto Ejecutivo PCM-013-2014 publicado el 30 de Mayo del 2014 y tiene como propósito la integración institucional del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueducto y Alcantarillados (SANAA) y demás afines al sector, en el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS). Independiente de su integración estas instituciones continúan cumpliendo los objetivos establecidos en sus leyes constitutivas. A partir de la aprobación del Decreto PCM-013-2014 queda establecida la nueva estructura y funcionamiento del IDECOAS con las entidades que lo integran.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su

productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

**Misión:**

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

**Visión:**

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

**Valores:**

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.

## Resumen Ejecutivo

El IDECOAS/FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto del FHIS para la gestión 2017 al 31 de diciembre de 2017 asciende a 656.19 Millones de Lempiras:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% de Participación en el Presupuesto Vigente
<b>BID</b>	L. 74,408,639.00	L. 66,573,828.00	10.15%
<b>BCIE</b>	L. 64,930,278.00	L. 89,155,169.00	13.59%
<b>BM</b>	L. 56,130,671.00	L. 63,829,671.00	9.73%
<b>USAID</b>	L. 20,820,000.00	L. 73,817,343.00	11.25%
<b>GOH*</b>	L. 190,478,295.00	L. 204,252,048.00	31.13%
<b>KfW</b>	L. 168,776,130.00	L. 158,567,870.00	24.16%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 575,544,013.00</b>	<b>L. 656,195,929.00</b>	<b>100.00%</b>

\* Incluye costo Operativo del FHIS



#### Situación Actual de los Programas:

1. Proyecto Municipios Más Seguros, 3 proyectos finalizados con un avance físico de 100%, 2 proyectos están con un avance físico de 80%, 1 proyecto de Construcción en ejecución y 3 Subproyectos en proceso de adjudicación.
2. Programa de Integración y Convivencia Urbana, en el Componente 1: Mejora en la convivencia social y comunitaria, Se ha ejecutado el Programa de Deportes y Valores en las disciplinas de: Taekwondo, Tenis de Mesa, Atletismo, Balonmano y Levantamiento de pesas, con una participación de 1,200 niños y jóvenes de las colonias beneficiarias y Componente 2: proyectos de Integración Urbana, 14 proyectos ejecutados en un 100% de avance físico.
3. Programa Infraestructura Rural (BCIE), En el sector **Agua y Saneamiento** se encuentran en ejecución 2 proyectos en el departamento de Lempira y se finalizaron 2 Subproyectos en el casco urbano en el departamento de Intibucá, municipio de Colomoncagua con 390 pobladores beneficiados generando 27 empleos y en el municipio de Magdalena con un total de 2,160 pobladores beneficiados generando 17 empleos locales y 1 proyecto de construcción de agua potable en el departamento de Lempira, municipio de Gualcince con 576 personas beneficiadas generando 17 empleos en la zona; En el sector **Caminos Rurales** se encuentran en ejecución 6 Subproyectos de rehabilitación de caminos y se finalizaron 2 Subproyectos de rehabilitación de caminos en el municipio de Santa Lucía, Departamento de Intibucá con 409 beneficiarios y generando 30 empleos locales.
4. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW: Fase III, Se ha ejecutado el 90.17% de los fondos asignados en presupuesto y se han concluyeron 19 proyectos con los cuales se beneficiaron a 6,467 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 546 empleos.
5. Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR), En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el programa CONVIVIR tiene una cartera actualmente de 30 proyectos de infraestructura para ejecutar con el monto del convenio, de los cuales ya se terminaron 15 obras, 11 proyectos en ejecución y 5 proyectos listos para dar inicio, cabe mencionar, que se está trabajando en los equipamiento de los proyectos priorizando los que están terminados y los que están próximos a inaugurar.

En el componente de Fortalecimiento de Habilidades Sociales y Laborales de Jóvenes, se continuó con la formulación de procesos y ejecución de procesos de igual manera con la selección de participantes para estos dos (2) componentes esenciales del programa CONVIVIR.

6. Programa Pueblos Indígenas y Afro Hondureños y Cambio Climático (PIAHCC), se finalizaron los tres proyectos de adquisición e instalación de 236 Sistemas Solares Domiciliarios en tres comunidades Rurales, siendo el monto de la inversión por parte del PIAHCC de L 4,637,720.50.

7. Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP), Este proyecto finalizó ejecución física el 30 de septiembre de 2017, según la Carta de Ejecución No 522-0441/31 522-05017/06. En este período se culminó con la ejecución de 108 proyectos de infraestructura comunitaria, beneficiando a 123,517 habitantes de las comunidades intervenidas (beneficiarios directos e indirectos).

El Programa cerró con una ejecución global de L. 175,440,708.87, divididos de la siguiente manera: L. 151,951,638.95 de fondos de donación de USAID y L. 27,943,750.00 de fondos de contraparte nacional. Actualmente se encuentra en proceso de cierre financiero, legal y técnico.


8. Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER), finalizados 12 sistemas de riego y 9 proyectos de energía renovable en 100% y se encuentran en ejecución 4 sistemas de riego y 11 proyectos de energía renovable. En inicio 4 proyectos de energía renovable.

## Proyectos FHIS

Fuente	Nombre de Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad de Ejecucion
<b>BID</b>	Programa de Integración y Convivencia Urbana	2895/SF-HO	Infraestructura Social	Centralizados
	Programa de Pueblos Indigenas y Afrohondureños y Cambio Climatico	ATN NV-13535-HO-1	Proyectos de Adaptación y Mitigación de Riesgos	PEC
<b>Banco Mundial</b>	Proyecto Municipios más Seguros	5192-HN	Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana	Descentralizados/ Centralizados
<b>BCIE</b>	Proyecto de Infraestructura Rural	BCIE 1736	Agua y Saneamiento, Electrificación y Caminos Rurales	Descentralizados/ Centralizados
<b>KFW</b>	Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestion Local SE-FHIS- KFW FASE III	PROMINE	Infraestructura Escolar	Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jovenes.	Descentralizados
<b>USAID</b>	Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías Renovables	PODER	Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.	Descentralizados
	Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP)	Mérida/CARSI	Proyectos de Seguridad en las comunidades que se puedan construir en menos de un año.	Descentralizados


## Ejecución Presupuestaria por Programas 2017

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado IV Trimestre	Devengado del IV Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución IV Trimestre/ Planificado IV Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L. 190,478,295.00	L. 204,252,048.00	L. 34,001,820.00	L. 105,026,251.85	L. 201,764,383.70	L. 2,487,664.30	309%	99%
Programa 11: Infraestructura Rural	L. 64,930,278.00	L. 89,155,169.00	L. 38,880,179.00	L. 37,997,812.87	L. 86,922,798.37	L. 2,232,370.63	98%	97%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L. 118,987,635.00	L. 107,279,375.00	L. 35,716,436.00	L. 25,169,028.39	L. 96,731,967.93	L. 10,547,407.07	70%	90%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L. 173,585,129.00	L. 218,721,662.00	L. 109,232,914.00	L. 111,713,356.65	L. 205,952,966.03	L. 12,768,695.97	102%	94%
Programa 15: Pueblos Indígenas y Cambio Climático	L. 6,742,676.00	L. 14,151,457.00	L. 9,901,561.00	L. 10,253,870.84	L. 13,656,861.83	L. 494,595.17	104%	97%
Programa 17: Infraestructura Productiva	L. 20,820,000.00	L. 22,636,218.00	L. 10,859,449.00	L. 9,281,095.00	L. 22,589,168.01	L. 47,049.99	85%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 575,544,013.00</b>	<b>L. 656,195,929.00</b>	<b>L. 365,635,123.00</b>	<b>L. 299,441,415.60</b>	<b>L. 627,618,145.87</b>	<b>L. 28,577,783.13</b>	<b>82%</b>	<b>96%</b>

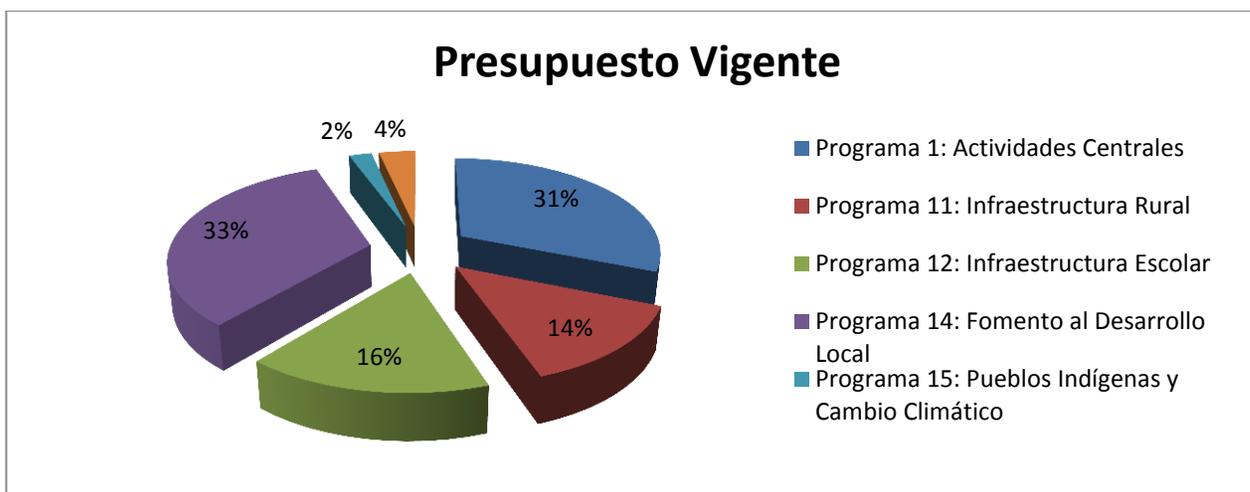


## Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2017

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2017	Devengado del IV Trimestre	Devengado Acumulado 2017	% Ejecución al I Trimestre / Presupuesto Vigente
Gasto Operativo/Gobierno	L. 190,478,295.00	L. 194,252,048.00	L. 99,981,388.92	L. 193,531,448.69	99.63%
Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE	L. 64,930,278.00	L. 89,155,169.00	L. 37,997,812.87	L. 86,922,798.37	97.50%
Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII	L. 118,987,635.00	L. 107,279,375.00	L. 25,169,028.39	L. 96,731,967.93	90.17%
Programa de Integración y Convivencia Urbana	L. 67,665,963.00	L. 52,422,371.00	L. 17,767,661.02	L. 47,817,034.79	91.21%
Proyecto Municipios mas Seguros	L. 56,130,671.00	L. 63,829,671.00	L. 21,802,166.12	L. 58,882,919.96	92.25%
Proyecto Convivencia y Especios Seguros para los Jovenes CONVIVIR	L. 49,788,495.00	L. 51,288,495.00	L. 20,962,404.51	L. 48,071,886.28	93.73%
Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria CLIP	L. -	L. 51,181,125.00	L. 51,181,125.00	L. 51,181,125.00	100.00%
Programa de Pueblos Indigenas y Afrohondureños y Cambio Climatico	L. 6,742,676.00	L. 14,151,457.00	L. 10,253,870.84	L. 13,656,861.83	96.50%
Programa de Oportunidades para el Desarrollo a través de Energía Renovable	L. 20,820,000.00	L. 22,636,218.00	L. 9,281,095.00	L. 22,589,168.01	99.79%
Decreto 45	L. -	L. 10,000,000.00	L. 5,044,862.93	L. 8,232,935.01	82.33%
<b>TOTAL</b>	<b>L. 575,544,013.00</b>	<b>L. 656,195,929.00</b>	<b>L. 299,441,415.60</b>	<b>L. 627,618,145.87</b>	<b>95.64%</b>

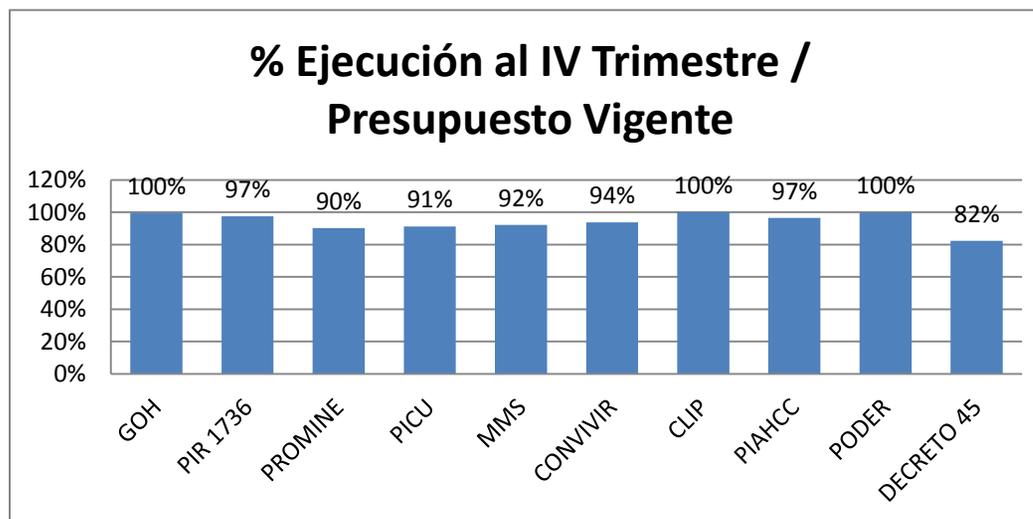

### Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2017

Grupo	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado IV Trimestre	Devengado Acumulado al IV Trimestre	Disponible	% Ejecución IV Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Servicios Personales	L. 107,112,978.00	L. 31,270,554.49	L. 107,083,975.03	L. 29,002.97	29%	100%
Servicios no personales	L. 123,810,083.00	L. 43,881,562.45	L. 116,375,505.32	L. 7,434,577.68	35%	94%
Materiales y Suministros	L. 9,775,614.00	L. 3,941,876.18	L. 8,976,714.23	L. 798,899.77	40%	92%
Bienes Capitalizables	L. 407,402,676.00	L. 215,723,147.18	L. 387,400,554.32	L. 20,002,121.68	53%	95%
Transferencias y Donaciones	L. 6,111,936.00	L. 4,624,275.30	L. 5,798,755.85	L. 313,180.15	76%	95%
Servicio de la Deuda Pública	L. 1,982,642.00	L. -	L. 1,982,641.12	L. 0.88	0%	100%
<b>Total</b>	<b>L. 656,195,929.00</b>	<b>L. 299,441,415.60</b>	<b>L. 627,618,145.87</b>	<b>L. 28,577,783.13</b>	<b>46%</b>	<b>96%</b>

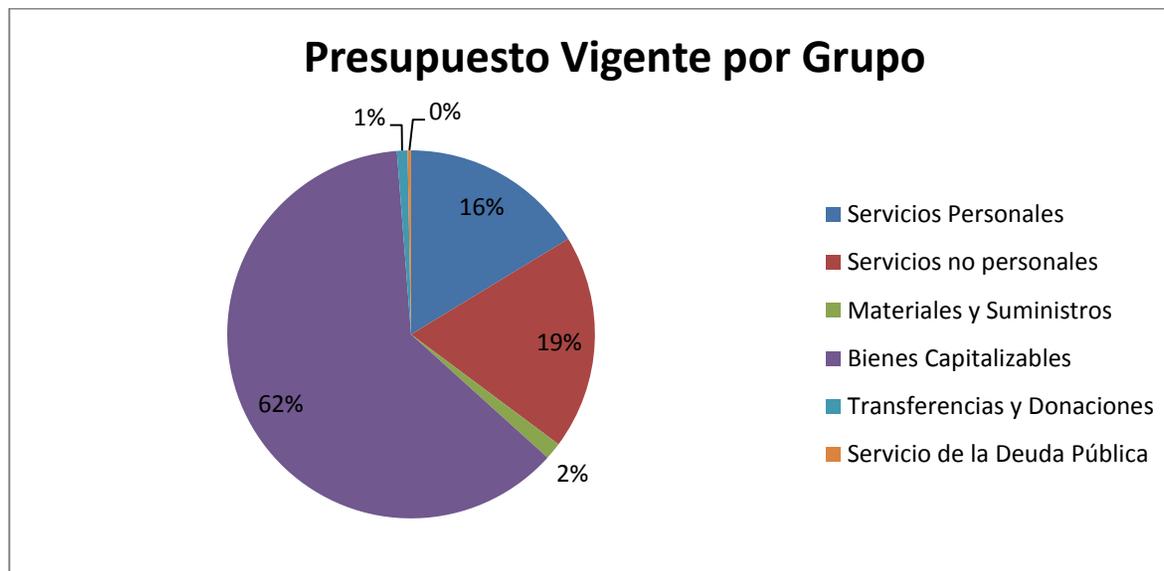

## Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2017

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	17,643,677.00	17,643,676.10	0.90
11400	Adicionales	1,177,813.00	1,177,813.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	1,495,619.00	1,495,619.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	1,495,619.00	1,495,619.00	0.00
11600	Complementos	1,113,653.00	1,113,653.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2,265,762.00	2,265,762.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	563,998.00	563,998.00	0.00
26110	Pasajes Nacionales	15,925.00	6,000.00	9,925.00
26210	Viáticos Nacionales	200,000.00	192,034.95	7,965.05
29100	Ceremonial y Protocolo	560,276.00	560,275.34	0.66
51220	Ayuda Social a Personas	76,000.00	75,900.00	100.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	4,600.00	0.00	4,600.00
1100	Sueldos Básicos	16,067,525.00	16,067,525.00	0.00
11400	Adicionales	748,031.00	748,030.97	0.03
11510	Decimotercer Mes	1,338,960.00	1,338,590.00	370.00
11520	Decimocuarto Mes	1,338,960.00	1,338,960.00	0.00
11600	Complementos	890,889.00	890,889.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2,040,308.00	2,040,308.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	873,801.00	873,800.48	0.52
12100	Sueldos Básicos	61,247.00	61,247.00	0.00
12420	Decimocuarto Mes	9,042.00	9,042.00	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	840,500.00	840,500.00	0.00
16200	Compensaciones	2,048,301.00	2,048,301.00	0.00
21200	Agua	74,100.00	53,300.00	20,800.00
22900	Otros Alquileres	24,054.00	0.00	24,054.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	68,910.00	68,909.21	0.79
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	617,708.00	617,707.85	0.15
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,220.00	1719.25	9,500.75
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,035.00	1,035.00	0.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	102,314.00	102,314.00	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	86,184.00	86,093.60	90.40
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	480,000.00	480,000.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	86,600.00	86,600.00	0.00
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y	3,638,279.00	3,589,483.33	48,795.67
25100	Servicio de Transporte	12,679.00	4,690.00	7,989.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,226,713.00	1,226,642.75	70.25
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,276,397.00	1,276,395.25	1.75
25800	Diferencial Cambiario	1,000.00	617.88	382.12
26210	Viáticos Nacionales	120,000.00	120,000.00	0.00
27210	Tasas	169,981.00	169,918.94	62.06
29100	Ceremonial y Protocolo	48,925.00	24,773.90	24,151.10

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
3100	Alimentos y Bebidas para Personas	342,946.00	320,884.25	22,061.75
33100	Papel de Escritorio	199,161.00	23,441.60	175,719.40
33400	Productos de Papel y Cartón	12,605.00	12,550.41	54.59
34400	Llantas y Cámaras de Aire	238,667.00	238,666.91	0.09
35100	Productos Químicos	12,027.00	12,025.00	2.00
35620	Diesel	393,350.00	301,397.00	91,953.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	182,428.00	178,492.47	3,935.53
36400	Herramientas Menores	68,361.00	68,359.95	1.05
36930	Elementos de Ferrería	5,343.00	5,342.89	0.11
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	81,251.00	81,250.86	0.14
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	235,037.00	233,310.03	1,726.97
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	48,319.00	48,318.95	0.05
39600	Repuestos y Accesorios	389,465.00	389,464.54	0.46
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71,077,363.00	71,052,387.48	24,975.52
11100	Sueldos Básicos	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00
11400	Adicionales	218,000.00	218,000.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	265,000.00	265,000.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	265,000.00	265,000.00	0.00
11600	Complementos	191,600.00	191,600.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	429,300.00	429,300.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	95,322.00	95,322.00	0.00
24300	Servicios Jurídicos	50,000.00	50,000.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	100,000.00	100,000.00	0.00
11100	Sueldos Básicos	2,078,021.00	2,063,021.00	15,000.00
11400	Adicionales	101,169.00	101,168.42	0.58
11510	Decimotercer Mes	173,169.00	173,169.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	173,169.00	173,169.00	0.00
11600	Complementos	116,935.00	116,935.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	280,533.00	267,033.00	13,500.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	79,436.00	79,436.00	0.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	240,540.00	104,633.16	135,906.84
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	168,378.00	168,296.75	81.25
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	192,582.00	191,581.24	1,000.76
11100	Sueldos Básicos	2,126,021.00	2,126,021.00	0.00
11400	Adicionales	68,000.00	68,000.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	177,168.00	177,168.00	0.00
11520	Decimocuarto Mes	177,168.00	177,168.00	0.00
11600	Complementos	108,984.00	108,984.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	238,413.00	238,413.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	79,436.00	79,436.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	150,000.00	150,000.00	0.00

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	17,900,285.00	17,900,285.00	0.00
11400	Adicionales	1,100,680.00	1,100,679.98	0.02
11510	Decimotercer Mes	1,491,704.00	1,491,573.08	130.92
11520	Decimocuarto Mes	1,491,703.00	1,491,703.00	0.00
11600	Complementos	1,076,050.00	1,076,050.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	2,306,915.00	2,306,915.00	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	651,381.00	651,381.00	0.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	190,404.00	154,400.00	36,004.00
26210	Viáticos Nacionales	2,507,943.00	2,468,258.92	39,684.08
12910	Contratos Especiales	18,458,711.00	18,458,711.00	0.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000,000.00	8,232,935.01	1,767,064.99
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>204,252,048.00</b>	<b>201,764,383.70</b>	<b>2,487,664.30</b>

### Cuadro por Sector 2017 (Ejecutado)

SECTOR	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios directos 2017
AGUA Y SANEAMIENTO	9	26,678,492.50	101	7,781
ENERGIA	8	11,806,832.48	213	16,332
EMPREDIMIENTO Y VALORES	46	6,878,982.64	0	341
INFRAESTRUCTURA VIAL	20	49,935,544.96	221	6,881
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	5	435,196.35	0	0
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVIENCIA	24	96,859,040.66	610	46,313
EDUCACION	21	80,050,388.20	546	6,467
RIEGO	7	4,985,793.84	0	102
PRODUCTIVO	0	5,722,855.85	598	825
ENERGIA RENOVABLE	11	19,102,579.76	102	4,006
<b>TOTAL</b>	<b>151</b>	<b>302,455,707.24</b>	<b>2,391</b>	<b>89,048</b>

### Cuadro por Departamento 2017 (Ejecutado)

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios directos 2017
ATLANTIDA	3	14,185,483.30	58	3,652
CHOLUTECA	1	1,944,498.03	0	0
COMAYAGUA	17	11,176,126.81	61	3,494
COPAN	5	13,785,520.78	252	1,652
CORTES	22	38,095,618.73	221	18,270
COLON	0	1,264,876.37	0	0
FRANCISCO MORAZAN	27	53,583,455.16	505	34,192
INTIBUCÁ	23	61,104,415.14	357	10,093
LA PAZ	8	21,375,099.54	135	4,317
LEMPIRA	30	48,771,429.52	220	7,258
OCOTEPEQUE	6	16,657,762.88	290	1,356
OLANCHO	1	560,555.12	0	0
SANTA BARBARA	7	14,795,913.57	277	764
YORO	1	5,154,952.29	15	4,000
<b>TOTAL</b>	<b>151</b>	<b>302,455,707.24</b>	<b>2,391</b>	<b>89,048</b>

### Otras Inversiones 2017 (Ejecutado)

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2017
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	131,630,989.94
ACTIVIDADES CENTRALES	193,531,448.69
<b>TOTAL</b>	<b>325,162,438.63</b>

## **CARTERA BANCO MUNDIAL**

### ✓ **Proyecto Municipios más Seguros**



#### **1. Objetivo**

Los objetivos de desarrollo del Proyecto son apoyar a Honduras para (i) mejorar las capacidades del gobierno central y de los gobiernos locales en la prevención de la violencia; (ii) abordar factores de riesgo de crimen y violencia en las Municipalidades Seleccionadas; y (iii) mejorar su capacidad de responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia elegible.

#### **2. Focalización:**

El Proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región Norte: La Ceiba, Choloma y El Progreso. Esto refleja la selección realizada por el Programa Municipios más Seguros que prioriza acciones en zonas con alta concentración de delincuencia y violencia. Para este Proyecto, los municipios fueron seleccionados por la clasificación en orden decreciente, tomando aquellos con poblaciones urbanas menores a 250.000 habitantes y con una tasa de homicidios mayor a 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es aproximadamente el promedio nacional.

#### **3. Tipología de Proyectos**

##### **Componente 1: Fortalecimiento Institucional para la Prevención de Violencia a Nivel Nacional:**

Subcomponente 1.1 Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad para orientar, coordinar y supervisar actividades de prevención de la violencia a nivel municipal; Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad y de las Municipalidades Seleccionadas para recolectar y procesar datos sobre violencia para la formulación de políticas basadas en la evidencia.

##### **Componente 2: Prevención Integrada de Crimen y Violencia a nivel Municipal y Comunitario**

Intervenciones de prevención social dirigidos a las poblaciones en riesgo, incluyendo aquellas:

- Orientadas a la familia (por ejemplo, capacitación para padres, programas de desarrollo para niños víctimas de maltrato en edad preescolar (0-5 años) y proveerán capacitación para estilos de crianza, disciplina y comunicación padre-niño, habilidades para manejo sin violencia de situaciones familiares, supervisión de padres de familia y actividades de desarrollo para preparación de la escuela y mejoramiento de capacidades cognoscitivas);

- Basadas en género (por ejemplo, consejerías y remisiones de mujeres víctimas de violencia interpersonal, doméstica y/o sexual, educación sobre salud reproductiva y salud sexual, masculinidad y el rol de los géneros, y fortalecimiento de redes locales de prevención de violencia de género);
- Basadas en la prevención de violencia escolar (por ejemplo, programas para después de clase que involucren deportes, música y arte, además de habilidades para la vida, y promoción de conductas pro-positivas; la promoción de habilidades para la resolución de conflictos y promoción de relaciones positivas entre estudiantes; intervenciones para estudiantes con problemas de aprendizaje o conducta; prevención y reducción del “bullying” y desarrollo de espacios escolares)
- Orientadas a los jóvenes (por ejemplo, Sub proyectos de mentoría (contacto sostenido con un adulto para proveer aprendizaje, acompañamiento y establecimiento de roles positivos a seguir) para jóvenes en situación de riesgo; servicios integrados para jóvenes de (15 -34 años) que cubran desarrollo de capacidades para obtención de trabajos incluyendo una mezcla de habilidades para la vida (auto-control, manejo de ira, mejora a la auto-estima y toma de decisiones así como pasantías laborables. También se prevé educación técnica vocacional, mediación en el mercado laboral y programas de rehabilitación de drogas.

Intervenciones de prevención situacional incluyendo:

- La construcción de infraestructura comunitaria en pequeña escala que reduce las oportunidades de cometer delitos o crea espacios seguros comunitarios (parques, jardines comunitarios, parques infantiles, alumbrado público y pavimentación de algunas calles);
- La construcción y/o rehabilitación de espacios que podrían servir como centro para la entrega de los servicios sociales para acciones de prevención de violencia.

Acceso a servicios básicos incluyendo:

- Intervenciones de mejoramiento urbano tales como conexiones de agua y saneamiento, alumbrado público, calles de acceso y obras de mitigación de riesgos.

Resolución alternativa de conflictos para ampliar los sistemas municipales de resolución de conflictos, incluyendo:

- La formación de mediadores municipales;
- Fortalecimiento de sistemas de registro de casos;
- Expansión de redes de mediadores voluntarios.

### **Componente 3: Administración del Proyecto y Monitoreo y Evaluación**

Subcomponente 3.1. Apoyo a la Administración del Proyecto; Subcomponente 3.2. Monitoreo y Evaluación del Proyecto, incluyendo (a) el establecimiento de sistemas y capacidades para el proceso de monitoreo de las actividades del Proyecto, (b) la recopilación de datos de línea de base y de seguimiento para la evaluación de impacto del Proyecto, y (c) el desarrollo de la evaluación de impacto de al menos dos tipos de intervenciones.

### **Componente 4: Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) para Contingencias por Emergencias**

Este componente incluye la entrega de apoyo para responder de forma inmediata ante una Emergencia Elegible.

El Monto del convenio original fue de \$15, 000,000.00, pero el 22 de septiembre del 2015 la subsecretaria de Inversión Pública notificó al Ministro Director de IDECOAS, mediante oficio DGIP-212-2015, la reestructuración de los fondos de financiamiento, que significó una disminución de 2.3 millones de Dólares, siendo el nuevo monto del convenio de US\$ 12, 700,000.00.

**Fecha de Firma del Convenio:** 18 de Diciembre de 2012

**Fecha de Finalización:** 31 de Agosto de 2018

#### **i. Avance Financiero**

<b>Año</b>	<b>Planificado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Eficiencia</b>
<b>2013</b>	19,288,000.00	11,605,763.23	60.17%
<b>2014</b>	43,046,050.00	22,346,049.32	51.91%
<b>2015</b>	54,222,419.00	51,468,890.89	94.92%
<b>2016</b>	57,912,834.00	55,876,475.87	96.48%
<b>2017</b>	63,829,671.00	58,882,919.96	92.25%

#### **ii. Avance Físico por Sector**

<b>SECTOR</b>	<b>Proyectos Finalizados 2017</b>	<b>Mto. Ejecutado 2017</b>	<b>Empleos Generados 2017</b>	<b>Beneficiarios Directos 2017</b>
ELECTRIFICACION	1		15	4,000
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVENCIA	4	22,174,697.29	90	11,060
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>22,174,697.29</b>	<b>105</b>	<b>15,060</b>

### iii. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios directos 2017
ATLANTIDA	1	3,539,869.30	25	2,387
CORTES	3	13,479,875.70	65	8,673
YORO	1	5,154,952.29	15	4,000
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>22,174,697.29</b>	<b>105</b>	<b>15,060</b>

### iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	EJECUTADO 2017
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	36,708,222.67
<b>TOTAL</b>	<b>36,708,222.67</b>

## 4. Principales Logros

#### 1. Proyecto Finalizado:

- ✚ Reposición Postes e Iluminación Sistema Eléctrico Colonia PALERMO, avance físico: 100%.
- ✚ Construcción Centro Integral Mi Comunidad–CDA, Colonia Melgar 1, La Ceiba, Departamento de Atlántida Obra en Ejecución, avance físico: 97% avance financiero: 80%.
- ✚ Construcción Centro Integral Mi Comunidad - CDA Colonia 11 de abril Avance físico: 100%
- ✚ Construcción de Área Recreativa Colonia CEDEN, avance físico: 80%
- ✚ Construcción Colector y Obras Complementarias Colonia CEDEN, avance físico 100%.  
Suspendido debido a que esta proceso de aprobación orden de cambio.

#### 2. Proyectos en Ejecución:

- ✚ Construcción Plaza Recreativa El Mirador. Se dio orden de inicio 9 de octubre de 2017

#### 3. Subproyectos en Proceso de Adjudicación:

- ✚ Construcción kínder Colonia INFOP, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, por un monto de \$ 71,000 oct-17, en etapa de adjudicación.
- ✚ Construcción de Cunetas, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, por un monto de \$ 211,000 oct-17, proyecto aprobado por el Comité de Operaciones del IDECOAS. Categoría Dos.

- ✚ Construcción Centro Integral Mi Comunidad Colonia PALERMO, Municipio de El Progreso, Yoro, por un monto de \$ 114,000 oct-17, en formulación. Categoría Ambiental Cero.

Descripción	Monto en Miles de US\$	Fecha Prevista Firma de Contrato	Estatus del Contrato
<b><u>Servicios para la Implementación del Proyecto Generación de Empleo Temporal</u></b> para los Conglomerados de Barrios y Colonias de Choloma, Cortés; El Progreso, Yoro y La Ceiba, Atlántida	661,000		EJECUTADO
Prevención de Violencia basada en Género (Metodología SASA)	34,000	Junio 2017	Consultoría en ejecución. Taller de entrenamiento reprogramado para primer trimestre 2017
Servicios de consultoría para la implementación de los Subproyectos de: (1) Generación de Empleo Temporal con Jóvenes entre 18 a 25 años en situación de riesgo y el de (2) Generación de Empleo Temporal con personas mayores de 25 años de los Conglomerados de Barrios y Colonias de los Municipios de Choloma, Cortés, La Ceiba, Atlántida y El Progreso, Yoro	611,000	oct-17	Contratada
“Levantamiento de la Línea Base del Subproyecto de Generación de Empleo Temporal con Jóvenes en Situación de Riesgo entre 18 a 25 años en los Conglomerados de Barrios y Colonias de los Municipios de Choloma, Cortés, La Ceiba, Atlántida y El Progreso, Yoro”.	150,000	oct-17	Contratada

## **CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**

### ✓ **Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático** **(PIAHCC)**



#### **1. Antecedentes**

En fecha 28 de febrero de 2013 se firmó el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión ATN/NV-13535-HO, Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), el monto total del convenio es de US\$ 4, 535,382.00 financiado con recursos provenientes de la Cooperación Técnica No Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Siendo US\$2,409,380.00 el monto asignado al componente I, para ejecución de Proyectos bajo la categoría de Soluciones de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (AMCC), para el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios cuyas inversiones elegibles correspondan al menú pre-establecido que consta en el Manual Operativo del Programa, incluyendo, sin limitarse a, muros de contención, protección de taludes pequeños sistemas de riego, vados, puentes colgantes y soluciones de energía renovable.

Las inversiones elegibles deben responder a dos criterios: i) efectividad de las intervenciones en Honduras, o en otros países; o ii) un resultado favorable en el análisis costo-beneficio ex-ante realizado para el proyecto respectivo.

El monto de US\$ 2,126,002.00 para el componente II Fortalecimiento del Capital Humano en Materia de Cambio Climático y Sistematización de Buenas Prácticas financiará: (i) la contratación de servicios de asistencia técnica para desarrollar e implementar talleres sobre AMCC para líderes pertenecientes a las comunidades beneficiarias del Programa; (ii) formación de jóvenes en el tercer ciclo de educación básica; y (iii) sistematización y difusión de buenas prácticas de los pueblos indígenas y Afrohondureños (PIAH) en AMCC.

El 11 de septiembre de 2015 se recibió notificación de parte del BID dirigida al Sr. Wilfredo Cerrato, Ministro de Finanzas, planteando asuntos referentes al Programa PIAHCC, entre los cuales se establece que: 1) Los fondos anteriormente establecidos para la ejecución del Programa PIAHCC, serán disminuidos a USD 1, 000,000.00 los cuales serán utilizados para la ejecución del componente

uno del proyecto por medio del IDECOAS/FHIS y, 2) El BID administrara directamente el presupuesto restante destinado para la Operación **ATN-13535-HO**, mediante la contratación directa de ONG's, afín de que ejecuten diversos proyectos.

El 22 de septiembre de 2015 se llevó a cabo una reunión entre el Gobierno de Honduras, El Fondo Nórdico y El Banco Interamericano de Desarrollo, para acordar las condiciones en que continuara la ejecución del Programa PIAHCC, y ratificar lo expuesto en notificación del BID de fecha 11 de septiembre de 2015. Es así como el Fondo Nórdico, como financista de la Donación, ha expresado su decisión que el Programa PIAHCC, continúe manejando solamente el Componente I del Programa, pero la asignación presupuestaria del mismo sería solamente de US\$ 1,000,000.00 que se oficiara con la emisión de la Carta Modificatoria N° 2 al convenio de donación.

El 28 de abril de 2015 el Gobierno de Honduras suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la Carta Modificación No. 1 al Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/NV-13535-HO, para realizar el cambio de Organismo Ejecutor de la operación específicamente el COMPONENTE II que iba a ser ejecutado por la SEDINAFROH - solicitado mediante comunicación No. DGCP-DEN-543/2014 de fecha 19 de septiembre de 2014 de la Secretaria de Finanzas, con lo cual el IDECOAS/FHIS pasa hacer el ejecutor de los dos COMPONENTES, el uso de los recursos según Carta la Carta Modificatoria I, estaba condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco, los siguientes requisitos:

- a. Que se haya suscrito un convenio subsidiarios entre el Beneficiario, representados por la Secretaria de Estado de Finanzas, e IDECOAS/FHIS para la transferencia, en forma No Reembolsable de los recursos del Programa;
- b. Que se haya modificado el Manual Operativo del Programa, el cual incluye un manual administrativo fiduciario y de control interno para que refleje la nueva estructura de ejecución del Programa;
- c. Que se haya revisado y modificado el Manual PEC del Programa, el cual incluye la participación comunitaria, el estudio socioeconómico de la comunidad, la línea de base, la identificación de actores y un énfasis en proyectos únicamente de adaptación y mitigación de cambio climático;

- d. Que se haya conformado la UCP con, al menos, el coordinador y el especialista administrativo/financiero.

En fecha 04 de febrero de 2016, el Gobierno de Honduras y el BID suscribieron la Carta Modificatoria N° 2 al convenio, dejando en firme un nuevo presupuesto de US\$1,000,000.00 para la ejecución del componente I.

## 2. Objetivo General

El Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.

## 3. Descripción del Proyecto

*El Componente I. Soluciones de adaptación y mitigación al cambio climático.* Que financiará pequeños proyectos comunitarios, de adaptación y mitigación al cambio climático hasta US\$ 100.000.00 cada proyecto, e incluirá los costos de pre-inversión, inversión y capacitación en la gestión del proyecto. Las comunidades a ser beneficiadas serán seleccionadas de la lista de 32 municipios elegibles que consta en el Manual Operativo (En varios municipios se localizan más de dos pueblos haciendo que el total de municipios aumente de 32 a 35).

*El Componente II. Fortalecimiento de capital humano en materia de cambio climático y sistematización de buenas prácticas:* según los acuerdos a los que se llegó en reunión del 22 de septiembre de 2015, quedará limitado a implementar la iniciativa “súbete” de educación sobre cambio climático, consensuada ya con la Secretaría de Educación del Gobierno de Honduras para inclusión en la curricula nacional básica en comunidades PIAH.

Por lo anteriormente mencionado el **Proyecto PIAHCC** se limitara a la ejecución del componente I *Soluciones de adaptación y mitigación al cambio climático*. Por un monto de **UN MILLON DE DOLARES (US\$1,000.000.00)**

#### 4. Focalización

Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca y Maya Chortí, a ellos se les está asignando más o menos US\$ 350,000.00, y para priorizar el resto de los recursos se analizará la factibilidad de los proyectos ya presentados al programa.

**Estructura del Convenio:** a continuación se muestra el detalle de costos y financiamiento ajustado según Carta Modificatoria N°2 para el componente uno, su estructura es la siguiente:

CATEGORÍAS DE INVERSIÓN	BID	BID	BID	APORTE LOCAL	TOTAL
	EJECUTADO FINANCIAMIENTO ORIGINAL	NUEVO FINANCIAMIENTO	TOTAL FINANCIAMIENTO		
Componente 1 Soluciones de AMCC	52,713.51	757,071.00	809,784.51	0.00	809,784.51
Sub componente 1.01 Propuesta	8,262.85	707,071.00	715,333.85	0.00	715,333.85
Sub componente 1.02 Acompañamiento Técnico	44,450.66	50,000.00	94,450.66	0.00	94,450.66
Gestión del Programa	158,039.54	202,812.00	360,851.54	0.00	360,851.54
Evaluación Externa y Auditoría	15,046.85	12,845.00	27,891.85	0.00	27,891.85
Imprevistos	0.00	27,272.00	27,272.00	0.00	27,272.00
Comisión de Administración	120,188.00	0.00	120,188.00	0.00	120,188.00
<b>TOTAL</b>	<b>345,987.90</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,345,987.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345,987.90</b>

Nota: en Dólares Americanos

#### i. Avance financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
<b>2013</b>	1,907,838.00	676,800.22	35%
<b>2014</b>	16,341,372.00	4,853,382.71	30%
<b>2015</b>	4,080,629.00	2,621,639.23	64%
<b>2016</b>	3,270,790.00	3,055,190.37	93%
<b>2017</b>	14,151,457.00	13,656,861.83	97%

## ii. Avance físico por sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios Directos 2017
PRODUCTIVO	0	5,722,855.85	598	825
ENERGIA RENOVABLE	3	5,622,470.50	102	1,350
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>11,345,326.35</b>	<b>700</b>	<b>2,175</b>

## iii. Avance físico por departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios directos 2017
COPAN	0	1,599,086.37	162	195
INTIBUCÁ	2	4,932,139.21	68	935
LA PAZ	1	1,924,251.29	34	415
OCOTEPEQUE	0	1,401,338.75	208	300
SANTA BARBARA	0	1,488,510.73	228	330
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>11,345,326.35</b>	<b>700</b>	<b>2,175</b>

## iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	MONTO TOTAL EJECUTADO
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	2,311,535.48
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,311,535.48</b>

## 5. Principales Logros

- Los tres Proyectos de Adquisición e Instalación de 236 Sistemas Solares Domiciliarios en tres comunidades Rurales, iniciaron ejecución 08 de mayo de 2017, y finalizaron el 15 de octubre de 2017, manifestando los beneficiarios su satisfacción por los beneficios recibidos, siendo el monto de la inversión por parte del PIAHCC de L 4,637,720.50.
- El 08 de noviembre finalizó el componente de Reforestación de los Proyectos de Energía Renovable y Manejo de Recursos Naturales se encuentra, mediante este componente se dotó de 6,000 Plantas Frutales y de la Instalación de tres viveros para el manejo y producción de 10,000 plantas forestales anuales cada uno en tres comunidades rurales, siendo el monto de la inversión por parte del PIAHCC de L 534,750.00.

- Al 31 de diciembre de 2017, los tres proyectos de Mejoramiento de Café con Sistemas Agroforestales adjudicados a la empresa Honduran Quality Coffe (HQC), presentan un avance significativo cumpliendo en un 60% con el plan de trabajo, equivale a L 4,488,935.85
- En lo que respecta a los dos proyectos de Mejoramiento de Cultivos Hortícolas con Riego por Goteo, la empresa FORCADEH inició la ejecución de los mismos el 26 de octubre de 2017, presentando su plan de trabajo y un avance de un 30% del cumplimiento del mismo a diciembre de 2017, lo que fue equivalente a una ejecución financiera de L 1,233,920.00.
- En el mes de noviembre de 2017 se recibió la No Objeción al proyecto construcción de una caja puente y Reforestación en el municipio de Gualcince, Departamento de Lempira, y en el mes de diciembre de 2017 se recibió la No Objeción a los documentos de comparación de precios.
- Al 31 de diciembre de 2017, presenta una ejecución de US\$ 1,075,371.31 lo que representa el 80% del total del convenio, montos comprometidos acumulados por US\$ 1,220,222.51 lo que representa un 91% del total del convenio, y monto por comprometer de US\$125,765.39 el equivalente a 9%, y se espera poder comprometer el remante durante el primer semestre del año 2018.

## 6. Problemática

- Será necesario para los meses que restan del año 2018, una ejecución fluida ya que los tiempos de ejecución del Programa son bastante ajustados para realizar los proyectos en el tiempo planificado y poder hacer cumplir con la fecha de último desembolso del Programa en febrero de 2018.
- Será necesario incorporación presupuestaria para la ejecución de los proyectos de Cultivos Hortícolas, proyectos de Mejoramiento de Café y Proyecto de construcción de caja puente, el cual se incorporará mediante solicitud a la SEFIN.
- Las lluvias han retrasado la ejecución de los proyectos ya que las zonas donde se ejecutan los mismos han tenido una gran cantidad de precipitaciones lo que hace más difícil el acceso a las comunidades, e impide en ocasiones que los beneficiarios asistan a las convocatorias para las reuniones comunitarias.



## ✓ Programa de Integración y Convivencia Urbana

### 1. Objetivo

El objetivo general del Proyecto es contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán (Distrito Central).

### 2. Objetivos específicos

- Mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos;
- Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo;
- Fortalecer el capital social de estas comunidades.

### 3. Descripción

Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, se apoyarán los siguientes componentes:

#### Componente 1. Mejora en la convivencia social

- ✓ Este componente busca apoyar acciones de capacitación y asistencia técnica destinadas a fortalecer las organizaciones comunitarias y apoyar a los grupos más vulnerables. Se busca desarrollar capacidades y valores individuales, familiares y comunitarios, dimensionados de acuerdo a las necesidades identificadas en cada barrio seleccionado de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP. Para ello, se financiarán: (i) talleres de capacitación sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria, salud reproductiva y prevención de violencia bajo un enfoque de género; (ii) talleres y cursos de capacitación laboral para incrementar las posibilidades de inserción de jóvenes, y mujeres en el mercado de trabajo de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP; (iii) actividades recreativas para niños; (iv) el personal técnico que ejecuta los trabajos sociales; y (v) una consultoría para la sistematización de las intervenciones sociales.

#### Componente 2. Proyectos de integración urbana

- ✓ Este componente busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios urbanos entre los más pobres del Distrito Central, seleccionados de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP. Previo a las intervenciones de cada barrio se

preparará un Plan Integral de Mejoramiento de Barrios (PIMB), el cual incluirá los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería y la programación y presupuestos de los trabajos sociales. Este instrumento permitirá la adecuada programación de las inversiones y facilitará el dialogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Este componente financiará: (i) la contratación de consultorías para la preparación de los PIMBs; y (ii) las contrataciones para las inversiones en obras de infraestructura básica de agua y saneamiento, alumbrado público, vialidad, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMBs. De ser necesario, se promoverá la recuperación de centros educativos y centros de salud públicos, operados por las entidades estatales competentes.

- ✓ Los barrios beneficiarios del Proyecto han sido seleccionados en base a tres criterios básicos: (i) pobreza (medido por el Índice de Marginación publicado por la Secretaria de Desarrollo Social); (ii) densidad demográfica (favoreciendo los barrios de mayor densidad); y (iii) déficit de infraestructura de saneamiento (con posibilidad de conexión a la red de alcantarillado existente). Los criterios de elegibilidad y de priorización de los barrios se describen con más detalle en el ROP.

#### Gestión del Proyecto y Evaluación

- i. Se financiarán los gastos operativos de la ejecución del Proyecto y su evaluación, además de estudios específicos. Las actividades específicas que serán financiadas incluyen: (i) los gastos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP); (ii) los materiales y equipos requeridos para la ejecución; (iii) el personal técnico que apoya, en campo, el monitoreo de los trabajos sociales, a cargo de los Enlaces Técnicos Comunitarios (ETEC); (iv) la estrategia de comunicación del Proyecto; (v) las consultorías de evaluación intermedia y final, además de la consultoría de impacto del Proyecto; y (vi) la auditoría financiera.

#### **4. Costo del Proyecto y plan de financiamiento**

- ii. El costo estimado del Proyecto es el equivalente de diecisiete millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$17.200.000), que serán financiados por el Banco de la siguiente forma: doce millones cuarenta mil dólares (US\$12.040.000) con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO) y cinco millones ciento sesenta mil dólares (US\$5.160.000) con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE). El

presupuesto consolidado por componente se muestra en el siguiente cuadro, el cual presenta la distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento. Los costos del Proyecto incluyen los impuestos, tasas y derechos arancelarios aplicables a las adquisiciones y contrataciones del Proyecto, según la legislación nacional. Los intereses podrán ser financiados con recursos del Financiamiento.

La fecha de cierre del proyecto es el 15 de Junio del 2017, pero según lo establecido a los acuerdos dictados por el BID, pero de acuerdo a CID/CHO/1797/2017 emitida por el BID respondiendo al Oficio DGCP-DEM-704-2017, el Banco otorgo su anuencia a que se amplié el plazo de cierre de la operación al 15 de diciembre del 2017 en los sistemas país, según lo solicitado, con la finalidad de que el Programa cuente con el tiempo suficiente para poder cerrar física y financieramente todos los compromisos de la operación, se otorgó mediante solicitud enviada a la Lic Rocio tabora Sub Secretaria de Crédito e Inversión Publica SEFIN, una extensión al 31 de diciembre de 2017 para realizar el cierre del Proyecto.

#### i. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	4,922,920.00	2,773,999.51	56.35%
2014	136,221,739.00	112,190,571.97	82.36%
2015	120,882,736.00	106,545,487.78	88.14%
2016	118,504,457.00	113,622,321.26	95.88%
2017	52,422,371.00	47,817,034.79	91.21%

#### ii. Avance Físico por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios Directos 2017
AGUA Y SANEAMIENTO	1	878,916.59	13	1,505
ELECTRIFICACION	6	11,806,832.48	155	12,062
INFRAESTRUCTURA VIAL	1	2,336,769.49	18	444
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	6	12,507,347.27	117	13,913
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>27,529,865.83</b>	<b>303</b>	<b>27,924</b>

Nota: Se incluyen proyectos terminados al 31 de diciembre de 2017 (actas de recepción definitivas).

### iii. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios directos 2017
FRANCISCO MORAZAN	14	27,529,865.83	303	27,924
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>27,529,865.83</b>	<b>303</b>	<b>27,924</b>

### iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	EJECUTADO 2017
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	20,287,168.96
<b>TOTAL</b>	<b>20,287,168.96</b>

## 5. Principales Logros

<i>Avances Programa</i>		
<b>Componente 1: Mejora en la convivencia social y comunitaria</b>		
<b>1.0</b>	<b>Talleres de capacitación laboral</b>	
<b>1.1</b>	<i>Capacitaciones en Emprendimiento</i>	Se impartieron 3 módulos de capacitación en emprendimiento: Elaboración de Encurtido, Bisutería y Elaboración de Pan de Pan donde asistieron 600 participantes.
<b>2.0</b>	<b>Capacitaciones sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia</b>	
<b>1.1</b>	<i>Capacitaciones en Valores</i>	Se impartieron 3 módulos de capacitación en valores para el mantenimiento y sostenibilidad de obras de infraestructura, aseo comunitario y fortalecimiento de comités donde asistieron 2450 participantes.
<b>1.2</b>	<i>Programa Deportivo y de Valores</i>	Se ha ejecutado el Programa de Deportes y Valores en las disciplinas de: Taekwondo, Tenis de Mesa, Atletismo, Balonmano y Levantamiento de pesas, con una participación de 1,200 niños y jóvenes de las colonias beneficiarias.
<b>3.0</b>	<b>Convivencias Integración y Eventos Recreativos</b>	
<b>3.1</b>	<i>Eventos recreativos con niños</i>	Se ejecutaron 9 actividades recreativas del Programa de Deportes y Valores, entre ellas: Visitas a la Villa Olímpica para entrenamientos especiales y al Museo de la Identidad Nacional, en estos eventos se ha tenido una asistencia de 2500 participantes entre jóvenes y niños; adicionalmente se realizaron 2 talleres de cierre y sostenibilidad donde participaron 700 líderes y jóvenes comunitarios.
<b>Componente 2: Proyecto de Integración urbana</b>		
<b>1.0</b>	<b>Construcción Salón Usos Múltiples colonia Alemania código 106140</b>	

	<p><i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Salón de usos múltiples.</i></li> <li>▪ <i>Cocineta.</i></li> <li>▪ <i>Patio trasero con pileta.</i></li> <li>▪ <i>Gradas de acceso.</i></li> </ul>	100% de Avance Físico.
<b>2.0</b>	<b>Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico colonia Brasilia código 106142</b>	
	<p><i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>pavimento de concreto hidráulico de 288.66 ml de calle.</i></li> <li>▪ <i>Construcción de huellas vehiculares en 202.41 ml de calle.</i></li> </ul>	100% de Avance Físico.
<b>3.0</b>	<b>Reparación de Cancha para Usos Múltiples colonia Buenas Nuevas código 105915</b>	
	<p><i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Instalación de portones: 1 vehicular y 2 peatonales.</i></li> <li>▪ <i>Desmontaje de la malla ciclón en mal estado y sustitución.</i></li> <li>▪ <i>Colocación de malla ciclón perimetral.</i></li> <li>▪ <i>Limpieza y pintura de paredes.</i></li> <li>▪ <i>Resane del área de gradería gradas.</i></li> <li>▪ <i>Construcción de muro posterior de la escuela.</i></li> <li>▪ <i>Instalaciones de iluminación para la cancha.</i></li> </ul>	100% de Avance Físico.
<b>4.0</b>	<b>Canalización de Quebrada colonia Las Pavas y Amates código105913</b>	
	<p><i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Canal de losa y pared de concreto hidráulico con una longitud aproximada de 106.89 M.</i></li> <li>▪ <i>Disipadores de energía.</i></li> <li>▪ <i>Pretil sobre calle pavimentada de la colonia Villafranca.</i></li> <li>▪ <i>Barrera de malla ciclón y tubo HG.</i></li> <li>▪ <i>Pasamanos de tubo HG.</i></li> </ul>	100% de Avance Físico.
<b>5.0</b>	<b>Construcción Centro Comunal Colonia Arcieri código: 106141</b>	
	<p><i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Salón comunal (112 M2).</i></li> <li>▪ <i>Cocina Bodega de 3.50 M x 8M</i></li> <li>▪ <i>Módulo Sanitario.</i></li> <li>▪ <i>Espacios para almacenamiento de agua potable: Tanque elevado y pila.</i></li> <li>▪ <i>Construcción de acera</i></li> <li>▪ <i>Acondicionamiento de área de juegos infantiles.</i></li> </ul>	100% de Avance Físico.
<b>6.0</b>	<b>Construcción Centro Comunal Colonia David Betancourth código 106138</b>	
	<i>Ejecución de obras, que incluye la</i>	100% de Avance Físico.

	<p><i>construcción de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Salón comunal (112 M2).</i></li> <li>▪ <i>Cocina Bodega de 3.50 M x 8M</i></li> <li>▪ <i>Módulo Sanitario de 3.50 M x 8.00 M</i></li> <li>▪ <i>Espacios para almacenamiento de agua potable: Tanque elevado.</i></li> <li>▪ <i>Construcción de Muro de mampostería.</i></li> <li>▪ <i>Construcción de Muro de Bloque y malla ciclón.</i></li> <li>▪ <i>Construcción de Gradadas.</i></li> <li>▪ <i>Acondicionamiento de área de juegos infantiles.</i></li> </ul>	
<b>7.0</b>	<b>Construcción de Centro Comunal Colonia Montes de Bendición código 106148</b>	
	<p><i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Salón comunal (70.7 M2).</i></li> <li>▪ <i>Bodega de usos múltiples (12.9 M2).</i></li> <li>▪ <i>Cocina (13.2 M2).</i></li> <li>▪ <i>4 Módulos de servicio sanitario.</i></li> <li>▪ <i>Espacios para almacenamiento de agua potable: Tanque elevado y pila.</i></li> </ul>	100% de Avance Físico.
<b>8.0</b>	<b>Reparación Campo de Fútbol Colonia Ramón Amaya Amador con código: 106173</b>	
	<p><i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Cancha (5,100 M2).</i></li> <li>▪ <i>Construcción de Muro de mampostería (240 M3)</i></li> <li>▪ <i>Construcción de cunetas de Mampostería (225 M).</i></li> <li>▪ <i>Construcción de acera (607 M2).</i></li> <li>▪ <i>Construcción de cerco perimetral (290M).</i></li> <li>▪ <i>Reparación de galera de gradadas existente.</i></li> <li>▪ <i>Construcción de bancas.</i></li> </ul>	100% de Avance Físico.
<b>9.0</b>	<b>Reparación del Sistema Eléctrico y Alumbrado Público Colonia Brisas de la Laguna con código: 105912</b>	
	<p><i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Instalación de Postes de Madera y de Concreto (23 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Instalación de estructuras para redes primarias y secundarias (31 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Instalación de Lámparas de Sodio (17 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Instalación de transformadores (1 unidad).</i></li> <li>▪ <i>Línea Primaria y Secundaria (570 Metros).</i></li> </ul>	100% de Avance Físico
<b>10.0</b>	<b>Reparación del Sistema Eléctrico y Alumbrado Público Colonia San Juan del Norte con código: 105918</b>	
	<p><i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de:</i></p>	100% de Avance Físico

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Instalación de Postes de Madera y de Concreto (102 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Instalación de estructuras para redes primarias y secundarias (156 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Instalación de Lámparas de Sodio (102 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Instalación de transformadores (3 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Línea Primaria y Secundaria (2,000 Metros).</i></li> </ul>	
<b>11.0</b>	<b>Reparación del Sistema Eléctrico y Alumbrado Público Colonia Arcieri con código: 105920</b>	
	<p><i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Instalación de Postes de Madera y de Concreto (40 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Instalación de estructuras para redes primarias y secundarias (67 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Instalación de Lámparas de Sodio (80 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Línea Primaria y Secundaria (850 Metros).</i></li> </ul>	100% de Avance Físico
<b>12.0</b>	<b>Reparación del Sistema Eléctrico y Alumbrado Público Colonia David Betancourth con código: 105923</b>	
	<p><i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Instalación de Postes de Madera y de Concreto (28 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Instalación de estructuras para redes primarias y secundarias (47 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Instalación de Lámparas de Sodio (60 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Línea Primaria y Secundaria (650 Metros).</i></li> </ul>	100% de Avance Físico
<b>13.0</b>	<b>Reparación del Sistema Eléctrico y Alumbrado Público Colonia Montes de Bendición con código: 105925</b>	
	<p><i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Instalación de Postes de Madera y de Concreto (35 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Instalación de estructuras para redes primarias y secundarias (62 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Instalación de Lámparas de Sodio (107 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Línea Primaria y Secundaria (1200 Metros).</i></li> </ul>	100% de Avance Físico
<b>14.0</b>	<b>Reparación del Sistema Eléctrico y Alumbrado Público Colonia Ramón Amaya Amador con código: 106081</b>	
	<p><i>Ejecución de obras, que incluye la construcción de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Instalación de Postes de Madera y de Concreto (79 unidades).</i></li> <li>▪ <i>Instalación de estructuras para redes primarias y secundarias (156 unidades).</i></li> </ul>	100% de Avance Físico

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Instalación de Lámparas de Sodio (200 unidades).</i></li><li>▪ <i>Línea Primaria y Secundaria (1750 Metros).</i></li><li>▪ <i>Instalación de transformadores (2 unidades).</i></li></ul>	
---	--

## 6. Problemática:

1. El Programa de deportes y valores es necesario la gestión de sostenibilidad ya que el Programa cerró en diciembre del año 2017.

## **CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA**

### **Proyecto de Infraestructura Rural BCIE**



#### **1. Objetivo General**

Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

#### **2. Focalización:**

- En base a la metodología de selección de la mancomunidades ejecutado por PIR, que toma en consideración el índice de desarrollo humano, la capacidad de gerenciamiento de la Unidades técnicas Municipales en cada mancomunidad y no más de una mancomunidad por departamento, fueron seleccionadas las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

#### **3. Tipología de Proyectos**

- Electrificación Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- Agua y Saneamiento: proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
- Caminos Rurales: proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando las comunidades beneficiadas el 15% del total del proyecto.

**Monto del Convenio:** L.285.0 Millones de Lempiras aproximadamente, según convenio de préstamo el tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses.

**i. Avance Financiero**

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2011	37,790,000.00	0.00	0.00%
2012	6,393,674.00	0.00	0.00%
2013	33,774,273.00	33,771,086.72	99.99%
2014	42,465,271.00	32,714,051.57	77.04%
2015	32,683,893.00	32,295,225.85	98.81%
2016	95,056,511.00	93,906,331.81	98.79%
2017	89,155,169.00	86,922,798.37	97.50%

**ii. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios Directos 2017
AGUA Y SANEAMIENTO	7	24,930,776.21	88	6,276
ELECTRIFICACION	1	-	43	270
INFRAESTRUCTURA VIAL	11	41,538,949.73	203	6,437
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>66,469,725.94</b>	<b>334</b>	<b>12,983</b>

**iii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios directos 2017
FRANCISCO MORAZAN	7	14,743,301.14	138	4,469
INTIBUCÁ	7	38,167,857.91	175	7,482
LEMPIRA	5	13,558,566.89	21	1,032
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>66,469,725.94</b>	<b>334</b>	<b>12,983</b>

**iv. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	EJECUTADO 2017
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	20,453,072.43
<b>TOTAL</b>	<b>20,453,072.43</b>

#### 4. Principales Logros

##### Ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2017

El año 2017 cierra con una ejecución presupuestaria de 97.50% al 31 de diciembre; la diferencia por ejecutar se debe, en su mayoría, a una estimación de obra del subproyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales Tramo El Roble - Susuma, Municipio de Piraera y la transferencia a la Mancomunidad CAFEG por concepto de Supervisión y Capacitación del subproyecto de Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Casco Urbano del Municipio de Candelaria, ambos en el departamento de Lempira.

En el IV trimestre 2017 se solicitó a la Secretaría de Finanzas una incorporación presupuestaria por L. 6,472,039.00, bajo el componente B “Servicios de Infraestructura Rural”, resultando el presupuesto vigente en L. 89, 155,169.00.

1. En el sector de **Agua y Saneamiento**, actualmente se encuentran en ejecución dos (02) construcciones de sistemas de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en los cascos urbanos de los municipios de San Andrés y Santa Cruz, en el departamento de Lempira con un 45% y 60% de porcentaje de ejecución respectivamente. Se tienen dos (02) subproyectos listos para dar inicio a sus obras en los primeros meses del 2018.

Durante el IV trimestre, se reporta como finalizado en el mes de noviembre, subproyecto de Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomoncagua, Departamento de Intibucá, donde se había planificado la conexión de 50 viviendas beneficiarias, sin embargo, al final del subproyecto se reportaron 15 conexiones extras al sistema, dando como resultado 65 conexiones finales, beneficiando a 390 pobladores del casco urbano del municipio; con la construcción de estas obras se logró la generación de 27 empleos como parte del aporte de mano de obra no calificada.

En el mes de diciembre se finalizan las obras del subproyecto de Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, también en el Departamento de Intibucá, proyecto en el cual se logró el aumento de 194 a 360 viviendas conectadas al sistema, dado que se dio un aumento de la cobertura de viviendas que se benefician por el tratamiento de las aguas servidas en la planta construida, con el que anteriormente no contaban. En total se benefician 2,160 pobladores del casco urbano y se generaron 17 empleos locales.

Por otra parte, se reporta como finalizada la Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Aldeas San José y La Alondra, en el Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira con 96 conexiones a viviendas beneficiando a 576 personas, además de la generación de 17 empleos en la zona.

2. En el sector de **Caminos Rurales**, se encuentran en ejecución seis (06) subproyectos de rehabilitación de caminos; en los municipios de San Francisco y Piraera en el departamento de Lempira, municipio de Orica departamento de Francisco Morazán y Municipio de Concepción en el departamento de Intibuca.

Para este sector, durante el IV trimestre se reportan como finalizados dos (02) subproyectos: Rehabilitación de Caminos Rurales Tramo El Barreal - El Portillo La Montaña (2.25 km) y Tramo Santa Lucía – Castaño (12.00 km), ambos ubicados en el Municipio de Santa Lucía, Departamento de Intibucá. Se registran 409 beneficiarios con la finalización de estos caminos, asimismo se generaron 30 empleos locales.

3. En el sector de **Electrificación Rural** por extensión de red, actualmente no se encuentran subproyectos en ejecución, sin embargo el informe de evaluación del subproyecto RorrUCA Centro de San Francisco, Lempira, ha sido concluido por parte de la Mancomunidad CAFEG y se encuentra en proceso de certificación por parte de la Dirección de Contrataciones de FHIS. Mientras que el expediente del subproyecto de la comunidad El Pedernal en Camasca, Intibucá y la comunidad de Susuma en el municipio de Piraera, Lempira, incluyendo las bases de licitación, se ha remitido al Especialista de PIR para su revisión.

Al 31 de diciembre del 2017, se suscribieron/adjudicaron contratos de inversión, supervisión de inversión, capacitación social y supervisión de capacitación, diseño y auditoría por el orden de los L 52.15 Millones, de los cuales L 51.20 Millones serán financiados con fondos del Préstamo.

De igual manera, se encuentra en proceso de contratación, un (01) subproyecto del sector de Electrificación (RorrUCA Centro), por un monto estimado total de L 1.02 Millones que será financiado con fondos del Préstamo.

Asimismo, se encuentran pendientes de inicio de proceso de contratación, dos (02) subproyectos del Sector Agua Potable y Saneamiento, por un monto total de L 7.57 Millones, y un subproyecto del

sector de Electrificación, por un monto total de L 2.6 Millones, en los departamentos de Francisco Morazán e Intibucá.

## 5. RESULTADOS DE GESTION (FP02)

Con fondos del Préstamo del BCIE-1736, durante el IV trimestre finalizaron sus obras físicas los subproyectos de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de los Cascos Urbanos de los Municipios de Colomoncagua (65 conexiones) y Magdalena (360 conexiones) del Departamento de Intibucá; que consisten en la construcción de una red colectora, mediante cajas de registro y pozos de inspección, Colector No 1 y Colector No 2, con tubería de PVC y Hierro Fundido Dúctil (HFD), incluye cruces aéreos, tubería de PVC con recubrimiento de concreto; Planta de Tratamiento: Pre tratamiento, rejillas, desarenador, fosas sépticas, biofiltro y patio de secado de lodos, construcción de obras de mitigación para protección de la planta de tratamiento (muros de contención y cabezal de descarga). En total se conectaron 425 viviendas a los dos sistemas beneficiando así a 2,550 personas de las zonas mencionadas.

De igual forma se finalizó la Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Aldeas San José y La Alondra, en el Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira, este proyecto consiste en una obra toma, dos desarenadores, dos líneas de conducción, dos tanques de distribución, (La Alondra -15 mil galones y San José -5 mil galones), dos redes de distribución, tanques rompecargas, 96 acometidas domiciliarias, cruces aéreos obras de protección como ser recubrimientos con concreto para tubería de PVC y saneamiento consistente en 42 letrinas de cierre hidráulico.**DESEMBOLSOS DEL PIR**

## 6. DESCENTRALIZACIÓN A LAS MANCOMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PIR

Con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE Préstamo No. 1736, durante el IV período 2017 no se realizaron transferencias a las Mancomunidades, sin embargo, desde el inicio del Proyecto se han transferido L141.9 Millones para la ejecución de subproyectos de infraestructura.

**TRANSFERENCIAS PARA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DESCENTRALIZADOS Y  
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2017**

MANCOMUNIDAD	AGUA Y SANEAMIENTO	ELECTRIFICACIÓN RURAL	CAMINOS RURALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TOTAL LEMPIRAS
AMFI	13,722,335.29	11,761,414.15	13,089,085.41		38,572,834.85
CAFEG	21,279,038.07	18,312,952.09	13,277,543.75		52,869,533.91
MANOFM	18,148,759.70	9,378,993.64	22,422,424.95	540,000.00	50,490,178.29
<b>Total</b>	<b>53,150,133.06</b>	<b>39,453,359.88</b>	<b>48,789,054.11</b>	<b>540,000.00</b>	<b>141,932,547.05</b>

## 7. DESEMBOLSOS DEL PIR

Durante el IV trimestre del 2017, se presentaron al BCIE dos (2) solicitudes para la Restitución del Fondo Rotatorio, la No. 5 y No. 6. La Restitución No. 5 por USD\$ 1,736,454.70, de los cuales fue desembolsado USD\$ 868,228.32 el 22 de noviembre del 2017, la diferencia retenida corresponde a la segunda amortización de fondos de conformidad a lo establecido en la Carta Complementaria No. 2 “Procedimiento para el mientras que la Restitución No.6 por un monto de USD\$ 837,562.40, se encuentra en proceso de revisión y aprobación.

## 8. PROBLEMÁTICA FÍSICA Y FINANCIERA

1. En el sector de Agua Potable y Saneamiento, se han tenido atrasos en los subproyectos de Alcantarillados Sanitarios de los cascos urbanos de Colomocagua, San Andrés y Santa Cruz por falta de cumplimiento de los aportes municipales en materiales y de la comunidad con su mano de obra no calificada, teniéndose que suspender la ejecución de los proyectos, para lo cual la UCP/PIR ha notificado al Contratista sobre la lenta ejecución, además de intervenir buscando mecanismos y estrategias puntuales para cada caso, para asegurar la terminación de las obras. A la fecha los subproyectos se encuentran en ejecución con el 45% y 60% de avance respectivamente.

2. Del sector de Caminos Rurales, se han presentado retrasos en el avance de obra por condiciones climáticas desfavorables de los subproyectos de Rehabilitación; lo cual ha obligado a realizar ampliaciones de plazo y/o suspensiones, además se han aplicado multas a los contratistas de los subproyectos que no han justificado los atrasos de la ejecución de obras. Se ha dado el monitoreo respectivo a estos subproyectos, además de haberse realizado reuniones con los Contratistas para definir la programación a desarrollar para el término de las obras.

## **CARTERA KfW Entwicklungsbank**

### **✓ Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE) FASE III**



#### **1. Objetivo General**

Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

#### **2. Focalización**

El área de intervención del Programa comprende principalmente los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. El Programa PROEFA de la GIZ apoya actualmente al sector educativo en Honduras. Al igual que en las fases I y II del Programa se buscará la coordinación con el Programa PROEFA de la GIZ o en su debido caso con el Programa que le siga, siempre y cuando existan medidas complementarias entre ambos programas.

#### **3. Descripción del Proyecto**

El Programa comprende la tercera fase del Programa PROMINE que se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EfA-FTI (Education for All / Fast Track Initiative) y contribuye al logro de las Metas del Milenio en Educación en la República de Honduras y por lo tanto en general se rige por los acuerdos ya definidos para la ejecución de la primera y segunda fase. Se financiará infraestructura educativa en estrecha articulación con el Sector. La ejecución del Programa será responsabilidad de la Secretaría de Educación (SE) como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) como ente ejecutor. Los recursos del Programa se utilizarán principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o el mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizarán mediante la modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (Proyectos Ejecutados por la Comunidad – PEC-FHIS) empleada con éxito en el programa FHIS VI y VII, aplicada de forma general en todos los proyectos, indistinto de su monto financiero, excepto los altamente complejos.

**Monto del Proyecto:** Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son EUR 11, 945,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

**Fecha de Firma de convenio:** 30/12/2013

**Fecha de Finalización de convenio:** 31/05/2018

**i. Avance Financiero PROMINE FASE III**

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2016	145,687,475.00	142,916,817.45	98.10%
2017	107,279,375.00	96,731,967.93	90.17%

**ii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE III**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017*	Empleos Generados 2017	Beneficiarios Directos 2017
EDUCACION	19	79,181,274.98	546	6,467
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>79,181,274.98</b>	<b>546</b>	<b>6,467</b>

\*Componente de Infraestructura SIAFI

\*Nota: Datos aproximados generados por el Sistema IDECOAS-FHIS

**iii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE III**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios directos 2017
INTIBUCA	5	11,109,688.07	114	604
LA PAZ	3	14,629,012.20	101	3,177
LEMPIRA	4	20,238,084.51	110	400
SANTA BARBARA	2	8,900,652.50	49	273
OCOTEPEQUE	2	11,559,721.04	82	806
COPAN	3	10,921,055.21	90	1,207
CHOLUTECA	0	16,218.75	0	0
OLANCHO	0	541,966.35	0	0
COLON	0	1,264,876.37	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>79,181,274.98</b>	<b>546</b>	<b>6,467</b>

\*Datos del Sistema de FHIS solo se considera componente de infraestructura .

**iv. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	EJECUTADO 2017
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	17,550,692.95
<b>TOTAL</b>	<b>17,550,692.95</b>

**4. Avance físico de las obras**



Fase III contempla 48 proyectos (incluye un proyecto de equipamiento) los cuales han ingresado al ciclo de proyectos del FHIS.

Este número de proyectos que se aprobarán variarán en base al costo de los mismos y la disponibilidad de recursos.

**5. Logros PROMINE Fase III**

- ✓ Se ejecutó el 90.17 % de los fondos asignados en presupuesto.
- ✓ Se han terminaron 19 proyectos con los cuales se beneficiaron a 6,467 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 546 empleos.

## 6. Retos Próximos

Entre los principales retos que enfrenta el PROMINE-KfW se mantienen los indicados en el informe anterior entre otros:

- **Ejecución de Proyecto:** i) Inicio y finalización de los proyectos pendiente orden de inicio.
- **Vigencia de PROMINE fase III:** Se estará analizando el tiempo requerido de ampliación para el PROMINE fase III de acuerdo al inicio de los proyectos pendientes iniciar.
- **Inicio de PROMINE fase IV:** Se está en proceso del cumplimiento de condiciones previas para el inicio de dicha fase.
- **Firma del Contrato de Aporte Financiero de PROMINE fase V:** Se están realizando las gestiones correspondientes para el Canje de Notas entre países (Honduras – Alemania) y la enmienda a la nota de prioridad del Programa, lo anterior para realizar la firma del contrato.

✓ **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras**  
**(CONVIVIR)**



### **1. Objetivo General**

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

### **2. Focalización**

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 3 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Gracias, departamento de Lempira
- Municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua
- Municipio de La Lima, departamento de Cortes.

### **3. Descripción del Proyecto**

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

**Monto del Proyecto:** Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son Euros 12, 200,000.00. El tipo de financiamiento es un contrato de Préstamo.

**Fecha de Firma de convenio:** 08/11/2012

**Fecha de Finalización de convenio:** 31/03/2019

Oficializado al KfW con oficio No. DGCP-DEM-504/2017 de la Secretaria de Finanzas.

**i. Avance Financiero**

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	21,289,204.00	18,316,427.97	86.04%
2015	38,873,159.00	34,024,198.74	87.53%
2016	88,796,503.00	83,460,868.42	93.99%
2017	51,288,495.00	48,071,886.28	93.73%

**ii. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios Directos 2017
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	46	6,878,982.64		341
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	7	24,917,347.10	198	12,479
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>31,796,329.74</b>	<b>198</b>	<b>12,820</b>

**iii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios directos 2017
COMAYAGUA	17	11,176,126.80	61	3,494
CORTES	16	7,147,322.03	48	3,800
LEMPIRA	20	13,472,880.90	89	5,526
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>31,796,329.74</b>	<b>198</b>	<b>12,820</b>

**iv. Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	EJECUTADO 2017
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	16,275,556.54
<b>TOTAL</b>	<b>16,275,556.54</b>

#### 4. Principales Logros

En el presente cuadro se observa la ejecución financiera que ha tenido el Programa CONVIVIR desde su creación a la fecha, en el Cuarto Trimestre lo ejecutado se distribuye de la siguiente manera:

##### *Ejecución financiera del 4to trimestre*

Componente	Presupuesto Ejecutado 2014	Presupuesto Ejecutado 2015	Presupuesto Ejecutado 2016	EJECUTADO 2017
<b>01-Gasto Operativo</b>	536,459.53	4011,908.76	8,186,328.38	7,484,899.00
<b>02- Construcción</b>	4134,589.44	14781,805.43	53,726,357.68	21,533,793.15
<b>03- Fortalecimiento de Habilidades de Jóvenes</b>	0.00	2011,078.63	8,078,022.83	3,972,943.74
<b>04- Mejoramiento Capacidades de Actores Relevantes</b>	0.00	4114,456.01	2,137,666.23	2,906,038.90
<b>05-Materiales y Equipos</b>	0.00	820,323.53	3,142,655.66	3,383,553.95
<b>06-Consultoría internacional</b>	13645,379.00	8284,626.38	8,189,837.64	8,790,657.54
<b>Total</b>	<b>18,316,427.97</b>	<b>34,024,198.74</b>	<b>83,460,868.42</b>	<b>48,071,886.28</b>

Al cierre del período del cuarto trimestre del año 2017 la ejecución financiera del programa alcanza a un 93.72%. Entre las razones más importantes para este % de ejecución, está la relacionada con la demora del avance de algunos proyectos de infraestructura, los cuales no han podido completar su porcentaje de avance físico como para solicitar un 2° desembolso y lograr cumplir con la programación de transferencias.

#### 5. Avance Físico

En el componente de Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura el programa CONVIVIR tiene una cartera actualmente de 30 proyectos de infraestructura para ejecutar con el monto del convenio, de los cuales ya se terminaron 15 obras, 11 proyectos en ejecución y 4 proyectos listos para dar inicio, cabe mencionar, que se está trabajando en los equipamiento de los proyectos priorizando los que están terminados y los que están próximos a inaugurar.

A continuación se anexan los tres cuadros que corresponden a la ejecución física de cada una de las obras de infraestructura:

***Obras priorizadas en el municipio de Siguatepeque, Comayagua***

Proyecto	Inversión Estimada* (millones de Lempiras)	Estado
1. Obra de Confianza	L. 3104790.51	Proyecto terminado
2. Cancha de Futbol Col. Mata	L. 2668978.76	Proyecto terminado
3. Centro Calidad de Vida Col. Noé Cruz	L. 3012043.70	Proyecto Terminado
4. Centro de calidad de vida Bo. San Juan	L. 3598956.85	Proyecto en Ejecución 40% avance físico
5. Centro de Educación Digital	L. 393,589.02	Proyecto Terminado
6. Colonia El Carmen	L. 3,767,167.59	Proyecto en Ejecución 98% avance físico
7. Centro de calidad de vida aldea Las Crucitas	L. 2,956,701.47	Proyecto Terminado
<b>Total</b>	<b>L. 19,753,680.80</b>	

***Obras priorizadas en el municipio de Gracias, Lempira***

Proyecto	Inversión Estimada* (millones de Lempiras)	Estado
1. Obra de Confianza	L.3,225774.58	Proyecto Terminado.
2. Ampliación Casa de la Juventud.	L.6,846269.84	Proyecto Terminado.
3. Construcción campo de pelota Bella Vista y Pinalito.	L. 2,974,938.57	Proyecto Terminado
4. Reposición Polideportivo Villas del Rosario.	L. 6,338,642.02	Proyecto en Ejecución 40% avance físico
5. Construcción plaza para la Recreación y la Convivencia Pinalito y Bella Vista.	L. 2,147,440.69	Proyecto Terminado
6. Remodelación Plaza San Sebastián	L. 4,029,707.82	Proyecto Terminado
7. Casa de la cultura	L. 8,169,443.80	Listo para iniciar
8. Centros de Formación Digital.	L. 53,756.51	Proyecto terminado
9. Construcción de Salón multiusos Bella Vista y Pinalito.	L. 2,979,546.19	Proyecto en Ejecución 99.50% avance físico
10. Construcción parque recreativo Moreno y Hércules.	L. 5,459,590.31	Proyecto en Ejecución. 2% avance físico
11. Ampliación plaza Marco Tulio Rodriguez	L. 2,454,714.29	Listo para iniciar
12. Centro de calidad de vida Villami	L. 2,447,597.92	Proyecto en Ejecución 52% avance físico

13. Escuela de música Mejicapa	L. 3,280,000.00	Proyecto en Ejecución 35% avance físico
<b>TOTAL</b>	<b>L.50,407,422.54</b>	

*Obras priorizadas en el municipio de La Lima, Cortés*

Proyecto	Inversión Estimada* (millones de Lempiras)	Estado
1. Construcción centro juvenil de desarrollo integral	L. 3262,221.20	Proyecto terminado
2. Ampliación Plaza de la Juventud.	L. 7036,616.12	Proyecto terminado
3. Remodelación Caminos de los Gatos paseo del Puente y Áreas Aledañas	L. 1261,200.58	Proyecto en ejecución 52% avance físico
4. Remodelación parque los Pinos La Lima	L. 1775,191.17	Proyecto terminado
5. Parque Mediana Sitraterco	L. 8518,858.49	Listo para iniciar
6. Casa de la Cultura	L. 9605,935.76	Listo para iniciar
7. Remodelación Cancha El Maestro	L. 2687,523.23	Proyecto en ejecución 93% avance físico
8. Centros de Formación Digital.	L. 211,335.17	Proyecto terminado
9. Construcción Centro de Calidad De Vida Col. Nuevo San Juan	L. 2961,528.33	Proyecto en ejecución 55% avance físico
10. Construcción Centro de Calidad de Vida Alvarez Martínez	L. 3068,158.19	Proyecto en ejecución 27% avance físico
<b>TOTAL</b>	<b>L. 40,388,568.24</b>	

**11. Avance del Componente de Fortalecimiento de Habilidades Sociales y Laborales de Jóvenes**

En el Cuarto Trimestre del año 2017, se continuó con la formulación de procesos y ejecución de procesos de igual manera con la selección de participantes para estos dos (2) componentes esenciales del programa CONVIVIR, el cual se detalle a continuación un cuadro resumen de la situación de cada uno de ellos:

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS
<b>COMPONENTE 002 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES Y LABORALES CON JÓVENES</b>		
1. Fomento de las Competencias Laborales de las y los jóvenes de barrios seleccionados en cooperación con instituciones de la educación técnica y formación profesional	<p><b>TALLERES TÉCNICO VOCACIONALES CON CADERH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Finalización de los talleres de formación técnico-vocacionales en los tres municipios, con la certificación en la norma ISO17 004.</li> <li>Seguimiento y revisión de listado de implementos y herramientas para la compra de kits para emprender.</li> <li>Identificación y selección de mentores para el coaching y seguimiento para el emprendimiento e inserción laboral con jóvenes.</li> <li>Desarrollo de un taller para la formación de Mentores en el municipio de Siguatepeque.</li> <li>Desarrollo de Pasantías o prácticas laborales dirigidas a los jóvenes certificados, para instalar capacidades y experiencia laboral y de emprendimientos.</li> </ol>	<p>Compra de 148 kits para emprender (un kit por joven certificado según taller).</p> <p>161 jóvenes capacitados y certificados en los talleres de reparación de celulares, bisutería y procesamiento de alimentos.</p>
	<p><b>TALLERES TECNICO VOCACIONALES CON INFOP:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el cierre y clausura de los talleres en cada municipio, con la coordinación del personal de Acciones formativas de INFOP, oficiales de juventud de cada municipio, asesoría técnica, etc.</li> <li>Preparación de convocatoria para los jóvenes en los municipios a través de redes sociales, medios de comunicación etc.</li> <li>Coordinación de logística de alimentación, locales, etc, en cada municipio.</li> <li>Revisión de lista de Kit para emprender.</li> <li>Clausura y entrega de Kit para emprender en cada municipio de los siguientes talleres: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Belleza Básica.</li> <li>· Barbería Básica.</li> <li>· Uñas acrílicas.</li> <li>· Piñatería</li> </ul> </li> <li>Asignación de una Tablet por joven para fortalecer los conocimientos (Entrega en el primer trimestre del año 2018).</li> <li>Se están construyendo una estrategia de seguimiento para los jóvenes formados en los diferentes talleres en conjunto con INFOP y las Municipalidades.</li> </ol>	<p>180 jóvenes han sido formados en los talleres de formación técnica en los 3 municipios.</p> <p>Entrega de 180 kits para emprender a los jóvenes certificados.</p>

**COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES**

Fortalecimiento institucional de los actores (Dirección de Juventud) Administración Municipal, y organizaciones de autoayuda a nivel barrial) para mejorar su organización y sus capacidades para la prestación de sus servicios.	1. Se realizó un Adendúm 2 con la Fundación para el Desarrollo Humano (FIPADEH), para desarrollar el Diplomado en Medición de Conflictos y Construcción de cultura de Paz.	175 jóvenes y actores relevantes formados para el manejo de proyectos enfocados al desarrollo comunitario y Desarrollo de la juventud.
	2. Identificación de participantes con apoyo de la Corporación municipal de Cada Municipio.	70 actores locales han mejorado sus conocimientos sobre mediación de conflictos, como estrategia de prevención de violencia a nivel comunitario.
	3. Elaboración y ejecución de Proyectos enfocados en temas referentes al Desarrollo de la juventud y Gestión de Desarrollo comunitario	Tres proyectos replicados a nivel local enfocado en promoción de convivencia, desarrollo de la juventud y comunidad.

## **CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)**

### ✓ **Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP)**



#### **1. Objetivo General**

El Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP), tiene como objetivo principal, la construcción de proyectos sociales que mejoren la calidad de vida de la población, los cuales promueven la seguridad local e incorporan diseños del entorno para prevención del crimen y la violencia.

De esta manera, se contribuye a la mejora de las condiciones de vida de la población, se construye cohesión social y se impulsa la convivencia ciudadana. Algunos de los proyectos se han ejecutado bajo la modalidad PEC (Proyecto Ejecutado por la Comunidad).

#### **2. Focalización**

Todos los sub proyectos seleccionados serán ejecutados en zonas “calientes” urbanas y rurales y en comunidades remotas amenazadas por las maras y el narcotráfico. Unos proyectos son modalidad PEC y otros con contratista individual o firma constructora. Estos proyectos se están ejecutando actualmente.

Nota: La elegibilidad de los proyectos: Comunidades urbanas identificadas por la USAID bajo Mérida/CARSI. Se elegirán los sub proyectos que ayuden a mejorar la seguridad en las comunidades y que puedan construirse en menos de un año. El Programa está orientado a beneficiar a los habitantes de barrios y colonias con alto índice de violencia ubicados en los municipios de: La Ceiba, Atlántida; Tela, Atlántida; San Pedro Sula, Cortés; Choloma, Cortés; Comayagua, Comayagua; Nueva Arcadia, Copán; San Agustín, Copán; Cane, La Paz; Distrito Central; Puerto Lempira, Gracias a Dios.

#### **3. Descripción del Proyecto**

Ejecución de obras de infraestructura a través de la implementación de metodologías altamente participativas con el objetivo de utilizar principios de prevención de la violencia situacional, transformando

el espacio físico de las comunidades beneficiadas e involucrando activamente a los miembros de la comunidad en la identificación, selección y ejecución de los subproyectos. Se ejecutan diferentes tipos de proyectos tales como instalaciones educativas, centros de salud, iluminación de calles, proyectos de agua, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance, centros vocacionales y capacitación juvenil.

**Monto del Convenio:** Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de 155.095 millones de lempiras. Estos fondos son donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Adicionalmente cuenta con una contraparte de fondos nacionales por un monto de 48.078 millones de lempiras.

**i. Avance Financiero**

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2014	70,145,453.00	68,995,453.00	98.36%
2015	24,579,983.00	23,604,345.43	96.03%
2016	31,659,786.00	31,659,785.44	100.00%
2017	51,181,125.00	51,181,125.00	100.00%

**ii. Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios Directos 2017
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	7	37,259,649.00	205	8,861
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>37,259,649.00</b>	<b>205</b>	<b>8,861</b>

**iii. Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Empleos Generados 2017	Beneficiarios directos 2017
ATLANTIDA	2	10,645,614.00	33	1,265
CORTES	3	17,468,421.00	108	5,797
FRANCISCO MORAZAN	2	9,145,614.00	64	1,799
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>37,259,649.00</b>	<b>205</b>	<b>8,861</b>

**iv. Otras Inversiones**

<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>EJECUTADO 2017</b>
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	13,921,476.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,921,476.00</b>

**4. Principales Logros (Octubre a Diciembre 2017)**

**A. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

Este proyecto finalizó ejecución física el 30 de septiembre de 2017, según la Carta de Ejecución No 522-0441/31 522-05017/06. En este período se culminó con la ejecución de 108 proyectos de infraestructura comunitaria, beneficiando a 123,517 habitantes de las comunidades intervenidas (beneficiarios directos e indirectos).

El Programa cerró con una ejecución global de L. 175,440,708.87, divididos de la siguiente manera: L. 151,951,638.95 de fondos de donación de USAID y L. 27,943,750.00 de fondos de contraparte nacional. Actualmente se encuentra en proceso de cierre financiero, legal y técnico.

**i. Problemática presentada en el período**

Se solicitó la incorporación del Programa al presupuesto 2017 vigente, este ha sido analizado técnicamente y acompañado de la documentación pertinente, hubo algunos inconvenientes en el proceso de aprobación, lo cual dilató la regularización a ser presentada, misma que fue aprobada a mediados de diciembre, lo cual se logró reflejar una ejecución de L. 51,181,125.00 para el período de 2017.

✓ **Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a Través de las Energías Renovables (PODER)**



### 1. Objetivo General

El Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a través de las Energías Renovables (PODER), tiene como objetivo principal, mejorar las condiciones de vida del sector rural de Honduras más pobre del país. La falta de energía limita las oportunidades económicas y las opciones alimenticias disponibles en los hogares hondureños. Sin energía, familias rurales no tienen la capacidad de refrigerar y almacenar alimentos nutritivos, operar sistemas de irrigación y llevar a cabo procesos que les de valor agregado para generar ingresos adicionales, o incluso que les permita finalizar las tareas escolares por la noche. La meta de esta Actividad es proporcionar acceso a energías renovables (incluyendo las tecnologías que pueden resultar en la entrega de energía eléctrica) a por lo menos 10,000 familias rurales de Honduras, aproximadamente 50,000 beneficiarios en el occidente de Honduras en comunidades de la iniciativa de Alimentando el Futuro del Gobierno de Estados Unidos, a través de los proyectos, y de esta manera abordar algunas de las causas fundamentales de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

### 2. Focalización

Proyectos que mejoran la posibilidad para generar el ingreso de los residentes de las comunidades del área de influencia en los departamentos de La Paz, Lempira, Intibucá, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque.

### 3. Descripción del Proyecto

Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.

**4. Monto del Convenio:** Los fondos destinados para la ejecución de este Programa es de 20.82 millones de lempiras para el año 2016. Estos fondos son donación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

v. **Avance Financiero**

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2015	10,860,882.00	9,750,284.62	89.77%
2016	16,406,200.00	16,406,199.26	100.00%
2017	22,636,218.00	22,589,168.01	99.79%

vi. **Avance por Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Beneficiarios Directos 2017
RIEGO	7	4,985,793.84	102
ENERGIA RENOVABLE	8	13,480,109.26	2,656
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>18,465,903.10</b>	<b>2,758</b>

vii. **Avance por Departamento**

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017	Beneficiarios directos 2017
COPAN	1	1,231,060.21	250
INTIBUCÁ	8	6,848,481.65	1,072
LA PAZ	2	2,462,120.41	725
LEMPIRA	1	1,501,897.22	300
OCOTEPEQUE	2	2,462,120.41	250
SANTA BARBARA	1	3,960,223.20	161
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>18,465,903.10</b>	<b>2,758</b>

viii. **Otras Inversiones**

OTRAS INVERSIONES	EJECUTADO 2017
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	4,123,264.91
<b>TOTAL</b>	<b>4,123,264.91</b>

## 5. Principales Logros (Octubre – Diciembre 2017)

### EJECUCIÓN DE PROYECTOS:

- Terminados 12 sistemas de riego y 9 proyectos de energía renovable.

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Status	% de Ejecución
1	Sistema de riego	San Antonio del Norte, San Antonio del Norte, La Paz	Finalizado	100%
2	Sistema de riego	Grupo Mixto, Azacualpa, Yamaranguila, Intibucá	Finalizado	100%
3	Sistema de riego	Togopala, Intibucá, Intibucá	Finalizado	100%
4	Sistema de riego	Las Mesas, Yamaranguila, Intibucá	Finalizado	100%
5	Sistema de Riego	El Tablón, Yamaranguila, Intibuca	Finalizado	100%
6	Sistema de Riego	Los Olivos, Yamaranguila, Intibbuca	Finalizado	100%
7	Sistema de Riego	La Rinconada, Intibucá, Intibucá	Finalizado	100%
8	Sistema de Riego	Las Lagunas, Intibucá, Intibucá	Finalizado	100%
9	Sistema de Riego	Las Quebradas, Yamaranguila, Intibucá	Finalizado	100%
10	Sistema de Riego	Belén, Intibucá, Intibucá	Finalizado	100%
11	Sistema de Riego	Panina, Intibucá, Intibucá	Finalizado	100%
12	Sistema de Riego	El Cerrón, Cabañas, La Paz	Finalizado	100%
13	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Departamento de Ocotepeque	Finalizado	100%
14	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Departamento de Copán	Finalizado	100%
15	Estufas mejoradas en el Departamento de Copán	Departamento de Copán	Finalizado	100%

16	Estufas mejoradas en el Departamento de Santa Bárbara	Departamento de Santa Bárbara	Finalizado	100%
17	Estufas mejoradas en el Departamento de Ocotepeque	Departamento de Ocotepeque	Finalizado	100%
18	Estufas mejoradas en el Departamento de Lempira	Departamento de Lempira	Finalizado	100%
19	Estufas mejoradas en el Departamento de Intibucá	Departamento de Intibucá	Finalizado	100%
20	Estufas mejoradas en el Departamento de La Paz	Departamento de La Paz	Finalizado	100%
21	Proyecto de secadoras solares y eco-estufas para pequeños productores de café	Departamento de La Paz e Intibucá	Finalizado	100%

### **PROYECTOS EN EJECUCIÓN**

- En ejecución 4 sistemas de riego y 11 proyectos de energía renovable. En inicio 4 proyectos de energía renovable

No.	Tipo de Proyecto	Ubicación	Monto del Proyecto	Status	% de Ejecución
1	Proyecto de secadoras solares y eco-estufas para pequeños productores de café	Departamento de La Paz e Intibucá	1,200.000.00	En ejecución	80%
2	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores	Departamento de Santa Bárbara	1,951,191.74	En ejecución	40%
3	Secadoras solares tipo domo para pequeños productores en Jesús de Otoro, Intibucá	Jesús de Otoro, Intibucá	2,563,630.00	En ejecución	10%
4	Riego por Goteo Nueva Yamalá	Nueva Yamalá, San Luis, Santa Bárbara	1,286,492.00	En ejecución	35%
5	Riego por Goteo Las Flores	Las Flores, Colomoncagua, intibucá	653,626.00	En ejecución	35%
6	Microgeneración en sistema de riego por goteo – Llanito Verde	Llanito Verde, Lempira	450,000.00	En inicio	0%

7	Sistema de biodigestión a partir de residuos de café en la Cooperativa Montaña Verde	San Luis, Santa Bárbara	550,000.00	En inicio	0%
8	Sistema de Riego Fase II	Panina, Intibucá, Intibucá	1,000,000.00	En ejecución	10%
9	Sistema de riego Fase II	Togopala, Intibucá, Intibucá	600,000.00	En ejecución	10%
10	Estufas mejoradas varias comunidades	Departamento de Copán	750,000.00	En ejecución	80%
11	Estufas mejoradas varias comunidades	Departamento de Santa Bárbara	750,000.00	En ejecución	80%
12	Estufas mejoradas varias comunidades	Departamento de Ocotepeque	750,000.00	En ejecución	80%
13	Estufas mejoradas varias comunidades	Departamento de Lempira	410,000.00	En ejecución	80%
14	Estufas mejoradas varias comunidades	Departamento de Intibucá	410,000.00	En ejecución	50%
15	Estufas mejoradas varias comunidades	Departamento de La Paz	410,000.00	En ejecución	80%
16	Centro de Entrenamiento Nutricional	El Portillo, Yamaranguila, Intibucá	775,000.00	En inicio	0%
17	Centro de Entrenamiento Nutricional	Azacualpa, Yamaranguila, Intibucá	775,000.00	En inicio	0%
18	Microgeneración en sistema de riego por goteo – Llanito Verde	Llanito Verde, Lempira	450,000.00	En inicio	0%
19	Sistema de biodigestión a partir de residuos de café en la Cooperativa Montaña Verde	San Luis, Santa Bárbara	550,000.00	En inicio	0%

## 6. Problemática

Se solicitó la incorporación del Programa al presupuesto 2017 vigente, este ha sido analizado técnicamente y acompañado de la documentación pertinente, hubo algunos inconvenientes en el proceso de aprobación, lo cual dilató la regularización a ser presentada, misma que fue aprobada a mediados de diciembre, lo cual se logró reflejar una ejecución de L. 22,589,168.01 para el período de 2017.

## **CARTERA PROYECTOS VARIOS**

### **DECRETO No. 045-2013**

**Artículo 1.-** Crease el Programa de Infraestructura, Viabilidad Comunitaria y Generación de Empleo, con el propósito de fomentar la Actividad Económica Nacional y mejorar las condiciones de vida de la población más desposeída del país.

**Artículo 2.-** Autorizar al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a emitir ordenes de comprar a favor de las Empresas Productoras de Cemento; dichas ordenes serán distribuidas en forma equitativa y las Empresas Productoras de Cemento entregaran el producto según las instrucciones que reciban del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Se autoriza a la referida Institución y a cada una de las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento, para suscribir los convenios necesarios para la entrega del comento comprado dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la entrada en vigencia de este decreto.

**Artículo 3.-** Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), a emitir notas de crédito para la compra de cemento, incluido el costo del flete, a las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento por un monto de MIL MILLONES DE LEMPIRAS (L. 1,000,000,000.00); las notas de crédito serán presentadas ante la Dirección Ejecutiva de Ingreso (DEI) como pago del Impuesto Sobre la Renta y Aportación Solidaria Temporal de las Empresas Productoras de Cemento, a partir de la entrada en vigencia de este Decreto.

**Artículo 4.-** Se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a suscribir, dentro los cinco (5) días calendarios siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto, convenio tripartitos a nivel de cada una de las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento para viabilizar el procedimiento de aplicación de crédito fiscal al Impuesto Sobre la Renta y aportación solidaria temporal, estos créditos se consideraran como parte de la recaudación para la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). La aplicación del crédito fiscal estará sujeta al control y fiscalización respectiva. Asimismo se faculta a la SEFIN para negociar los descuentos correspondientes según el volumen de compra del cemento, en ningún caso esta podrá negociar un precio superior al de la lista vigente al momento de emitida la orden de compra.

**Artículo 5.-** El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), procederá a realizar obras civiles en todo el territorio nacional, en forma directa o mediante las contrataciones de Empresas del sector privado incluyendo empresas constructoras, empresas supervisoras, empresas de consultoría, empresas de gerenciamiento de proyectos y empresas desarrolladoras de proyectos y Asociaciones Comunitarias.

**Artículo 6.-** Autorizar al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a suscribir convenios subsidiarios de coejecución de proyectos con otras instituciones de gobierno que estén vinculadas a la ejecución de proyectos de infraestructura como la Secretaría de Estado en las Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y Fondo Vial, así como con alcaldías municipales, patronatos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias e iglesias.

**Artículo 7.-** Se autoriza al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y a las municipalidades que así lo decidan a suscribir convenios para la entrega de cemento con cargo a sus transferencias municipales, tales convenios deberán ser registrados en la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población.

**Artículo 8.-** Se autoriza al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a canalizar el cemento hacia las Empresas que tienen contratos con el Estado para la construcción, reparación y rehabilitación de la red vial; el valor del cemento entregado será para reducir el costo de la obra contratada, ajustando las estimaciones de avance de obra, reduciendo el costo del cemento utilizado, previa calificación de la Institución ejecutora.

**Artículo 9.-** El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), estructurará una cartera de proyectos elegibles, dentro de los cuales se incluirá, entre otros los siguientes:

- Pavimentación de calles en las zonas urbanas de las comunidades (pavimentación municipal);
- Proyectos de Mejoramiento y conservación ubicados en la red vial secundaria y terciaria, que de acuerdo a evaluaciones técnicas cuenten con un adecuado sistema de drenaje. Estos podrán ser ejecutados ya sea mediante un proceso de licitación con financiamiento y con pagos parciales o totales con cemento;
- Construcción de pisos de concreto para las casas de la familias más necesitadas, en el marco de la iniciativa de Pisos Saludables

- Autoconstrucción de proyectos con participación de las comunidades y de los gobiernos locales
- Ciclo vías para que los niños accedan a su escuela utilizando bicicletas o cualquier otro medio de transporte rural
- Instalaciones deportivas para la recreación y prevención
- Pavimentación del acceso hacia el centro de salud cuando este no estén aledaño a la plaza central
- Arreglo del acceso a un determinado atractivo turístico que posea la comunidad en sus alrededores
- Construcción de una obra importante de drenaje menor o reparación de una obra de drenaje mayor, como un puente que sea de vital importancia para la accesibilidad integral de la comunidad.

**Artículo 10.-** El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), deberá implementar un sistema de gestión, planificación, control de calidad, seguimiento y verificación de la ejecución de los proyectos objeto de este Decreto; podrá contratar para estos propósitos los servicios profesionales de empresas privadas especializadas.

**Artículo 11.-** Toda compra de cemento realizada al amparo de este Decreto queda exenta del pago de Impuesto Sobre la Renta.

**i. Avance Sector**

SECTOR	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017
AGUA Y SANEAMIENTO	1	868,799.70
INFRAESTRUCTURA VIAL	8	6,059,825.74
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	5	435,196.35
EDUCACION	2	869,113.22
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>8,232,935.01</b>

ii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2017	Mto. Ejecutado 2017
CHOLUTECA	1	1,928,279.28
COPAN	1	34,318.99
FRANCISCO MORAZAN	4	2,164,674.19
INTIBUCÁ	1	46,248.30
LA PAZ	2	2,359,715.64
OCOTEPEQUE	2	1,234,582.68
OLANCHO	1	18,588.79
SANTA BARBARA	4	446,527.14
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>8,232,935.01</b>
