



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: municipalidadojojona@gmail.com



Ojojona Francisco Morazán 04 de diciembre 2018

Señorita

LISSIE GONZALEZ

Oficial Información Publica

Presente

Remito a usted la información solicitada acerca de la ejecución de proyectos realizados por esta Municipalidad durante el mes de noviembre 2018

De usted Atentamente


MARIO R. GARAY
Presupuesto



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2018

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
086 Mantenimiento de calles y carreteras, casco Urbano	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,740.00	17,740.00	0.00	0.00	17.74 %
14 02 015 001 000 23400 11-001-01 20 5 Proyecto Mantenimiento Calles Casco Urbano	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,740.00	17,740.00	0.00	0.00	17.74 %
094 Proyecto Mantenimiento de Lineas Electricas del Casco Urbano	100,000.00	0.00	170,150.10	0.00	0.00	270,150.10	20,196.87	20,196.87	0.00	0.00	7.48 %
14 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 5 Proyecto Mantenimiento de Lineas Electricas del Casco Urbano	100,000.00	0.00	170,150.10	0.00	0.00	270,150.10	20,196.87	20,196.87	0.00	0.00	7.48 %
115 Perforación de Pozo Casco Urbano	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5 Proyecto Perforacion de Pozo Casco Urbano Barrio Yucanteca SANAA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
116 Construcción de Embalse de Agua Chocoarquin	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00 %
14 01 004 001 000 24200 15-013-01 20 5 Proyecto Construcion de Embalse de Agua Chocoarquin II Etapa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00 %
118 Mantenimiento de Sistemas de Aguas Negras	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	2.40 %
11 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 4 Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	2.40 %
119 Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano	300,000.00	0.00	378,458.42	100,000.00	0.00	778,458.42	37,460.00	37,460.00	0.00	15,360.00	4.81 %
11 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 4 Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 001 000 22220 11-001-01 20 4 Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano	200,000.00	0.00	378,458.42	100,000.00	0.00	678,458.42	37,460.00	37,460.00	0.00	15,360.00	5.52 %
126 Proyecto Mantenimiento de Centro de Usos Multiples	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	370.30	370.30	0.00	0.00	0.74 %
14 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 5 Proyecto Mantenimiento del Centro de Usos Multiples	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	370.30	370.30	0.00	0.00	0.74 %
131 Construcción Proyecto de Agua Potreritos Saracaran	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	71,251.00	71,251.00	0.00	0.00	28.50 %
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5 Proyecto Construcion de Sistema de Agua Potreritos Saracaran II Etapa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	71,251.00	71,251.00	0.00	0.00	28.50 %
144 Proyecto de Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones Artesanales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1.50 %
13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 Proyecto Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1.50 %
145 Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal	100,000.00	0.00	26,025.24	0.00	0.00	126,025.24	7,901.00	7,901.00	0.00	0.00	6.27 %
14 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 Proyecto Mantenimiento del Edificio Municipal	100,000.00	0.00	26,025.24	0.00	0.00	126,025.24	7,901.00	7,901.00	0.00	0.00	6.27 %
146 Proyecto Mantenimiento del Parque Central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turísticos Casco Urbano	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	57,441.18	57,441.18	0.00	0.00	22.98 %
14 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 Proyecto Mantenimiento de la Plaza central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turísticos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	57,441.18	57,441.18	0.00	0.00	22.98 %
147 Proyecto de Mantenimiento del Cementerio Municipal	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	17.86 %
14 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5 Proyecto Mantenimiento del Cementerio Municipal	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	17.86 %
153 Proyecto Ampliacion Sistema de Electrificacion Coror, Guerisne	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 Proyecto Ampliacion Sistema de Electrificacion Coror Guerisne	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
157 Proyecto de Construcción Cancha Polideportiva El Circulo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 8 Proyecto Construcion de Cancha Polideportiva en El Circulo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
164 Proyecto Construcción Cajas Puentes Pueblo Viejo, Aragua	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 3 Proyecto Construcción Caja Puente Pueblo Viejo Aragua	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
166 Proyecto Construcción de 1320 Metros de Empedrado en el Casco Urbano	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.GARAY

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2018

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Construcción de 1320 Mt de Empedrado en Barrio El Centro del Casco Urbano		749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
171	Proyecto Construcción Estación de Buses Barrio El Mirador		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto Construcción Estación de Buses Barrio El Mirador		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	Proyecto Construcción Tanque de Agua Barrio Yucanteca		400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto Construcción Tanque de Agua Barrio Yucanteca		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Construcción Tanque de Agua Barrio Yucanteca		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
178	Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserio Cenicerias		575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Las Cenicerias		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Las Cenicerias		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
179	Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserio San Sebastian		575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
186	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Filiberto Gonzalez El Plomo Guasucaran		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Filiberto Gonzalez El Plomo Guasucaran		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
187	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
188	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
189	Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 4	Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
190	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Reina Isabel II Las Cenicerias		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Reina Isabel II Las Cenicerias		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
191	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
192	Proyecto Construcción de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas		749,721.40	0.00	123,383.37	0.00	0.00	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	Proyecto Construcción Viviendas a Personas Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas		749,721.40	0.00	123,383.37	0.00	0.00	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
193	Proyecto Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano		149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00 %
12 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	Proyecto Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano		149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	149,944.28	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00 %
194	Proyecto Mantenimiento de Calle Aldea de Aragua		500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2018
Hora : 10:50 a.m.
Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
14 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Mantenimiento Calle Aldea de Aragua		500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
195	Proyecto Mantenimiento de Calles de Caseríos Cenicerías y San Sebastian		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Mantenimiento de Calles Caseríos Cenicerías, San Sebastian hasta Río San José		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
196	Proyecto Construcción Sistema de Agua Guasucarán, Santa Cruz y Guayabal		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto Construcción de Sistema de Agua Guasucarán, Santa Cruz y Guayabal III Etapa		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
197	Proyecto Construcción Red de Distribución de Agua Potable El Llano de Guerisne		135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto Construcción Red de Distribución de Agua Potable El Llano de Guerisne		135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %
198	Proyecto Mantenimiento de Calle Coror Guerisne		0.00	0.00	408,508.01	0.00	0.00	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 001 000 23400 11-001-03 20 3	Proyecto de Mantenimiento de Calle Coror Guerisne		0.00	0.00	88,368.41	0.00	0.00	88,368.41	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento de Calle Coror Guerisne		0.00	0.00	42,382.96	0.00	0.00	42,382.96	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 001 000 23400 15-013-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento de Calle Coror Guerisne		0.00	0.00	277,756.64	0.00	0.00	277,756.64	0.00	0.00	0.00	0.00 %
199	Proyecto Construcción Parque Vida Mejor		0.00	0.00	123,383.37	0.00	0.00	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Construcción Parque Vida Mejor		0.00	0.00	123,383.37	0.00	0.00	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00 %
200	Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Ciénega Saracarán		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Ciénega Saracarán		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
201	Proyecto Mantenimiento de Calle Suyatal hasta Guasucarán Centro		0.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Mantenimiento de Calle Suyatal hasta Guasucarán Centro		0.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
202	Proyecto Mantenimiento de Calle Guasucarán hasta El Plomo		0.00	0.00	393,300.00	0.00	0.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 011 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Mantenimiento de Calle Guasucarán hasta El Plomo		0.00	0.00	393,300.00	0.00	0.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
203	Proyecto de Mantenimiento de Calle con Mano de Obra Los Tablones El Aguacatal		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 012 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Mantenimiento de Calle con Mano de Obra Los Tablones El Aguacatal		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 012 001 000 23400 14-227-02 20 3	Proyecto Mantenimiento de Calle con Mano de Obra Los Tablones El Aguacatal		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
204	Proyecto Mantenimiento de Calle con Mano de Obra desde El Aguacatal hasta San Sebastián		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 013 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Mantenimiento de Calle con Mano de Obra desde El Aguacatal hasta San Sebastián		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
205	Proyecto Construcción de Empedrado Calle Ladislao Valladares		0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Construcción Empedrado Calle Ladislao Valladares		0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00 %
206	Proyecto Ampliación de Electrificación Quebrada Onda El Círculo		0.00	0.00	61,691.68	0.00	0.00	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Ampliación de Electrificación Quebrada Onda El Círculo		0.00	0.00	61,691.68	0.00	0.00	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00 %
207	Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.GARAY



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2018

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 6	Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
208	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo de Jiniguare	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 7	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo de Jiniguare	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
209	Proyecto Mantenimiento Plaza Cruz de los Milagros	0.00	0.00	55,375.27	0.00	0.00	55,375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 014 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto Mantenimiento Plaza Cruz de los Milagros	0.00	0.00	55,375.27	0.00	0.00	55,375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
210	Construcción Capilla Cementerio del Aguacatal	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 016 000 001 47110 11-001-01 20 5	Construccion Capilla Cementerio Aguacatal	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		9,145,607.16	0.00	2,878,092.19	250,000.00	400,000.00	11,873,699.3	232,660.35	232,660.35	0.00	23,560.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+jsf9JmcVIYNjnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS3zNP2rXf1IDkZORnA21x47I8CXrywOB8ojgRW4dib84UftZwCjipJgRub432fM4wkNWQ6wwgiadhrVD5nRAGhMCK1awebJF7Few+zJ7g3a8k1XSoPGZ+jJZzLpU010Y/BCsEIBF7009EKArSKSg8/tZVnBihKApo3v8Bt93IIAJdQmmx2IuYn9x3SuoMjnw

710dlSNPmgYFCIHhtnG/cCd8drNo/IMQ7GXPeYHAKmN0X5CBXbeZDH9e3g61qoAHu5GKoHNYGj8wWa1F9qIdA0oRDmHPiGkuEIJCCC9zrMQ8P3chC8Scrylh6gw=



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

San Juan de Ojojona, 10 de diciembre del 2018.

Lic. Lissie Gonzalez Zelaya.
Oficial de Información Pública (OIP).


Presente.

Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones. El motivo de la presente es para presentarle el resumen de los programas y proyectos que durante el mes de noviembre del presente año se realizaron en el término municipal además se continúa con la ejecución de proyectos iniciados en el periodo anterior.

Así mismo le adjunto el resumen que acompaña dicha información.

Agradeciendo de antemano por su tiempo, se suscribe de usted.

Atentamente.

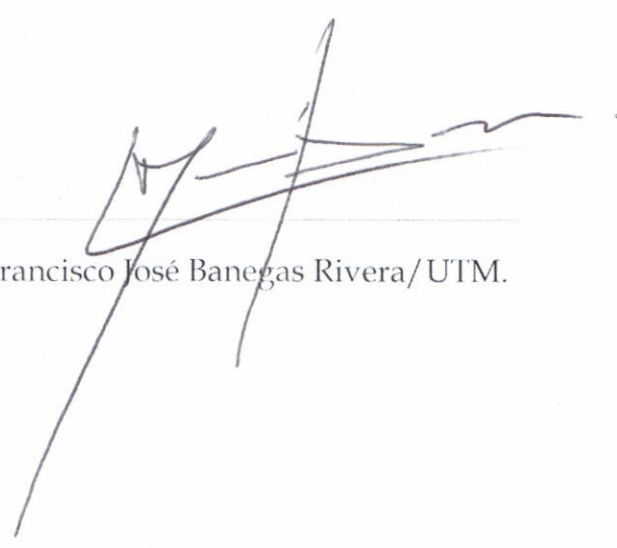

Francisco José Banegas Rivera/UTM.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA




MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS NOVIEMBRE 2018.

N°	NOMBRE	UBICACION	BENEFICIARIOS	% AVANCE	GASTO	OBSERVACION
1	Reparación del sistema Eléctrico de la plaza Central	Plaza Central Ojojona	Residentes y visitantes del casco urbano de Ojojona	Finalizado	En proceso de pago.	En proceso de pago.
2	Correcciones eléctricas solicitadas por FOSODE/ENEE a proyecto de electrificación de la Aldea de La Ciénega.	Aldea Ciénega.	Aproximadamente 80 familias	Finalizado	En proceso de pago.	El proyecto fue recibido ya por el FOSODE/ENEE.
3	Limpieza y reparación del alcantarillado Sanitario. Barrio La cruz de los Milagros y Barrio Payaguagre.	Barrio La cruz de Los Milagros y Barrio Payaguagre.	Residentes de los dos Barrios	Finalizado	L. 2,500.00	Comprobantes de pago (Recibos), consultar a tesorería.
4	Apertura de ofertas para el proyecto de agua que consiste en la Construcción de un tanque de 40,000 galones y línea de bombeo para el casco urbano de Ojojona.	Barrio Yucanteca. Ojojona.	5 barrios del casco urbano de Ojojona. Aproximadamente 400 familias.	Finalizado	0	Está en proceso de evaluación de las ofertas para continuar con la adjudicación.
5	Proyecto de Electrificación de Cenicerías.	Aldea Cenicerías	55 viviendas, Aprox. 275 personas.	60% de avance, falta terminar agujeros de las retenidas, colocar cableado transformadores y lámparas.	0	El proyecto viene desde el periodo pasado. * PROYECTO CON RETRASO.
6	Proyecto electrificación San Sebastián.	Aldea de San Sebastián	55 viviendas, Aprox. 275 personas.	60% de avance.	0	El proyecto viene desde el periodo pasado. * PROYECTO CON RETRASO.
7	Construcción del sistema de agua de las comunidades de Guazucarán, El Plomo, Tierra Amarilla,	Aldeas de Guazucarán, El Plomo, Tierra Amarilla,	500 viviendas, Aprox. 2,500 personas.	60 % de avance, falta terminar línea de conducción, realizar prueba	Consultar en presupuesto.	El proyecto viene desde el periodo pasado, continua en la




	Santa Cruz y Guayabal.	Guayabal, Santa Cruz.		de verificación del sistema, construir el tanque de distribución y las líneas de distribución domiciliarias.		instalación de la línea de conducción; la construcción de tramos aéreos. Proyecto mancomunado con visión mundial.
--	------------------------	-----------------------	--	--	--	---

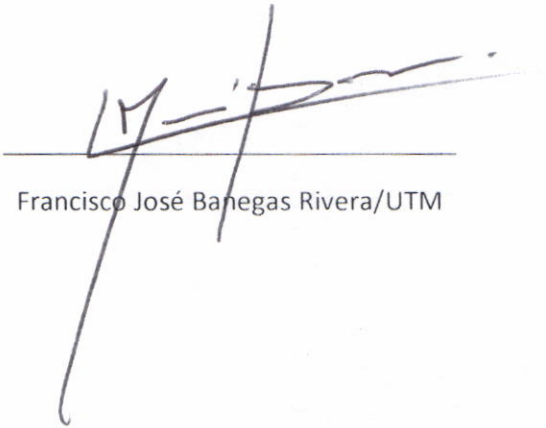

Francisco José Banegas Rivera/UTM

INFORME

CORRECCIONES ELECTRICAS COMUNIDAD DE LAS CIENEGAS



Ing. Francisco José Banegas/UTM.
29 noviembre del 2018.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Resumen

El proyecto eléctrico de la aldea de las Ciénagas, fue terminado en el periodo anterior pero no fue presentado a la ENEE para su aprobación y visto bueno para su uso por parte de los abonados, desde finales del año pasado; por lo que la comunidad solicito a la alcaldía que por favor se finalizara con el proyecto para poder hacer uso del sistema eléctrico, de esa manera la alcaldía comenzó a gestionar el proceso de recepción del proyecto por parte de la ENEE.


La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, hizo una visita de Campo para evaluar el proyecto y hacer el dictamen el cual tiene las siguientes observaciones: 1. Cambio de 4 estructuras de línea primaria, 2. 1 Cambio de cortacircuitos a transformador, 3. 3 Cambio de pararrayo a transformador, 4. Instalación de 21 aterrizajes de líneas primarias y remates de líneas secundarias, 5. Levantamiento de 106 puntos Georreferenciados, 6. Instalación de 3 retenidas.

A continuación, se detallan las actividades realizadas del 22 al 27 de noviembre del presente año:


1. Modificaciones a estructuras.



Antes

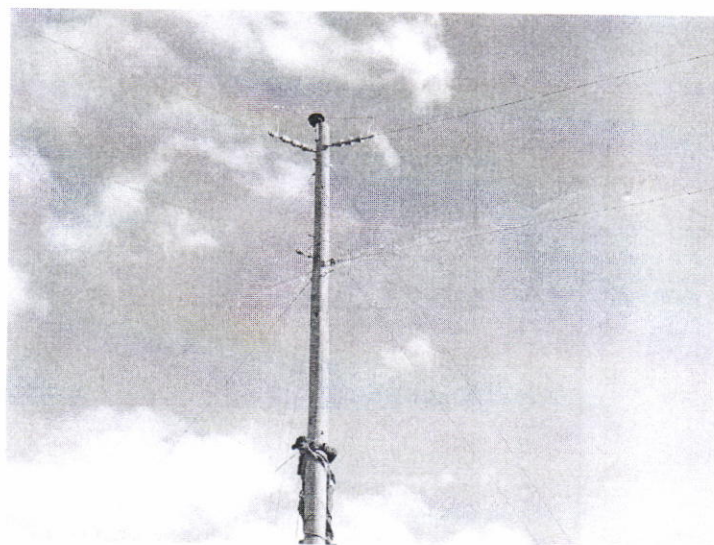


Después

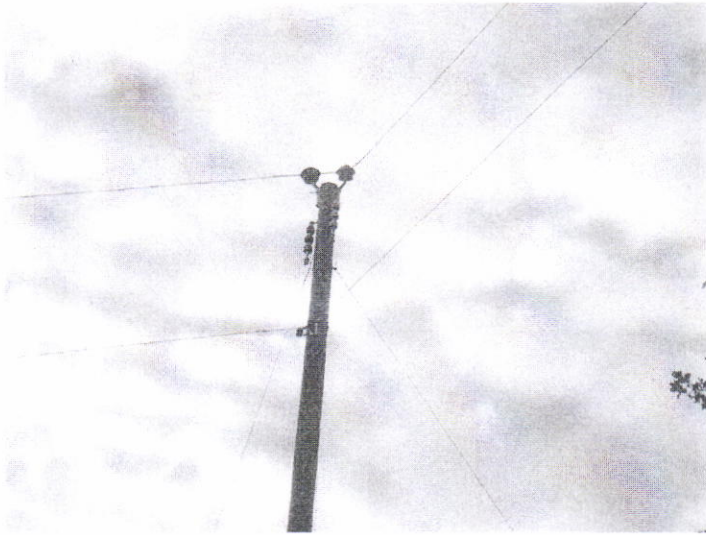

Antes



Después

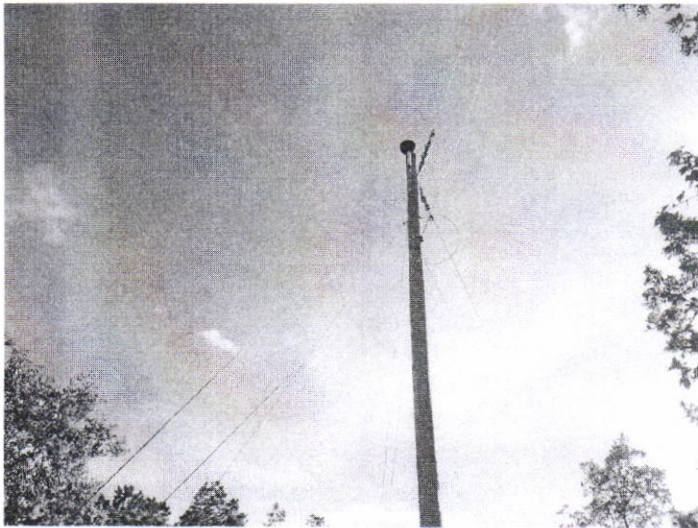

Antes



Después

2. Aterrizaje de transformadores e instalación de proyectores de retenidas.

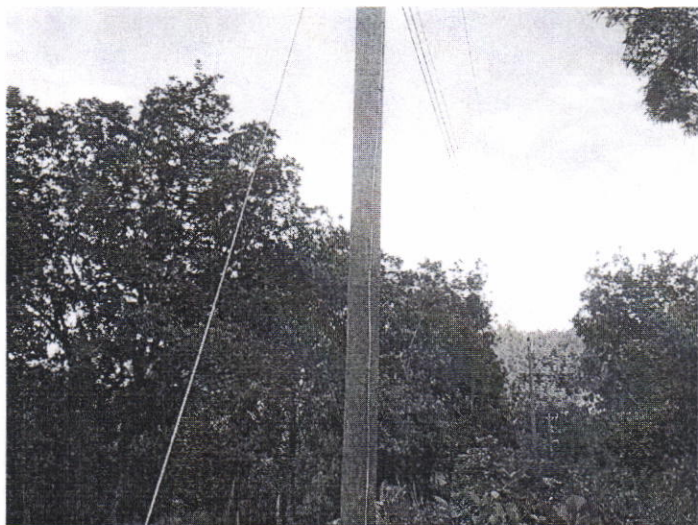


Imagen primer Aterrizaje.



Imagen segundo Aterrizaje.





Imagen tercer Aterrizaje.

CONCLUSION

1. Se ejecutaron todas las correcciones solicitadas por FOSODE/ENEE, para recibir el proyecto eléctrico de la aldea de Las Ciénegas y el sistema está en buen funcionamiento.

RECOMENDACIÓN

1. Es necesario que todos los beneficiarios del proyecto, procedan a legalizar sus tierras para poder conectarse al sistema.

INFORME

REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLAZA CENTRAL

Ing. Francisco José Banegas/UTM.
29 de noviembre del 2018.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



RESUMEN

El 21 de noviembre se comenzó con la reparación del sistema eléctrico de la plaza central, ya que el mismo estaba en mal estado, debido a un corto circuito que quemó gran parte de cableado, bombillos y faroles. Lo que generó que la plaza central pasara mucho tiempo a oscuras.

Debido a esto la alcaldía municipal, contrató a la empresa J. DAVID AMADOR, para resolver el problema eléctrico de la plaza.

A continuación, se detalla la actividad realizada:

1. Revisión general del sistema eléctrico.



Imagen muestra el proceso de revisión del sistema eléctrico.

Observaciones: Se revisó todo el sistema caja x caja para diagnosticar donde estaban los cortos. Se diagnosticaron 3 uno en la Iglesia del

Carmen, otro en los faroles frente a los baños públicos y otro en los faroles altos frente a Pollos del Campo, se repararon los cortos y se remplazó el cable quemado.

2. Colocación de bombillos y faroles.



Imagen muestra la colocación de faroles y bombillos

Observaciones: se colocaron los bombillos dañados (24) y faroles (8) en lugares importantes como escenarios, letreros comerciales y lugares oscuros.

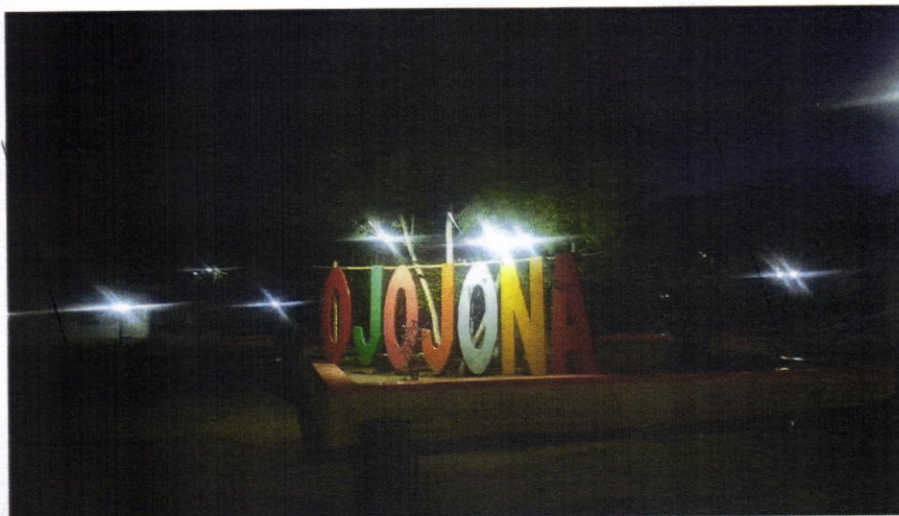


Imagen muestra faroles en imagen del municipio.



Imagen de la iluminación general de la plaza.

3. Reparación de bomba de la Fuente de Agua.



Imágenes muestran la reparación de las luces y bomba de la fuente en la plaza central.

Observaciones: Los faroles de la fuente habían sido arrancados de la misma y quemados sus faroles, además la bomba estaba pegada, por lo que se procedió comprar faroles esta vez de colores y reconstruir los porta faroles y se reparo la fuente la cual solo estaba pegada y obstruido el tuvo de succión.

4. Reparación del sistema eléctrico faroles de la calle Guancasco.



Imagen muestra los faroles de la calle real El Guancasco.

Observaciones: Los faroles no funcionaban ya que la caja de circuitos estaba dañada, por lo que se recurrió a eliminar esa caja y dejar la caja de controles alto en el poste donde se conectó la acometida.

CONCLUSION


1. La Iluminación y sistema Eléctrico de la plaza esta totalmente arreglado, prenden los faroles de las calles peatonales y los de los escenarios.

RECOMENDACIÓN

1. Se recomienda tener un mejor control en el uso del sistema eléctrico de la plaza, para evitar los daños ocasionados por ferias, eventos en general en los que se hacen conexiones clandestinas sin ningún control de un encargado.

INFORME

Limpieza y reparación del alcantarillado sanitario. Barrio La Cruz de los Milagros y Barrio Payaguagre



Ing. Francisco José Banegas/UTM.
14 noviembre del 2018.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Resumen

Los días lunes, martes y miércoles, 5, 6 y 7 de noviembre y por problemas de ubicación de las cajas de payaguagre el trabajo se extendió hasta el 14 de noviembre. Se procedió a atender la denuncia de derrame de aguas negras en los barrios La Cruz de los Milagros y Barrio Payaguagre, dejando la tubería limpia y sellado el sistema para impedir la filtración de sedimento, grava, basura.

A continuación, se detallan las actividades realizadas:

1. Limpieza y apertura en el barrio La Cruz de los Milagros.



Imagen, limpieza de mecha.



Imagen, limpieza de caja, principal

Observaciones: Se limpió la zona y se abrieron tres cajas, donde se encontró una obstrucción mínima del sistema, no hay muchas personas

conectadas en esta zona. El derrame era producido por un agua retenida en una alcantarilla que se filtraba por en medio de la calle.


2. Limpieza del sistema:



Imagen, muestra la caja en donde se produce el derrame.



Imagen, muestra el momento en el que ejecutaba la limpieza de la caja.

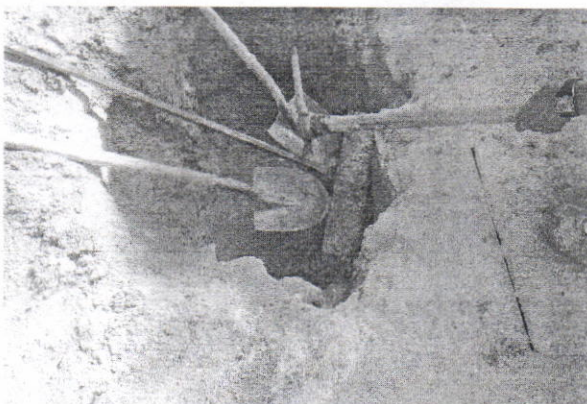

Imágenes, muestra la caja atascada con sedimento y piedra, la tapadera se encontró a 1.5 mts del nivel de la calle.

Observaciones: El problema en este punto es más serio ya que la caja esta bien profunda a unos 1.5 m del nivel de la calle, lo que dificulto encontrarla y limpiarla, debido a que se encuentra en una curva y es una calle de mucho tráfico. Para el dia 13 de noviembre se logró encontrar y limpiar bien esta caja, estaba llena de gravín y piedra, ahora el sistema está funcionando bien.

CONCLUSION

1. El sistema quedo reparado; se limpió el sedimento, se eliminó el problema que generaba la obstrucción en el barrio La cruz de los Milagros (arena y grava), el sistema y las cajas domiciliarias quedaron funcionando bien.
2. El sistema en el barrio payaguagre fue más complicado solucionarlo pero quedo en buen funcionamiento.

RECOMENDACIÓN

1. Es necesario hacer un diagnóstico total del sistema, e ir tapando y reparando la tubería de pegues que están abiertos, rotos y obstruidos.
