



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA



Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión
(UPEG)

Informe de Avance Físico y Financiero
Proyectos de Inversión Pública
Mes de Febrero 2019

Marzo 2019


Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto General vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al mes de febrero del Año 2019.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2019, las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de demostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los proyectos.


Ing. Ricardo Peña Ramírez
Director UPEG-SAG



La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política se basan, en Programa de Gobierno “Honduras avanza con paso firme”.

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario,
- b) Atender las funciones institucionales específicas y
- c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 5 proyectos que se detallan en el presente documento.


Resumen Ejecutivo


Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 5 proyectos:

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)
4. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (PROLENCA).
5. Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos.

Estos proyectos son financiados con fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank de la India y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un presupuesto de **L.809,754,740.00** representando un 39.9% del presupuesto total de la institución (**L.2,027,484,384.00**).

Presupuesto Vigente vrs Presupuesto Ejecutado en millones de lempiras del mes de febrero

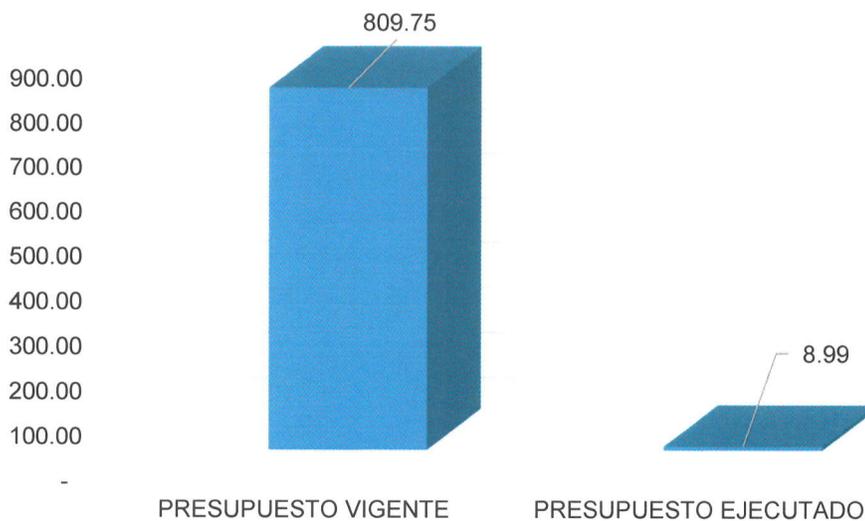

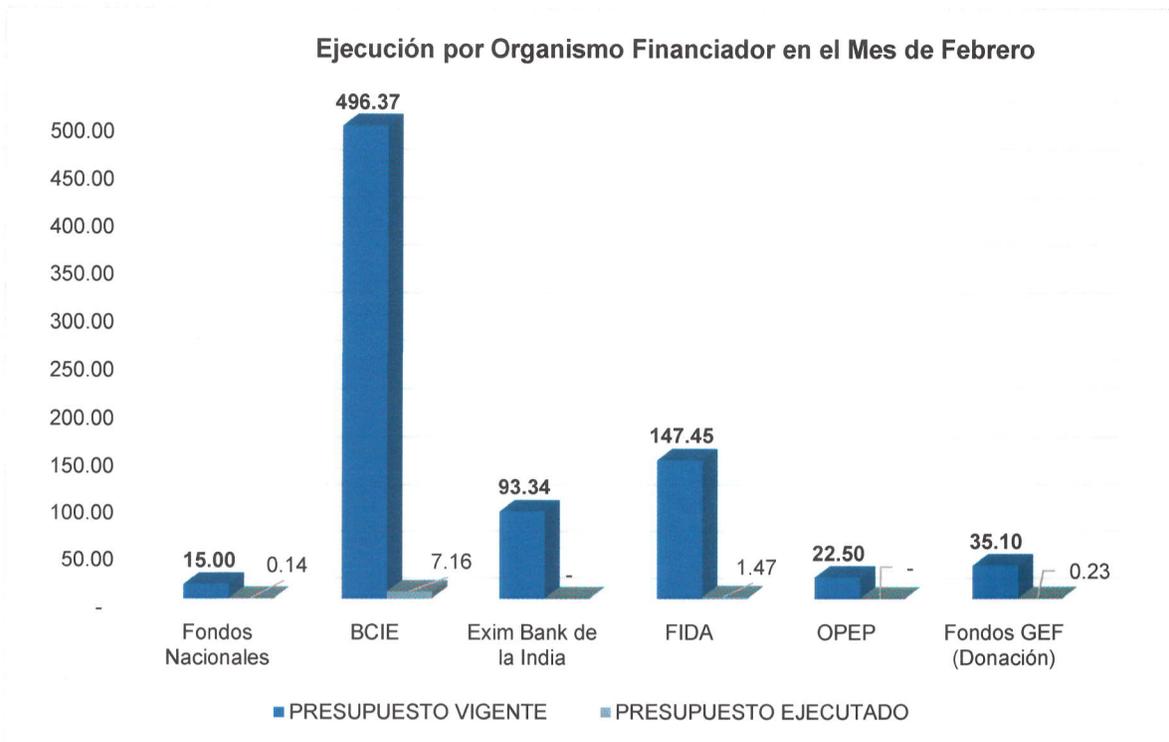

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco sub proyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Olomán
4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco
5. Diseño y construcción de Pequeño Riego

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L. 1, 118, 047,750.00.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es de 30/11/2019

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria del 01 al 28 de Febrero				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Febrero	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	15,000,000.00	15,000,000.00	135,962.20	0.91	10,336,074.57
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	433,679,873.00	433,679,873.00	1,772,506.72	0.41	66,327,194.69
Total	448,679,873.00	448,679,873.00	1,908,468.92	0.43	76,663,269.26

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019 PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado febrero	Ejecutado febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a febrero	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	2,519	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	0	0	0	1,001	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	798	0	0
	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	0	0	0	848	0	0
	Represas construidas para los sistemas de riego instalados, en las parcelas de los grupos de productores / as organizados / as.	Obra de Infraestructura	0	0	0	25	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	0	0	0	743	0	0
	Organizados los productores /as en grupos empresariales de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	0	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado febrero	Ejecutado febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a febrero	%
Rehabilitación , Construcción y modernización de áreas riego	Contrato firmados con empresa constructoras de los sistemas de riego (proyectos de pequeño riego).	Contrato	0	0	0	5	0	0
	Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	16	0	0	275	6	2
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitaciones en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agro empresarial).	Capacitación	0	0	0	78	0	0
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	0	0	0	675	0	0
Organización y Desarrollo Social	Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias).	Capacitación	0	0	0	133	0	0
	Capacitación en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las micro cuencas.	Capacitación	0	0	0	39	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0.36

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

PDABR
Logros
Inicio de construcción de la obras tomas de Siguapa, Maralito y Tascalapa focalizadas en el Municipio de Sulaco, Yoro, con la rehabilitación de 6 kilómetros de Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias).
Problemática/Observaciones
Falta de matrícula de los Vehículos y Motocicletas para el Personal de la UCP y UTLs, por lo que, existe la limitante de poder realizar giras de supervisión de los proyectos.
Falta de Resolución de Conflictos con personal despedido por la UAP/ PDABR.

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de acuerdo a las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta la cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación.

El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L. 609, 235,000.00.

El Proyecto inicio 01/01/2016 y su fecha de finalización es de 31/12/2019

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en el departamento de El Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria del 01 al 28 de Febrero				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Febrero	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	93,337,527.00	93,337,527.00	-	-	93,337,527.00
TOTAL	93,337,527.00	93,337,527.00	-	-	93,337,527.00

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
JAMASTRÁN

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado febrero	Ejecutado febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a febrero	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastrán	Estaciones de bombeo y equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastrán.	Estación	0	0	0	15	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado febrero	Ejecutado febrero	%	Programado Anual	Ejecutado acumulado a febrero	%
Infraestructura de Riego	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	0	0	0	100	0	0
Organización y Administración de Proyecto	Informes técnicos sobre avances de las obras.	Informe	0	0	0	2	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	
						0		

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

JAMASTRÁN
Actividades
Se visitó el terreno donde está definido el reservorio para la irrigación de 500 hectáreas con agua superficial del río San Francisco, así como la ubicación de la toma de agua del río.
Visita a la zona del proyecto en donde se sostuvo reunión con el Sr. Alcalde de Danlí y con representantes de la Junta de regantes (productores beneficiarios), donde se les hizo entrega del plano con el diseño definitivo, con la ubicación georreferenciada de cada uno de los pozos y el listado de las parcelas y beneficiarios del proyecto.
Estructuración de un programa de desembolsos y envíos de materiales y maquinaria en conjunto con Apollo International Limited (en proceso), con el objeto de programar la logística al momento de su arribo, ya que esto equivale al 60% del monto disponible en la línea de crédito, aproximadamente.
Problemática/Observaciones
El proyecto actualmente se encuentra en proceso de auditoría, el informe de la misma fue enviado al Tribunal Superior de Cuentas, para su revisión y análisis, quedando a la espera de la remisión del informe oficial dirigido a esta Secretaría de Estado. Por su parte se remitió el contrato de ejecución y el addendum No. 1 del proyecto, a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno para su revisión y posterior envío al Congreso Nacional para su aprobación. Posteriormente requerirá Sanción por parte de Casa de Gobierno y publicación en La Gaceta.

3. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur – EMPRENDESUR

Objetivo: Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios competitivos a los mercados nacionales y externos.

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Descripción del proyecto: Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.

El proyecto consta de tres componentes: (i) Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamientos Empresariales, (ii) Componente de Desarrollo Humano y Territorial, y (iii) Componente de Gestión del Proyecto. Con un costo total del Proyecto de L. 733, 500,000.00

El Proyecto inició el 02/11/2011 y su fecha de finalización es de 30/09/2019

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de Choluteca, Francisco Morazán, Valle, El Paraíso, y La Paz.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos EMPRENDESUR
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria del 01 al 28 de Febrero				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Febrero	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo	111,588,401.00	111,588,401.00	6,455,883.65	5.79	91,397,747.13
BCIE	62,694,456.00	62,694,456.00	5,388,681.86	8.60	55,187,774.14
FIDA	26,394,492.00	26,394,492.00	1,067,201.79	4.04	18,360,436.48
OPEP	22,499,453.00	22,499,453.00	-	0.00	17,849,536.51
Total	111,588,401.00	111,588,401.00	6,455,883.65	5.79	91,397,747.13

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
EMPRENDESUR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado febrero	Ejecutado febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a febrero	%
Programa de Desarrollo Rural sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Planes de negocios sostenibles, financieros y de desarrollo organizacional, implementándose por los grupos organizados y cajas rurales.	Plan	10	3	30	28	3	11

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Informe final de cierre del proyecto, dirigido a los organismos financiadores, máxima autoridad de la SAG, SEFIN, población en general, otros.	Informe	0	0	0	1	0	0
Supervisión de la obra de los caminos rurales terciarios rehabilitados a zonas de influencia de las organizaciones rurales beneficiadas.	Informe	1	1	100	3	2	67
Asistencia técnica en huertos familiares a productores(as) rurales pobres.	Asistencia Técnica	100	100	100	200	200	100
Asistencia técnica a productores(as) de grupos beneficiados en manejo de cultivos agrícolas bajo riego.	Asistencia Técnica	8	2	25	24	10	42
Nivel de Ejecución		Mensual		51	Anual		44

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado febrero	Ejecutado febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a febrero	%
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento EMPRENDESUR	Estudio de evaluación de impacto elaborado del proyecto EmprendeSur	Documento	0	0	0	1	0	0
	Asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros, Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional.	Asistencia Técnica	10	10	100	30	20	67
	Caminos rurales terciarios rehabilitados	Kilómetro	10	8	80	25	13	52
Desarrollo Humano	Implementación del Plan de Asistencia Técnica	Porcentaje	50	50	100	100	100	100
	Incorporación de hectáreas agrícolas al riego.	Hectárea	30	0	0	100	22	22
	Informe de implementación de la estrategia de salida del proyecto.	Informe	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución		Mensual		47	Anual		40	

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

EMPRENDESUR
Logros
8 kilómetros de caminos rurales rehabilitados, en el en el municipio de Guajiquiro, La Paz.
Se aprobaron 3 planes de Desarrollo Organizacional (PDO); PDO Emprendedores de Buena Vista del municipio de Marcovia, Choluteca por un monto de apoyo de EmprendeSur por L. 737,346.34; Inversiones Alimenticias El Rosario del municipio de

Distrito Central, Francisco Morazán por un monto de apoyo del Programa L.1,191,250.00; Empresa Asociativa Campesina de Producción Lazos de Amista del municipio de Morocelí, El Paraíso por un monto de apoyo del Programa L.1,385,283.00. Pendiente de aprobación 7 Planes de Inversión por parte de BCIE/FIDA.
Se realizó la asistencia a 100 productores con sistemas de micro riegos. Los temas dados corresponden al uso adecuado de los equipos de riego, manejo del agua.
Generación de 734 autoempleos/empleos temporales/permanentes, de los cuales el 86% corresponde a mujeres y 14% hombres.
Problemática/Observaciones
Organizaciones beneficiarias pendiente de desembolsos financieros, por cual se debe agilizar con UAP y SEFIN los ajustes en el sistema para la disponibilidad financiera.
No se cuenta con los contratos de personal del programa.
Agilizar los pagos para entregarlos antes del 15 de marzo y gestionar otro desembolso antes de finalizar el mes para cumplir con el Convenio FIDA.

4. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA).

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33.000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total del Proyecto de L. 574, 086,000.

El Proyecto inicio 15/04/2016 y su fecha de finalización es de 31/03/2020

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria del 01 al 28 de Febrero				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Febrero	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	118,000,000.00	118,000,000.00	402,674.73	0.34	96,727,787.93
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	35,097,000.00	35,097,000.00	226,275.35	0.64	32,074,559.62
Total	153,097,000.00	153,097,000.00	628,950.08	0.41	128,802,347.55

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019
PROLENCA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado febrero	Ejecutado febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a febrero	%
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidente PRO-LENCA	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias	Plan de Inversión	4	1	25	98	1	1
	Desembolsos realizados a Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Desembolso	4	1	25	100	1	1
Nivel de Ejecución			Mensual		25	Anual		1

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico febrero			Ejecución Acumulada		
			Programado febrero	Ejecutado febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a febrero	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan de Inversión	0	0	0	90	0	0

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	Plan	0	0	0	90	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	0	0	0	65	0	0
	Asistencia técnica a productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia técnica	0	0	0	59	0	0
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	0	0	0	1	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	0	0	0	25	0	0
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	4	4	100	59	4	7
	Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	Hectárea	0	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		13	Anual		1

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

PROLENCA
Logros
Un Plan de inversión con desembolso e implementándose por la organización beneficiaria Cooperativa de Servicios Agropecuarios Gualcinse Limitada, por un valor de L. 165,000.00.
Rehabilitación de 4 kilómetros de caminos terciarios rurales, en el municipio de San José, departamento de La Paz.
Capacitación a 4 grupos de Yarula en el proceso de documentación y legalización,

(ESM El Granero de Yarula, ESM Red de jóvenes emprendedores, ESM Chaguiton, ESM sistema de riego, Zacate Blanco, Cedro, y Puentes).
Problemática/Observaciones
Consultoría de asistencia técnica a 59 Organización Beneficiaria no fue contratada de acuerdo a lo planificado lo que está afectando la entrega de productos en tiempo (asistencias técnicas a productores). Debido a que los procesos de adquisiciones no se han realizado de acuerdo a lo Planificado a inicios del 2019.
Para los procesos de pago de servicios, obras y adquisición de bienes se requiere de exoneraciones las cuales a la fecha no han sido aprobadas por el ente responsable. Falta de recursos en ciertos objetos de gasto necesarios para financiar actividades programadas.

5. Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en Honduras

Objetivo: Contribuir a mejorar la gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural que son administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Descripción del proyecto: Fortalecer las capacidades de la UAP/SAG.

El proyecto será ejecutado directamente por la SAG a través de la UAP/SAG, esta última es la responsable de la coordinación estratégica y operativa del mismo. Como parte de su estructura, el proyecto contará con un (a) Coordinador (a) General, que estará a cargo de coordinar todas las actividades del Proyecto con el apoyo de la Coordinación y el resto del personal de la UAP/SAG.

El grupo objetivo directo del proyecto lo constituyen los empleados actuales de la UAP, que realizan las actividades de esta Unidad en apoyo a los proyectos financiados con recursos externos de la SAG, 53% mujeres y 47% hombres. En concreto, el grupo meta directo está compuesto por los 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP/SAG.

El Proyecto tiene un costo total de L. 6, 112,500.00.

El Proyecto inicio 30/01/2018 y su fecha de finalización es de 30/03/2020, cabe mencionar que la fecha de cierre de la donación será el 30/09/2020

Localización: El proyecto se ubica en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., específicamente estará instalado en el espacio físico de la UAP/SAG, en las instalaciones de la SAG.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROYECTO UAP
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria del 01 al 28 de Febrero
--------	--

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Febrero	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	3,051,939.00	3,051,939.00	-	0.00	3,051,939.00
Total	3,051,939.00	3,051,939.00	-	0.00	3,051,939.00

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2019

PROYECTO UAP

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico febrero			Ejecución Acumulada			
			Programado febrero	Ejecutado febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a febrero	%	
Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de la UAP/SAG	Plan de desarrollo institucional en proceso de implementación, optimizando las capacidades de los técnicos de la UAP/SAG.	Porcentaje	0	0	0	1	0	0	
	Plan de capacitación implementándose, en beneficio del personal técnico y administrativo de la UAP/SAG.	Porcentaje	0	0	0	1	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico febrero			Ejecución Acumulada			
			Programado febrero	Ejecutado febrero	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a febrero	%	
Implementación del Plan de Desarrollo Institucional	Talleres de capacitación en temas administrativos, financieros, adquisiciones, monitoreo y evaluación.	Taller de Capacitación	0	0	0	8	0	0	
	Sistema automatizado de información gerencial instalado.	Sistema de Información	0	0	0	1	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

UAP/SAG
Logros
Durante el mes de febrero el Proyecto no presenta ejecución física ni financiera.
Problemática/Observaciones
Se continúa con el proceso de contratación de la empresa que elaborará el

diagnóstico y evaluación de la UAP. El contrato se encuentra desde el mes de septiembre 2018 en el Despacho de la SAG para firma.

No se cuenta con recursos en la cuenta operativa del proyecto, debido a que para solicitarle al FIDA los fondos, aún no se nombra al Coordinador del proyecto.

Conclusiones

- El presupuesto ejecutado al cierre del mes de febrero ascendió a L.8.99 millones de un presupuesto vigente de L.809.75 millones de la cartera de proyectos, representando un 1.1%, lo cual es sumamente bajo

considerando que en el mes de marzo se estará finalizando el primer trimestre del año en curso.

Recomendaciones

- Seguimiento conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad Administradora de Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los cuellos de botella que desfasen la ejecución y trazar la ruta crítica respectiva.

Fecha de Elaboración: 08 de marzo de 2019

Elaborado por: Alidio Donaire Pereira/Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.
