



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1023, CEL.: 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



INFORME DE PROYECTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019

NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DEL PROYECTO EN EL MENSUAL SEGÚN MONTO PROGRAMADO
1	CONSTRUCCION DE UN PARQUE, REPARACION DE SERCA PERIMETRAL, ELABORACION DE AREA DE CAFETERIA, RELLENO DE MATERIAL SELECTO Y COMPACTADO PARA LA NIVELACION DEL TERRENO.	Aldea del guante	100,000.00	25% el que equivale de la contra parte municipal 100,000.00


Angel Alberto Andino
JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO

Zedros in nostra Sanguinis




MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1023, CEL.: 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

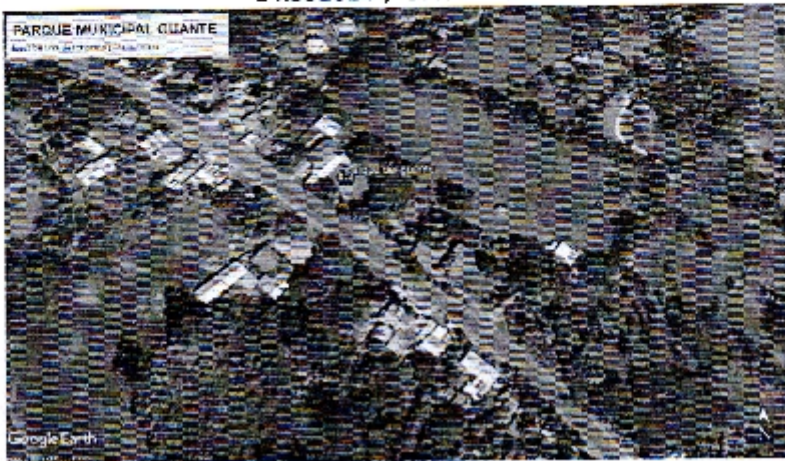

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	ROBERTO SUAREZ MURILLO Patronato de la Aldea del Guante
Sector, Sub sector	Uno
Nombre del Proyecto	CONSTRUCCION DE UN PARQUE, REPARACION DE SERCA PARIMETRAL, ELABORACION DE AREA DE CAFETERIA, RELLENO DE MATERIAL SELECTO Y COMPACTADO PARA LA NIVELACION DEL TERRENO
Ubicación del Proyecto	Coordenadas UTM del Proyecto 14.552024°, -87.094747°  PARQUE MUNICIPAL GUANTE Google Earth
Propósito	Elaboración proyecto de se busca mejorar la calidad de vida social de la comunidad y evitar la inserción de menores en maras y pandillas
Descripción del Proyecto	construccion de un parque, reparacion de serca parimetral, elaboracion de area de cafeteria,relleno de material selecto y compactado para la nivelacion del terreno
Elaboración del Proyecto	

Cedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1023, CEL.- 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamientos	ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	ROBERTO SUAREZ MURILLO, tesorero
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	25,000.00 Lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	07/01/2019
Estado del Proyecto (actual)	En EJECUNCION
Costo de Finalización (proyectado)	500,000 Lempiras como contra parte municipal
Fecha de Finalización (proyectada)	DICIEMBRE 2019
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Primer desembolso: Ejecutado a 100%
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Angel Alberto Andino
Depto. Desarrollo Comunitario

Zedros in nostra Sanguinis
