



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@yahoo.com



INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE MARZO 2020.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento de carretera que conduce de casco urbano a Aldea de Tajeada)	Omar Antonio Cbrera Ventura (TRACTOMAR)	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato Reparacion de carretera que comprende de la Aldea de Tablones Arriba a La Tajeada.	16/12/2019	567,557.50	-	567,557.50	100%	
2	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento de carretera que conduce de casco urbano a Aldea Los Zorrillos)	Jose Ernesto Nuñez Serrato	Aldea Los Zorrillos, El Puente, Santa Anita y Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato Reconstruccion de 8.00 km de calle en el Municipio de Santa Ana de Yusguare.	19/12/2019	600,000.00	-	600,000.00	100%	
3	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento de carretera de la Aldea La Tajeada)	Omar Antonio Cbrera Ventura (TRACTOMAR)	Aldea de Tablones Arriba y La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de 31.7 horas maquinas para corte de material selecto y 38 viajes de material para balastado de carretera que comprende de la Aldea de Tablones Arriba a La Tajeada.	06/01/2020	94,714.00	-	94,714.00	100%	

4	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento de carretera de la Aldea La Tajeada)	Omar Antonio Cbrera Ventura (TRACTOMAR)	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Apertura, Ampliacion y Mecanizacion de un (1) kilometro de carretera en la Aldea La Tajeada.	06/01/2020	187,852.50	-	187,852.50	100%
5	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento de carretera de B° Los Mangos, El Guasimal, San Antonio, El Milagro, San Francisco, El Carbonal, El Guapinol, El Centro, Tierras Morenas, Colonia Santa Rosa y Colonia Melitza Hernandez)	Empresa Profesionales al Servicios de la Ingenieria S.A. de C.V. (Proietario Jose Ernesto Nuñez Serrato).	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Reconstruccion de calles Barrio Los Mangos.	10/01/2020	91,200.00	-	91,200.00	100%
6	TODOS POR LA PAZ 12-001 (Mejoramiento de alumbrado publico de: area rurak de la Tajeada, Tablones Arriba, Tablones Abajo, el Cerro, La Filipinas, El Puente, Los Zorrillos, Samta Anita, el Divisadero, Cerco de Piedra, Manuel Fernandez, La Najar, Villas El Dorado, Satelite, La Permuta, Pueblo Nuevo, El Zapotillo, Barrio Los Mangos, EL Carbonal, El Guapinol, El Guasimal, El Milagro, Tierras Morenas, La Montaña, Santa Rosa, San Francisco, El Centro, La Garita, San Antonio.	Luis Antonio Medina Rodriguez (ELECME)	Aldea Tablones Abajo, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para la Instalacion de Transformador en pozo de agua potable.	17/01/2020	8,600.00	-	8,600.00	100%
7	PRO-HONDURAS 13-001 (Mejoramiento de carretera de B° Los Mangos, El Guasimal, San Antonio, El Milagro, San Francisco, El Carbonal, El Guapinol, El Centro, Tierras Morenas, Colonia Santa Rosa y Colonia Melitza Hernandez)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra para la construccion e instalacion de tapadera de pozo septico de aguas negras en carretera	03/02/2010	4,000.00	-	4,000.00	100%

8	DEPORTES 12-001 (Construcción de Cerca Perimetral de Cancha de Fútbol de Los Zorrillos).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Aldea Los Zorrillos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra para la Construcción de Cerca Perimetral con malla ciclón en Campo de Fútbol.	14/02/2020	132,000.00	-	132,000.00	58%
9	PRESERVACION DEL PATRIMONIO 12-001 (Mejoramiento Edificio Municipal)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra para la reparación y cambio de piezas a bomba para cisterna, reparación de baños y cambio de cerámica en el Edificio Municipal.	24/02/2020	4,600.00	-	4,600.00	100%
10	CULTURA 12-001 (Subsidios para actividades de Cultura).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para la Construcción e instalación de caseta para letrina de Iglesia Católica.	26/02/2020	2,200.00	-	2,200.00	100%
11	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 14-002 (Apoyo a personas de escasos recursos económicos con la construcción de 1 Vivienda popular para familia de Aldea El Puente).	Felipe Antonio Maradiaga Peralta	Aldea El Puente, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para la construcción de una vivienda de 6.00x6.00 de la Señora Lidia Esperanza Vallejo.	06/03/2020	30,000.00	-	30,000.00	30%
12	SALUD 11-001 (Construcción Centro de Salud de La Permuta).	Jorge Alcides Fuentes Perez	Aldea La Permuta, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para la Construcción de Centro de Salud Cesar Tipo AC/95.	06/03/2020	255,442.60	-	255,442.60	15%
13	EDUCACION 11-001 (Subsidios al Sector de Educación).	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Aldea Los Zorrillos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para el Mejoramiento del Centro de Educación Básica Francisco Morazan.	09/03/2020	10,000.00	-	10,000.00	100%

14	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 14-002 (Apoyo a personas de escasos recursos economicos con la construccion de 1 Vivienda popular para familia de Aldea El Puento).	Felipe Antonio Maradiaga Peralta	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra para la construccion de una vivienda de 6.00x6.00 del Señor Julio Ever Flores.	25/03/2020	30,000.00	-	30,000.00	15%
----	--	----------------------------------	--	---	------------	-----------	---	-----------	-----


CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL LOS ZORILLOS

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO EN ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL	
				TOTAL	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE
CERCA PERIMETRAL											
1.0	Trabajo y transporte	MT	50	18.00	1,350.00			50.00	1,350.00	50.00	1,350.00
2.0	Construccion de malla de cerchas	MT	47.19	245.00	11,532.50			47.19	11,532.50	47.19	11,532.50
3.0	Trabajo de montaje de cerchas	MT	91.38	180.00	1,638.00			91.38	1,638.00	91.38	1,638.00
4.0	Monte de cerchas 20x20x2 con 400 y 60000 cm	UNIDAD	1.00	200.00	2,000.00			1.00	2,000.00	1.00	2,000.00
5.0	Monte de cerchas 20x20x2 con 400 y 60000 cm	UNIDAD	30.00	180.00	5,400.00			30.00	5,400.00	30.00	5,400.00
6.0	Construccion de mamparas 0.20x0.80 cm	MT	30.21	180.00	5,436.00			30.21	5,436.00	30.21	5,436.00
				TOTAL	1,150.00	1,150.00			1,150.00	1,150.00	1,150.00
ESTRUCTURAS											
7.0	Trabajo de obra de 15x15, 400 y 60000 cm	MT	157.20	600.00	9,432.00			157.20	9,432.00	157.20	9,432.00
8.0	Trabajo superior de 15x15 cm, 200 y 40, 80, 100 cm	MT	103.63	400.00	4,145.20			103.63	4,145.20	103.63	4,145.20
9.0	Chapas 15x15, 400 y 60, 10, 15, 20 cm, 1.5 x 2.5 x 3.5	MT	78.52	100.00	3,925.00			78.52	3,925.00	78.52	3,925.00
10.0	Chapas 15x15, 400 y 60, 10, 15 cm, 1.5 x 2.5 x 3.5	MT	2.36	40.00	1,544.00			2.36	1,544.00	2.36	1,544.00
				TOTAL	1,169.86	1,169.86			1,169.86	1,169.86	1,169.86
FENCES											
11.0	Malla de alambre 6" mesh, 180x180 cm	MT	132.21	1,118.00	14,735.80			132.21	14,735.80	132.21	14,735.80
12.0	Malla de alambre 6" mesh, 180x180 cm	MT	387.30	1,400.00	5,412.60			387.30	5,412.60	387.30	5,412.60
13.0	Malla de alambre 6" mesh, 180x180 cm	MT	198.03	1,400.00	5,412.60			198.03	5,412.60	198.03	5,412.60
14.0	Malla de alambre 6" mesh, 180x180 cm	MT	15.00	1,400.00	5,412.60			15.00	5,412.60	15.00	5,412.60
				TOTAL	1,169.86	1,169.86			1,169.86	1,169.86	1,169.86
CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL											
15.0	Cercha de malla de cerchas cal. 10 de 8 pies con tubo HD de 2" chapa 18 vertical y tubo Hg de 1-1/2" chapa 18 horizontal superior, reforzada con varilla de 3/8" ligadura.	MT	103.80	1,100.00	11,532.00			103.80	11,532.00	103.80	11,532.00
16.0	Plata de acceso puntal con tubo HD de 1-1/2" chapa 18 y malla de cerchas cal. 10.	MT	2.36	1,100.00	2,592.00			2.36	2,592.00	2.36	2,592.00
				TOTAL	1,102.16	1,102.16			1,102.16	1,102.16	1,102.16
				SUB-TOTAL CERCA PERIMETRAL	1,102.16	1,102.16			1,102.16	1,102.16	1,102.16

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PU	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO EN ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL	
					TOTAL	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE	TOTAL	IMPORTE
CERCA PERIMETRAL												
					TOTAL	1,150,000.00					1,150,000.00	1,150,000.00
RETENCION ANTERIOR												
RETENCION ACTUAL												
RETENCION ACUMULADA												

CONTRATISTA: INGENIERO SUPERVISOR: COORDINADOR: ALCALDE MUNICIPAL:

FECHA: 13-03-2020

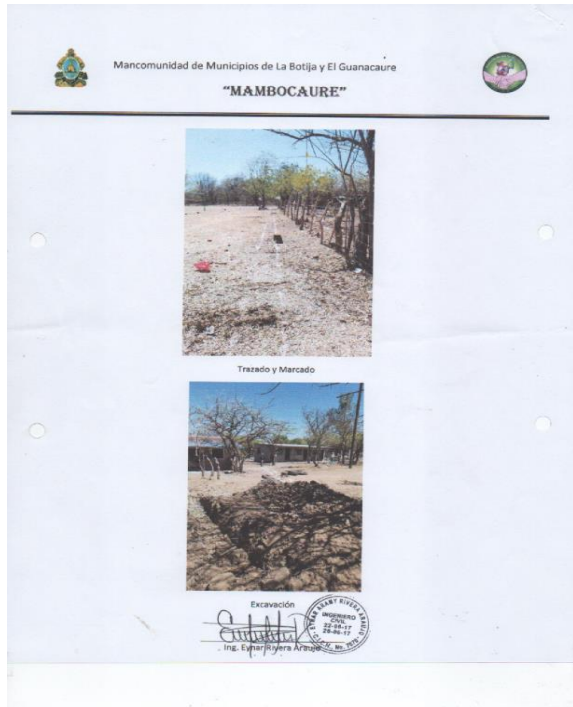

ACTUALIZADO 15-04-2020

