



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Informes del estatus de la Cartera de Proyectos ejecutados por la SAG

Abril, 2020

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto General vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al mes de **Abril** del Año 2020.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2020, las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de demostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los proyectos.



Ing. Ricardo Peña Ramírez
Director UPEG-SAG



Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política se basan, en Programa de Gobierno “Honduras avanza con paso firme”.

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario,
- b) Atender las funciones institucionales específicas y
- c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 4 proyectos que se detallan en el presente documento.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 6 proyectos:


1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).
4. Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG).
5. Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)
6. Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán.

Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA, Exim Bank, de la India y ING Bank N.V., mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un presupuesto vigente de **L. 730,449,182.00** representando un **38.14%** del presupuesto total de la institución **L.1,915,226,098**. Los Proyectos de inversión reflejan una ejecución en el mes de abril de **L 193,727,052.22**.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)**

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Abril	Ejecución acumulada al 30 de Abril
Fuente 11: Fondos Nacionales	37,542,285.00	13,294.29	191,493.55
Fuente 21: Crédito Externo	671,582,293.00	193,671,716.43	256,732,883.83
BCIE	233,379,798.00	3,889,372.91	41,076,372.00
FIDA	145,018,425.00	1,589,973.23	27,464,141.54
INDIA	97,363,072.00	-	-
(ING Bank N.V.)	195,820,998.00	188,192,370.29	188,192,370.29
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	21,324,604.00	42,041.50	14,886,243.80
	730,449,182.00	193,727,052.22	271,810,621.18

Fuente: SIAFI

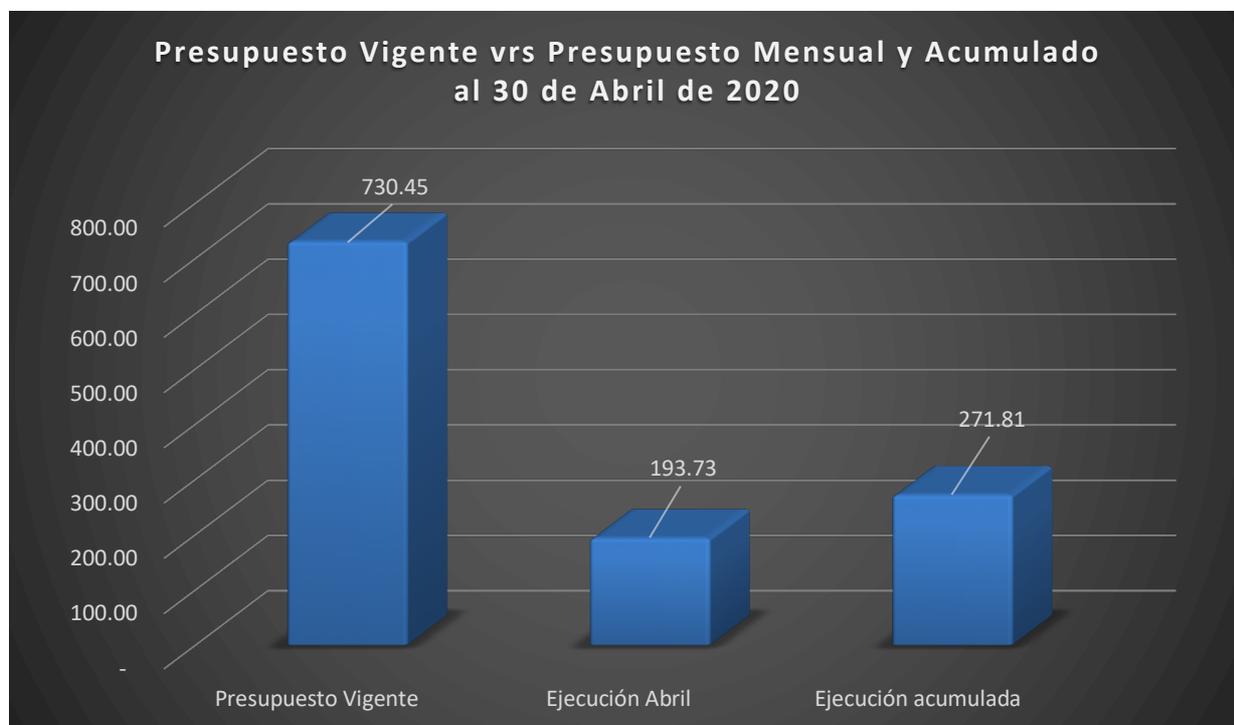

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Olomán
4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco
5. Diseño y construcción de Pequeño Riego

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019, es relevante destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021), mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Abril	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	37,542,285.00	37,542,285.00	13,294.29	0.04	191,493.55	0.51	18,732,374.26
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	399,129,059.00	212,806,219.00	1,271,362.91	0.60	38,458,362.00	18.07	172,974,897.80
Total	436,671,344.00	250,348,504.00	1,284,657.20	0.51	38,649,855.55	15.44	191,707,272.06

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020

PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Abril			Ejecución Acumulada		
			Programado Abril	Ejecutado Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	1,550	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	0	0	0	263	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	250	0	0
	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	0	0	0	263	0	0
	Represas construidas para los sistemas de riego instalados, en tierras agrícolas de los productores /as.	Obra de Infraestructura	0	0	0	11	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	0	0	0	163	0	0
	Grupos empresariales de productores/as organizados, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	10	0	0	40	0	0
	Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual
							0	

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

- No presenta logros para este mes.

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación.

El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609,235,000.00.

El Proyecto inició 01/12/2016 y su fecha de finalización es de 28/08/2022

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en el departamento de El Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al 30 de Abril						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Abril	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	97,363,072.00	97,363,072.00	-	0.00	-	0.00	97,363,072.00
TOTAL	97,363,072.00	97,363,072.00	-	0.00	-	0.00	97,363,072.00

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020
JAMAISTRÁN**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Abril			Ejecución Acumulada		
			Programado Abril	Ejecutado Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Proyecto Desarrollo Agrícola bajo Riego Valle de Jamastrán Fase I	Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastrán .	Estación	0	0	0	22	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Abril			Ejecución Acumulada		
			Programado Abril	Ejecutado Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Infraestructura de Riego	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	0	0	0	20	0	0
Organización y Administración de Proyecto	Informes técnicos sobre avances de las obras, elaborados.	Informe	0	0	0	4	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros realizados en el mes:

- No presenta logros ni actividades para este mes.

3. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA).

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Barbará, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33.000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total del Proyecto de L.574,086,000. El Proyecto inició 15/04/2016 y su fecha de finalización es de 31/03/2020.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Abril	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	175,090,162.00	145,018,425.00	1,589,973.23	1.10	27,464,141.54	18.94	115,266,418.46
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	18,228,068.00	18,228,068.00	42,041.50	0.23	14,886,243.80	81.67	3,231,824.20
Total	193,318,230.00	163,246,493.00	1,632,014.73	1.00	42,350,385.34	25.94	118,498,242.66

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020

PROLENCA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Abril			Ejecución Acumulada		
			Programado Abril	Ejecutado Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Programa de Competitividad Rural	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias	Plan de Inversión	0	0	0	100	0	0
	Desembolsos realizados a Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Desembolso	0	0	0	100	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual	
						0	0	

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Abril			Ejecución Acumulada		
			Programado Abril	Ejecutado Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan	10	10	100	80	10	13
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas.	Plan	0	0	0	80	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	10	10	100	80	10	13
	Asistencia técnica a productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia técnica	0	0	0	100	0	0
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	0	0	0	10	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	5	2	40	20	2	10
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	0	0	0	45	0	0

Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación.	Hectárea	0	0	0	100	0	0
		Nivel de Ejecución	Mensual		30	Anual		4

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades realizadas en el mes:

- 10 planes de inversión aprobados mediante sesión CAI (Comité de Aprobación de Inversiones), dichos planes corresponden a los departamentos de Intibucá y Lempira.
- Se elaboraron y firmaron 12 convenios entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y las organizaciones beneficiarias de los departamentos de Lempira e Intibucá.
- 327 autos empleos generados a través de las actividades agrícolas del programa.

4. Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en Honduras.

Objetivo: Contribuir a mejorar la gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural que son administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Descripción del proyecto: Fortalecer las capacidades de la UAP/SAG.

El proyecto será ejecutado directamente por la SAG a través de la UAP/SAG, esta última es la responsable de la coordinación estratégica y operativa del mismo. Como parte de su estructura, el proyecto contará con un (a) Coordinador (a) General, que estará a cargo de coordinar todas las actividades del Proyecto con el apoyo de la Coordinación y el resto del personal de la UAP/SAG.

El grupo objetivo directo del proyecto lo constituyen los empleados actuales de la UAP, que realizan las actividades de esta Unidad en apoyo a los proyectos financiados con recursos externos de la SAG, 53% mujeres y 47% hombres. En concreto, el grupo meta directo está compuesto por los 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP/SAG.

El Proyecto tiene un costo total de L. 6, 112,500.00.

El Proyecto inició 30/01/2018 y su fecha de finalización es de 30/03/2020, cabe mencionar que la fecha de cierre de la donación será el 30/09/2020

Localización: El proyecto se ubica en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., específicamente estará instalado en el espacio físico de la UAP/SAG, en las instalaciones de la SAG.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROYECTO UAP
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al 30 de Abril						
	Presupuest o Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Abril	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	3,096,536.00	3,096,536.00	-	0.00	-	0.00	2,660,536.00
Total	3,096,536.00	3,096,536.00	-	0.00	-	0.00	2,660,536.00

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020
PROYECTO UAP**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Abril			Ejecución Acumulada			
			Programado Abril	Ejecutado Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%	
Competitividad Rural	Plan de Desarrollo Institucional implementado por personal técnico de la UAP.	Porcentaje	15	0	0	45	0	0	
	Plan de Capacitación implementado con el personal técnico y administrativo de la UAP/SAG.	Porcentaje	20	0	0	60	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Abril			Ejecución Acumulada			
			Programado Abril	Ejecutado Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%	
Implementación del Plan de Desarrollo Institucional	Talleres de capacitación en temas administrativos, financieros, adquisiciones, monitoreo y evaluación.	Taller de Capacitación	3	0	0	9	0	0	
Evaluación de las capacidades	Auditoria externa realizada al proyecto.	Informe	0	0	0	1	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Fuente:SIAFI

Principales logros y actividades realizadas en el mes:

- No presenta logros ni actividades para este mes.

5. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur –EMPRENDESUR

Objetivo: Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios competitivos a los mercados nacionales y externos.

Descripción del proyecto: Contribuir a incrementar las oportunidades de ingresos, empleo y seguridad alimentaria de los pequeños productores organizados, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales y externos.

El proyecto consta de tres componentes: (i) Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamientos Empresariales, (ii) Componente de Desarrollo Humano y Territorial, y (iii) Componente de Gestión del Proyecto. Con un costo total del Proyecto de L.733,500,000.00. El Proyecto inició el 02/11/2011 y su fecha de finalización es de 30/09/2019. Cabe mencionar que se ha enviado una solicitud de ampliación del mismo al BCIE, para la culminación de algunos proyectos que no se han podido finalizar.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de Choluteca, Francisco Morazán, Valle, El Paraíso, y La Paz.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos EMPRENDESUR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Abril	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	-	20573,579.00	2618,010.00	12.73	2618,010.00	12.73	8052,430.20
Total	-	20573,579.00	2618,010.00	12.73	2618,010.00	12.73	8052,430.20

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020 EMPRENDESUR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Abril			Ejecución Acumulada		
			Programado Abril	Ejecutado Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Programa de Competitividad Rural	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias	Plan	0	0	0	13	0	0

Nivel de Ejecución			Mensual	0	Anual	0		
Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Abril			Ejecución Acumulada		
			Programado Abril	Ejecutado Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	Desembolso de planes de inversión realizados a organizaciones beneficiarias	Cantidad	0	0	0	13	0	0
Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamiento Empresariales	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas.	Convenio	0	0	0	13	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual	0	Anual	0		

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades realizadas en el mes:

- 370 autos empleos generados a través de las actividades agrícolas del programa.
- Se ha culminado las obras de siete centros de acopio en las organizaciones: Empresa de Servicios Múltiples (ESM) El Corpus, ESM Agua Fría, Frutales de Pespire, ESM Frutales de la Tajada, ESM Frutas Frescas de Tablones Arriba, ESM Curaren Centro, Indios de Ojojona y la EACP Pensando en el Futuro de Aguacatal Ojojona.
- Se logró la Instalación de geo membranas para la producción de tilapia en las empresas Camino Hacia El Progreso (8); Tilapias de El Porvenir (6) y Emprendedores de Buena Vista (3) para la producción total anual de 188,000 libras.
- Se ha logrado un avance del 90% de la Construcción centro de acopio de granos básicos para la Cooperativa Agroforestal Indios de Ojojona de 10x15 con módulo de baños. Inversión estimada de EmprendeSur en 460,000.00.

6. Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán.

Objetivos:

- Beneficiar con más de 3,000 hectáreas en los temas de regadío para la zona. Incluye un componente de regadío para cítricos.
- Aumentar y estabilizar la producción agrícola mediante la optimización del uso del agua.
- Contribuir al desarrollo ambiental sostenible reduciendo el gasto del agua.
- Evitar la contaminación de las capas subterráneas, frenando la pérdida de nitratos y otros productos debido al uso adecuado de las cantidades de agua.
- Aumentar la eficiencia técnica del riego.

Descripción del proyecto:

El proyecto será ejecutado directamente por la SAG a través de la UAP/SAG, esta última es la responsable de la coordinación estratégica y operativa del mismo. Como parte de su estructura, el proyecto será coordinado por el Coordinador (a) General de la UAP.

El grupo objetivo directo del proyecto son los productores en la zona del Aguán, los cuales podrán acceder a tecnología de riego.

El Proyecto tiene un costo total de EUR24,000,000.00 el cual se divide en EUR 4,320,000.00 por donación y EUR 19,680,000.00 por préstamo. Adicionalmente el Banco ING (prestamista) cobra un seguro por EUR 1,877,700.00 para un gran total por financiamiento y donación de EUR 25,877,700.00 lo que se traduce en aproximadamente L.600,864,084.93.

El Acuerdo Financiero entró en vigor el 15 de febrero de 2019 y el banco tiene como fecha límite de desembolsos el 16 de febrero de 2020 según una extensión de plazo otorgada de oficio por el Banco ING de Dinamarca.

Localización: El proyecto se ubica en la ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, beneficiando la zona del Valle del Aguán y alrededores.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Abril						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Abril	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (ING Bank N.V.)	-	195820,998.00	188192,370.29	96.10	188192,370.29	96.10	7628,627.71
TOTAL	-	195820,998.00	188192,370.29	96.10	188192,370.29	96.10	7628,627.71

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2020
Proyecto Aguan**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Abril			Ejecución Acumulada			
			Programado Abril	Ejecutado Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%	
Proyecto Transformación en Regadío en la Ribera del Aguan	Sistemas de riego instalados en las hectáreas de tierra de los productores/as del Aguan	Sistema de Riego	0	0	0	38	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico Abril			Ejecución Acumulada		
			Programado Abril	Ejecutado Abril	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Abril	%
Equipamiento de los Sistemas de Riego	Sistemas de riego recibidos	Sistema de Riego	28	58	207	58	58	100

Programa de Formación y Capacitación	Capacitaciones brindadas a productores en el uso del equipo de riego	Capacitación	0	0	0	38	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		104	Anual		50

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades realizadas en el mes:

- En el mes de abril se regularizó el desembolso por pago directo realizado del ING BANK a PAA Project Finance (Proveedor) en febrero cubriendo la totalidad de lo programado a ejecutar este año.

Conclusiones

- El presupuesto ejecutado en el mes de abril es de L.193, 727,052.22 de la cartera de proyectos vigente correspondiente a L.730, 449,182.
- No se cumplió con la mayoría de las metas físicas programadas para este mes de abril, debido a que se continua con el Estado de Emergencia que la pandemia COVID-19 ha ocasionado a nivel mundial y de conformidad a lo dispuesto en la Gaceta, de fecha 16 de marzo del 2020, referente al Decreto Ejecutivo número PCM-021-2020.
- A partir de este mes de abril se tiene la incorporación a la cartera de Proyectos de la SAG los Proyectos EMPRENDESUR, el cual se le otorgó una ampliación por parte del BCIE para la culminación de sus proyectos, así mismo la incorporación del Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán, los cuales se espera la finalización de los mismos en este año 2020.

Recomendaciones

- Seguimiento conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad Administradora de Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los cuellos de botella que desfasen la ejecución tanto financiera como física.

Fecha de Elaboración: 11 de mayo de 2020

Elaborado por: Alidio Donaire Pereira/Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.
