



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



INFORME DE PROYECTOS MES DE JULIO DE 2020

NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DEL PROYECTO EN EL MENSUAL SEGÚN MONTO PROGRAMADO
1	Reparación y apertura de carreteras	EL tule y Trozos	46,000.00	100% EJECUTADO



ANGEL ALBERTO ANDINO
JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO

Zedros in nostra Sanguinis




MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com

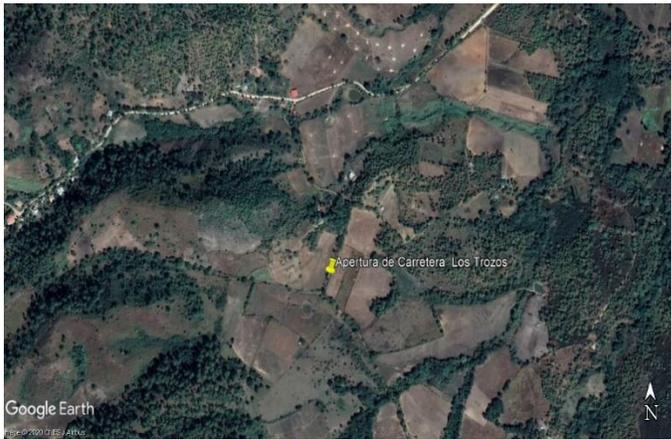

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Desarrollo comunitario
Sector, Sub sector	Uno y dos
Nombre del Proyecto	Reparación y apertura de carreteras
Ubicación del Proyecto	<p style="text-align: center;">Coordenadas UTM del Proyecto 483862.24 m E, 1611005.39 m N</p>  <p style="text-align: center;">472986.32 m E, 1592611.39 m N</p> 
Propósito	Elaboración mejoras y creación de proyectos carreteras
Descripción del Proyecto	Alquiler de equipo para reparación y apertura de carreteras
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamientos	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	JORGE DIAZ



MUNICIPALIDAD DE CEDROS


FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros	
Presupuesto de Proyecto	46,000.00	lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	07/01/2020	
Estado del Proyecto (actual)	En EJECUCION	
Costo de Finalización (proyectado)	46,000.00	lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	Julio 2020	
Ejecución del Proyecto		
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Primer desembolso: Ejecutado a 100%	
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno	
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno	
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno	


Angel Alberto Andino
Depto. Desarrollo Comunitario
