




SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

GERENCIA DE PROYECTOS

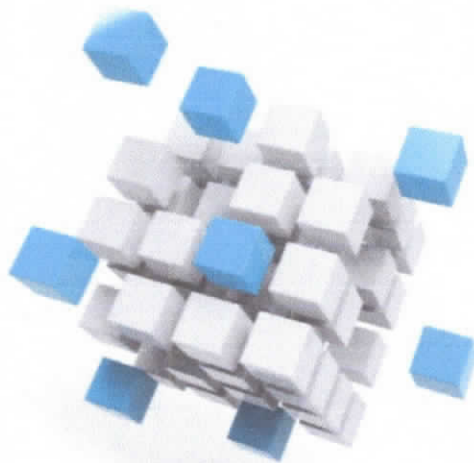

PROYECTOS:

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO, (911), EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Y TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN.

HONDURAS, C.A.

SEPTIEMBRE, 2020



INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911), para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Gerencia de Proyectos de la institución, es la principal responsable de supervisar y dar seguimiento a las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.

Los proyectos se desarrollan con base en el ciclo de vida de estos, lo que comprende desde la fase de inicio, fase de planificación, implementación, control y seguimiento, la evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados con recursos económicos provenientes del Fondo de Inversiones y Asignaciones (FINA2).

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras”, tienen como finalidad brindar un aporte a la sociedad hondureña, en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en las ciudades de Choluteca, departamento de Choluteca, San Pedro Sula, departamento de Cortés y Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por medio de la implementación de un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de las ciudades antes descritas.



INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (SNE911), CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA2).

IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN SEPTIEMBRE, 2020

N#	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL
1	Fortalecimiento del Centro de Operaciones de Tegucigalpa con la Construcción del Edificio Anexo Administrativo.	Culminado
2	Supervisión de la Construcción del Edificio Anexo Administrativo del SNE911, Tegucigalpa.	Culminado
3	Expansión de las condiciones Operativas del Centro de Operaciones de SNE911 de la Ciudad de San Pedro Sula.	Culminado
4	Expansión y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), por medio de la creación de un centro de Coordinación y Operación en la ciudad de Choluteca, Choluteca.	Vigente
5	Contratación del Suministro de Mobiliario para el Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán.	Culminado

- **Área que ejecuta los proyectos;** Gerencia de Proyectos del SNE911.
- **Tipo de proyectos:** Fortalecimiento de Seguridad Pública y Expansión Institucional.
- **Responsable de la ejecución de los proyectos:** Lic. Ronny Adalid García.
- **Cargo:** Gerente de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias 911.
- **Firma y Sello:** _____





ELABORACIÓN DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1) Propietario del Proyecto	Gobierno de la República de Honduras por medio del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).
2) Sector, sub sector	Seguridad
3) Fuente de Financiamiento	El presupuesto del proyecto es manejado por el Comité Técnico del Fideicomiso de FINA2
4) Fecha de Aprobación del Presupuesto de los Proyectos	03 de septiembre 2018.
5) Ubicación geográfica	Ciudad de: Choluteca, Choluteca, San Pedro Sula, Cortés y Tegucigalpa, Francisco Morazán.
6) Información de Contacto del proyecto.	Gerencia de Proyectos, +504 2290-7800 Ext. 2102, Lic. Ronny Adalid García, Gerente de Proyectos, correo electrónico: rgarcia@911.gob.hn
7) Objetivo	<p>El incremento en los índices de delincuencia y la demanda por mayor seguridad por parte de la población hondureña ha generado que las autoridades del sector seguridad de Honduras, busquen estrategias para reducir estos altos índices que se registran en Honduras, y por ello durante el año 2019 se decidió ejecutar una serie de proyectos orientados a fortalecer este sector.</p> <p>Entre los proyectos que se aprobaron con los fondos FINA2 y actualmente se ejecutan, están: Creación de un centro de operaciones del SNE911 en la ciudad de Choluteca, Choluteca, Construcción del Edificio en Tegucigalpa como Fortalecimiento del Centro de Operaciones SNE911, junto con este proyecto se encuentra la supervisión de la obra. También se realizó una remodelación del Centro de Operaciones de San Pedro Sula, Cortés para la expansión y mejor funcionamiento de sus operaciones.</p>
8) Justificación de los Proyectos	Una población que en forma constante se encuentra expuesta a condiciones de inseguridad en muy pocos casos logrará convertirse en un país, municipio y/o ciudad desarrollada. Uno de los principales desafíos del estado hondureño es adoptar y poner en práctica mecanismos que ayuden a mejorar las condiciones de seguridad pública y para ello las instituciones de seguridad deben esforzarse por



trabajar de forma coordinada y sumar esfuerzos que logren fortalecer el sector de seguridad pública de Honduras.

<p>9) Alcance de los Proyectos (Principal Producto):</p>	<p>El proyecto: Creación de un centro de Coordinación y Operación en la ciudad de Choluteca, Choluteca, se basa en la adquisición de hardware, software, diseño, implementación Y construcción del edificio de centro de comando y despacho en la ciudad Choluteca, Choluteca., la instalación de ciento veinte (120) dispositivos aproximadamente (cámaras de seguridad fijas, PTZ y LPR) en la ciudad de Choluteca, Choluteca, así como la contratación de los servicios de transmisión de datos, seguros, comunicaciones, operaciones y fortalecimiento de las capacidades (capacitación) del personal operativo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911). También el proyecto incluye mejoras y expansión en el Centro de operaciones de San Pedro Sula y la construcción del edificio anexo del Edificio Anexo Administrativo de Tegucigalpa.</p>
<p>10) Costo de Finalización (proyectado):</p>	<p>Se estima que con el presupuesto aprobado servirá para dar cobertura a los proyectos antes mencionados, en su totalidad.</p>
<p>AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.</p>	<p>Los proyectos para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública que ejecuta el SNE911, durante el mes de septiembre 2020, han registrado importantes avances, entre ellos</p> <ul style="list-style-type: none"> a. La construcción del Edificio Anexo Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa para este periodo cuenta con un avance del 100%, cumpliendo así con el cronograma de trabajo establecido. b. La supervisión de la construcción del edificio administrativo anexo SNE911 de Tegucigalpa, ha cumplido sus obligaciones, conforme lo estipulado en los Términos de Referencia y los productos se han recibido a entera satisfacción. c. El proyecto de Expansión de las condiciones Operativas del Centro de Operaciones de SNE911 de la Ciudad de San Pedro Sula fue culminado en el mes de septiembre-octubre de 2019, y se le cancelaron los pagos pendientes al proveedor de servicios.



	<p>d. El proyecto: Creación de un centro de Coordinación y Operación en la ciudad de Choluteca, Choluteca, se encuentra en su fase de ejecución, y con un avance financiero del 68%.</p> <p>e. Suministro de Mobiliario para el Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Y entregados a satisfacción</p>
--	---

INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE AVANCE DE LOS PROYECTOS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	DESGLOSE DE MONTO	MONTO EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL (%)
SNE911-001	Construcción del Edificio Administrativo Anexo de Tegucigalpa, para el Fortalecimiento del Centro de Operaciones.	Anticipo	L. 5,202,000.00	
	Construcción del Edificio Administrativo Anexo de Tegucigalpa, para el Fortalecimiento del Centro de Operaciones.	Construcción	L. 31,192,405.22	100.00%
	Supervisión de la Construcción del Edificio Anexo Administrativo del SNE911, Tegucigalpa.	Supervisión	L. 1,200,000.00	100.00%
	Supervisión por obras adicionales en el Edificio Administrativo Anexo de Tegucigalpa. Adendum 1 contrato 005-2019	Supervisión	L. 120,000.00	100.00%
	Adquisición de mobiliario para Edificio Administrativo Anexo de Tegucigalpa, para el Fortalecimiento del centro de operaciones	Compra de Mobiliario	L. 2,364,989.34	100.00%
SNE911-002	Centro de Coordinación y Operación en la ciudad de Choluteca, Choluteca.	Anticipo	L. 10,038,487.36	
	Centro de Coordinación y Operación en la ciudad de Choluteca, Choluteca.	Construcción y Tecnología	L. 24,092,369.66	68%



*Existe una diferencia entre el monto aprobado al inicio del proyecto y el monto al momento del cierre, debido a los incrementos y reducciones por las ordenes de cambio registradas en el presupuesto de este proyecto: Edificio Administrativo Anexo de Tegucigalpa.

*Se espera realizar la culminación de los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución en el segundo semestre del año 2020.

*Se presentan los datos similares al mes de agosto, ya que no se han realizado cambios estructurales, avances de obras, o pagos de financieros
