



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES**

**PERFIL DE PROYECTOS**

**MAYO-JUNIO 2025.**

**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN  
BO. LAS FLORES, SECTOR LA IGLESIA ALDEA  
SANTIAGO**



**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
TRABAJANDO PARA USTED**





### DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

**Extensión Territorial:** 39.34 km<sup>2</sup>

**Población:** 26,084 personas

#### **Ubicación geográfica**

El Municipio de Pimienta se encuentra ubicado en el departamento de Cortés, al noreste del país. Se desarrolla principalmente a lo largo de la carretera CA-5 Norte que conecta a esa zona con el centro del país.


**Ubicación:** Geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas:

desde	87°	58'	hasta	87°	58'	Longitud
	06"			40"		Oeste
desde	15°	16'	hasta	15°	17'	Latitud Norte
	49"			08"		

**Altura:** 60 msnm (promedio)

**Relieve:** La conformación de la superficie terrestre del municipio es plana ya que se encuentra, en su totalidad en un valle, con pendientes características que van de 0 a 5% de inclinación.

**Acceso:** El acceso al municipio se hace por la carretera CA-5 Norte, la cual cruza el municipio de norte a sur y conecta a las ciudades de Tegucigalpa con San Pedro Sula. Pimienta se ubica a escasos 26 km de San Pedro Sula.

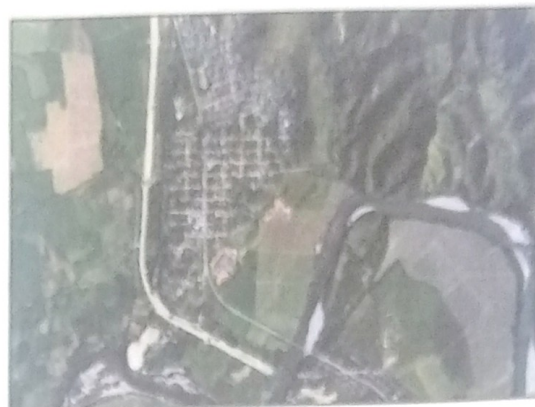

#### **Colindancias:**

*Norte:* Municipios de San Manuel y Villanueva

*Sur:* Municipio de Potrerillos

*Este:* Municipio de El Progreso, Depto. de Yoro

*Oeste:* Municipio de Villanueva



### **Historia del municipio**

El municipio de Pimienta se ubica en el Valle de Sula, en la parte sur del departamento de Cortés y es bañado por el caudaloso Río Ulúa. A sólo 3 km río abajo se localiza la unidad maya de Cerro Palenque, habitada hace más de 200 años y que, como parte del Patrimonio Cultural Tangible, es un sitio arqueológico actualmente reconocido como Monumento Arqueológico. Históricamente una considerable colonia de ciudadanos árabes, palestinos y centroamericanos instalaron sus negocios y empresas en Pimienta, dedicándose en su mayoría a la distribución de mercadería para el occidente de Honduras por a vía fluvial, lo mismo que como intermediarios en la explotación de varios productos provenientes del occidente. La zona de explotación del ferrocarril nacional representa una parte muy importante del desarrollo de Pimienta, con una sección de línea, patios de acopio y fuentes de empleo para muchos ferrocarrileros. En 1914, con la inauguración del puente ferroviario, queda







REPUBLICA DE HONDURAS

# Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



totalmente comunicada la zona de Potrerillos, ocupando Pimienta el lugar comercial de mayor crecimiento, pues las compañías bananeras instalaron allí la pagaduría de fruta de San Manuel, Villanueva y Potrerillos.

El 7 de junio de 1934, siendo alcalde municipal don Alfonso Pineda Torres, el río Ulúa en una enorme crecida arrasó con el poblado de Pimienta causando daños incalculables, por lo cual en 1936 la población es trasladada al nuevo sitio, conocido como Nueva Pimienta.



Aldeas	Aldea Santiago
	Aldea La Venta
	Total de Viviendas Urbano: 4,172                      Rural: 1,110
<u>Recursos Naturales</u>	Cerro el Palenque Río Ulúa
Infraestructura Principal	<u>RED VIAL</u> Carretera Interoceánica Carretera Secundaria
	<u>CENTROS EDUCATIVOS</u> Pre-escolares:     9 Escuelas:           9 Centro Básico     1 Colegios:           4
	<u>CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA</u> Cesamo en Santiago Cesamo en Pimienta Filial Cruz Roja Hondureña Clínica de Odontología
	<u>PARQUES RECREATIVOS</u> Parque Central en Santiago Parque Central en Pimienta Parquecito en Bo. Suyapa Parquecito de Col. Jordán
	<u>CENTROS SOCIALES</u> Centro Cívico Municipal
	<u>CENTROS DEPORTIVOS</u> Cancha Fútbol Col. Esquipulas con Graderías Estadio Municipal Santiaguense Rosendo Dubon

ALDEA SANTIAGO	
1	Bo. Las Flores
2	Bo. Los Almendros
3	Bo. La Escuela
4	Bo. El Palenque
5	Bo. La Zona
6	Bo. La Bomba
7	Bo. Las Guaras
8	Bo. Abajo
9	Col. Velásquez Cabrera
10	Col. Marvin Umaña N 2
11	Sector La Bomba
12	Col. Izaguirre
13	Caserío Maranatha
PIMIENITA	
1	Bo. Suyapa
2	Bo. El Playón
3	Bo. El Terraplén
4	Bo. El Rastro
5	Bo. El Plantel
6	Bo. Las Acasias
7	Bo. El Bosque No. 1
8	Bo. El Bosque No. 2
9	Bo. El Tanque No. 1
10	Bo. El Tanque No. 2
11	Bo. El Centro
12	Col. Esquipulas
13	Col. El Jordán
14	Col. Villas del Carmen
15	Col. San Ramón
16	Col. Alemania No. 1
17	Col. Alemania No. 2
18	Col. Episcopal
19	Col. Cruz Roja
20	Col. La Promesa
21	Col. KM 86
22	Col. Buena Vista
ALDEA LA VENTA	
1	Caratasca
2	Ulúa
3	San Antonio





**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE  
CUNETA EN BO. LAS FLORES, SECTOR LA  
IGLESIA  
ALDEA SANTIAGO**

**MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA/ 2025**





### 1. Nombre del Proyecto

Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, sector la Iglesia, Aldea Santiago.

### 2. Descripción del Problema

El Municipio de Pimienta ha incrementado su densidad poblacional en todo el territorio, especialmente en la Aldea Santiago, que en su clasificación poblacional tiene parte de área rural y área urbana, ya que por las fincas bananeras ha provocado que el desarrollo haya urbanizado algunos sectores, lo que ha aumentado el índice poblacional.

En el Bo. Las Flores, hay un sector muy vulnerable a las inundaciones por las aguas pluviales porque hay un tramo que no cuenta con un drenaje para estas aguas, donde se encuentra una Iglesia llamada Bethel de las Asambleas de Dios, la cual ha sido muy apoyada por la Fundación Norteamericana Finish The Work con grandes edificaciones y áreas recreativas para beneficios que incluyen a la población en general del sector, lo que hace que el Centro Cristiano sea muy visitado por niños, jóvenes adultos y adultos mayores, pero en la actualidad tienen muchas dificultades para poder ingresar al Centro, también la calle es dañada en el momento de las inundaciones que también afectan a muchas viviendas en el momento de las lluvias.

Por lo anterior es necesario la construcción del canal de Aguas servidas y pluviales.

### 3. Objetivo General:

Garantizar un drenaje para las aguas pluviales para evitar inundaciones.





#### **4. Objetivos Específicos**

- Evitar las inundaciones de las viviendas y la calle.
- Evitar azolvamiento y sedimentación.
- Garantizar el drenaje adecuado en el entorno.
- Garantizar el buen estado de las carreteras.

#### **5. Población Beneficiada**

20 familias.

#### **6. Generación de Empleos**

Empleos Directos: 8 Personas.

#### **7. Fuente de Financiamiento**

Fondos Municipales.



## 8. Ubicación del Proyecto

16P399118.83 E ; 1689655.05 N



## 9. Período de ejecución:

El proyecto tendrá una vigencia de 4 Semanas.

## 10. Fecha de inicio y finalización

**Fecha prevista de inicio:** 08 de Mayo 2025

**Fecha prevista de Finalización:** 07 de Junio del 2025





### 11. Presupuesto Inicial del proyecto

Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
44	m.l.	Excavación de Zanjo de 1.00 x 0.80 mts	L 150.00	L 6,600.00
44	m.l.	Preparación y nivelación del terreno	L 200.00	L 8,800.00
44	m.l.	Fundición de piso con un ancho de 1.00 m. 10 cm de espesor ref. 3#3	L 650.00	L 28,600.00
56	m2	Pegado de bloques de 6" ref. #3 en forma de U@.40m	L 700.00	L 39,200.00
10	m.l.	Encofrado y fundición de embaulado de 15 c.m. de espesor ref con malla #4@20cm longitudinales y transversales concreto 4,000 psi	L 1,350.00	L 13,500.00
68	m.l.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor concreto ref 2#2	L 300.00	L 20,400.00
1	Gral	Limpieza final	L 2,900.00	L 2,900.00
<b>Total</b>				<b>L 120,000.00</b>



*Henry Javier Rodas Andino*  
Henry Javier Rodas Andino  
Jefe de U.T.M.



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



## ANEXOS





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



## ESTADO ACTUAL





## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### Nombre del proyecto:

Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, sector la Iglesia, Aldea Santiago.

### **Tramo #1**

#### **Construcción de Canal Abierto de 3 líneas de bloque de 6"**

Distancia= 14.00 metros

- Piso de 0.90 m de ancho, 10 c.m. de espesor reforzado con hierro de 3/8" en U cada 60 cm y con tres varillas de 1/4" a lo largo.
- 2 Paredes de 3 hiladas de bloques de 6" reforzado con varilla de 3/8" en U.
- Batiente de 10 c.m. de espesor reforzado con dos varillas de 1/4".
- Relleno con material selecto en ambos lados
- Limpieza final.

### **Tramo #2**

#### **Construcción de Canal de 3 líneas de bloques**

Distancia= 20.00 metros Ancho: 0.90 metro

- Piso de 0.90 m de ancho, 10 c.m. de espesor reforzado con hierro de 3/8" en U cada 60 cm y con tres varillas de 1/4" a lo largo.
- 2 Paredes de 3 hiladas de bloques de 6" reforzado con varilla de 3/8" en U.
- Batiente de 10 c.m. de espesor reforzado con dos varillas de 1/4".
- Relleno con material selecto en ambos lados
- Limpieza final.





### Construcción de Canal Embaulado de 3 líneas de bloques de 6"

Distancia = 10.00 metros

- Piso de 0.90 cm de ancho; 10 c.m. de espesor reforzado con hierro de 3/8" en U cada 40 cm y con tres varillas de 3/8" a lo largo.
- 2 Paredes de 3 hiladas de bloques de 6" fundido y reforzado con varilla de 3/8" en U.
- Fundición de losa de 15 c.m. de espesor con concreto hidráulico a 4,000 psi ref. malla #4@0.20 mts



## INFORME DE LIQUIDACION

# PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, SECTOR LA IGLESIA ALDEA SANTIAGO





## INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, la liquidación del proyecto de **CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, SECTOR LA IGLESIA**, el cual se llevó a cabo en **BARRIO LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO**, ubicado en el en el Municipio de **PIMIENTA**, Departamento de **CORTES**; dicho Municipio cuenta con una gran diversidad de necesidades de infraestructura para el apoyo a la **RED VIAL**, una cuales pudo resolverse gracias a las gestiones del gobierno del Sr. Alcalde Municipal el Dr. Raúl Alfredo Ugarte y la Corporación Municipal.



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



# ACTA DE APROBACION DEL PROYECTO





REPUBLICA DE HONDURAS

*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*

TELEFAX: (504) 2650-2180



Pimienta Cortes.  
30 de Abril del año 2025.

**Sr. Henry Rodas**  
Jefe de UTM  
Su Oficina.

**Asunto:** Solicitud de ejecución del Proyecto.

Estimado Señor Rodas.

Por este medio, me permito saludarle cordialmente y, a la vez, solicitarle que proceda con la ejecución del proyecto que fue aprobado por la Corporación Municipal en la sesión ordinaria celebrada el día 15 de Marzo del año 2025 conforme a los acuerdos tomados y registrados en el acta número 641 punto Numero 8, el cual describo a continuación:


**Nombre del Proyecto:** Solicitud de ejecución del Proyecto de Construcción de Cuneta en Bo. Las Flores, Aldea Santiago, sector la Iglesia.  
**Ubicación:** Bo. Las Flores, Aldea Santiago, sector la Iglesia.

Deberá coordinar las acciones necesarias para su pronta ejecución, siguiendo los lineamientos técnicos establecidos y los procedimientos administrativos pertinentes, asegurando la correcta aplicación de los recursos destinados para tal fin.

Agradezco de antemano su colaboración y compromiso con el desarrollo de nuestro municipio.

Atentamente,



  
**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
**Alcalde Municipal**  
Municipalidad de Pimienta Cortes



## CERTIFICACIÓN

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE TÉRMINO CERTIFICA QUE EN EL LIBRO DE ACTAS QUE LLEVA ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022-2026, SE ENCUENTRA EL ACTA CUYO PREAMBULO Y PUNTO CONDUCENTE LITERALMENTE DICE ACTA No.641, EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 EN SESION ORDINARIA DE LOS SEÑORES SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DR. RAUL ALFREDO UGARTE - CON LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES REGIDORES: ELSY LORENA RODAS ANDINO, HECTOR EDUARDO FUENTES PERLA, DELMER AGUSTO GUEVARA, DONALDO QUIROZ BAUTISTA, JUAN PABLO CUELLAR REYES, MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS, CARLOS MAURICIO REYES, OSCAR ARMANDO PEREZ PAZ, LIC. ALEJANDRO RAMOS MARMOL VICE ALCALDE MUNICIPAL, MIEMBROS DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, COMISIONADO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE DA FE 1°.....2°.....3°.....4°.....5°.....6°.....7°.....8° EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DIO PARTICIPACION A LA JOVEN: NANCY NORELI BRIONES JEFE DE PRESUPUESTO LA CUAL AUXILIADA DE METODO AUDIOVISUAL DATA-SHOW PRESENTO LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA (AMPLIACION) RESPECTO AL AUMENTO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DE ACUERDO AL OFICIO NO.003-0DFM-2025 ENVIADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, DETALLADA A CONTINUACION:

### MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2025

#### AMPLIACION POR AUMENTO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

##### Ampliación al Presupuesto de Ingreso

Estructura del Ingreso	Descripcion	Cantidad
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	425,662.03
	Transferencias y Donaciones de Corrientes del Gobierno General	425,662.03
	Transferencias Corrientes de la Administración Central	425,662.03
	Transferencias Corrientes de la Administración Central para G. L.	425,662.03
18.1.1.01.01.00	Transferencia para Gobierno Local(Funcionamiento)	425,662.03
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL</b>	1702,648.13
	Transferencias y Donaciones de Capital del Gobierno General	1702,648.13
	Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central	1702,648.13
	Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central para G. L.	1702,648.13
22.1.1.01.01.00	Transferencia para Gobierno Local(Inversión)	1702,648.13
<b>TOTAL INGRESOS</b>		2128,310.16

##### Ampliación al Presupuesto de Egresos

Estructura del Ingreso	Descripcion	Cantidad
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	L. 425,662.03
01	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	L. 425,662.03
01-005	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	L. 245,662.03
01 00 000 005 000 16100 11-001-01 10 0160	Beneficios	L. 170,000.00
01 00 000 005 000 35610 11-001-01 10 0160	Gasolina	L. 53,813.87
01 00 000 005 000 35620 11-001-01 10 0160	Diesel	L. 21,848.16
01-010	<b>ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	L. 90,000.00
01 00 000 010 000 12200 11-001-01 10 0160	Jornales	L. 90,000.00
04-009	<b>Relaciones Publicas</b>	L. 90,000.00
04 00 000 009 000 12200 11-001-01 10 0160	Jornales	L. 90,000.00
	<b>INVERSION</b>	L. 1702,648.13
12	<b>FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	744,908.56
12-03	<b>Niñez juventud</b>	33,308.56
12 03 000 001 000 54200 11-001-01 20 0730	Niñez juventud	33,308.56
12-04	<b>Red Vial</b>	670,000.00
12 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 0340	Proyecto de Construcción de cuneta en Col. Alemania #1, Calle de en Medio	670,000.00



12-06	Servicios Públicos	41,600.00
12 06 003 001 000 23400 11-001-01 20 0413 7	Mejoramiento del Tren de Asco (Elaboración de Chasis)	41,600.00
13	ATENCIÓN A LA MUJER	106,415.51
13-01	Eje de Prevención de la violencia	10,641.55
13 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	Eje de Prevención de la violencia	10,641.55
13 02 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	Eje de economía	31,924.65
13 03 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	Eje de Participación Social y Política	21,283.11
13 04 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	Eje de salud	21,283.10
13 05 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	Eje de educación	10,641.55
13 06 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	Eje de ambiente	10,641.55
14	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	425,662.03
14 01	Seguridad Ciudadana	400,000.00
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 0340	Proyecto de construcción de gradas y cunetas en el Bo. El Tanque #2.	400,000.00
14-02	Participación Ciudadana	25,662.03
14 02 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	Participación Ciudadana	25,662.03
15	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	212,831.02
15-01	Actividades Productivas	212,831.02
15 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 0340	Mantenimiento de acceso a los Sectores Turísticos y Productivos del Municipio	212,831.02
16	Infraestructura	212,831.01
16-00	Sin Subprograma	31,157.02
16 00 001 001 000 23400 11-001-01 20 0520	Mantenimiento del Palacio Municipal, Pimienta	31,157.02
16-01	Aportaciones AMHON, TSC y Mancomunidad	61,673.99
16 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0160	Cuota AMHON	21,283.10
16 01 000 002 000 55110 11-001-01 20 0160	Cuota TSC	40,390.89
16-02	Construcción de Canales de Drenaje Pluviales	120,000.00
16 02 010 000 001 47210 11-001-01 20 0520	Proyecto de Construcción de cuneta en Bo. Las Flores, Sector la Iglesia	120,000.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>2128,310.16</b>

LOS SEÑORES CORPORATIVOS SE DIERON POR ENTERADOS Y APROBARON POR UNANIMIDAD LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA (AMPLIACION) POR AUMENTO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 POR LA CANTIDAD DE L.2,128,310.16.

CERRÓ LA SESION A LAS 1 : 30 P.M. SELLO Y FIRMA.- DR. RAUL ALFREDO UGARTE ALCALDE MUNICIPAL, LOS SEÑORES REGIDORES: ELSY LORENA RODAS ANDINO, HECTOR EDUARDO FUENTES PERLA, DELMER AGUSTO GUEVARA, DONALDO QUIROZ BAUTISTA, JUAN PABLO CUELLAR REYES, MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS, CARLOS MAURICIO REYES, OSCAR ARMANDO PEREZ PAZ, LIC. ALEJANDRO RAMOS MARMOL VICE ALCALDE MUNICIPAL - ANTE LOS MIEMBROS DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, SELLO Y FIRMA.-SECRETARIA MUNICIPAL ES CONFORME A SU ORIGINAL.- SE EXTIENDE EN PIMIENTA, CORTES A LOS 24 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO

MARGARITA PONCE RUBIO  
SECRETARIA MUNICIPAL





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



# SOCIALIZACION DEL PROYECTO



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



**Socialización del Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Sector La Iglesia**

07 de Mayo de 2025





ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, SECTOR LA IGLESIA, ALDEA SANTIAGO

FECHA: \_\_\_\_\_

NO	NOMBRE	DNI	CEL.	FIRMA
1	Fatima Janeth Lainez	1701-1791-00759	9449-0192	x fatima lainez
2	Angelina Lora Ramos			x Angelina Lora Ramos
3	Henry Javier Fodas	0612-1982-00120	9419-0987	A J F
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				





SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, SECTOR LA IGLESIA, ALDEA SANTIAGO

FECHA: \_\_\_\_\_

NO	NOMBRE	DNI	CEL.	FIRMA
1	Pedro Pablo Ortiz	15-06-1955	9216-3493	Pedro Pablo Ortiz
2	Maria Jesus Ramos	10/01/1965-00003	97422898	Ramos
3	Nancy Yessenia Fajardo	1618-1981-00141	98688666	Nancy Fajardo.
4	Juan Pablo Cuellar	0504-1972-00174	8790-2331	Juan Pablo Cuellar
5	Oscar Santiago Perez	0504-2002-00079	8997-5488	Oscar Santiago Perez
6	Daniel Alexander Nuñez R.	0509-1993-00457	9620-2787	Daniel Alexander Nuñez R.
7	Ramón Pérez Morales	16/8/197500060	97324577	Ramón Pérez
8	Miguel Flores	0504199700558	88473587	Miguel Flores
9	Edder Nahum Perez	0504-1991-00143	91642-0031	Edder Nahum Perez
10	José Luis Paredes	0504-2001-00063	9831-9542	José Luis Paredes



ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN BO. LAS FLORES, SECTOR LA IGLESIA, ALDEA SANTIAGO

FECHA: \_\_\_\_\_

NO	NOMBRE	DNI	CEL.	FIRMA
1	Iris Leiva	160619920027	99027112	Iris Leiva
2	Migdelia Godínez	1804-1984-04495	95699169	migdelia Godínez
3	Maria Josefina Flores Alvarado		8769-6014	x
4	Keila Liseth Paz Escobar	0509-2004-00346	93-35-05-53	x Keila Paz
5	Pastora Gómez Pérez	1316-197500147	89228903	Pastora Gómez Pérez
6	Marta Julia Pineda			x
7	Roney Oduber Delcid G.	0509-2002-00041	9381-4429	
8	José Ambrosio Ramos	0507-1979-00632	96-17-27-91	
9	Helen Nicolle Ramos Pérez	0504-2007-00082	9992-5634	Helen Ramos
10	Roberto Castillo			Roberto Castillo





ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN BO. LAS FLORES, SECTOR LA IGLESIA, ALDEA SANTIAGO

FECHA: \_\_\_\_\_

NO	NOMBRE	DNI	CEL.	FIRMA
1	Maria Elena Flores	1306-1977-00020	8912-7775	x Maria Elena Flores
2	Mirna Pineda	1401-1986-00174	9904-0396	x Mirna Pineda
3	Maria Elena Andrade	0101-1983-00334	9897-6576	x Maria Elena Andrade
4	Celia Cristina Garcia		3354-5555	x Celia Cristina Garcia
5	Pedro Antonio Castellon			x
6	Alexander Ramos	1010-1973-	8900-0773	x Alexander Ramos
7	M <sup>ra</sup> Magdalena Fuentes		9330-4142	M <sup>ra</sup> Magdalena Fuentes
8	DORA ANGELICA ESCO			DORA ESCOBAR
9	Maria Alba Nuñez	1654-1963-00551	9704-5414	x Maria Alba Nuñez
10	Reyna Flores Garcia		9562-5268	Reyna Flores Garcia





ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, SECTOR LA IGLESIA, ALDEA SANTIAGO

FECHA: \_\_\_\_\_

NO	NOMBRE	DNI	CEL.	FIRMA
1	Aison Milagros Ramos		94377036	Aison
2	Iris Romero morales	0505198200456	87304179	Iris Romero
3	José Lara	0504/198000025	99861456	José Lara
4	Wilmer R. Moncada	1501-1980-01516	97953590	Wilmer R. Moncada
5	Tania Trissl Orellana	0509 2006 00171	9890-0283	Tania Orellana
6	Marcos Josué Rivera Zavala	0504-2003-00105	9698-5117	Marcos
7	Keyllyn Trochez	0509-1994-00350	93-74-71-08	Keyllyn Trochez
8	Yeani Sarahi Anduray Pérez	1621 1988 00007	926133-97	Yeani Sarahi Anduray
9	Argentina Rios	0403 1458 00200		Argentina Rios
10	Maria Natividad Gomez	1002-1978-00154	938452-92	Natividad Gomez



ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, SECTOR LA IGLESIA, ALDEA SANTIAGO

FECHA: \_\_\_\_\_

NO	NOMBRE	DNI	CEL.	FIRMA
1	Oscar Rene Escobar Escobar	1307-1977-00075	9261-4887	
2	Vivian Jibell Medina Hernandez	0312-1998-01011	9561-7337	Vivian Medina
3	Beto Ramos	0507 1984 00157	9997 56 34	
4	Zoila Donelia Garcia	0501-1986-03705	9794-55-75	Zoila Garcia
5	Cristian MRM	0504-1990-00073	92939642	Cristian MR
6	Marta Lidia Quintero		94-57-70-56	
7	Manuel Ramos			
8	maria lara	0505-1993-00601	92 02-57-78	maria lara
9	Jose Reyes Lara.			Reyes Lara
10	Julio C Costilla		9803-0168	Julio C Costilla



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



# CONTRATO Y PROCESO DE CONTRATACION



## COTIZACION DE MANO DE OBRA

**CONSTRUCTOR: DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES**

ID:1804-1977-00783 # 9649-6778

**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA**

UBICACION: BARRIO LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, PIMIENTA, CORTES.

PARA: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

FECHA: 07 DE MAYO DE 2025 /

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
44	M.L.	Excavación de zanjo de 1.00 x 0.80 mts ✓	L150.00	L. 6,600.00
44	M.L.	Preparación y nivelación del terreno ✓	L200.00	L. 8,800.00
44	M.L.	Fundición de piso con un ancho de 1.00 m. 10 cm de espesor ref. 3#3 ✓	L650.00	L. 28,600.00
56	M2	Pegado de bloques de 6" ref. #3 en forma de U@.40m ✓	L700.00	L. 39,200.00
10	M.L.	Encofrado y fundición de embaulado de 15 c.m. de espesor ref. con malla #4@20cm longitudinales y transversales concreto 4,000 psi ✓	L1,350.00	L. 13,500.00
68	M.L.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor concreto ref. 2#2 ✓	L300.00	L. 20,400.00
1	Gral.	Limpieza final ✓	L2,500.00	L. 2,500.00
<b>TOTAL DE MANO DE OBRA</b>				<b>L. 119,600.00</b>

  
DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES  
ID: 1804-1977-00783





Inversiones y Servicio Caballero  
Bo La Victoria, 4ta calle.  
Villanueva, Cortes  
Tel: 9451-6605  
RTN: 05011987039502



COTIZACIÓN		
DIA	MES	AÑO
07	Mayo	2025

Señor (es): Municipalidad de Pimienta

Dirección: Cortés

R.T.N.: 05049995126357

Tel.:

A continuación presentamos oferta a solicitud de cotización:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44	M.L. de Excavación de Zanja de 1.00 x 0.80 mts	L. 200.00	L. 8,800.00
44	M.L. de Preparación y nivelación del terreno	L. 200.00	L. 8,800.00
44	M.L. de Fundición de piso con un ancho de 1.00 m. 10 cm de espesor ref. 3#3.	L. 650.00	L. 28,600.00
56	M.2. de Pegado de bloques de 6" ref. #3 en forma de U@.40m	L. 700.00	L. 39,200.00
10	M.L. de Encofrado y fundición de embaulado de 15 c.m. de espesor ref con malla #4@20cm longitudinales y transversales concreto 4,000 psi.	L. 1,350.00	L. 13,500.00
68	M.L. de Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor concreto ref 2#2	L. 300.00	L. 20,400.00
1	Limpieza final	L. 3,000.00	L. 3,000.00
TODO TRABAJO DEBERA CANCELAR EL 50 % ANTICIPADO		Sub-Total	L. 122,300.00
Cotización válida por: _____ días.		15% Imp. S/V	L. 0.00
Fecha de entrega: _____ días después de su orden.		Total	L. 122,300.00
Anticipo Lps. _____ Contra entrega: _____			

En espera de que nos favorezcan con su apreciable pedido, nos suscribimos muy atentamente.



FIRMA DEL CLIENTE

Jorge Ernesto Pacheco  
GERENTE GENERAL





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta Cortes.  
07 de Mayo del año 2025.

Sr. Jesús Alberto Dubon  
Tesorero Municipal  
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación, le notifico el contrato que ejecutaremos con el Sr. **Danec Alexander Acosta Fuentes Con DNI 1804-1977-00783** Por La Ejecución Del Proyecto de Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia

Consiste en:

Consiste en la construcción de cuneta abierta de 44.00 M.L. de largo con 1.00 M.L. de ancho y 3 líneas de bloques de 6, con piso de 1.00 M.L. de ancho y 10 cm de espesor, 68.00 M.L. de batiente de 0.15x0.15 y 10 M.L. de embaulado de 15 c.m de espesor, Ubicado en Barrio Las Flores, Aldea Santiago, Del Municipio De Pimienta, Departamento De Cortés. En el Presente contrato EL CONTRATISTA suministrara todo lo necesario en la Ejecución de la Obra, que cuenta con en las siguientes actividades y especificaciones:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
1.	44 ✓	M.L.	Excavación de zanjo de 1.00 x 0.80 mts ✓	L. 150.00 ✓	L. 6,600.00 ✓
2.	44 ✓	M.L.	Preparación y nivelación del terreno ✓	L. 200.00	L. 8,800.00 ✓
3.	44 ✓	M.L.	Fundición de piso con un ancho de 1.00 m. 10 cm de espesor ref. 3#3 ✓	L. 650.00	L. 28,600.00 ✓
4.	56 ✓	M2	Pegado de bloques de 6" ref. #3 en forma de U@.40m ✓	L. 700.00	L. 39,200.00 ✓
5.	10 ✓	M.L.	Encofrado y fundición de embaulado de 15 c.m. de espesor ref. con malla #4@20cm longitudinales y transversales concreto 4,000 psi ✓	L.1,350.00	L. 13,500.00 ✓
6.	68 ✓	M.L.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor concreto ref. 2#2 ✓	L. 300.00	L. 20,400.00 ✓
7.	1	Gral.	Limpieza final ✓	L2,500.00	L. 2,500.00
Total					L. 119,600.00

Por un total de **L. 119,600.00.**

FECHA DE INICIO 08/05/2025.  
FECHA DE FINALIZACION 07/06/2025.

Agradeciendo su colaboración  
Atentamente:



Henry Javier Rodas Andino  
Jefe de UTM

CC.Archivo





**CONTRATO**

**AMP-023-2025**

**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES,  
ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA.**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, Hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Documento Nacional de Identificación #0501-1960-01209, RTN #05011960012094 declarado Alcalde por el Consejo Nacional Electoral de fecha 25 de Enero del 2022 según punto único de la Sesión Ordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Señor DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES, Mayor de edad, Hondureño, Ingeniero Civil y con domicilio en Aldea Santiago, Municipio de Pimienta, Departamento de Cortes, con DNI 1804-1977-00783, RTN #18041977007839 quien se denomina EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO NO: AMP-023-2025 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA", que resultado del proceso de contratación llevado a cabo bajo la modalidad de Compra menor No: CM-023-AMP-2025, contrato que se regirá bajo las siguientes clausulas:

**CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:**

Consiste en la construcción de cuneta abierta de 44.00 M.L. de largo con 1.00 M.L. de ancho y 3 líneas de bloques de 6, con piso de 1.00 M.L. de ancho y 10 cm de espesor, 68.00 M.L. de batiente de 0.15x0.15 y 10 M.L. de embaulado de 15 c.m de espesor, Ubicado en Barrio Las Flores, Aldea Santiago, Del Municipio De Pimienta, Departamento De Cortés. En el Presente contrato EL CONTRATISTA suministrara todo lo necesario en la Ejecución de la Obra, que cuenta con en las siguientes actividades y especificaciones:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
1.	44	M.L.	Excavación de zanja de 1.00 x 0.80 mts	L. 150.00	L. 6,600.00
2.	44	M.L.	Preparación y nivelación del terreno	L. 200.00	L. 8,800.00
3.	44	M.L.	Fundición de piso con un ancho de 1.00 m. 10 cm de espesor ref. 3#3	L. 650.00	L.28,600.00
4.	56	M2	Pegado de bloques de 6" ref. #3 en forma de U@.40m	L. 700.00	L.39,200.00
5.	10	M.L.	Encofrado y fundición de embaulado de 15 c.m. de espesor ref. con malla #4@20cm longitudinales y transversales concreto 4,000 psi	L.1,350.00	L.13,500.00
6.	68	M.L.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor concreto ref. 2#2	L. 300.00	L.20,400.00
7.	1	Gral.	Limpieza final	L.2,500.00	L. 2,500.00
Total					L 119,600.00

**CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:**

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 08 de Mayo del Año 2025 al 07 de Junio del año 2025.

**CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:**

El contrato tendrá un valor de Lps. 119,600.00 (CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) los que se cancelaran de la siguiente manera: Un pago semanal de acuerdo al avance de la obra, Un pago final al ser recibidas las obras a satisfacción. No se hará la retención del Impuesto sobre la Renta ya que posee la Constancia de Pagos a Cuenta CSV: RNMFWQQKEZ37JVA.

**CLAUSULA No... 4 GARANTIAS:**

El contratista se compromete a presentar las garantías siguientes:

- Garantía de Cumplimiento:** Una vez suscrito el contrato el contratista proporcionará una Garantía de Cumplimiento mediante una fianza bancaria, cheque certificado o cheque de caja del Quince Por Ciento (15%) del monto del proyecto la cual equivale a Lps 17,940.00, (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS), esta deberá ser presentada por el contratista





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortés*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



al contratante, a más tardar 5 días después de firmado el contrato, esta estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra y deberá renovarse treinta (30) días antes del vencimiento si fuese necesario.

- b) **Garantía de Calidad:** El contratista garantiza la calidad de su trabajo mediante una fianza bancaria, cheque certificado o cheque de caja del cinco por ciento (5%) del monto del proyecto equivalente a Lps. 5,980.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS) que será entregada una vez finalice la obra, esta tendrá un plazo de Seis (6) meses de vigencia a partir de la finalización del contrato; así mismo a realizar subsanaciones por defectos o daños que le sucedieren a la obra por responsabilidad del contratista.

**CLAUSULA No... 5 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:**

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara la multa mediante el cobro de la fianza bancaria, cheque certificado o cheque de caja por incumplimiento del contrato del Quince Por Ciento (15%), siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del contratista.

**CLAUSULA No... 6 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:**

El Contratista deberá utilizar el equipo, materiales, herramientas y personal adecuados y calificados para la ejecución de la obra.

**CLAUSULA No.... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**

Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Andino Jefe de la Unidad Técnica Municipal, encargado de la supervisión y el departamento de auditoría o cualquier institución contralor del estado podrá supervisar la obra durante su ejecución en cualquier momento.

**CLAUSULA No.... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:**

Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la negociación directa entre el contratante y el contratista, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado de Paz del Municipio de Pimienta, Cortés y/o Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

**CLAUSULA No.... 10 RATIFICACIÓN:**

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista. Pimienta Cortés, 07 de Mayo del Año 2025.




*Raúl Alfredo Ugarte Florentino*  
DNI. # 0501-1960-01209  
Contratante

*Danec Alexander Acosta Fuentes*  
DNI. #1804-1977-0078  
Contratista



**INVERSIONES ACOSTA LARA**  
Propietario: Danec Alexander Acosta Lara  
RTN: 18041977007839 Cel: 9649-6778  
Email: [danecacosta1977@gmail.com](mailto:danecacosta1977@gmail.com)  
Aldea Santiago, Pimienta, Cortés.



### CONSTANCIA DE ENTREGA

**Fecha:** Pimienta, Cortés, 13 de Mayo de 2025.

**Contrato No.** AMP-023-2025

**Objeto del contrato:** Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia

Yo, **DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES**, En Mi Calidad De Gerente Propietario De La Empresa **Inversiones Acosta Lara**, Con RTN No. **18041977007839**, Hago Constar Por Medio De La Presente Que, En Cumplimiento De Lo Establecido En El Contrato Antes Referido, Se Entrega **Garantía De Cumplimiento** por un monto de **L. 17,940.00 (DIECISITE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS)**, correspondiente al 15% del valor total del contrato.

Dicha garantía se presenta en la forma de **cheque de caja N.º 80900934** emitido por el Banco Atlántida S.A., a nombre de **Municipalidad de Pimienta**, con fecha de emisión **13 de Mayo de 2025**.

La presente garantía tiene como fin asegurar el cumplimiento fiel y oportuno de las obligaciones contractuales asumidas por nuestra empresa y estará vigente hasta el cumplimiento total de dichas obligaciones o según lo determine el contrato.

Se extiende la presente nota de entrega para los fines legales y administrativos correspondientes.

**Atentamente,**

  
Danec Alexander Acosta Fuentes  
**Gerente Propietario**  
**Inversiones Acosta Lara**





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



13 de Mayo del año 2025.  
Pimienta Cortes.

Lic. Jesús Dubon.  
Tesorero Municipal.  
Su Oficina.

**Asunto:** Remisión de Garantía de Cumplimiento de Contrato  
**Referencia:** Contrato No. AMP-023-2025.

Por este medio me permito remitir a usted la garantía de cumplimiento correspondiente al contrato identificado como Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia, suscrito entre esta Municipalidad y la empresa Inversiones Acosta Lara, representada por el señor Danec Alexander Acosta Fuentes.

La garantía consiste en lo siguiente:

**Tipo de garantía:** Cheque De Caja

**Número de cheque:** 80900934

**Banco emisor:** Banco Atlántida S.A.

**Monto:** L. 17,940.00 Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta Lempiras Exactos

**Fecha de emisión:** 13 De Mayo de 2025.

Esta garantía se entrega para su custodia y registro, conforme a lo establecido en la cláusula #4 del contrato mencionado, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa contratista.

Sin otro particular, quedo atento a cualquier consulta o gestión adicional.

Atentamente,



*Henry Javier Rodas*  
Henry Javier Rodas  
Jefe de UTM



CC. Archivo



CHEQUE DE CAJA  
BANCO ATLÁNTIDA, S.A.  
R.T.N. 08019996368674  
Cuenta N.º: 23101010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80900934

VILLANUEVA 13 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

\*\*\*\*\*17,940.00\*\*\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA \*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

*[Handwritten Signature]*  
SPA169


⑈01001024⑈231010101000⑈80900934

ENDOSE AQUI

No escriba, selle o firme debajo de esta línea.  
Reservado para uso de Instituciones Financieras.



**INVERSIONES ACOSTA LARA**  
Propietario: Danec Alexander Acosta Lara  
RTN: 18041977007839 Cel: 9649-6778  
Email: [danecacosta1977@gmail.com](mailto:danecacosta1977@gmail.com)  
Aldea Santiago, Pimienta, Cortés.



### CONSTANCIA DE ENTREGA

**Fecha:** Pimienta, Cortés, 19 de mayo de 2025

**Contrato No.:** AMP-023-2025

**Objeto del contrato:** Proyecto de construcción de cuneta en Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia

Yo, **Danec Alexander Acosta Fuentes**, en mi calidad de **Gerente Propietario** de la empresa **Inversiones Acosta Lara**, con RTN No. **18041977007839**, hago constar por medio de la presente que, en cumplimiento de lo establecido en el contrato antes referido, se entrega la **garantía de calidad** por un monto de **L. 5,980.00 (Cinco Mil Novecientos Ochenta Lempiras Exactos)**, correspondiente al 5% del valor total del contrato.

Dicha garantía se presenta en la forma de **cheque de caja No. 80900936**, emitido por **Banco Atlántida S.A.**, a nombre de la **Municipalidad de Pimienta**, con fecha de emisión **19 de mayo de 2025**.

La presente garantía tiene como fin asegurar la calidad de las obras ejecutadas por nuestra empresa y estará vigente hasta el cumplimiento total de dichas obligaciones, o según lo determine el contrato.

Se extiende la presente constancia para los fines legales y administrativos correspondientes.

**Atentamente,**

  
**Danec Alexander Acosta Fuentes**  
**Gerente Propietario**  
**Inversiones Acosta Lara**





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



20 de Mayo del año 2025.  
Pimienta Cortes.

**Lic. Jesús Dubon.**  
Tesorero Municipal.  
Su Oficina.

**Asunto:** Remisión de Garantía de Calidad de Obra  
**Referencia:** Contrato No. AMP-023-2025.

Por este medio me permito remitir a usted la garantía de cumplimiento correspondiente al contrato identificado como **Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia**, suscrito entre esta Municipalidad y la empresa **Inversiones Acosta Lara**, representada por el señor **Danec Alexander Acosta Fuentes**.

La garantía consiste en lo siguiente:

**Tipo de garantía:** Cheque De Caja  
**Número de cheque:** 80900936  
**Banco emisor:** Banco Atlántida S.A.  
**Monto:** L. 5,980.00 Cinco Mil Novecientos Ochenta Lempiras Exactos  
**Fecha de emisión:** 19 De Mayo de 2025.

Esta garantía se entrega para su custodia y registro, conforme a lo establecido en las cláusulas del contrato mencionado, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa contratista.

Sin otro particular, quedo atento a cualquier consulta o gestión adicional.

Atentamente,



**Henry Javier Rodas**  
Jefe de UTM



CC. Archivo



CHEQUE DE CAJA  
BANCO ATLÁNTIDA, S.A.  
R.T.N. 08019995368674  
Cuenta N.º: 23101010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80900936

VILLANUEVA 19 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Páguese a la orden de

\*\*\*\*\*5,980.00\*\*\*\*\*

\*\*\*CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

⑈01001024⑈231010101000⑈80900936

ENDOSAR AQUI

No escriba, selle o firme debajo de esta línea.  
Reservado para uso de Instituciones Financieras.



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



# ACTAS DE APERTURA Y RECEPCION DE LA OBRA





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta Cortes.

07 de Mayo del año 2024.

**Sr. Danec Alexander Acosta.**

Inversiones Acosta Lara.


Su Oficina.



**ORDEN DE INICIO**



Estimado Sr. Acosta:

Habiendo cumplido con la presentación de la documentación requerida, La Unidad de Proyectos por medio de la presente le instruye, para que, a partir del día 08 de Mayo del año 2025, de inicio a la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA"** incluido en el contrato No: AMP-023-2025, suscrito el día 07 de Mayo del 2025, entre el Doctor **RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO** en su condición de Alcalde Municipal y el Sr. **DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES** en su condición de Contratista, Por un monto de **Lps. 119,600.00 (CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**; a la vez se le comunica que deberá ejecutar la obra con apego al contrato y sus Anexos y seguir las instrucciones impartidas por escrito por la Unidad de Proyectos.

Atentamente:

  
Dr. Raul Alfredo Ugarte  
Alcalde Municipal

  
  
Henry Javier Rodas Andino  
Jefe de U.T.M.



## ACTA DE APERTURA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: **Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.**

Dirección: **Barrio Las Flores, Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.**

Procedencia de fondos: **Municipalidad de Pimienta, Cortes.**

Nosotros: **Henry Javier Rodas Andino** DNI No. **0612-1982-00120** en carácter de jefe de la Unidad Técnica Municipal de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el **Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes** Con DNI **1804-1977-00783** quien actúa en su condición de Contratista hemos acordado la ejecución del proyecto de: **Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia**, del Municipio de Pimienta, Cortes, el cual consiste en:

Consiste en la construcción de cuneta abierta de 44.00 M.L. de largo con 1.00 M.L. de ancho y 3 líneas de bloques de 6, con piso de 1.00 M.L. de ancho y 10 cm de espesor, 68.00 M.L. de batiente de 0.15x0.15 y 10 M.L. de embaulado de 15 c.m de espesor, Ubicado en Barrio Las Flores, Aldea Santiago, Del Municipio De Pimienta, Departamento De Cortés. En el Presente contrato EL CONTRATISTA suministrara todo lo necesario en la Ejecución de la Obra, que cuenta con en las siguientes actividades y especificaciones:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
1.	44	M.L.	Excavación de zanjo de 1.00 x 0.80 mts	L. 150.00	L. 6,600.00
2.	44	M.L.	Preparación y nivelación del terreno	L. 200.00	L. 8,800.00
3.	44	M.L.	Fundición de piso con un ancho de 1.00 m. 10 cm de espesor ref. 3#3	L. 650.00	L. 28,600.00
4.	56	M2	Pegado de bloques de 6" ref. #3 en forma de U@.40m	L. 700.00	L. 39,200.00
5.	10	M.L.	Encofrado y fundición de embaulado de 15 c.m. de espesor ref. con malla #4@20cm longitudinales y transversales concreto 4,000 psi	L. 1,350.00	L. 13,500.00
6.	68	M.L.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor concreto ref. 2#2	L. 300.00	L. 20,400.00
7.	1	Gral.	Limpieza final	L. 2,500.00	L. 2,500.00
Total					L. 119,600.00

El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida del 08 de Mayo de 2025 al 07 de Junio del año 2025. Con un valor total de la obra **Lps. 119,600.00 (CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS**





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL




LEMPIRAS EXACTOS). Por parte del Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para dar inicio, procediéndose de la siguiente forma:

**Primero:** El Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes manifiesta que dará inicio a la obra: El día Jueves 08 de Mayo del Año 2025, para la ejecución del Proyecto de Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.


**Segundo:** Se socializo con la comunidad beneficiaria, las diferentes actividades de trabajo acordando dar inicio al proyecto.


**Tercero:** Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 07 días del mes de Mayo del Año 2025.




  
Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino  
DNI #0501-1960-01209  
Contratante



  
Sr. Henry Javier Rodas Andino  
DNI #0612-1982-00120  
Jefe de UTM

  
Representante de la comunidad  
Nombre: Wilmer Rigoberto Mancado  
DNI #. 1501-1980-01516

  
Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes  
DNI #1804-1977-00783  
Contratista






Fotografías del Estado Actual







**INVERSIONES ACOSTA LARA**  
Propietario: Danec Alexander Acosta Lara  
RTN: 18041977007839 Cel: 9649-6778  
Email: [danecacosta1977@gmail.com](mailto:danecacosta1977@gmail.com)  
Aldea Santiago, Pimienta, Cortés.



## SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE OBRA

Pimienta, Cortés, 19 de Mayo de 2025

**Señores:**  
Municipalidad de Pimienta  
Presente

**Asunto:** Solicitud de recepción de obra

**Contrato No.:** AMP-023-2025

**Objeto:** Proyecto de construcción de cuneta en Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia

Yo, **Danec Alexander Acosta Fuentes**, mayor de edad, hondureño, con identidad No. 1804-1977-00000 y en mi condición de **Gerente Propietario** de la empresa **Inversiones Acosta Lara**, con RTN No. 18041977007839, me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitar la **recepción formal** del proyecto ejecutado conforme al contrato anteriormente referido.

El proyecto, consistente en la **construcción de cuneta en el Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia**, ha sido concluido en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, plazos y condiciones estipuladas en el contrato.

Con base en lo anterior, solicitamos que se programe a la mayor brevedad posible la visita de inspección por parte del personal técnico correspondiente para proceder con el acta de recepción de obra.

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración, quedo a la espera de su confirmación.

Atentamente,

**Danec Alexander Acosta Fuentes**  
Gerente Propietario  
**Inversiones Acosta Lara**  
RTN: 18041977007839





## ACTA DE RECEPCION FINAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.

Dirección: Barrio Las Flores, Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.

Procedencia de fondos: Municipalidad de Pimienta, Cortes.

Nosotros: Henry Javier Rodas Andino DNI No. 0612-1982-00120 en carácter de jefe de la Unidad Técnica Municipal de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el Sr. Danee Alexander Acosta Fuentes Con DNI 1804-1977-00783 quien actúa en su condición de Contratista hemos acordado la ejecución del proyecto de: **Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia**, del Municipio de Pimienta, Cortes, el cual consiste en:

Consiste en la construcción de cuneta abierta de 44.00 M.L. de largo con 1.00 M.L. de ancho y 3 líneas de bloques de 6, con piso de 1.00 M.L. de ancho y 10 cm de espesor, 68.00 M.L. de batiente de 0.15x0.15 y 10 M.L. de embaulado de 15 c.m de espesor, Ubicado en Barrio Las Flores, Aldea Santiago, Del Municipio De Pimienta, Departamento De Cortés. En el Presente contrato EL CONTRATISTA suministrara todo lo necesario en la Ejecución de la Obra, que cuenta con en las siguientes actividades y especificaciones:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
1.	44	M.L.	Excavación de zanja de 1.00 x 0.80 mts	L. 150.00	L. 6,600.00
2.	44	M.L.	Preparación y nivelación del terreno	L. 200.00	L. 8,800.00
3.	44	M.L.	Fundición de piso con un ancho de 1.00 m. 10 cm de espesor ref. 3#3	L. 650.00	L. 28,600.00
4.	56	M2	Pegado de bloques de 6" ref. #3 en forma de U@.40m	L. 700.00	L. 39,200.00
5.	10	M.L.	Encofrado y fundición de embaulado de 15 c.m. de espesor ref. con malla #4@20cm longitudinales y transversales concreto 4,000 psi	L. 1,350.00	L. 13,500.00
6.	68	M.L.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor concreto ref. 2#2	L. 300.00	L. 20,400.00
7.	1	Gral.	Limpieza final	L. 2,500.00	L. 2,500.00
Total					L. 119,600.00

El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida del 08 de Mayo de 2025 al 07 de Junio del año 2025. Con un valor total de la obra **Lps. 119,600.00 (CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS**





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL




**LEMPIRAS EXACTOS).** Por parte del Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes, nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para dar por terminado el proyecto, procediéndose de la siguiente forma:

**Primero:** El Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes manifiesta que finalizo a la obra: El día Lunes 19 de Mayo del Año 2025.


**Segundo:** Los presentes procedieron a realizar un recorrido al proyecto, encontrando que este fue construido de acuerdo a las especificaciones técnicas de mano de obra.


**Tercero:** Mediante este documento el Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes da por finalizado el: Proyecto de Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia, traspasando la misma al representante de la Comunidad quienes se comprometen a dar mantenimiento al proyecto finalizado.

**Cuarto:** Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 20 días del mes de Mayo del año 2025.

  
Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino  
DNI #0501-1960-01209  
Contratante

  
Sr. Henry Javier Rodas Andino  
DNI #0612-1982-00120  
Jefe de UTM

  
Representante de la comunidad  
Nombre: Wilmer Rigoberto Moncada  
DNI #. 1501-1980-01516

  
Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes  
DNI #1804-1977-00783  
Contratista





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

**PROYECTO:** Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.

**CONTRATO:** AMP-023-2025.

**DIRECCION:** Barrio Las Flores, Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.

En cumplimiento con la solicitud por parte del Sr. **Danec Alexander Acosta Fuentes**, recibida el día 19 de Mayo del año en curso, La Unidad de Proyectos procedió a realizar la inspección en Campo de la obra, estando la misma en un nivel aceptable con relación a lo contratado, por lo cual, se determina lo siguiente:

Habiendo cumplido con lo establecido en la cláusula #01 del contrato antes mencionado, La Unidad de Proyectos por medio de la presente da por terminado y Recibido el Proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA" por un monto de L. 119,600.00, el cual inicio el 8 de Mayo del Año 2025 y finalizo el día 19 de Mayo de 2025.

Para los fines que el interesado estime conveniente, firmamos la presente acta en el Municipio de Pimienta, Cortés a los 20 días del mes de Mayo del año 2025.



**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal



**Henry Javier Rodas Andino**  
Supervisor Municipal

**Danec Alexander Acosta Fuentes**  
Contratista





Fotografías del Proyecto Terminado







REPUBLICA DE HONDURAS  
*Municipalidad De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



**INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE**

**NO. AMP-023-2025-01**

Pimienta Cortes.

10 de Mayo del Año 2025.

**INFORMACION DEL PROYECTO:**

CONTRATO **AMP-023-2025**  
NOMBRE **Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.**  
UBICACION **Barrio Las Flores, Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.**  
FINANCIAMIENTO **Fondos de Transferencia Código: 16 02 010 000 001 47210 11-001-01 20**  
CONTRATISTA **Sr. Danee Alexander Acosta Fuentes Con DNI 1804-1977-00783.**  
MONTO Y VIGENCIA **Valor. L. 119,600.00 Inicio: 08/05/2025 Finalización: 07/06/2025**

**Sr. Jesús Alberto Dubon.**  
Tesorero Municipal.

A continuación, detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.** Durante la fecha que comprende del día **Jueves 08 de Mayo del año 2025 al Sábado 10 de Mayo del Año 2025.** Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

No	Cant.	Unidad	Descripción	Porcentaje
1	44	m.l.	Excavación de zanja de 1.00 x 0.80 mts	100.00%
2	44	m.l.	Preparación y nivelación del terreno	100.00%
3	24	m.l.	Fundición de piso con un ancho de 1.00 m. 10 cm de espesor ref. 3#3	54.55%
Total				25.92%


Hasta la fecha se han concluido a un 25.92% las actividades del servicio prestado, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 31,000.00 COMO ANTICIPO POR AVANCES AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**



**Henry Javier Rodas Andino**  
Jefe de UTM

CC. Archivo



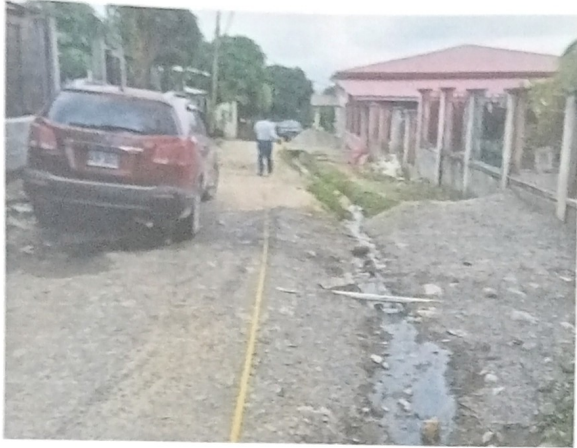



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



**INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE**

**NO. AMP-023-2025-02**

Pimienta Cortes.  
15 de Mayo del Año 2025.

**INFORMACION DEL PROYECTO:**

CONTRATO **AMP-023-2025**  
NOMBRE **Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.**  
UBICACION **Barrio Las Flores, Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.**  
FINANCIAMIENTO **Fondos de Transferencia Código: 16 02 010 000 001 47210 11-001-01 20**  
CONTRATISTA **Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes Con DNI 1804-1977-00783.**  
MONTO Y VIGENCIA **Valor. L. 119,600.00 Inicio: 08/05/2025 Finalización: 07/06/2025**

**Sr. Jesús Alberto Dubon.**  
Tesorero Municipal.

A continuación, detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.** Durante la fecha que comprende del día **Lunes 12 de Mayo del año 2025 al Sábado 17 de Mayo del Año 2025.** Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:




No	Cant.	Unidad	Descripción	Porcentaje
3	20	M.L	Fundición de piso con un ancho de 1.00 m. 10 cm de espesor ref. 3#3	45.45%
4	56	M2	Pegado de bloques de 6" ref. #3 en forma de U@.40m	100.00%
6	10	M.L.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor concreto ref 2#2	14.71%
Total				72.07%

Hasta la fecha se han concluido a un 72.07% las actividades del servicio prestado, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 55,200.00 COMO ANTICIPO POR AVANCES AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**



**Henry Javier Rodas Andino**  
Jefe de UTM



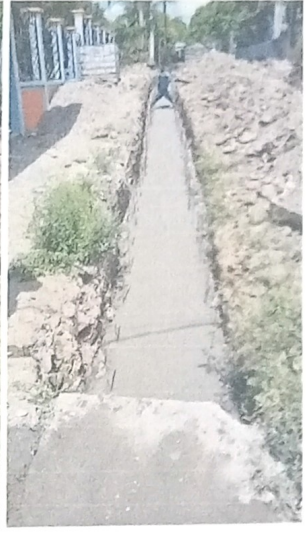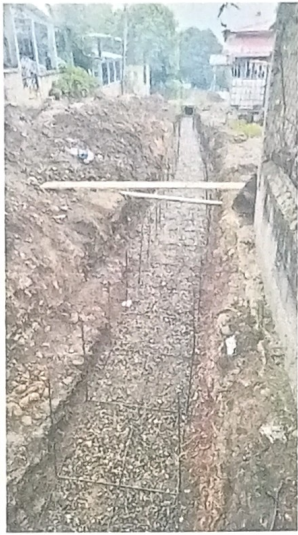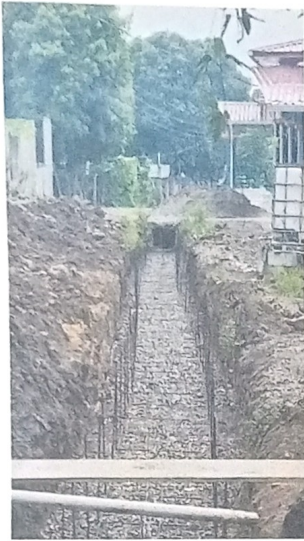





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



**INFORME DE SUPERVISION Y BITACORA**

**NO. AMP-023-2025-03**

Pimienta Cortes.  
20 de Mayo del Año 2025.

**INFORMACION DEL PROYECTO:**

CONTRATO	AMP-023-2025
NOMBRE	Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.
UBICACION	Barrio Las Flores, Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos de Transferencia Código: 16 02 010 000 001 47210 11-001-01 20
CONTRATISTA	Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes Con DNI 1804-1977-00783.
MONTO Y VIGENCIA	Valor. L. 119,600.00 Inicio: 08/05/2025 Finalización: 07/06/2025

**Sr. Jesús Alberto Dubon.**  
Tesorero Municipal.

A continuación, detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.** Durante la fecha que comprende del día **Lunes 19 de Mayo del año 2025 al Martes 20 de Mayo del Año 2025.** Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

No	Cant.	Unidad	Descripción	Porcentaje
5	10	M2	Encofrado y fundición de embaulado de 15 c.m. de espesor ref con malla #4@20cm longitudinales y transversales concreto 4,000 psi	100.00%
6	58	M.L	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor concreto ref 2#2	85.29%
7	01	Gral	Limpieza final.	100.00%
Total				100.00%

Hasta la fecha se han concluido a un 100.00% las actividades del servicio prestado, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 33,400.00 / COMO ANTICIPO POR AVANCES AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**



**Henry Javier Rodas Andino**  
Jefe de UTM



Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.  
Lunes 19 de Mayo del año 2025 al Martes 20 de Mayo del Año 2025





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



# PRESUPUESTO EJECUTADO





## PRESUPUESTO EJECUTADO

### Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Santiago

Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
44	M.L.	Excavación de Zanjo de 1.00 x 0.80 mts	L150.00	L6,600.00
44	M.L.	Preparación y nivelación del terreno	L200.00	L8,800.00
44	M.L.	Fundición de piso con un ancho de 1.00 m. 10 cm de espesor ref. 3#3	L650.00	L28,600.00
56	M2	Pegado de bloques de 6" ref. #3 en forma de U@.40m	L700.00	L39,200.00
10	M.L.	Encofrado y fundición de embaulado de 15 c.m. de espesor ref con malla #4@20cm longitudinales y transversales concreto 4,000 psi	L1,350.00	L13,500.00
68	M.L.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor concreto ref 2#2	L300.00	L20,400.00
1	Gral	Limpieza final	L2,500.00	L2,500.00
<b>Total</b>				<b>L.119,600.00</b>



**Henry Javier Rodas Andino**  
Jefe de U.T.M.



# LIQUIDACION FINANCIERA (ORDENES DE PAGO, FACTURAS, CHEQUES)





LIQUIDACION DE PROYECTO  
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, SECTOR LA IGLESIA  
MAYO DE 2025



NO.	FECHA	ORDEN	DESCRIPCION	FACTURA	PROVEEDOR	FONDOS		
						PROPIOS	TRANSFE	DISPONIBLE
1	24 03 2025		PRESUPUESTO APROBADO EN LA AMPLIACION POR AUMENTO DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, EN EL ACTA 641 PUNTO 8 E FECHA 15 DE MARZO DE 2025.			L -	L 120,000.00	L 120,000.00
2	16 05 2025	33846	DESEMBOLSO POR ANTICIPO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA EN CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA ABIERTA DE 44.00 M.L. DE LARGO CON 1.00 M.L. DE ANCHO Y 3 LÍNEAS DE BLOQUE DE 6, CON PISO DE 1.00 M.L. DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR, 68.00 M.L. DE BATIENTE DE 0.15X0.15 Y 10 M.L. DE EMBAULADO DE 15 C.M. DE ESPESOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 10 DE MAYO Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2025, SEGÚN INFORMES DE SUPERVISIÓN Y AVANCE AMP023-2025-01 Y AMP023-2025-02 EN CONTRATO AMP-023-2025.	000-001-01-00000301	DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES	L -	-L \$6,200.00	L 33,800.00
3	21 05 2025	33864	ANCELACIÓN AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA, SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN Y BITÁCORA NO, AMP-023-2025-03.	000-0001-01-00000302	DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES	L -	-L 33,400.00	L 400.00
DISPONIBLE						L -	L 400.00	L 400.00
RESUMEN DE EJECUCION						PRESUPUESTO APROBADO		
						L 120,000.00		
						AMPLIACION PRESUPUESTARIA		
						L -		
						DISMINUCION		
						L -		
						EJECUTADO		
						-L 119,600.00		
						SALDO		
						L 400.00		





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2025

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/05/2025

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: NANCY.BRIONES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 33864

L.: 33,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19596

Fecha de Emisión: 21/5/2025

No Cheque/Nota de Debito:

00023634

Pague a: DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES

Id/RTN: 18041977007839

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA, SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN Y BITÁCORA NO, AMP-023-2025-03.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 010 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Construcción de cuenta en Bo. Las Flores, Sector la Iglesia	33,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,400.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,400.00

PRESUPUESTO 2025  
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.: 18041977007839


0s+jsf9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KyjM9/ExmvSmCw3gUuXwPyxsEsUjUsKuUJVOb6Eg9v9MFYF6nmXQ0zp+IMe8AXbnH2MzMuNViaYQOgTGn1Izpl  
5agFCOWfW8J9PxIXhH2/aGIIITSuGBM+b8WT





Fecha: 22 / Mayo / 25 Contado ☐ Crédito ☐  
 Cliente: Municipalidad de Pimienta  
 R.T.N. 05049995126357 Tel.:  
 Dirección:  
 N° de Orden de Compra Exenta:  
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAC:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
01	Pago por concelacion al contrato de mano de obra por el 100% de ejecución del proyecto de construcción de cenota en Be. Las Flores aldea Santiago, sector 1a Iglesia.	33,400.00	33,400.00



Rango Autorizado: 000-001-01-000000001 - 000-001-01-000000050  
Fecha de Emisión: 05/12/2024 - Fecha límite de Emisión 05/12/2025  
C.A.I. 288D5C-214F0B-52B2E0-63BE03-0909F5-EA

C.A.I. 288D5C-214F0B-52B2E0-63BE03-0909F5-EA

David H. H. H.

Son treinta y tres Mil  
Cuatrocientos lempiros  
exactos

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% L.S.V.L.

18% L.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L

33.400 00

*La 1 actura El Beneficio De Todos, "Enjola"*

Original Client: Costa Colnago Tiquende Emp

FACTURA 000-001-01-00 N° 000302



**MUNICIPALIDAD DE  
NUEVA PIMIENTA**

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE  
A PARQUE PIMIENTA  
CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716



**CHEQUE No. 00023634**

**PIMIENTA**  
Lugar y Fecha

21 de mayo de 2025

**DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES**

Páguese a la orden de

L 33,400.00

**TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01211308⑆00002111110716⑆00023634

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCIÓN DEL 100% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA, SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN Y BITÁCORA NO, AMP-023-2025-03.	33,400.00
CHEQUE No. <b>00023634</b>	HECHO POR 	REVISADO POR 
RECIBI CONFORME		







REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta Cortes.

20 de Mayo del año 2025.

**Sr. Jesús Alberto Dubon**

Tesorero Municipal

Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

Por medio del presente, solicito el desembolso a favor del **Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes**, con **DNI 1804-1977-00783**, por un monto de **L. 33,400.00** Corresponde a la cancelación del 100% del avance contemplado en el Informe de Supervisión y Bitácora No. AMP-023-2025-03, por la ejecución del contrato del **Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.**

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



  
**Henry Javier Rodas Andino**  
Jefe de UTM



**INVERSIONES ACOSTA LARA**  
Propietario: Danec Alexander Acosta Lara  
RTN: 18041977007839 Cel: 9649-6778  
Email: [danecacosta1977@gmail.com](mailto:danecacosta1977@gmail.com)  
Aldea Santiago, Pimienta, Cortés.



## SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE OBRA

Pimienta, Cortés, 19 de Mayo de 2025

Señores:  
Municipalidad de Pimienta  
Presente

Asunto: Solicitud de recepción de obra

Contrato No.: AMP-023-2025

Objeto: Proyecto de construcción de cuneta en Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia

Yo, Danec Alexander Acosta Fuentes, mayor de edad, hondureño, con identidad No. 1804-1977-00000 y en mi condición de Gerente Propietario de la empresa Inversiones Acosta Lara, con RTN No. 18041977007839, me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitar la **recepción formal** del proyecto ejecutado conforme al contrato anteriormente referido.

El proyecto, consistente en la **construcción de cuneta en el Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia**, ha sido concluido en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, plazos y condiciones estipuladas en el contrato.

Con base en lo anterior, solicitamos que se programe a la mayor brevedad posible la visita de inspección por parte del personal técnico correspondiente para proceder con el acta de recepción de obra.

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración, quedo a la espera de su confirmación.

Atentamente,

Danec Alexander Acosta Fuentes  
Gerente Propietario  
Inversiones Acosta Lara  
RTN: 18041977007839





CHEQUE DE CAJA  
BANCO ATLÁNTIDA, S.A.  
R.T.N. 08019995368674  
Cuenta N.º: 231010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80900936

VILLANUEVA 19 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Páguese a la orden de

L \*\*\*\*\*5,980.00\*

QUINIENTOS NOVECIENTOS OCHENTA y 8/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

⑆0001024⑆231010101000⑈80900936

ENDOSE AQUI

No escriba, selle o firme debajo de esta línea.  
Reservado para uso de Instituciones Financieras.



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

**PROYECTO:** Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.

**CONTRATO:** AMP-023-2025.

**DIRECCION:** Barrio Las Flores, Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.

En cumplimiento con la solicitud por parte del Sr. **Danec Alexander Acosta Fuentes**, recibida el día 19 de Mayo del año en curso, La Unidad de Proyectos procedió a realizar la inspección en Campo de la obra, estando la misma en un nivel aceptable con relación a lo contratado, por lo cual, se determina lo siguiente:

Habiendo cumplido con lo establecido en la cláusula #01 del contrato antes mencionado, La Unidad de Proyectos por medio de la presente da por terminado y Recibido el Proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA" por un monto de L. 119,600.00, el cual inicio el 8 de Mayo del Año 2025 y finalizo el día 19 de Mayo de 2025.

Para los fines que el interesado estime conveniente, firmamos la presente acta en el Municipio de Pimienta, Cortés a los 20 días del mes de Mayo del año 2025.



**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal



**Henry Javier Rodas Andino**  
Supervisor Municipal

**Danec Alexander Acosta Fuentes**  
Contratista







Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2025

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 16/05/2025

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: NANCY.BRIONES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 33846

L.: 86,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19581

Fecha de Emisión: 16/5/2025

No Cheque/Nota de Debito: 00023619

Paguese a: DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES

Id/RTN: 18041977007839

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DESEMBOLSO POR ANTICIPO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA EN CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA ABIERTA DE 44.00 M.L. DE LARGO CON 1.00 M.L. DE ANCHO Y 3 LÍNEAS DE BLOQUE DE 6, CON PISO DE 1.00 M.L. DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR, 68.00 M.L. DE BATIENTE DE 0.15X0.15 Y 10 M.L. DE EMBAULADO DE 15 C.M. DE ESPESOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 10 DE MAYO Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2025, SEGÚN INFORMES DE SUPERVISIÓN Y AVANCE AMP023-2025-01 Y AMP023-2025-02 EN CONTRATO AMP-023-2025.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
16 02 010 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Construcción de cuenta en Bo. Las Flores, Sector la Iglesia	86,200.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		86,200.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		86,200.00



Presupuesto y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 18041977007839

Os xjs/9JmeIY1VwM7KxyE3IDTzUNV1529KyJM9/ExmvSmdt5xw3gUuY... yxsEsWVUsKuUJVC6EgJv9MFYF6nmXQ0zp+ImeSAXbnH2MzMuNVlaYQOgTGn1Izpi  
SegFCOWlW8J9PnIZXhH2/aGUTSuGBM+b8WT





# INVERSIONES ACOSTA LARA

Prop. DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES

Cel.: 96496778 - E-mail: danecacosta1977@gmail.com

Buenos Aires, Calle Principal, A Cuatro Cuadras De Empacadora

De Bananos Los Pelmas, Pimienta, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 18041977007839



Fecha:	17 / Mayo / 2025	Contado	<input type="checkbox"/>	Crédito	<input type="checkbox"/>
Cliente:	Municipalidad de Pimienta				
R.T.N.	05049905126357	Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAC:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
01	Desembolso por anticipo al proyecto de construcción de cancha en Bo. las Flores sector la Iglesia, según informes de supervisión y Avances AMP-023-2015-01 y AMP-023-2015-02 del contrato NO AMP-023-2015.	84,700.00	84,700.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350  
Fecha de Emisión: 05/12/2024 - Fecha límite de Emisión 05/12/2025  
C.A.I. 288D5C-214F0B-52B2E0-63BE03-0909F5-EA

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son: Ochenta y Seis Mil  
Dieciento con cero  
centavos.

15% I.S.R. L.

18% I.S.R. L.

TOTAL A PAGAR L. 84,700.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

Original: Cliente - Copia: Obligado - Requiere Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000301





**MUNICIPALIDAD DE  
NUEVA PIMIENTA**

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE  
A PARQUE, PIMIENTA  
CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00023619

Nueva Pimienta  
Lugar y Fecha

10 mayo 2021

Nueva Pimienta, Bo. Las Flores

L 86,200.00

Por Donación de Honduras, S.A. de C.V.

Lempiras

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

ochenta y seis mil doscientos exactos

**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

1001211308000021111071600023619

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	Desembolso por anticipo al proyecto de Construcción de Cuneta en Bo. Las Flores aldea Santiago	86,200.00
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00023619		<i>[Signature]</i>
		RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2220-9999 FAX 2220-1313



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta Cortes.

15 de Mayo del año 2025.

**Sr. Jesús Alberto Dubon**

Tesorero Municipal

Su Oficina


Reciba mi cordial saludo:

Por medio del presente, solicito el desembolso a favor del **Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes**, con DNI 1804-1977-00783, por un monto de **L. 86,200.00** Corresponde al anticipo contemplado en los Informes de Supervisión y Avance No. AMP-023-2025-01 y No. AMP-023-2025-02, por la ejecución del contrato del **Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.**

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



  
**Henry Javier Rodas Andino**  
Jefe de UTM





**INVERSIONES ACOSTA LARA**  
Propietario: Danec Alexander Acosta Lara  
RTN: 18041977007839 Cel: 9649-6778  
Email: [danecacosta1977@gmail.com](mailto:danecacosta1977@gmail.com)  
Aldea Santiago, Pimienta, Cortés.



### CONSTANCIA DE ENTREGA

Fecha: Pimienta, Cortés, 13 de Mayo de 2025.

Contrato No. AMP-023-2025

Objeto del contrato: Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia


Yo, **DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES**, En Mi Calidad De Gerente Propietario De La Empresa **Inversiones Acosta Lara**, Con RTN No. **18041977007839**, Hago Constar Por Medio De La Presente Que, En Cumplimiento De Lo Establecido En El Contrato Antes Referido, Se Entrega **Garantía De Cumplimiento** por un monto de **L. 17,940.00** (DIECISITE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS), correspondiente al 15% del valor total del contrato.

Dicha garantía se presenta en la forma de **cheque de caja N.º 80900934** emitido por el Banco Atlántida S.A., a nombre de **Municipalidad de Pimienta**, con fecha de emisión **13 de Mayo de 2025**.

La presente garantía tiene como fin asegurar el cumplimiento fiel y oportuno de las obligaciones contractuales asumidas por nuestra empresa y estará vigente hasta el cumplimiento total de dichas obligaciones o según lo determine el contrato.

Se extiende la presente nota de entrega para los fines legales y administrativos correspondientes.

Atentamente,

  
Danec Alexander Acosta Fuentes  
**Gerente Propietario**  
**Inversiones Acosta Lara**





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



13 de Mayo del año 2025.  
Pimienta Cortes.

**Lic. Jesús Dubon.**  
Tesorero Municipal.  
Su Oficina.

**Asunto:** Remisión de Garantía de Cumplimiento de Contrato  
**Referencia:** Contrato No. AMP-023-2025.

Por este medio me permito remitir a usted la garantía de cumplimiento correspondiente al contrato identificado como **Proyecto De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia**, suscrito entre esta Municipalidad y la empresa **Inversiones Acosta Lara**, representada por el señor **Danec Alexander Acosta Fuentes**.

La garantía consiste en lo siguiente:

**Tipo de garantía:** Cheque De Caja

**Número de cheque:** 80900934

**Banco emisor:** Banco Atlántida S.A.

**Monto:** L. 17,940.00 Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta Lempiras Exactos


**Fecha de emisión:** 13 De Mayo de 2025.

Esta garantía se entrega para su custodia y registro, conforme a lo establecido en la cláusula #4 del contrato mencionado, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa contratista.

Sin otro particular, quedo atento a cualquier consulta o gestión adicional.

Atentamente,



  
**Henry Javier Rodas**  
Jefe de UTM





CHEQUE DE CAJA  
BANCO ATLÁNTIDA, S.A.  
R.T.N. 08019995368674  
Cuenta N.º: 23101010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80900934

VILLANUEVA 13 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE PIMENTA

\*\*\*\*\*17,040.00\*\*\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA \*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



  
Firma (s) SPA 169

10100102412310101010100080900934

ENDOSE AQUI

No escriba, selle o firme debajo de esta línea.  
Reservado para uso de Instituciones Financieras.



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2025

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2025

Hora : 01:48 p.m.

USUARIO: NANCY.BRIONES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 33853

L.: 17,940.00

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES

Expediente No.: 329

Fecha de Emisión: 20/5/2025

No. Cheque/Nota de Débito: 00023623

Paguese a: DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES

Id/RTN: 18041977007839

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMP-023-2025 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETA EN BO. LAS FLORES DE ALDEA SANTIAGO SECTOR LA IGLESIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
--------	-------------------------	-------

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------	-------------	-------

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
--------	---------------------------------------	-------------	-------

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,940.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,940.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 18041977007839

0s+js/j9Jmely1VwM7KxyE3fDTzUNVI529KyjM9/ExmvSmdt5xw3gUuYVyxSesWYUsKuUJVC06EgJv9MFYF6nmXQ0zp+iMe8AXbnH2MzMUNViaYQOgTGn1Izpl  
5agFCOWfW8J9PxIXhH2/aGIIISuGBM+b8WT







**MUNICIPALIDAD DE  
NUEVA PIMIENTA**

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE  
A PARQUE, PIMIENTA  
CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00023623

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

20 de mayo de 2025

DANEC ALEXANDER ACOSTA PUENTES  
Páguese a la orden de

L 17,940.00

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1012113081000021111071600023623

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMP-023-2025 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BO. LAS FLORES DE ALDEA SANTIAGO SECTOR LA IGLESIA.	17,940.00
CHEQUE No. 00023623	HECHO POR 	REVISADO POR 
		RECIBI CONFORME





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



20 de Mayo de 2025  
Pimienta Cortes.

**Lic. Jesús Dubon.**  
Tesorero Municipal.  
Su Oficina

Por este medio, le solicito la devolución del monto de la Garantía de Cumplimiento a favor del **Sr. Danec Alexander Acosta Fuentes**, con DNI: **1804-1977-00783**, por la cantidad de **Lps 17,940.00**, en virtud de haber finalizado satisfactoriamente los trabajos estipulados en el contrato **N.º AMP-023-2025**, relacionado con el Proyecto **De Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia**, ubicado en la comunidad de Barrio Las Flores, Aldea Santiago.

Dicho contrato fue ejecutado conforme a lo establecido y ha sido recibido a entera satisfacción por parte de la Municipalidad, según consta en el Acta de Recepción del Proyecto, firmada en fecha 20 de Mayo de 2025.

Se adjunta la siguiente documentación para su respectivo respaldo y trámite:


1. Copia del contrato suscrito.
2. Copia de la Garantía de Cumplimiento emitida por Banco Atlántida S.A.
3. Copia del Acta de Recepción del proyecto.

Agradezco de antemano su atención y gestión, quedando atento a cualquier solicitud de información adicional que considere necesaria.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



  
**Henry Javier Rodas**  
Jefe de UTM





**INVERSIONES ACOSTA LARA**  
Propietario: Danec Alexander Acosta Lara  
RTN: 18041977007839 Cel: 9649-6778  
Email: [danecacosta1977@gmail.com](mailto:danecacosta1977@gmail.com)  
Aldea Santiago, Pimienta, Cortés.



## **SOLICITUD DE PAGO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

Pimienta, Cortés, 19 de Mayo de 2025

**Señores:**

Municipalidad de Pimienta  
Presente

**Asunto:** Solicitud de pago de garantía de cumplimiento

**Contrato No.:** AMP-023-2025

**Objeto:** Proyecto de construcción de cuneta en Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.

Yo, **Danec Alexander Acosta Fuentes**, mayor de edad, hondureño, con identidad No. 1804-1977-00000 y en mi condición de **Gerente Propietario** de la empresa **Inversiones Acosta Lara**, con RTN No. 18041977007839, me dirijo respetuosamente a ustedes para solicitar el pago correspondiente a la **garantía de cumplimiento** entregada como respaldo del contrato mencionado.

Dicha garantía asciende a un monto de **L. 17,940.00 (Diecisiete mil novecientos cuarenta lempiras exactos)**, equivalente al 15% del valor total del contrato, y fue presentada mediante **cheque de caja No. 80900934**, emitido por **Banco Atlántida S.A.**, a favor de la Municipalidad de Pimienta, con fecha de emisión 13 de mayo de 2025.

Habiendo cumplido a cabalidad con todas las obligaciones contractuales y conforme a lo estipulado en el contrato AMP-023-2025, solicito se realicen las gestiones necesarias para la **devolución del monto entregado como garantía de cumplimiento**.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedo a la espera de una pronta y favorable respuesta.

Atentamente,

  
**Danec Alexander Acosta Fuentes**  
Gerente Propietario  
**Inversiones Acosta Lara**  
RTN: 18041977007839





**CONTRATO**

AMP-023-2025

**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES,  
ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA.**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, Hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Documento Nacional de Identificación #0501-1960-01209, RTN #05011960012094 declarado Alcalde por el Consejo Nacional Electoral de fecha 25 de Enero del 2022 según punto único de la Sesión Ordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Señor **DANEC ALEXANDER ACOSTA FUENTES**, Mayor de edad, Hondureño, Ingeniero Civil y con domicilio en Aldea Santiago, Municipio de Pimienta, Departamento de Cortes, con DNI 1804-1977-00783, RTN #18041977007839 quien se denomina EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO NO: AMP-023-2025 "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA", que resultado del proceso de contratación llevado a cabo bajo la modalidad de Compra menor No: CM-023-AMP-2025, contrato que se regirá bajo las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:**

Consiste en la construcción de cuneta abierta de 44.00 M.L. de largo con 1.00 M.L. de ancho y 3 líneas de bloques de 6, con piso de 1.00 M.L. de ancho y 10 cm de espesor, 68.00 M.L. de batiente de 0.15x0.15 y 10 M.L. de embaulado de 15 c.m de espesor, Ubicado en Barrio Las Flores, Aldea Santiago, Del Municipio De Pimienta, Departamento De Cortés. En el Presente contrato EL CONTRATISTA suministrara todo lo necesario en la Ejecución de la Obra, que cuenta con en las siguientes actividades y especificaciones:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la actividad	Valor Unit.	Total
1.	44	M.L.	Excavación de zanja de 1.00 x 0.80 mts	L. 150.00	L. 6,600.00
2.	44	M.L.	Preparación y nivelación del terreno	L. 200.00	L. 8,800.00
3.	44	M.L.	Fundición de piso con un ancho de 1.00 m. 10 cm de espesor ref. 3#3	L. 650.00	L.28,600.00
4.	56	M2	Pegado de bloques de 6" ref. #3 en forma de U@.40m	L. 700.00	L.39,200.00
5.	10	M.L.	Encofrado y fundición de embaulado de 15 c.m. de espesor ref. con malla #4@20cm longitudinales y transversales concreto 4,000 psi	L.1,350.00	L.13,500.00
6.	68	M.L.	Encofrado y fundición de batiente de 10 c.m. de espesor concreto ref. 2#2	L. 300.00	L.20,400.00
7.	1	Gral.	Limpieza final	L.2,500.00	L. 2,500.00
Total					L 119,600.00

**CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:**

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 08 de Mayo del Año 2025 al 07 de Junio del año 2025.

**CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:**

El contrato tendrá un valor de Lps. 119,600.00 (CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) los que se cancelaran de la siguiente manera: Un pago semanal de acuerdo al avance de la obra, Un pago final al ser recibidas las obras a satisfacción. No se hará la retención del Impuesto sobre la Renta ya que posee la Constancia de Pagos a Cuenta CSV: RNMFQWQQKEZ37JVA.

**CLAUSULA No... 4 GARANTIAS:**

El contratista se compromete a presentar las garantías siguientes:

- a) **Garantía de Cumplimiento:** Una vez suscrito el contrato el contratista proporcionará una Garantía de Cumplimiento mediante una fianza bancaria, cheque certificado o cheque de caja del Quince Por Ciento (15%) del monto del proyecto la cual equivale a Lps 17,940.00, (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS), esta deberá ser presentada por el contratista



CHEQUE DE CAJA  
BANCO ATLÁNTIDA, S.A.  
R.T.N. 08019995368674  
Cuenta N.º: 23101010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80900934

VILLANUEVA 13 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

\*\*\*\*\*17,940.00\*\*\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA \*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

*[Handwritten Signature]*  
SPAIGA

10100102412310101010100080900934

ENDOSAR AQUI

No escriba, selle o firme debajo de esta línea.  
Reservado para uso de Instituciones Financieras.



**INVERSIONES ACOSTA LARA**  
Propietario: Danec Alexander Acosta Lara  
RTN: 18041977007839 Cel: 9649-6778  
Email: [danecacosta1977@gmail.com](mailto:danecacosta1977@gmail.com)  
Aldea Santiago, Pimienta, Cortés.



## SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE OBRA

Pimienta, Cortés, 19 de Mayo de 2025

**Señores:**

Municipalidad de Pimienta

Presente

**Asunto:** Solicitud de recepción de obra

**Contrato No.:** AMP-023-2025

**Objeto:** Proyecto de construcción de cuneta en Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia

Yo, **Danec Alexander Acosta Fuentes**, mayor de edad, hondureño, con identidad No. 1804-1977-00000 y en mi condición de **Gerente Propietario** de la empresa **Inversiones Acosta Lara**, con RTN No. 18041977007839, me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitar la **recepción formal** del proyecto ejecutado conforme al contrato anteriormente referido.

El proyecto, consistente en la **construcción de cuneta en el Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia**, ha sido concluido en su totalidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas, plazos y condiciones estipuladas en el contrato.

Con base en lo anterior, solicitamos que se programe a la mayor brevedad posible la visita de inspección por parte del personal técnico correspondiente para proceder con el acta de recepción de obra.

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración, quedo a la espera de su confirmación.

Atentamente,

**Danec Alexander Acosta Fuentes**  
Gerente Propietario  
**Inversiones Acosta Lara**  
RTN: 18041977007839





CHEQUE DE CAJA

BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

R.T.N. 08019995368674

Cuenta N.º: 23101010101000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 80900934

VILLANUEVA 13 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

\*\*\*\*\*17,940.00\*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA \*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

*[Handwritten Signature]*  
SPA169

10100102412310101010100080900934

ENDOSE AQUI

No escriba, selle o firme debajo de esta línea.  
Reservado para uso de Instituciones Financieras.



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

**PROYECTO:** Construcción De Cuneta En Bo. Las Flores, Aldea Santiago, Sector La Iglesia.


**CONTRATO:** AMP-023-2025.


**DIRECCION:** Barrio Las Flores, Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.

En cumplimiento con la solicitud por parte del Sr. **Danec Alexander Acosta Fuentes**, recibida el día 19 de Mayo del año en curso, La Unidad de Proyectos procedió a realizar la inspección en Campo de la obra, estando la misma en un nivel aceptable con relación a lo contratado, por lo cual, se determina lo siguiente:

Habiendo cumplido con lo establecido en la cláusula #01 del contrato antes mencionado, La Unidad de Proyectos por medio de la presente da por terminado y Recibido el Proyecto de **"CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN BO. LAS FLORES, ALDEA SANTIAGO, SECTOR LA IGLESIA"** por un monto de L. 119,600.00, el cual inicio el 8 de Mayo del Año 2025 y finalizo el día 19 de Mayo de 2025.

Para los fines que el interesado estime conveniente, firmamos la presente acta en el Municipio de Pimienta, Cortés a los 20 días del mes de Mayo del año 2025.

  
**Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino**  
Alcalde Municipal

  
**Henry Javier Rodas Andino**  
Supervisor Municipal

  
**Danec Alexander Acosta Fuentes**  
Contratista

