



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM #274/06/2021

PARA: Licda. Cintya Mejía
Oficial de Acceso a La Información Pública

DE: Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 03 Junio 2021



Estimada Licenciada:

El motivo de la presente es para remitirle el Reporte de Proyectos Ejecutados del Mes de Mayo 2021

Sin otro particular

Atentamente.



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL

REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS

MAYO 2021




www.facebook.com/municipalidadlaceiba/

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - MES DE MAYO DEL 2021

N°	Sector	Nombre de Proyecto	Ubicación Proyecto	Alcance	Costo del Proyecto	Descripción Obra	Impacto Ambiental	Fuente Financiamiento	Monto Ejecutado Acumulado	Orden de Cambio			Fecha de Finalización	% de Avance
										Sí	No	Just.		
1		Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada Terracería La Ceiba	Barrios y Colonias de La Ceiba	Beneficiará toda la población de La Ceiba	L. 192,000.00	Mejoramiento de las calles de Terracería de la Ceiba.	Ninguno	Fondos Municipales	L. 192,000.00		X		31 de Mayo del 2021	100%
2		Reconstrucción del Boulevard 15 de Septiembre – II Etapa	Blvd. 15 de Septiembre entre Ave. Los Próceres y Ave. Morazán.	Beneficiará toda la población de La Ceiba que transita por dicha zona.	L. 1,500,000.00	Reconstrucción del Boulevard 15 de septiembre el cual tiene un ancho 12.40 metros dividido entre dos carriles de 6.20 cada uno, con una longitud aproximada de 100.00 metros.	Ninguno	Fondos Municipales	L. 1,500,000.00		X		31 de Mayo del 2021	100%



I. FOTOGRAFÍAS




No. Fundición de Trocha.

1

Reconstrucción del Boulevard 15 de septiembre.

Fecha: May/2021

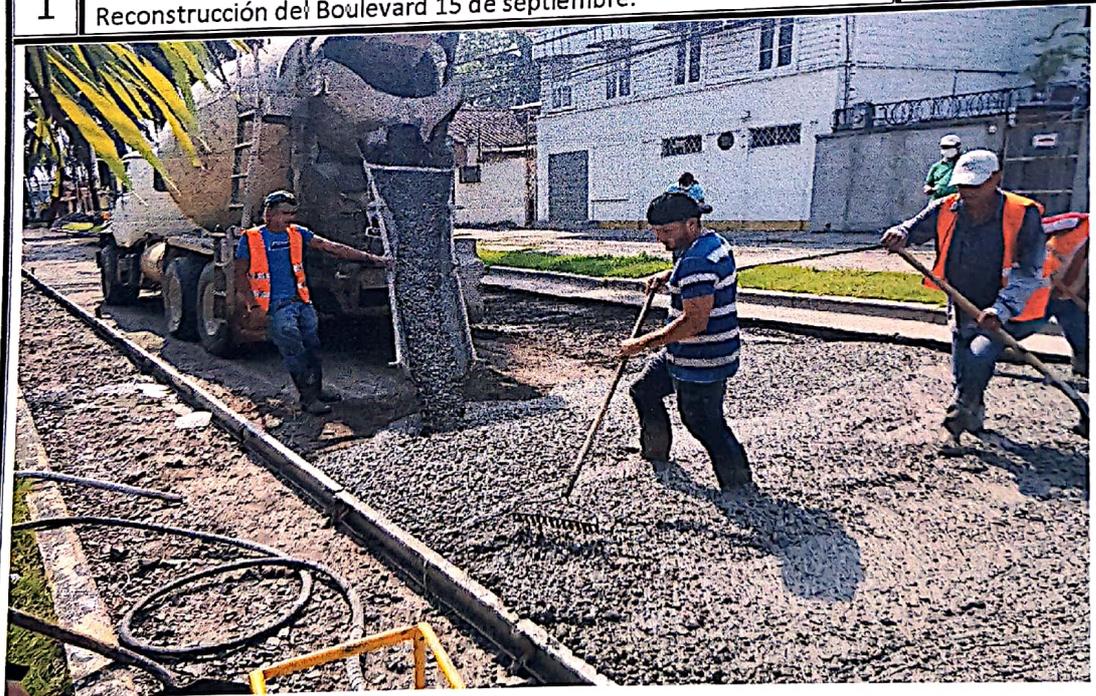

No. Fundición de Trocha.

2

Reconstrucción del Boulevard 15 de septiembre.

Fecha: May/2021





No.	Trocha en proceso de fundición.	
3	Reconstrucción del Boulevard 15 de septiembre.	Fecha: May/2021



No.	Mantenimiento de la red vial no pavimentada, calles de terracería.	
4	Red vial no pavimentada.	Fecha: May/2021






No. 5 Mantenimiento de la red vial no pavimentada, calles de terracería.

Fecha: May/2021

Red vial no pavimentada.

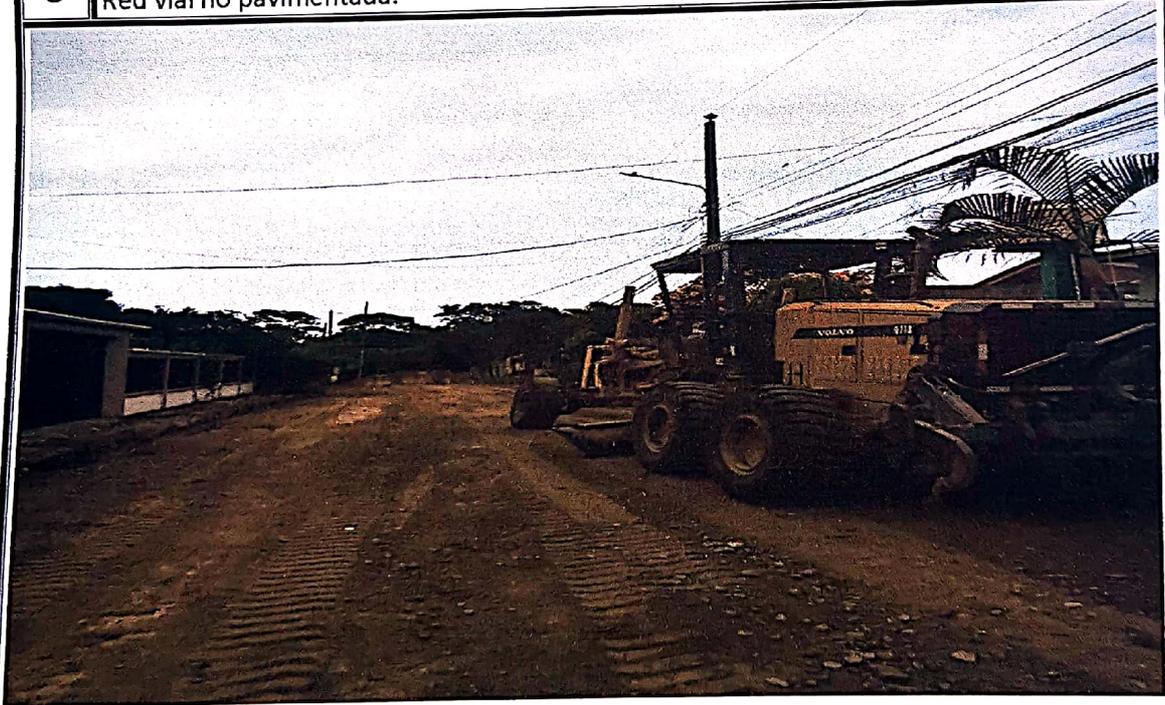

No. 6 Mantenimiento de la red vial no pavimentada, calles de terracería.

Fecha: May/2021

Red vial no pavimentada.

