



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL

REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS

Enero 2021



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A



MEMORANDUM

Para: Licda. Cintya Loriley Mejía Veliz
Oficial Portal de Transparencia

De: Ing. Luis Armando Mejía
Ingeniero Municipal



Asunto: Informe proyectos ejecutados

Fecha: 06 de febrero 2021

Adjunto al presente, remito el informe de proyectos ejecutados correspondientes al mes de enero del 2021. Para que sea cargado al Portal de transparencia

Sin más que adicionar me despido.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - MES DE ENERO DEL 2021

N°	Sector	Nombre de Proyecto	Ubicación Proyecto	Alcance	Costo del Proyecto	Descripción Obra	Impacto Ambiental	Fuente Financiamiento	Monto Ejecutado Acumulado	Orden de Cambio			Fecha de Finalización	% de Avance
										Si	No	Just.		
1		Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada Terracería La Ceiba	Barrios y Colonias de La Ceiba	Beneficiará toda la población de La Ceiba	L. 180,000.00	Perfilado de Cunetas y mejoramiento de la calzada con material selecto	Ninguno	Fondos Municipales	L. 180,000.00		X		31 de Enero del 2021	100%
2		Sobrecancho en la intersección entre la 22 calle y la CA-13, frente a Megapaca.	Intersección entre la 22 calle y la CA-13, frente a Megapaca.	Beneficiará toda la población de La Ceiba que transita por dicha zona.	L. 1,000,000.00	Sobrecancho de 3.50 metros de ancho por 175 ml de largo, para generar un carril de fácil circulación en el intercambiador ubicado en la entrada de la Col. Suyapa.		Fondos Municipales	L. 1,000,000.00		x		Enero del 2021	100%

FOTOGRAFÍAS




No.

Sobrancho Megapaca.

1

Pavimentación de trocha 22 calle.

Fecha: Ene/2021

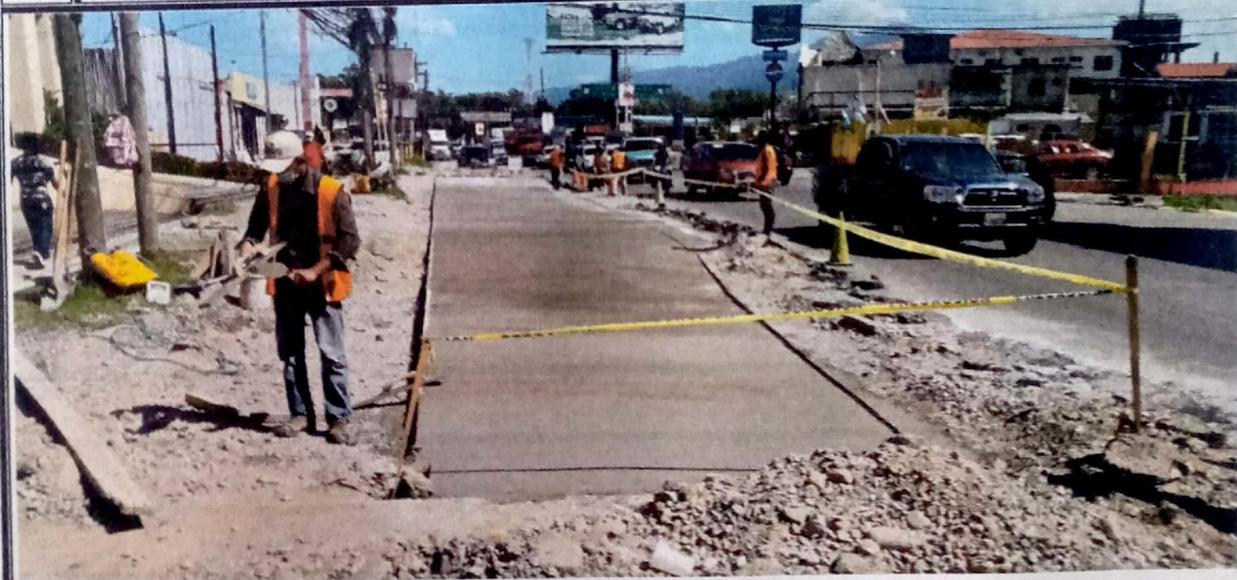

No.

Sobrancho Megapaca.

2

Pavimentación de trocha 22 calle.

Fecha: Ene/2021



No.	Sobreancho Megapaca.	
3	Pavimentación de trocha 22 calle.	Fecha: Ene/2021



No.	Mantenimiento de calle.	
4	Mantenimiento de la red vial no pavimentada.	Fecha: Ene/2021



No.	Mantenimiento de calle.	
5	Mantenimiento de la red vial no pavimentada.	Fecha: Ene/2021



No.	Mantenimiento de calle.	
6	Mantenimiento de la red vial no pavimentada.	Fecha: Ene/2021
