



**GERENCIA GENERAL**

# **REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS**

**POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL**



**MES DE ABRIL DEL 2023**

[www.facebook.com/municipalidadla.ceiba/](https://www.facebook.com/municipalidadla.ceiba/)





**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**  
**INGENIERIA MUNICIPAL**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**PERIODO DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2023**

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					
CODIGO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
	Este La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Corozal, Piedra Pintada, Río María, Perú, Boca Vieja, Satuye	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Este, Corozal, Piedra Pintada, Río María, Perú, Boca Vieja, Satuye.
	Oeste - La Ceiba, Atlántida	Contrucción de Cancha de Volleyball	Paseo de los Ceibeños	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Cargado, Colocación y Regado de Arena para la Construcción de la Cancha de Volleyball de Playa.
	Este - La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Granadita 1 y 2, Villa Hellen, Sambo Creek, Corinto, La Ensenada y Villa Nuria.	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Este, Granadita 1 y 2, Villa Hellen, Sambo Creek, Corinto, La Ensenada y Villa Nuria.
	Este - La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Prolongación del Boulevard del Este hasta Satuye.	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en las comunidades del Sector Este, Prolongación del Boulevard del Este hasta Satuye.
	Oeste - La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Calle del Crila, Calle Maxi Despensa, La Bantral y Nueva Era (Campo de Fútbol)	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Oeste, Calle del Crila, Calle Maxi Despensa, La Bantral y Nueva Era (Campo de Fútbol)



**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**  
**INGENIERIA MUNICIPAL**  
**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**PERIODO DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2023**



<b>ELABORACION DEL PROYECTO</b>									
<b>ALCANCE DEL PROYECTO</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>	<b>IMPACTO EN EL TERRENO Y ACENTAMIENTO</b>	<b>DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO</b>	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO</b>	<b>MONTO EJECUTADO ACUMULADO</b>	<b>ESTADO DEL PROYECTO</b>	<b>COSTO DE FINALIZACION PROYECTADO</b>	<b>FECHA DE FINALIZACION</b>
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	INVERTLAN Inversiones del Atlántico Norte	Municipalidad de La Ceiba	08-Marzo-23	L. 608,330.00	100%	L. 856,000.00	14-abril-23
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	Constructora Asriel	Municipalidad de La Ceiba	31-mar-23	L. 17,250.00	100%	L. 30,000.00	01-Abril-23
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	Constructora Universal	Municipalidad de La Ceiba	08-Marzo-23	L. 625,970.00	100%	L 758,000.00	02-Abril-23
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	INVERSOL Sociedad de Responsabilidad Limitada	Municipalidad de La Ceiba	30-Marzo-23	L. 27,200.00	100%	L. 30,000.00	09 -Abril-23
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	INVERTLAN Inversiones del Atlántico Norte	Municipalidad de La Ceiba	03-Abril-23	L. 356,080.00	100%	L. 554,000.00	30-Abril-23

Ing. Luis A. Mejía  
Ingeniero Municipal



**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA  
INGENIERIA MUNICIPAL  
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION  
PERIODO DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2023**



EJECUCION DEL PROYECTO											
ORDEN DE CAMBIO			MODIFICACION DE CONTRATO			APLICACIÓN DEL TIEMPO			RECISION DE CONTRATO		
SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
	X			X		X				X	
	X			X		X				X	
	X			X		X				X	
	X			X		X				X	
	X			X		X				X	

Ing. Luis A. Mejía  
Ingeniero Municipal

# ANEXOS

**Corozal, Piedra Pintada, Río María, Perú, Boca Vieja**




No.	Comunidad de Corozal	
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023




No.	Comunidad de Corozal	
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023




No.	Sector de Boca Vieja	
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023

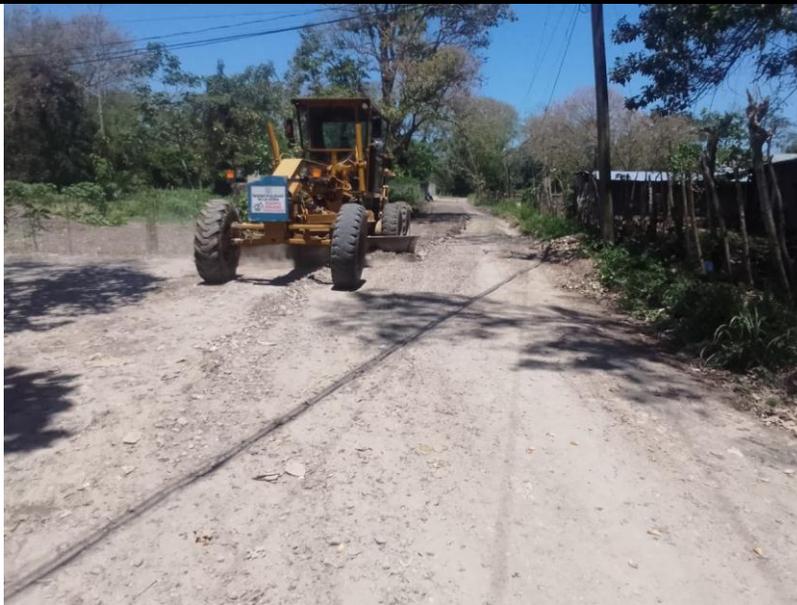


No.	Sector de Boca Vieja	
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023

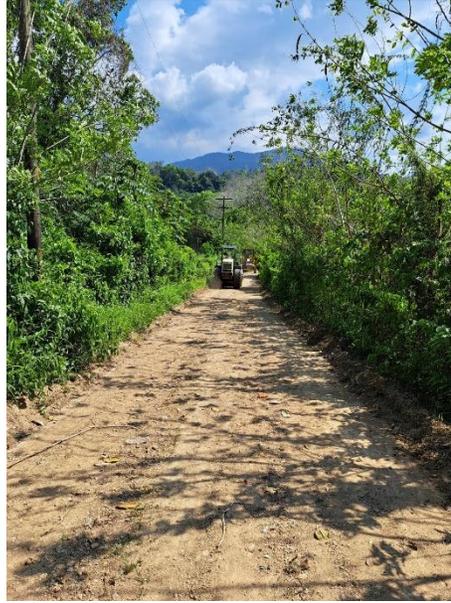

No.	Sector de Rio María	
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023

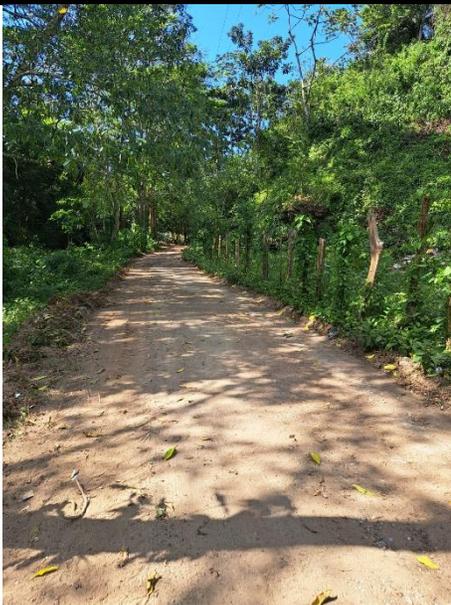

No.	Sector de Rio María	
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023

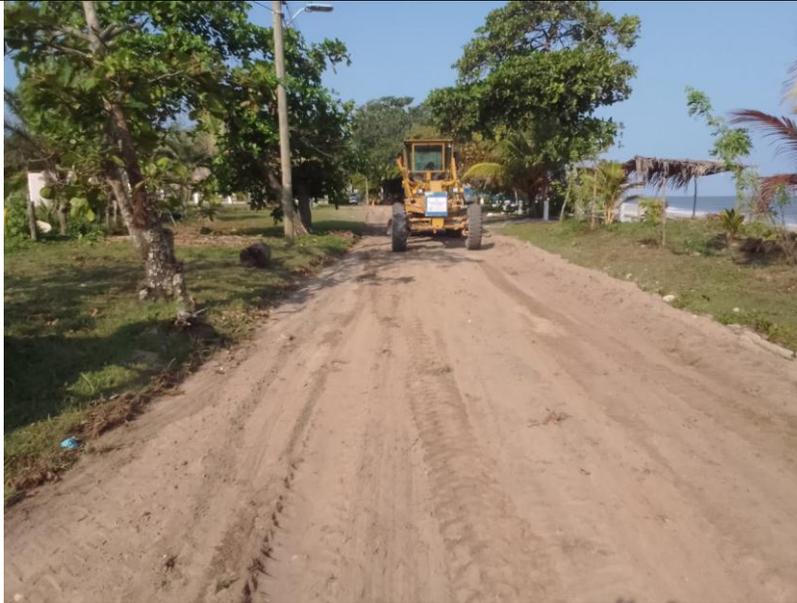

No.	Aldea El Perú	
7	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Aldea El Perú	
8	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Aldea El Perú	
9	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Aldea El Perú	
10	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Sector Satuye	
11	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Sector Satuye	
12	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023

**Construcción de Cancha de Volleyball - Paseo de los Ceibeños**



No.	Cargado de material en volqueta	
1	Construcción de Cancha de Volleyball	Fecha: Abril/2023



No.	Cargado de material en volqueta	
2	Construcción de Cancha de Volleyball	Fecha: Abril/2023



No. 3	Acarreo de Arena en volquetas	
	Construcción de Cancha de Volleyball	Fecha: Abril/2023



No. 4	Acarreo de Arena en volquetas	
	Construcción de Cancha de Volleyball	Fecha: Abril/2023



No.	Colocación y regado de material	
5	Construcción de Cancha de Volleyball	Fecha: Abril/2023



No.	Colocación y regado de material	
6	Construcción de Cancha de Volleyball	Fecha: Abril/2023

**Granadita 1 y 2, Villa Hellen, Sambo Creek, Corinto**



No.	Comunidad de Granadita 1	
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Comunidad de Granadita 1	
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023




No.	Comunidad e Granadita 2	
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Comunidad de Granadita 2	
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Sector de Villa Hellen	
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023

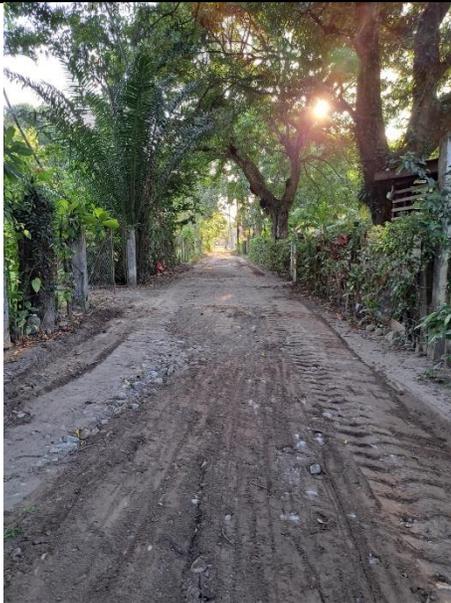

No.	Sector de Villa Nuria	
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Sector de Villa Nuria	
7	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Comunidad de La Ensenada	
8	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Comunidad de La Ensenada	
9	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Comunidad de Corinto	
10	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Comunidad de Corinto	
11	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Comunidad de Sambo Creek	
12	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Comunidad de Sambo Creek	
13	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023



No.	Comunidad de Sambo Creek	
14	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Marzo-Abril/2023

Prolongación del Boulevard del Este hasta Satuye



No.	Riego de calles de terracería - Semana Santa	
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Abril/2023



No.	Riego de calles de terracería - Semana Santa	
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Abril/2023



No.	Riego de calles de terracería – Semana Santa	
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Abril/2023



No.	Riego de calles de terracería – Semana Santa	
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Abril/2023




No.	Riego de calles de terracería - Semana Santa	
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Abril/2023




No.	Riego de calles de terracería - Semana Santa	
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Fecha: Abril/2023

**Calle del Crila, Calle Maxi Despensa, La Bantral y Nueva Era (Cancha de Futbol)**

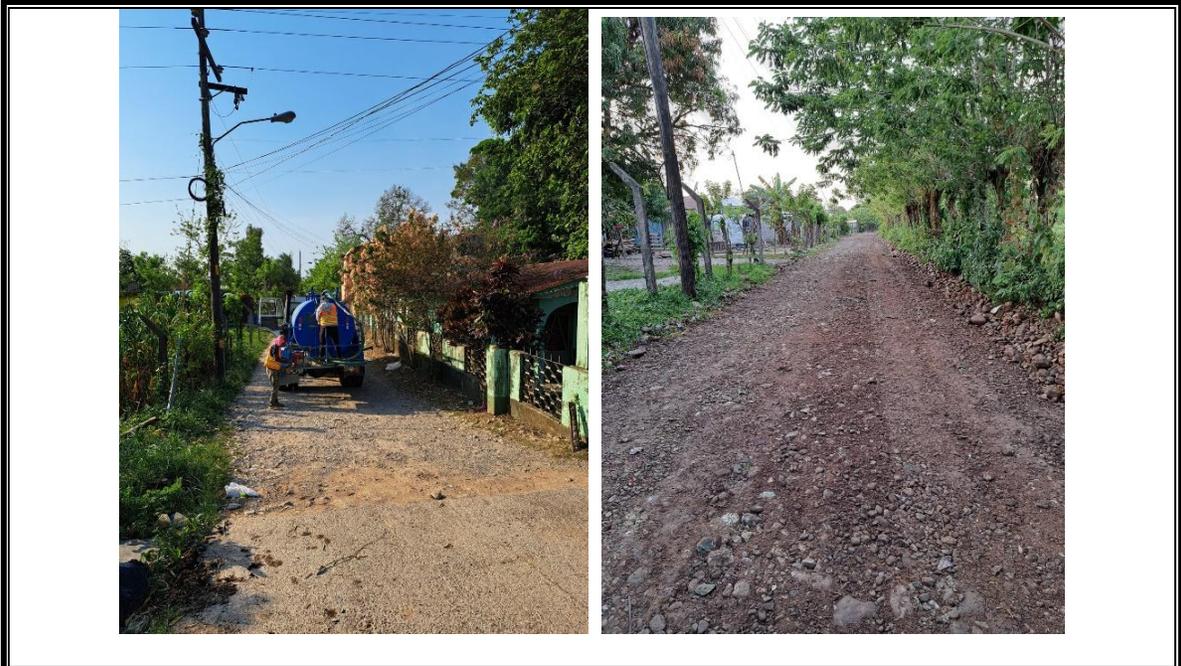


No.	Calle del Crila	
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril/2023

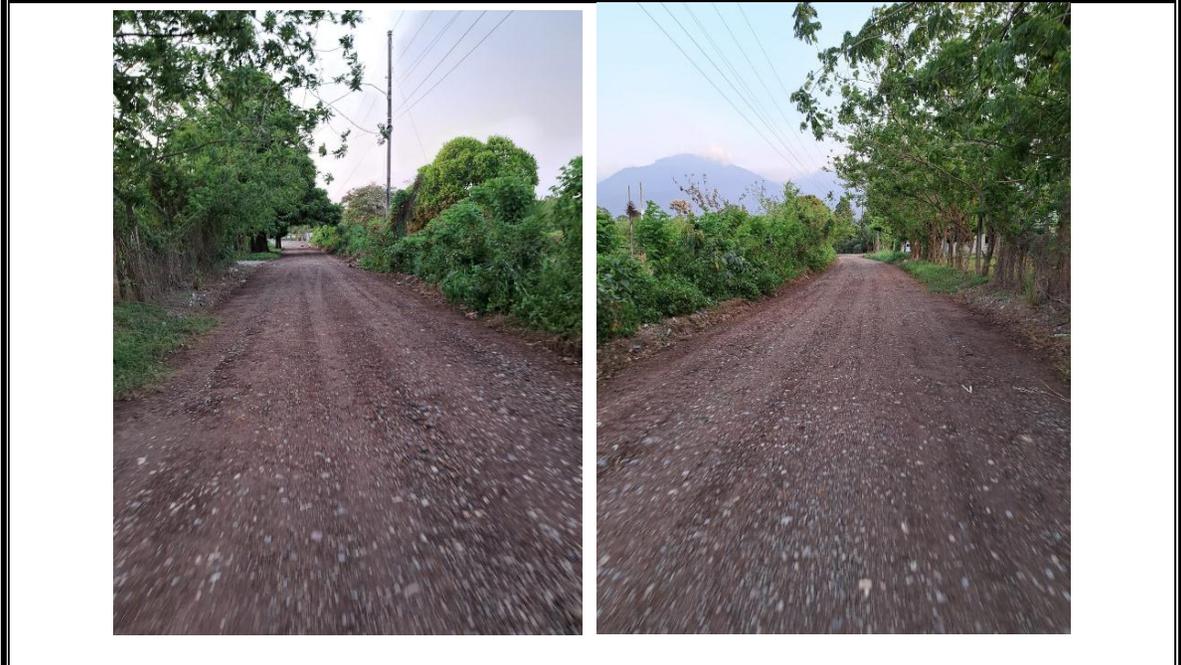

No.	Calle del Crila	
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril/2023



No.	Calle de la Maxi Despensa	
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril/2023

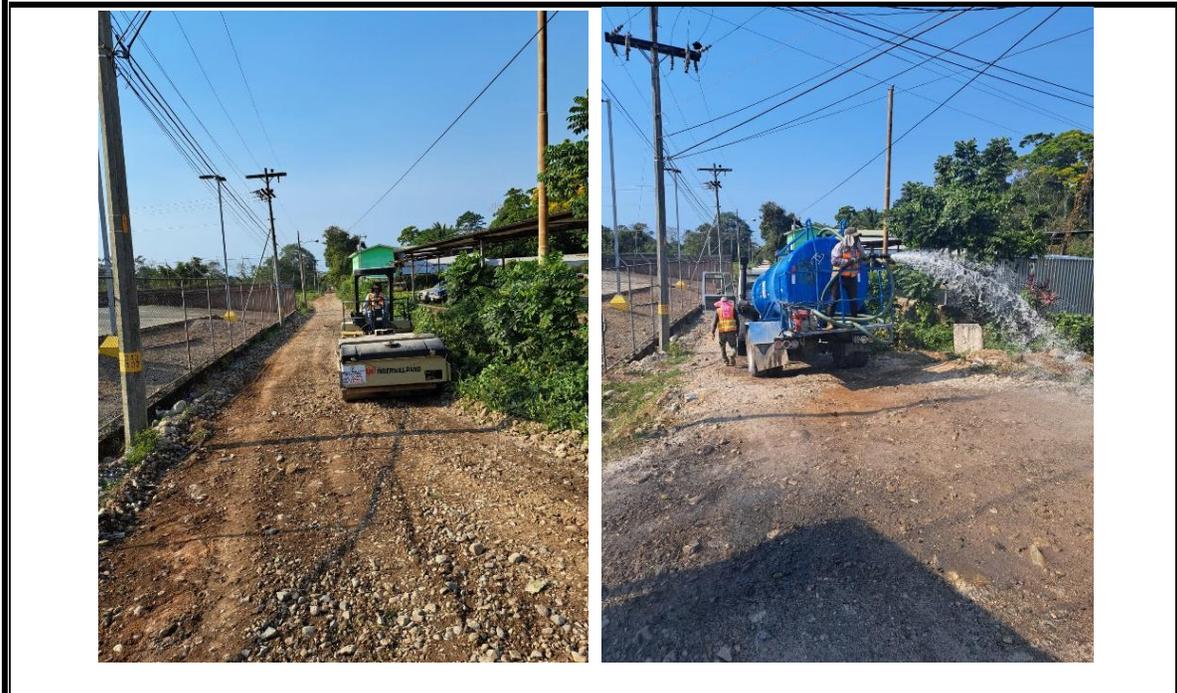

No.	Calle de la Maxi Despensa	
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril/2023



No.	Campo Colonia Nueva Era	
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril/2023



No.	Campo Colonia Nueva Era	
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril/2023



No.	Colonia Bantral	
7	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril/2023



No.	Colonia Bantral	
8	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Abril/2023
