




Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Julio 2023

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de tuberia de 4" en Barrio Suyapa, se uso tubo de 4"	4,200.00	
2	Reparacion de tuberia de 6" en Col.Orquidea se utilizo tubo de 6",abrazadera de 6" a 1/2" y valvula de aire	7,470.83	
3	Instalacion de 10 tubos pvc de 1 1/2" en Col.Orquidea #1,8 tee de 1 1/2",valvula de 2",adaptadores de 2"	3,834.50	
4	Limpieza y reparacion de tuberia por obstruccion en Res.Real del Puente,tubo de 6",dresser de 6"	9,400.00	
5	Reubicacion de transformador seco, colocacion de tubo hg,160 ft.acometida#6,panel de 4 circuitos	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
6	Prueba en la estacion de bombeo en la Col.Municipal	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
7	instalacion de lamparas de brazo luz led en estacion de bombeo de Brisas del Calan,12ft. Cable#14	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
8	Cambio de bomba en Pozo #2 en el Rastro Municipal,2 hp de segunda mano que estaba en bodega	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
9	Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de registro,holes y conexiones en diferentes lugares del Municipio	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios



ING. OSCAR SANTOS
GERENTE TECNICO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de agosto del 2023

Dirigida a:

Julio Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de julio del año 2023 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 259 (OTE = 125) (OTI= 134)
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 226
-
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 27

RENDIMIENTO: $\frac{226}{259} \times 100 = 87.2\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	9
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	16
3	NO LE LLEGA EL AGUA	48
4	TUBERIA RIPIADA	33
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	7
6	FUGA DE AGUA	1
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	134
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	2
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	7
12	SERVICIO DE COMPRESO	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	1
		259



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 77
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 72
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 5

RENDIMIENTO: $\frac{72}{77} \times 100 = 93.5\%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	45
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	25
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	5
		77

ELECTROMECANICA

- Fecha: 03 de Julio 2023
Desconexión y conexión de cajas cortocircuito para realizar cambio de remaches de compresión en líneas del secundario 480v (6 horas).
- Fecha: 04 de Julio 2023
Montaje de transformador seco e instalación de panel de control de 4 circuitos para aire acondicionado en bodega Martin fajardo (8 horas).
- Fecha: 05 de Julio 2023
Finalización de la instalación de panel de control en bodega y desmontaje de acometidas anteriores (8 horas).



Aguas del Valle

- Fecha: 06 de Julio 2023
Revisión y reparación de panel de control de juntas de agua de Los Laureles y El Pino en Col. Monte María (4 horas).

Reconexión de energía por cuchillas caídas en Pozo #1, Pozo #2 y Pozo #6 en sector Cañeras (4 horas).
- Fecha: 07 de Julio 2023
Revisión y reubicación de panel de control en la estación de bombeo de la Col. Municipal (5 horas).

Se transportó al bombero de la Gran Villa a Col. Municipal en varias ocasiones durante el día (3 horas).
- Fecha: 09 de Julio 2023
Reconexión de energía por dos cuchillas caídas en Pozo de 20hp en Brisas del Calan (2 horas).
- Fecha: 10 de Julio 2023
Revisión de bomba #2 de El Rastro Municipal por problemas de flujo (1 hora).

Se realizó reconexión de energía por cuchillas caídas en Pozo #6, sector Cañeras (3 horas).

Instalación de lámpara en Pozo de Brisas del Calan, estación de bombeo de 60hp (4 horas).



Aguas del Valle

- Fecha: 11 de Julio 2023

En la oficina actualizando el libro de actividades diarias con los trabajos realizados (1 hora).

Revisión del generador en las instalaciones de ADV (1 hora).

Revisión de estación de bombeo en Llanos de Canada (2 horas).

Revisión de estación de bombeo de Col. Apadrinados (1 hora)

Finalización de la instalación de la lampara en estación de bombeo de Brisas del calan (3 horas).

- Fecha 12 de Julio 2023

En la oficina actualizando el libro de actividades diarias con los trabajos realizados (1 hora).

Revisión de estación de bombeo de El Rastro Municipal #2 (2 horas).

Revisión de la estación de bombeo de km 71 (1 hora).

Revisión de la estación de bombeo de Lomas del Calan (4 horas).



Aguas del Valle

- Fecha 13 de Julio 2023
Instalación de cámara de video en porton de la bodega de La Martin Fajardo (1 hora).

Recolección de materiales en ferreteria para la instalación de dos cámaras más (1 hora).

Instalación de cámaras en oficinas de la bodega de La Martin Fajardo (4 horas).

Revisión de la estación de bombeo de La Gran Villa #2 (1 hora).

Transporte de bombero para cerrar válvulas en Col. Tres Rosas (1 hora).
- Fecha 14 de Julio 2023
Revisión y llenado de combustible al generador de energia en oficinas ADV. (1 hora)

Revisión y reconexión de cuchillas caidas en la estacion de bombeo de Llanos de Canada (5 horas).

Revisión a estacion de bombeo de El Pozo #2, sector Cañeras (3 horas).
- Fecha 17 de Julio 2023
Se recogió material en bodega para reparaciones en estación de bombeo (1 hora).

Revisión y reparación del panel de control por breaker dañado, en la estación de bombeo de KM 71 (2 horas).

Revisión de la estacion de bombeo del bordo del río en sector KM 71 (1 hora).

Revisión a la estación de bombeo de La Gran Villa #2 (3horas).

Revisión de la estación de bombeo del Terraplen #2 (1 hora).



Aguas del Valle

- Fecha 18 de Julio 2023
Pruebas de arranque a motor, medición de voltaje para determinar la falla en bomba de El Rastro Municipal (2 horas).

Revisión en estación de bombeo en sector Cañeras #1 (2 horas).

Extracción de bomba y motor de estación de bombeo de El Rastro Municipal #2 (4 horas).
- Fecha 19 de Julio 2023
Se realizó instalación de equipo en estación de bombeo #2 en El Rastro Municipal (4 horas).
Se realizó cambio de breaker trifásico de 230v. 160amp. En estación de bombeo de Brisas del Rosario. (4 horas).
- Fecha 20 de Julio 2023
Se recogió motor, bomba, cable eléctrico sumergible y 9 tubos pvc 2" de l estación de bombeo de Bª La Victoria y se traslado a la bodega Martin Fajardo (1 hora).

Revisión de la estación de bombeo en Dos Caminos (1 hora).

Revisión de la estación de bombeo de Col. Apadrinados, sector de El Milagro (2 horas).

Revisión de la estación de bombeo de la La Gran Villa #2 (4 horas).
- Fecha 21 de Julio 2023
Revisión al submonitor de la estación de bombeo de La Gran Villa #2 (4 horas).

Revisión de la estación de bombeo de El Terraplen (2 horas).

Revisión de la estación de bombeo de El Rastro Municipal #2 (1hora).

Revisión del generador de energía eléctrico en oficinas ADV (1 hora).



Aguas del Valle

- Fecha 24 Julio 2023
Revisión del Pozo #3 y Pozo #5 en sector cañeras (4 horas).

Pruebas en la estación de bombeo de El Rastro Municipal (4 horas).
- Fecha 25 de Julio 2023
Revisión de la estación de bombeo en Col. Victoria (4 horas).

Revisión de la estación de bombeo #1 en sector Cañeras (1 hora).

Pruebas y medición de galonaje en Pozo de El Rastro Municipal (1 hora).

Extracción e instalación de equipo sumergible en Pozo de El Rastro Municipal (2 horas).
- Fecha 26 Julio 2023
Se recogió en bodega los manómetros a usar en estación de bombeo #1 en sector Cañeras (2 horas)

Revisión y colocación de manómetro en la estación de bombeo #1 sector Cañeras (3 horas).

Revisión de la estación de bombeo de El Rastro Municipal #2 (1 horas).

Revisión e instalación de flote en tanque de la Col. Sinaí, sector Dos Caminos (2 horas).



Aguas del Valle

- Fecha 27 de Julio 2023
 - Revisión y monitoreo de tiempo de operación de la estación de bombeo de El Rastro Municipal (2 horas).
 - Revisión y cambio de manómetro en la estación de bombeo #2 de Col. Orquidea (2 horas).
 - Revisión de la estación de bombeo #1 y #2 de Res. Real Del Puente (2 horas).
 - Conexión de tomacorriente de 203v para maquina de soldar en bodega de Bº Martin fajardo (2 horas).
- Fecha 28 de Julio 2023
 - Elaboración de solicitud de materiales para instalación eléctrica en galera de tanque rojo (2 horas).
 - Recogiendo material en ferreteria para la instalación en galera de tanque rojo (2 horas).
 - Instalación de circuito eléctrico para iluminación en galera de tanque rojo (4 horas).



Aguas del Valle

- Fecha 31 de Julio 2023
Extracción de transformador seco de caseta en Pozo #4, sector Cañeras (2 horas)

Revisión de panel de control en Pozo #1 y Pozo#2 en La Gran Villa (2horas).

Instalación de transformador seco en caseta de vigilancia de estación de bombeo de KM 71 (4 horas).

RENDIMIENTO: $\frac{102}{165} \times 100 = 61.8\%$

Sin otro Particular.

Atte.



Oscar Santos
Ing. Oscar Santos
Gerente Técnico



Aguas del Valle

ANEXOS

AGUA POTABLE

- Reparación de tubería rota de 4" en Barrio Suyapa. Se usó tubo de 4"



- Reparación de tubería de 6" en Col. Orquídea. Se utilizó tubo pvc 6", abrazadera de 6" a 1/2" y válvula de aire de 3/4"





Aguas del Valle

AGUA POTABLE

- Instalación de 10 tubos pvc de 1 ½"
En Col. Orquídea #1, se utilizó 8 tee de 1 ½" a ½", 1 válvula de 2" y dos adaptadores macho de 2"



- Limpieza y reparación de tubería por obstrucción en Res. Real Del Puente, se utilizó 4 lances de tubo de 6" y 1 dresser de 6"





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Limpieza de hool y sondeo en Bº La Victoria.



- Limpieza de cisterna en Esc. Manuel Bonilla



- Limpieza de hool y sondeo de tubería en Dos Caminos.



- Limpieza de hool en Col. Villa Linda





Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA


- Reubicación de transformador seco, colocación de tubo hg 4", 160 ft de cable acometida #6 e instalación de panel eléctrico de 4 circuitos, para alumbrado en oficinas.



- Instalación de lampara de brazo luz led en estación de bombeo de Brisas del Calan, se uso 12 ft de cable eléctrico tsj #14



- Pruebas en la estación de bombeo en la Col. Municipal.

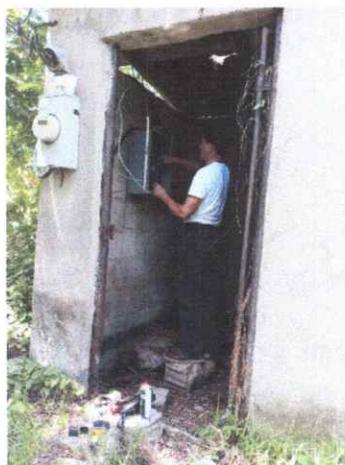

- Cambio de bomba en Pozo #2 en El Rastro Municipal. Se utilizó bomba de 2 HP de segunda mano que estaba en bodega

