



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja

Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Noviembre 2023

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Conexión de tubería para abastecer de agua a la Col. 31 de Agosto, 2 tubos hg de 2", 4 codos, 2 adaptadores 2"	1,950.00	
2	Reparacion de tubería PVC de 2" y 2 tee de 2 a 1/2" para el Bo. San Ramon	2,235.50	
3	Reparacion de tubería rota en la Col. Independencia se utilizo tubo de 2"	1,063.42	
4	Instalacion de bomba nueva en la Col. Villa Sol	4,100.00	
5	Electromecanica Se realizo limpieza de Contactor en Pozo el Higo	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
6	Electromecanica Cambio e instalacion de Equipo sumergible en pozo Real del Puente	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
7	Electromecanica se realizo extracción para revision de bomba de desechos solidos Col. Villa Linda	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
9	Electromecanica Se realizo instalacion de equipo sumergible en El Pozo de Terraplen	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
10	Alcantarillado sacando Obstrucciones en diferentes lugares del Municipio	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios




ING. OSCAR SANTOS
GERENTE TECNICO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de diciembre del 2023

Dirigida a:

Julio Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de noviembre del año 2023 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 406 (OTE = 220) (OTI= 186)
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 326
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 76

RENDIMIENTO: $\frac{326}{406} \times 100 = 80.2\%$

406

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	10
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	30
3	NO LE LLEGA EL AGUA	31
4	TUBERIA RIPIADA	27
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	10
6	FUGA DE AGUA	3
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	186
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	1
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	4
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	4
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	77
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	21
	TOTAL	406



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 51
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 39
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 12

$$\text{RENDIMIENTO: } \frac{39}{51} \times 100 = 76.4\%$$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	24
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	11
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2
	TOTAL	51



Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- Fecha: 01 De Noviembre 2023
 - Se revisó el armado y puesta en marcha generador de la oficina ADV (3 horas).
 - Revisión y armado puesta en marcha de la moto sierra (5 horas).
 -

- Fecha: 02 de Noviembre de 2023.
 - Se realizó trabajo en recaudación de equipo eléctrico en bodega (8 horas).

- Fecha: 03 de Noviembre de 2023
 - No se salió de la oficina por las constates lluvia (8horas)

- Fecha: 06 de Noviembre de 2023
 - Revisión y medición de bomba de colonia villa linda (3 horas).
 - Revisión de equipo usado en bodega buscando motor y bomba 2hp en bodega (3horas).
 - Se realizó reparación del trípode de tercera pata que le faltaba (2 horas).

- Fecha 07 de Noviembre 2023.
 - Extracción y revisión del equipo sumergible en Pozo Apadrinados (4 horas).
 - Revisión en bodega buscando bomba de segunda para instalar en Pozo de Apadrinados (2 horas).
 - En oficina haciendo solicitud de bomba sumergible (1 hora).
 - Revisión de bombeo en el Barrio Miguel Yáñez (1 hora).



Aguas del Valle

- Fecha 08 de Noviembre 2023.
- Se realizo instalacion de centro de carga que alimenta varias aires en las oficinas(8horas)

- Fecha 09 de Noviembre 2023.
- Se realizo trabajo de revision de pozo monte carmel y revision de bomba en pozo de col. Shalon dos caminos (4 horas)

- Fecha 10 de Noviembre 2023
 - Se Trabajo en revision de bomba sector milagro pozo monte carmel y pozo shalon(5horas).
 - Se trabajo en La oficina ADV(3horas).

- Fecha 11 de Noviembre 2023
 - Se realizo instalacion de bomba de pozo el fin de semana en el pozo de coloniua villa sol(8horas).

- Fecha 13 de noviembre 2023.
 - Reparacion del vehiculo de electromecanica soldadura de chasis en tanque rojo (3horas).
 - Reparacion de barrade direccion en taller moderno(3 horas),
 - Revision de bomba en colonia orquidea#2(2horas).



Aguas del Valle

- Fecha 14 de Noviembre 2023
 - Se realizo trabajo de evaluacion de solicitudes (2 horas).
 - Se Trabajo en reparando caseta para extraer panel de control de bomba del rebombeo (4 horas).
 - Se realizo revision de bomba de desechos solidos de colonia villa linda(2horas). shalon(5horas).

- Fecha 15 de Noviembre 2023
 - Se Trabajo en estacion de bombeo en el milagro ,revision y puesta en marcha el equipo(2 horas).
 - revision de los pozos de colonia gran villa (3horas).
 - Se realizo trabajo de estacion del rastro(3 horas).

- Fecha 16 de Noviembre 2023
 - Se realizo trabajo de bombeo en el higo y revision y puesta en marcha el equipo (4 horas).
 - Se realizo la revision de estacion de bombeo en villa del rio y las bombas de real del puente(4 horas),

- Fecha 17 de Noviembre 2023
 - Se Trabajo en revision de bomba de llanos de canada kinder (2hora).
 - Se realizo trabajo de revision de bomba de desechos solidos de colonia villa linda (2 horas).
 - Se realizo trabajo de revision de bomba del kinder de llanaos de canada y bomba de llanos de canada(4 horas).



Aguas del Valle

- Fecha 20 de Noviembre 2023
 - Se realizo trabajo en la bodega (2horas).
 - Recogiendo materiales para el cambio de tuberia de subcion de tuberia de bomba de oficina ADV(2horas).
 - Se realizo instalacion de tuberia de subcion en bomba de oficina ADV(4horas).
 - Se realizo instalacion de tuberia de subcion en bomba de oficina ADV(4hora

- Fecha 21 de Noviembre 2023
 - Se realizo revision de las bombas del sector el milagro (5horas).

 - Se realizo revision de lasa bomba de clorogas en tanque rojo(3horas)

- Fecha 22 de Noviembre 2023.
 - Se realizo trabajo de revision de la bomba #6 sector cañera(4 horas).
 - Revision de bomba #3 sector cañeras en tanque rojo (4 horas)
- Fecha 23 de Noviembre 2023.
 - Revision de bomba en col. La orquidea#2(2horas).
 - Revision de la bomba del vivero municipal(2horas).
 - Revision de bomba la bomba de col. Sinai(2horas).
 - Revision de pozo colonias de suiza (2horas
- Fecha 24 de Noviembre 202
 - Revision de la bodega del barrio martin fajardo (2horas).
 - Se realizo trabajo en la ferreteria recogiendo material(2 horas).
 - Se realizo instalacion de tuberia de subcion de bomba de oficinas de ADV(4horas).




Aguas del Valle

Fecha 27 de Noviembre 2023.

- Se reviso la bomba del barrio miguel yanez(2horas).
- Se realizo revision de bomba del terraplen (3horas).
- Se realizo revision de la bomba del barrio miguel yanez(3horas).
- Fecha 28 de Noviembre 2023.
- Se realizo revision y extraccion de bomba del terraplen(4horas).
- Se realizo desmontaje de ma bomba del bº mihçguel yanez(4horas).
- Fecha 29de Noviembre 2023.
- Se realizo la elavoracion del empalme del motor(4horas).
- Se instalo el equipo sumergible en pozo del terraplen(4horas).

RENDIMIENTO: $\frac{100}{176} \times 100 = 56.8\%$



Ing. Oscar Santos
Gerente Técnico



Aguas del Valle

ANEXOS

AGUA POTABLE

- Conexión de tubería para abastecer de agua a la
- Col. 31 de Agosto, Sector Marañón. Se utilizó 2 tubos HG de 2", 4 codos de 2x45" y 2 adaptadores hembra de 2"
- Reparación de tubería rota de PVC en Barrio San Ramón. Se utilizó 1 tubo pvc de 2" y 2 tee de 2 a 1/2".



- Instalación de bomba nueva en Col. Villa Sol



- Reparación de tuberías rota en Col. Independencia, se utilizó un tubo de 2"




Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Limpieza de hool y sondeo en Bº La Victoria



- Limpieza y mantenimiento de hool en Bº. José Cecilio del Valle.

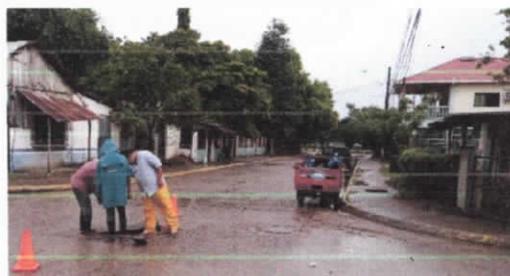

- Realizando trabajos de limpieza en Col. Vista Hermosa.



- Limpieza de hool por ripios en Bº Cabañas.






Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA


- Instalación de bomba en pozo de Col. Villa Sol.



- Se realizó extracción para revisión de bomba de desechos solidos en Col. Villa Linda.

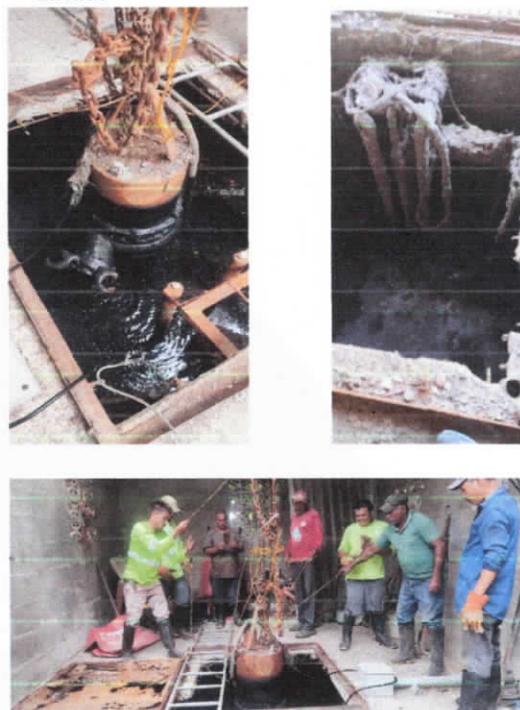

- Se realizó Limpieza de contactor en pozo el Higo.

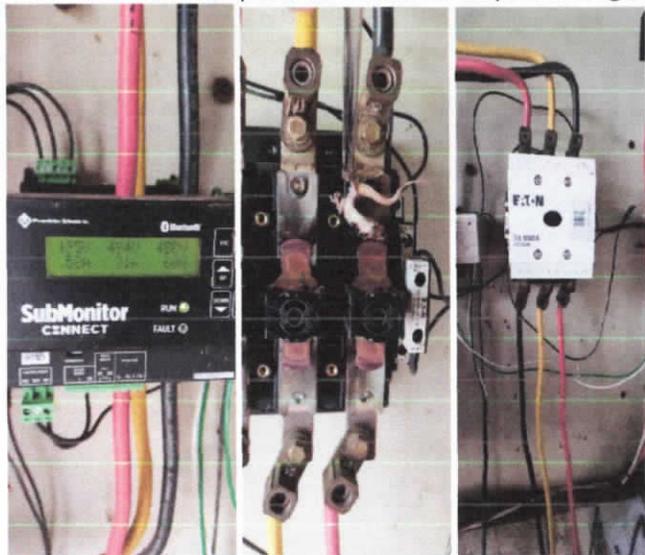

- Se realizó instalación de equipo sumergible en el Pozo de El Terraplen.

