



Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Actividades del mes de Abril 2024

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de tubo de 6" en El Mango Sector Marañon, se utilizo 1 dresser de 6" y 8pies de tubo de 6"	3,603.72	
2	Trabajo de reparacion de tubo de 6" y 1 dresser de 6" en El Vivero Municipal	3,603.72	
3	Trabajo en el Pozo #2 y #3 Sector Cañeras, se utilizo 2 dresser de 8", 1 tubo de 8", 1 valvula de 3/4	4,396.34	
	5 pies de tubo de 3/4 hg. Y 1 camisa de 3/4 hg.		
4	Trabajo en la Orquidea Reparacion de valvula de 8"	2,280.34	
5	Electromecanica instalacion de equipo sumergible en Pozo Apadrinados, motor Mastra 5.5 Hp		
	Bomba Mastra de 5HP	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
6	Electromecanica instalacion de equipo sumergible en el Rastro Municipal Motor AFT Pumps 2HP	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
	Bomba AFT Pumps de 2HP	-	
7	Electromecanica cambio de caja corta circuito en Pozo de Altos de Santa Fe Dos Caminos	-	esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
8	Electromecanica instalacion de Equipo en Pozo de la Gran Villa, Motor y Bomba Mastra 30 HP		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
9	Electromecanica cambio de aisladores, caja corta circuito, para rayos, y puesta a tierra para corregir		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
	voltaje en dos estaciones de Bombeo del Sector de las Cañeras.		
10	Electromecanica, Instalacion de equipo de Bombeo en la Col. Monte Carmel, Motor y Bomba Mastra 5HP		
11	Alcantarillado Sanitario realizando trabajos de limpieza y sacando obstrucciones en diferentes lugares del municipio		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle

Nota : Estas actividades realizadas, solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios


GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AGUAS DEL VALLE



Aguas del Valle

Villanueva, Cortés
05 de ABRIL del 2024
Dirigida a:

Julio Morel
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Diciembre del año 2023 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 334
- Ordenes de trabajo realizadas en el mes: 225
- Ordenes de trabajo pendientes en el mes: 93
-
- RENDIMIENTO: $\frac{225}{334} \times 100 = 67.36\%$

AGUA POTABLE		
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	16
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	12
3	NO LE LLEGA EL AGUA	75
4	TUBERIA RIPIADA	39
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	3
6	FUGA DE AGUA	0
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	129
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	2
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	12
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	0
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	0
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	46
	TOTAL	334



Aguas del Valle

ALCANTARILLADO SANITARIO

- Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 61
- Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 59
- Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 0

RENDIMIENTO: $\frac{59}{61} \times 100 = 96.72\%$

ALCANTARILLADO SANITARIO		
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	20
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	18
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4
TOTAL		61



Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- **Fecha: 01 de ABRIL 2024**

- Regulación de voltaje en transformadores en pozo #1, #2, #3 sector cañeras (4horas).
- Conexión de soldadura en pozo #6 sector cañeras (2horas).
- Caja de medición de colinas de suiza conexión dañada (2horas).
-

- **Fecha: 02 de ABRIL 2024**

- Se realizó regulación de voltaje en transformadores en el rebombeo de la Martin Fajardo (4horas).
- Se trabajó trasladando cuadrilla para reparación en el barrio la victoria (4horas).

- **Fecha: 03 de ABRIL de 2024**

- Realizando trabajo de regulación de voltaje a los transformadores en el rebombeo de Martin Fajardo (2horas).
- Se realizó revisión de bomba la gran villa #1 voltaje bajo en una de las fases (3 horas).
- Se regulo el voltaje de los transformadores en la bomba de 20 hp del calan (3horas).

- **Fecha: 04 de ABRIL de 2024.**

- SE Reviso y se procedió a la extracción en el pozo terraplén de la Victoria (4horas).
- Se revisó el motor dañado y subminitor en pozo los Apadrinados (4horas).

- **Fecha 05 de ABRIL de 2024.**

- Trabajo de instalación de bobina de arranque de motor y bomba de 60 hp en pozo terraplén (8horas).

- **Fecha 08 de ABRIL 2024.**

- Trabajo de extracción de motor y bomba de pozo el Apadrinado sector Milagros (8horas).
-

- **Fecha 09 de ABRIL 2024.**

- Se realizo instalacion de lamparas en vivero municipal (4horas).
- Se instalacion de lampara en el terraplen de la Victoria(4horas).

- **Fecha 10 de ABRIL 2024**

- Se instalo iluminacion en baños nuevos de oficina ADV(4horas).
- Se reviso el rebombeo de viveros para realizar intalacion de cambio de lugar del panel de control(4horas).

- **Fecha 11 de ABRIL de 2024**

- Instalacion de iluminacion de baños nuevos de oficina ADV(4HORAS).
- Se realizo la conexión de alimentacion de motor los Apadrinados en bodega (4horas).



Aguas del Valle

Fecha 12 de ABRIL 2024.

- Se instalo el motor y bomba nueva en pozo los Apadrinados (4horas).
- Se reviso el pozo del rastro para extraer equipo (4horas).

• **Fecha 13 de ABRIL de 2024.**

- Se abastecio de combustible al generador de la oficina de ADV(4horas).
- Revision de bomba del pozo del rastro municipal (horas).

FECHA 15 de ABRIL de 2024.

- Extraccion de equipo del pozo rastro municipal de colonoia villa sol (4horas).
- Revision de sistema electrico de bomba de junta de agua potable en la aldea San Isidro (4horas).

Fecha 16 de ABRIL de 2024.

- Se relizo trabajo en la bodega revisando componente electrico (1hora).
- Trabajo de en el pozo terraplen conectando banco de condensadores y reseteado submonitor que tenia el software dañado (1hora).
- revision en pozo de colonia villa sol se estaba realizando sopleteo por parte de inversiones OCHOA(2horas).
- Trabajo en la bodega sacando equipo para trasladar en pozo colonia villa sol(2horas).
- Instalando equipo en pozo de la colonia villa sol elaborando el empalme y se instalo tuberia ,mas la bomba a 170 pies (2horas).

FECHA 17 de ABRIL de 2024

- Instalando capsula capacitadora en pozo #3 sector cañeras(4horas).
- Instalando equipo sumergible en pozo del terraplen municipal (4horas).

Fecha de 18 ABRIL 2024

- Corrigiendo y cambiamndo caja de corto circuito dañada que alimenta banco de trasformadores en pozo de altos de Santa Fe (8horas).

• **Fecha 19 de ABRIL de 2024.**

- Inmtalando control de nivel en pozo rastro municipal (4horas).



Aguas del Valle

-
-
- Revisando los transformadores, intentando problema de voltaje en los pozos #1, #2 sector cañeras (4 horas).
- **Fecha 20 de ABRIL de 2024.**
- Revision y medicion de motor en pozo gran villa #1 (2 horas).
- Medicion y revision de motor en pozo monte Carmel (1 hora).
- Instalando Red temporizador en pozo los Apadrinados (2 horas).
- Extrayendo equipo del pozo gran villa (3 horas).
- **Fecha 21 de ABRIL de 2024**
- Instalacion de equipo sumergible en pozo #1 gran villa (8 horas).
- **FECHA 22 de ABRIL de 2024.**
- Supervisando trabajo por contratista de cooreccion de voltaje en bomba, que se cambiaron 5 cajas de corta circuitos, 7 aisladores de espiga, 2 aisladores de cadena, 2 para rayos, 4 conectores electricos en pozo #1, #2 sector cañeras (8 horas).
- **FECHA 23 de ABRIL de 2024.**
- Cambio de aisladores y cajas cortacircuito para rayos y puesta a tierra para mejorar la caida de voltaje en pozos #1, #2 sector cañeras (4 horas).
- Instalacion de equipo sumergible en el pozo de colonia Monte Carmel sector Dos acminos (4 horas).
- **FECHA 24 de ABRIL de 2024.**
- Revision del panel electrico en bomba de desechos solidos de colonia villa linda (4 horas).
- Instalando red termico en panel de control de junta de agua en aldea san Isidro (4 horas).
- **FECHA 25 ABRIL de 2024.**
- Revision del pozo #1, #2 sector cañeras (4 HORAS).
- Revision del pozo terraplen (2 horas).
- Revision del pozo colonas de suiza, pozo sinai, pozo el milagro (2 horas).
- **FECHA 26 de ABRIL de 2024.**
- Revision de los pozos #1, #2 de colonia gran villa (4 horas).
- Revision y medicion en pozo km 71 bordo del rio (2 horas).
- Revision del pozo #3 sector cañeras y pozo #5 (2 horas).
- **FECHA 29 de ABRIL 2024.**
- Subiendo fusible (2 hora).
- Revision del panel de control, medicion con el megger del motor #5 sector cañeras, subiendo fusible (3 horas).
- Revision del panel control medicion de voltaje (3 horas).



Aguas del Valle

ANEXO

Agua potable

- Reparacion de tubo de 6" en el mango sector marañon .
- Gastos de materiales i dress de 6" y 8pies de tuberia de 6"



- Trabajo reparacion de tubo de 6" y 1 Dresser de 6" en la el VIVERO Mnicip





Aguas del Valle

- Trabajo en pozo #2y #3 sector cañeras.
- Materiales 2 dresser de 8".1 tubo de 8",i valvula de $\frac{3}{4}$,
- 5pies de tubos de $\frac{3}{4}$ hg,1camisa de $\frac{3}{4}$ hg



- Trabajo en la orquídea.
- Reparación de válvula de 8"





Aguas del Valle

ALCANTARILLADO

- Limpieza de rípios en barro Cabañas



- Limpieza de rípios y cajas de registri sanitario en barrio las flores





Aguas del Valle

- Limpieza de ripios y caja de registro sanitario en barrio la victoria



- Limpieza de holes y sondeo de tubería de aguas negras en dos caminos sur.





Aguas del Valle

- Limpieza de holes y sondeo de tubería en DOS Caminos



- Limpieza de ripios en la colonia 21 de abril

i





Aguas del Valle

Trabajo de limpieza de holes en Dos caminos centro con el camion vector



- Limpieza de pozo septico en la escuela Francisco Morazan en la aldea el Milagro.





Aguas del Valle

ELECTROMECHANICA

- Instalacion de equipo sumergible en pozo Apadrinados.
- Motor Mastra 5.5 Hp.
- Bomba Mastra 5HP



- Instalacion de equipo sumergible en el ratro municipal.
AFT Pumps
Bomba 2 HP
Motor 2 HP






Aguas del Valle

Cambio de caja corta circuito en pozo altos de Santa Fe Dos camino



-
- Instalando motor en pozo de Gran Villa
- Motor Mastra 30 HP
- Bomba 30 HP

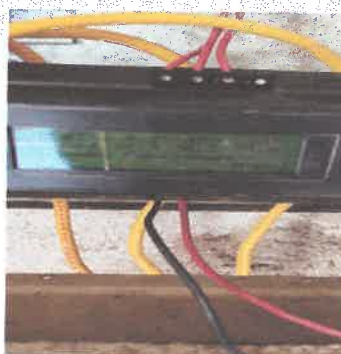



Aguas del Valle

- Cambio de aisladores cajas corta circuito , pararravosy puesta a tierra para corregir voltaje en dos estaciones de bombeo en las cañeras los pozos



- Instalando equipo sumergible en pozo de la colonia Monte Carmel.
- Motor Mastra 5 HP.
- BOMBA Mastra 5 HP





Aguas del Valle

- Instalando lampara en el pozo #2 sector cañeras



Aguas del Valle

PROCEDIMIENTO: $\frac{424}{176} \times 100 = 100\%$

Sin otro particular
