



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM

PARA: **Licda. Cintya Mejía**
Oficial de Acceso a la Información Pública

DE: **Ing. Luis A. Mejía**
Ingeniero Municipal

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 15 de Agosto del 2024



Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus funciones diarias;

El motivo de la presente es para remitirle el **Reporte de Proyectos Ejecutados del Mes de Mayo del año 2024.**

Sin otro particular,

Atentamente.

CC. Archivo



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
GERENCIA GENERAL
REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS
POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL



MES DE MAYO DEL 2024

www.facebook.com/municipalidadla ceiba/





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					
CODIGO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
	Oeste La Ceiba, Atlántida	Nivelación de Terreno Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Vivienda Los Pescadores	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Nivelación de Terreno, en comunidad del Sector Oeste, Vivienda los Pescadores
	Este La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Kawas, Sierra Pina, Irias del Este, Cordimariana, Bella Oriente, Calle del Obispado, San Angel, Col. Modelo, La Pizzaty, San Isidro, Magnolias, Riviera, La Manantial, Las Palmas, Cementerio San Isidro.	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Este: Kawas, Sierra Pina, Irias del Este, Cordimariana, Bella Oriente, Calle del Obispado, San Ángel, Col. Modelo, La Pizzaty, San Isidro, Magnolias, Riviera, La Manantial, Las Palmas, Cementerio San Isidro.
	Oeste La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	LAS PALMAS, LA PRESA, LAS VEGAS, COL. SATELITE, COL. EDEN, DANTO, LOS PINOS	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Oeste: Las Palmas, La Presa, Las Vegas, Col. Satelite, Col. Eden, Danto, Los Pinos

Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal



Informe de Actividades Mayo 2024 / Ingeniería Municipal




MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

ELABORACION DEL PROYECTO									
ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ACENTAMIENTO	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACION
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	Inversiones del Atlántico Norte - INVERTLAN	Municipalidad de La Ceiba	18-Marzo-24	L. 196,590.00 de 393,180.00	50% Final	L 476,000.00	16-Mayo -24
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	Constructora Universal	Municipalidad de La Ceiba	01-Abril-24	L. 713,690.00 de 1,115,140.00	64% Final	L 1,328,000.00	31-Mayo -24
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	Inversiones del Atlántico Norte - INVERTLAN	Municipalidad de La Ceiba	16-Mayo-24	L. 289,867.00 de 690,160.00	42%	L. 1,026,000.00	31-Mayo-24


Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

EJECUCION DEL PROYECTO											
ORDEN DE CAMBIO			MODIFICACION DE CONTRATO			APLICACIÓN DEL TIEMPO			RECISION DE CONTRATO		
SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
	X			X		X				X	
	X			X		X				X	
	X			X		X				X	

Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

ANEXOS


Nivelación de Terreno, Vivienda Los Pescadores.



No.	Proyecto Los Pescadores	Fecha:
1	Nivelación y Compactación de Terreno	Mayo 2024




No.	Proyecto Los Pescadores	Fecha:
2	Nivelación y Compactación de Terreno	Mayo 2024





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

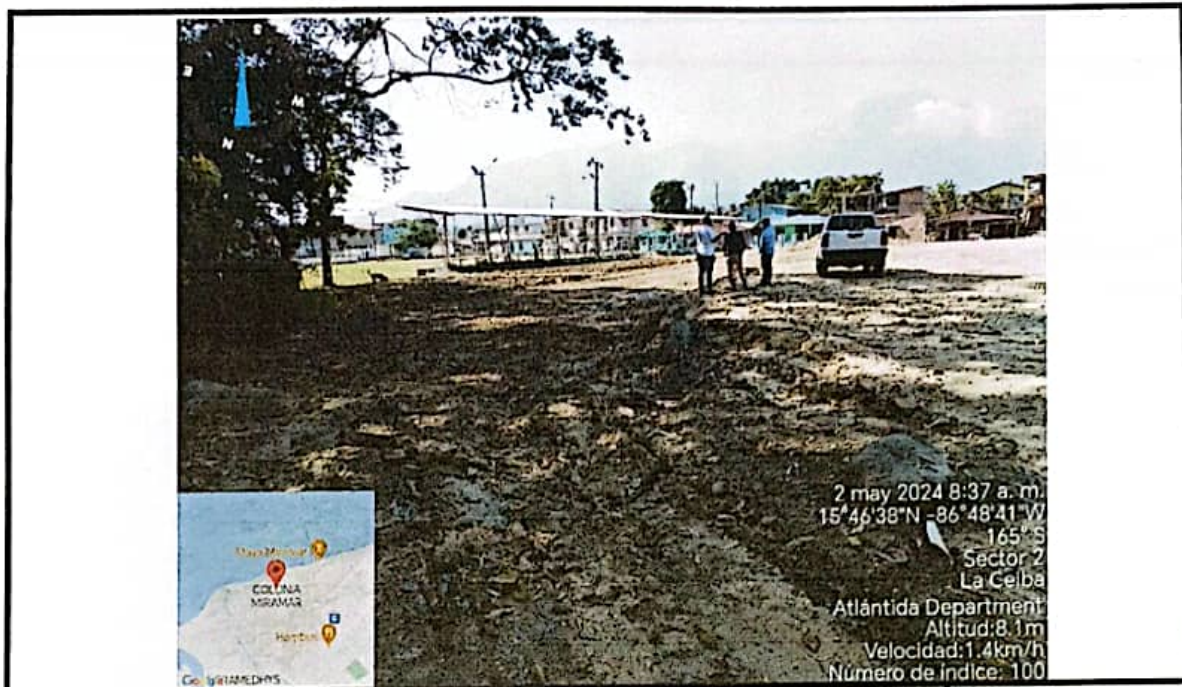

No.	Proyecto Los Pescadores	Fecha:
3	Nivelación y Compactación de Terreno	Mayo 2024



No.	Proyecto Los Pescadores	Fecha:
4	Nivelación y Compactación de Terreno	Mayo 2024





**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA**

Kawas, Sierra Pina, Irias del Este, Cordimariana, Bella Oriente, Calle del Obispado, San Angel, Col. Modelo, La Pizzaty, San Isidro, Magnolias, Riviera, La Manantial, Las Palmas, Cementerio San Isidro.



No.	Colonia Modelo	Fecha:
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024



No.	Colonia Modelo	Fecha:
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Colonia Pizzaty	Fecha:
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024



No.	Colonia Pizzaty	Fecha:
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Colonia Pizzaty	Fecha:
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024



No.	Colonia San Isidro	Fecha:
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Colonia San Isidro	Fecha:
7	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024



No.	Colonia San Isidro	Fecha:
8	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024






MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Colonia Magnolias	Fecha:
9	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024



No.	Colonia Magnolias	Fecha:
10	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024






MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Colonia Magnolias	Fecha:
11	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024




No.	Colonia Riviera	Fecha:
12	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024



Informe de Actividades Mayo 2024 / Ingeniería Municipal




MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

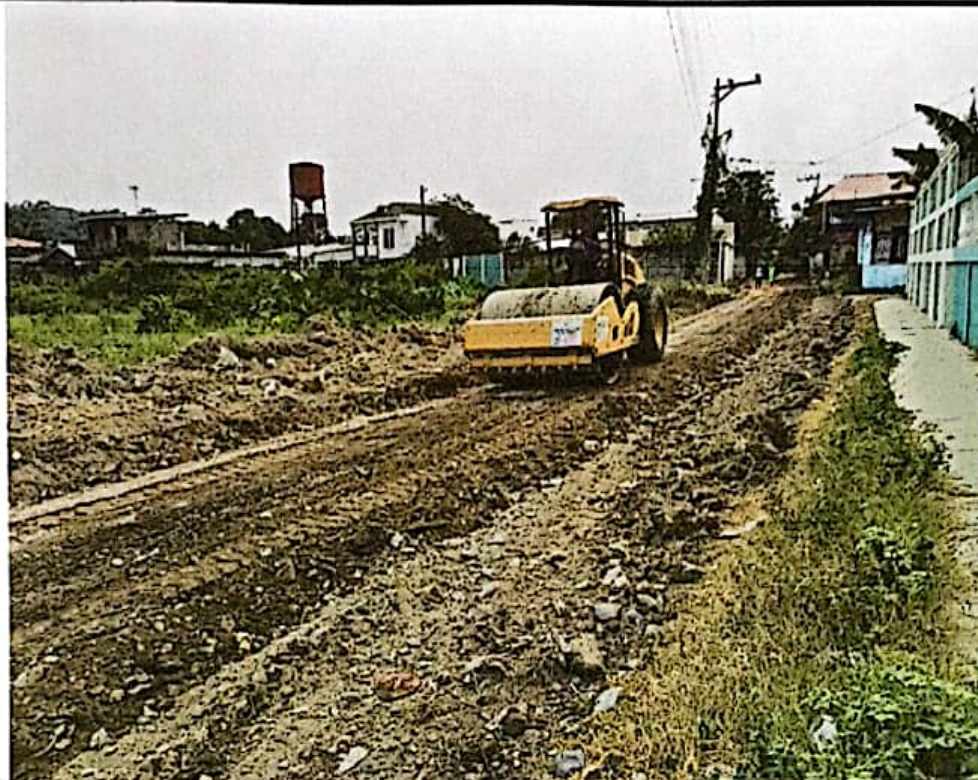

No.	Colonia Riviera	Fecha:
13	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024



No.	Colonia Riviera	Fecha:
14	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Colonia Manantial	Fecha:
15	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024



No.	Colonia Manantial	Fecha:
16	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Colonia Las Palmas	Fecha:
17	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024



No.	Colonia Las Palmas	Fecha:
18	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Cementerio San Isidro	Fecha:
19	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024



No.	Cementerio San Isidro	Fecha:
20	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

LAS PALMAS, LA PRESA, LAS VEGAS, COL. SATELITE, COL. EDEN, DANTO,
LOS PINOS



No.	Las Palmas	Fecha:
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024



No.	Las Palmas	Fecha:
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024




Informe de Actividades Mayo 2024 / Ingeniería Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

		
No.	La Presa	Fecha:
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024
		
No.	La Presa	Fecha:
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Las Vegas	Fecha:
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024



No.	Las Vegas	Fecha:
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Mayo 2024



Informe de Actividades Mayo 2024 / Ingeniería Municipal
