




REPORTE DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

COMUNIDAD LAS MARIAS, ALDEA LA CONCEPCIÓN, OROCUINA, CHOLUTECA.



COMUNIDAD DE LAS VENTANAS, ALDEA SANTA LUCIA, Y COMUNIDAD DE MATAPALITO, ALDEA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

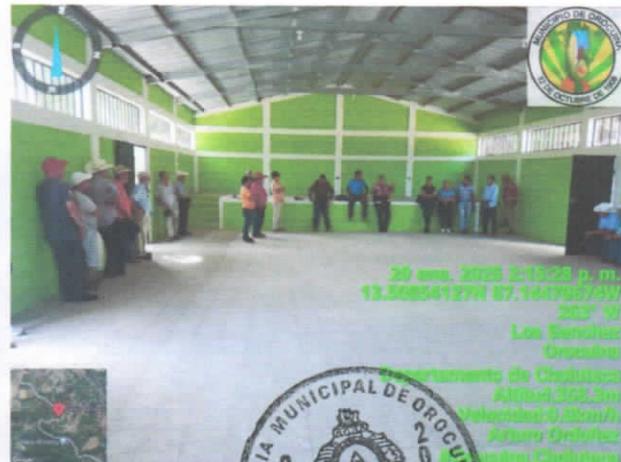

Responsable de la Actividad
 Lic. Arturo Alexander Ordoñez (UTM) *Arturo A.*

Orocuina, Choluteca 30 de Enero del 2025



OBJETIVO GENERAL

- ❖ Promover la participación de las organizaciones de bases comunitarias, de los procesos de los proyectos de desarrollo local.

OBJETIVO ESPECIFICO

- ❖ Socializar la construcción de concreto ciclópeo en las comunidades de las Marías, tramo la tomatera, Las Ventanas (tramos el trapiche y cuesta la quebrada), Matapalito (tramo cuesta el dolor) con las fuerzas vivas de las comunidades anterior mencionadas; los que se ejecutaran a través del Programa Nacional de Intervención de caminos productivos y Municipalidad de Orocuina.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Miembros de la cooperación municipal de Orocuina, personal de la municipalidad, ingeniero de la SIT y fuerzas vivas de las diversas comunidades del corredor de Honduras Brujas a las Marías el día 20 de enero asistieron a la socialización de los proyectos de Construcción de concretos ciclópeo E = 20 CMS en tramo cuesta la tomatera de la comunidad de las Marías, tramo cuesta el trapiche y cuesta la quebrada en la comunidad de Las Ventanas y tramo cuesta el dolor comunidad de Matapalito, los cuales son financiados con fondos del gobierno central y fondos municipales a través del programa nacional de intervención a caminos productivos, informándoles las especificaciones generales de las obras, el proceso de ejecución, el rol protagónico de cada una de las instancias y el mecanismo de desarrollo de las obras, demostrando actitud positiva por parte las fuerzas vivas de los dos corredores, con el propósito mejorar la infraestructura que responde a una necesidad crítica y urgente en las zonas rurales, donde la deficiente calidad de las vías de acceso limita el desarrollo y afecta negativamente la economía local.

Generalidades del Proyecto: **Construcción de Concreto Ciclópeo e = 20 CMS, Tramo: Cuesta La Tomatera, Comunidad Las Marías, Aldea la Concepción, Orocuina, Choluteca.**

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD
1	Limpieza de Terreno	M ²	504
2	Excavación de Material	M ³	50.4
3	Trazado y Marcado	ML	126



Alcaldía Municipal de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A
Teléfono: 2788-1088/ 2788-1322



4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M ³	25.2
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M ³	100.8
6	Limpieza Final	JRD	1

Datos Generales.

- 1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 126 ML.
- 2.-Metros Cuadros 504²
- 3.-Ancho de la Calzada = 4.00 MTS

Generalidades del Proyecto: **Construcción de Concreto Ciclópeo e = 20 CMS, Tramo # 1 Cuesta la Quebrada, Comunidad De Las Ventanas, Aldea Santa Lucia, Orocuina, Choluteca.**

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD
1	Limpieza de Terreno	M ²	382.5
2	Excavación de Material	M ³	38.25
3	Trazado y Marcado	ML	85
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M ³	19.13
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M ³	76.5
6	Limpieza Final	JRD	1

Datos Generales.

- 1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 85 M.L.
- 2.-Metros Cuadros 382.5 M²
- 3.-Ancho de la Calzada = 4.50 MTS

Generalidades del Proyecto: **Construcción de Concreto Ciclópeo e = 20 CMS, Tramo: # 2 Cuesta el Trapiche, Comunidad las Ventana, Aldea Santa Lucia, Orocuina, Choluteca.**

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD
1	Limpieza de Terreno	M ²	450
2	Excavación de Material	M ³	45
3	Trazado y Marcado	ML	100
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M ³	22.5
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M ³	90
6	Limpieza Final	JRD	1



Datos Generales.

- 1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CMS = 100 M.L
- 2.-Ancho de la Calzada = 4.50 MTS
- 3.-Metros Cuadrados = 450 M²

Generalidades del Proyecto: **Construcción de Concreto Ciclópeo e = 20 CMS, Tramo: Cuesta Del Dolor, Comunidad De Matapalito, Aldea San José, Orocuina, Choluteca.**

N°	ACTIVIDADES A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD
1	Limpieza de Terreno	M ²	605
2	Excavación de Material	M ³	60.5
3	Trazado y Marcado	ML	121
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M ³	30.25
5	Concreto Ciclópeo e = 20 cm Proporción 1:2:3	M ³	121
6	Limpieza Final	JRD	1

Datos Generales.

- 1.-Construcción de concreto Ciclópeo e = 20 CM = 121 M.L.
- 2.-Metros Cuadros 605 M²
- 3.-Ancho de la Calzada = 5.00 MTS

RESULTADO

- ❖ Socializado los tramos a intervenir con concreto ciclópeo E = 20 cms a través del Programa Nacional de Intervención de caminos productivos y Municipalidad de Orocuina, como respuesta a la necesidad crítica y urgente en las zonas rurales, donde la deficiente calidad de las vías de acceso limita el desarrollo y afecta negativamente la economía local.

ACUERDO

- Los miembros del corredor de Honduras Brujas-Las Marías se comprometieron a ser veedores de la operatividad, administración, ejecución del proyecto y de participar en cierre de los tramos carreteros de ser necesarios para la construcción como también velar por el curado oportuno para que alcance la resistencia y sea un proyecto de alta calidad.



ANEXOS

Socialización del Proyecto: Construcción de Concreto Ciclópeo E = 20 CMS, Tramo:
Cuesta La Tomatera, Comunidad Las Marías, Aldea la Concepción, Orocuina,
Choluteca.






Socialización de los Proyectos:

Construcción de Concreto Ciclópeo e = 20 CMS, Tramo # 1 Cuesta la Quebrada, Comunidad De Las Ventanas, Aldea Santa Lucia, Orocuina, Choluteca.

Construcción de Concreto Ciclópeo e = 20 CMS, Tramo: # 2 Cuesta el Trapiche, Comunidad las Ventana, Aldea Santa Lucia, Orocuina, Choluteca.

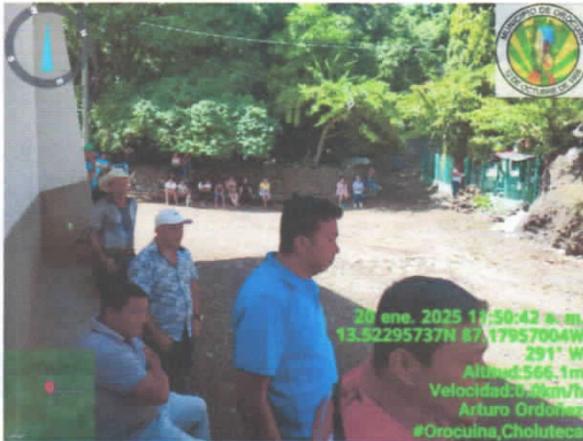



Socialización del Proyecto: Construcción de Concreto Ciclópeo e = 20 CMS, Tramo: Cuesta Del Dolor, Comunidad De Matapalito, Aldea San José, Orocuina, Choluteca.

