

INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE OCTUBRE AÑO 2018.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1	Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	Juan Carlos Servellon Méndez	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Mano de obra de Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	02/10/2017	220,270.24	31,715.54	251,985.78	82.93%	No se ha continuado con el Proyecto por Falta de Materiales
2	Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Techo y Tres Puertas de Metal en Proyecto de Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	18/01/2018	79,400.00	-	79,400.00	67.18%	No se avanzado el Proyecto porque el contratista de obra gris no ha continuado por falta de materiales
3	Construcción de Caja Punte	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	B° El Milagro	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Caja Punte.	04/01/2018	48,798.50	-	48,798.50	100%	-
4	Centro de Capacidades Especiales	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	B° El Centro	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Capacidades Especiales	29/12/2017	190,687.45	27,888.60	218,576.05	100%	Se realizó orden de cambio por L. - 3,480.00, quedando el contrato por L. 215,096.05
5	Energía Eléctrica	Fausto Ordoñez	Caserío La Filipinas	Contrato de Mano de Obra de Aplomado de Postes	10/01/2018	60,000.00	-	60,000.00	100%	Terminada la obra pero no cancelado el Contrato
6	Alcantarillado Sanitario	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Barrio Tierras Morenas	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Alcantarillado Sanitario	20/03/2018	213,263.33	-32,934.70	180,328.63	100%	-

7	Sector Educación	Ronald Alfredo Moreno	Caserío El Zapotillo, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Construcción de Techo y Paredes Falsas con lamina de aluzinc en Bodega Cocina Kinder El Zapotillo	09/05/2018	6,000.00	-	6,000.00	100%	-
8	Mejoramiento de Canchas Deportivas	Ronald Alfredo Moreno	Barrió Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de reparación de 4 portones e instalacion de una puerta en Campo de Futbol	18/05/2018	2,600.00	-	2,600.00	100%	-
9	Mejoramiento del Edificio de la Municipalidad	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en Bodega Municipal (consiste en cambio e instalacion de dos láminas).	22/05/2018	2,300.00	-	2,300.00	100%	-
10	Construcción de Centro Comunales y de Usos Múltiples.	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en el Centro Social Municipal (Consiste en sellado y tapado de goteras)	25/05/2018	1,300.00	-	1,300.00	100%	-
11	Mejoramiento del Edificio de la Municipalidad	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en Oficinas Municipales (Consiste en sellado y tapado de goteras en Oficina de Comité de Transparencia, Cocina, O.M.M., U.M.A., U.T.M., P.M.I.A.J., y Desarrollo Comunitario	28/05/2018	800	-	800	100%	-

12	Alcantarillado Sanitario	Omar Antonio Cabrera Ventura	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 48.30 Horas de Excavación en Proyecto de Alcantarillado Sanitario	02/05/2018	56,028.00	-	56,028.00	100%	-
13	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba y Caserío La Montaña, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 70.10 Horas de Excavadora cortando material selecto, 6.30 Horas de Retroexcavadora regando material y 6.30 Horas de Patrol Conformando Calle para Mejoramiento de Carretera que conduce a Aldea de Tablones Arriba y Carretera hacia el Relleno Sanitario	18/05/2018	137,586.00	-	137,586.00	100%	-
14	Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	Omar Antonio Cabrera Ventura	Barrió Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 50.50 Horas de Excavación en Proyecto de Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Barrio Tierras Morenas.	19/05/2018	46,460.00	-	46,460.00	100%	-
15	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba	Servicios de 21.60 Horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba	01/06/2018	37,260.00	-	37,260.00	100%	-

16	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Servicios por acarreo de 09 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Abajo	19/05/2018	7,245.00	-	7,245.00	100%
17	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Servicios por acarreo de 09 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Abajo	19/05/2018	5,635.00	-	5,635.00	100%
18	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce de Tablones Abajo a Tablones Arriba (De entrada Los Martínez hacia la cuesta de Julio Zepeda)	19/05/2018	11,235.00	-	11,235.00	100%
19	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Abajo, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce de del Barrio el guapinol a Tablones Abajo (De quebrada los indios a Tablones Abajo hasta la	19/05/2018	15,622.00	-	15,622.00	100%

				entrada Los Martínez)						
20	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio Tierras Morenas	Contrato de Servicios por acarreo de 39 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio Tierras Morenas	21/05/2018	16,100.00	-	16,100.00	100%	
21	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Caserío La Montaña	Contrato de Servicios por acarreo de 20 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Relleno Sanitario, Caserío La Montaña.	21/05/2018	11,500.00	-	11,500.00	100%	
22	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Caserío La Montaña	Contrato de Servicios por acarreo de 28 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Relleno Sanitario, Caserío La Montaña.	28/05/2018	22,425.00	-	22,425.00	100%	
23	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio Tierras Morenas	Contrato de Servicios por acarreo de 12 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del	28/05/2018	6,900.00	-	6,900.00	100%	

				Barrio Tierras Morenas						
24	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio El Carbonal	Contrato de Servicios por acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio El Carbonal.	29/05/2018	2,875.00	-	2,875.00	100%	
25	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio El Carbonal	Contrato de Servicios por acarreo de 10 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio El Carbonal.	29/05/2018	5,750.00	-	5,750.00	100%	
26	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	30/05/2018	4,140.00	-	4,140.00	100%	
27	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	30/05/2018	4,140.00	-	4,140.00	100%	

28	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba	Servicios de 67.30 Horas de alquiler de Retro excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba	01/06/2018	61,916.00	-	61,916.00	100%	
29	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por acarreo de 82 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	01/06/2018	84,870.00	-	84,870.00	100%	
30	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por acarreo de 85 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	01/06/2018	87,975.00	-	87,975.00	100%	
31	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	Aldea de Tablones Arriba	Servicios de 85.50 Horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba	04/06/2018	73,743.75	-	73,743.75	100%	-
32	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Abajo	Servicios de 58.60 Horas de alquiler de Retro excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	14/06/2018	53,912.00	-	53,912.00	100%	-

33	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	Aldea de Tablones Abajo	Servicios de 44.70 Horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	14/06/2018	38,553.75	-	38,553.75	100%
34	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Servicios por acarreo de 86 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Abajo	14/06/2018	69,230.00	-	69,230.00	100%
35	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Servicios por acarreo de 124 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Abajo	14/06/2018	99,820.00	-	99,820.00	100%
36	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Abajo	Servicios de 46.60 Horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	19/06/2018	80,385.00	-	80,365.00	100%

37	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	Servicios de 58.60 Horas de alquiler de Retro excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	27/06/2018	15,640.00	-	15,640.00	100%
38	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	Servicios de 19.60 Horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a El Barrio El Guapinol, San Antonio y Barrio Los Mangos.	27/06/2018	16,905.00	-	16,905.00	100%
39	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	Servicios de 22.30 Horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	27/06/2018	38,467.50	-	38,467.50	100%
40	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio El Guapinol	Contrato de Servicios por acarreo de 58 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio El Guapinol.	28/06/2018	33,350.00	-	33,350.00	100%

41	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio El Guapinol	Contrato de Servicios por acarreo de 54 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio El Guapinol.	28/06/2018	31,050.00	-	31,050.00	100%
42	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce de Yusguare al Barrio El Guapinol (De Yusguare hacia quebrada los indios)	28/06/2018	5,029.00	-	5,029.00	100%
40	Mejoramiento de Canchas Deportivas	Ronald Alfredo Moreno	Barrió Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Construcción de dos cajas de protección de breaker en campo de futbol del B° Los Mangos.	29/06/2018	2,500.00	-	2,500.00	100%
41	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio San Antonio	Contrato de Servicios por acarreo de 01 viaje de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio San Antonio.	29/06/2018	575.00	-	575.00	100%
42	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio San Antonio	Contrato de Servicios por acarreo de 02 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio San	29/06/2018	1,150.00	-	1,150.00	100%

				Antonio.						
43	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia Santa Anita	Contrato de Servicios por acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera de Colonia Santa Anita.	29/06/2018	2,300.00	-	2,300.00	100%	
44	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio Los Mangos	Contrato de Servicios por acarreo de 02 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera de Barrio Los Mangos.	29/06/2018	1,150.00	-	1,150.00	100%	
45	Fortalecimiento Catastral	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Todo El Municipio	Servicios profesionales para elaboración de plano de Delimitación del Municipio de Santa Ana de Yusguare	18/07/2018	5,000.00	-	5,000.00	100%	
46	Iluminación de Villas Publicas	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de iluminación de calles principales del B° El Centro y Boulevard del Municipio de Santa Ana de Yusguare	01/07/2018	31,740.00	-	31,740.00	100%	

47	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de mejoramiento del Sistema Eléctrico en Parque Municipal	02/07/2018	5,750.00	-	5,750.00	100%
48	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 12.00 horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en Banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba sector hacia La Tajeada	02/07/2018	16,905.00	-	16,905.00	100%
49	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Servicios de 88.30 horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce hacia la Aldea La Tajeada	02/07/2018	152,317.50	-	152,317.50	100%
50	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de mejoramiento e instalacion de cerámica en piso, pilas y mostrador del Bar del Centro Social Municipal	03/07/2018	5,100.00	-	5,100.00	100%
51	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 61 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce de la Aldea de Tablones Arriba hacia la Aldea La Tajeada.	03/07/2018	63,135.00	-	63,135.00	100%

52	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 11 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce de la Aldea de Tablones Arriba hacia la Aldea La Tajeada.	03/07/2018	11,385.00	-	11,385.00	100%
53	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 24 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce de la Aldea de Tablones Arriba hacia la Aldea La Tajeada.	03/07/2018	24,840.00	-	24,840.00	100%
54	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Servicios de 61.80 horas de alquiler de Retro-excavadora para mejoramiento de carretera que conduce hacia la Aldea La Tajeada	04/07/2018	56,856.00	-	56,856.00	100%
55	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de módulos sanitarios en Centro Comunal Municipal	06/07/2018	24,365.00	-	24,365.00	100%
56	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de dos canastas protectoras de bomba y reflector en fuente de Plaza Cívica Municipal	06/07/2018	800.00	-	800.00	100%
57	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de construcción de puertas y ventanas en el Bar del Centro Comunal Municipal	09/07/2018	15,153.70	-	15,153.70	100%

58	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de techo y canal de aguas lluvias en el Centro Social Municipal	09/07/2018	27,640.00	-	27,640.00	100%
59	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce de Tablones Arriba hacia carretera a la Tajeada (De Tablones Arriba hacia carretera que conduce a la Tajeada por donde Rosael Galindo)	09/07/2018	4,815.00	-	4,815.00	100%
60	Construcción y Ampliación de Proyectos de Energía Eléctrica	Eléctrica Medina S. de R.L. (ELECME)	Barrio San Antonio, Santa Ana de Yusguare	Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica	09/07/2018	343,748.40	-	343,748.40	100%
61	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 13 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce al Barrio El Guapinol	09/07/2018	7,475.00	-	7,475.00	100%

62	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortez	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce al Barrio El Guapinol	09/07/2018	2,300.00	-	2,300.00	100%
63	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce al Barrio El Guapinol	09/07/2018	2,875.00	-	2,875.00	100%
64	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de Obra de instalacion de reflectores, fotoceldas y flotador en Parque y Plaza Cívica Municipal	10/07/2018	2,875.00	-	2,875.00	100%
65	Cultura	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de escenario para eventos culturales	17/07/2018	10,000.00	-	10,000.00	100%
66	Iluminación de Villas Publicas	Osmin Odilón Jiménez	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de iluminación de calles en B° Tierras Morenas	19/07/2018	21,562.50	-	21,562.50	100%
67	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de construcción de base para rotoplas en el Centro Social Municipal	19/07/2018	2,500.00	-	2,500.00	100%
68	Iluminación de Villas Publicas	Osmin Odilón Jiménez	Aldea de Tablones Abajo, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de iluminación de calles en la Aldea de Tablones Abajo	22/07/2018	20,125.00	-	20,125.00	100%
69	Mejoramiento y Apertura de Calles	Osmin Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, San Francisco y Tierras Morenas.	Contrato de Mano de Obra de Limpieza de Calles.	30/07/2018	1,150.00	-	1,150.00	100%

69	Construcción de Centros Comunes y de Usos Múltiples	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de instalación de cielo falso PVC, Lámparas, toma corriente, puertas y ventiladores	06/08/2018	9,200.00	-	9,200.00	100%
70	Sector Salud	Omar Antonio Cabrera Ventura	Caserío La Montaña, Santa Ana de Yusguare	Contrato por servicios de 17.00 horas de alquiler de excavadora para construcción de Trinchera en Relleno Sanitario	07/08/2018	29,325.00	-	29,325.00	100%
71	Sector Salud	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Caserío La Montaña, Santa Ana de Yusguare	Contrato de Mano de obra para marcar e instalación de tubería en Relleno Sanitario.	08/08/2018	4,700.00	-	4,700.00	100%
72	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Colonia Manuel Fernández, Villas El Dorado y La Najara, Santa Ana de Yusguare	Contrato por servicios de 100.90 horas de excavadora cortando y cargando material selecto para carretera.	10/08/2018	174,052.50	-	174,052.50	100%
73	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Colonia Manuel Fernández, Villas El Dorado y La Najara, Santa Ana de Yusguare	Contrato por servicios de 76.50 horas de Patrol regando material selecto para carreteras.	10/08/2018	131,962.50	-	131,962.50	100%

74	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Colonia Manuel Fernández	Acarreo de 47 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Manuel Fernández	13/08/2018	37,835.00	-	37,835.00	100%
75	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia Manuel Fernández	Acarreo de 71 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Manuel Fernández	13/08/2018	57,155.00	-	57,155.00	100%
76	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Colonia Manuel Fernández	Acarreo de 42 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Manuel Fernández	13/08/2018	33,810.00	-	33,810.00	100%
77	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Colonia Manuel Fernández, Villas El Dorado y La Najar, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera de la Colonia Manuel Fernández, Villas El Dorado y La Najar	13/08/2018	16,157.00	-	16,157.00	100%
78	Protección a La Mujer	Ronald Alfredo Moreno	Aldea El Puente, Santa Ana de Yusguare	Contrato de Mano de Obra de Construcción de una Caseta para la venta de tortillas.	17/08/2018	4,800.00	-	4,800.00	100%
79	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Contrato de mano de obra de instalacion de lámina desplegada, barandales y tubos en piso para base de rotoplas del Centro Social Municipal.	20/08/2018	2,500.00	-	2,500.00	100%

80	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Colonia La Najar	Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia La Najar.	21/08/2018	4,025.00	-	4,025.00	100%
81	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Colonia Villas El Dorado	Acarreo de 08 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Villas El Dorado.	21/08/2018	6,440.00	-	6,440.00	100%
82	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Colonia Villas El Dorado	Acarreo de 11 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Villas El Dorado.	21/08/2018	8,855.00	-	8,855.00	100%
83	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Colonia La Najar	Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia La Najar.	21/08/2018	4,025.00	*	4,025.00	100%
84	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia Villas El Dorado	Acarreo de 11 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia Villas El Dorado.	21/08/2018	8,855.00	-	8,855.00	100%
85	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia La Najar	Acarreo de 07 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Colonia La Najar.	21/08/2018	5,635.00	-	5,635.00	100%

86	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortez	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por Acarreo de 14 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	22/08/2018	14,490.00	-	14,490.00	100%
87	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por Acarreo de 10 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	22/08/2018	10,350.00	-	10,350.00	100%
88	Construcción de un Aula en Instituto Técnico Vocacional del Sur.	Santos Lucio Flores Espinal	Colonia Santa Anita, Santa Ana de Yusguare	Contrato de Servicios por compra y Acarreo de 04 viajes de arena, 02 de piedra, 03 de grava y 08 de selecto para construcción de aula de clases en el Instituto Técnico Vocacional del Sur.	22/08/2018	23,575.00	-	23,575.00	100%
89	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Arriba	Contrato de Servicios por Acarreo de 21 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Tablones Arriba	22/08/2018	21,735.00	-	21,735.00	100%

90	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Contrato de servicios para la supervisión de colocación y espesor de material selecto en carretera que conduce interna de Tablones Arriba (desde Los Martínez hacia el Cerrito)	22/08/2018	2,942.50	-	2,942.50	100%
91	Construcción de un Aula en Instituto Técnico Vocacional del Sur.	Jorge Alcides Fuentes Pérez	Colonia Santa Anita, Santa Ana de Yusguare	Contrato de Mano de obra de construcción de una aula de clases de 9x8 metros en el Instituto Técnico Vocacional del Sur.	24/08/2018	105,481.57	-	105,481.57	100%
92	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortez	Aldea Pueblo Nuevo	Contrato de Servicios por Acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Pueblo Nuevo.	24/08/2018	3,220.00	-	3,220.00	100%
93	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea La Permuta	Contrato de Servicios por Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Aldea La Permuta	24/08/2018	4,025.00	-	4,025.00	100%
94	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea Pueblo Nuevo	Contrato de Servicios por Acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Pueblo	24/08/2018	3,220.00	-	3,220.00	100%

				Nuevo.						
95	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea La Permuta	Contrato de Servicios por Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de la Aldea La Permuta	24/08/2018	4,025.00	-	4,025.00	100%	
96	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea Pueblo Nuevo	Contrato de Servicios por Acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea de Pueblo Nuevo.	24/08/2018	3,220.00	-	3,220.00	100%	
97	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Aldea Los Zorrillos	Contrato de Servicios por Acarreo de 08 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea Los Zorrillos.	25/08/2018	6,440.00	-	6,440.00	100%	
98	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea Los Zorrillos	Contrato de Servicios por Acarreo de 09 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea Los Zorrillos.	25/08/2018	7,245.00	-	7,245.00	100%	

99	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea Los Zorrillos	Contrato de Servicios por Acarreo de 09 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce a la Aldea Los Zorrillos.	25/08/2018	7,245.00	-	7,245.00	100%
100	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios por cargada y acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera de Tierras Morenas por donde Iris Vásquez.	10/09/2018	4,600.00	-	4,600.00	100%
101	Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable.	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Reparación de Pozo.	10/09/2018	1,200.00	-	1,200.00	100%
102	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra de instalacion de tubería para agua potable en Centro Comunal.	12/09/2018	3,500.00	-	3,500.00	100%
103	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios para el marcado y supervisión de balastado de 480.00 metros lineales de Carretera.	12/09/2018	4,560.00	-	4,560.00	100%


104	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ivonne Michelle Fonseca Aguilar	Barrió el Carbonal, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios por acarreo de 03 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera del Barrio El Carbonal.	13/09/2018	10,350.00	-	10,350.00	100%
105	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ivonne Michelle Fonseca Aguilar	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios por 23.60 horas de alquiler de retroexcavadora cargando material selecto para mejoramiento de carretera de la Aldea La Tajeada.	13/09/2018	21,712.00	-	21,712.00	100%
106	Sector Salud	Osmin Odilón Jiménez	Aldea La Permuta, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra de instalacion de energía eléctrica en el Centro de Salud.	13/09/2018	9,142.50	-	9,142.50	100%
107	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios por Acarreo de 17 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera de Aldea La Tajeada.	13/09/2018	24,150.00	-	24,150.00	100%
108	Construcción de Letrinas	Santos Lucio Flores Espinal	Barrió Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios por compra y acarreo de 01 viaje de arena y 01 viaje de grava para la construcción de fosa séptica.	14/09/2018	2,450.00	-	2,450.00	100%

109	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Carlos Roberto Erazo Mejía	Aldea de Tablones Abajo, Santa Ana de Yusguare	Contrato de mano de obra de construcción de acera en Centro Comunal.	18/09/2018	9,458.00	-	9,458.00	100%
110	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ivonne Michelle Fonseca Aguilar	Aldea El Puente, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios por acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera de la Aldea El Puente.	18/09/2018	1,725.00	-	1,725.00	100%
111	Mejoramiento y Apertura de Calles	Ivonne Michelle Fonseca Aguilar	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de servicios por acarreo de 03 viajes de balastre (material selecto) para mejoramiento de carretera de la Aldea La Tajeada.	19/09/2018	4,025.00	-	4,025.00	100%
112	Iluminación de Vías Publicas	Osmin Odilon Jiménez	Barrio Los Mangos, El Carbonal, Aldea El Puente y Colonia Najar, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de obra de instalacion y reparación de lámparas.	27/09/2018	2,472.00	-	2,472.00	100%
113	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra de instalacion y reparación de canal de aguas lluvias del Centro Social Municipal.	27/09/2018	800.00	-	800.00	100%
114	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra de demolición de concreto y vidrios, construcción de pared de estructura metálica en contorno en muro perimetral y	05/10/2018	10,500.00	-	10,500.00	100%

				construcción de banca metálicas en el Centro Social Municipal.						
115	SECTOR EDUCACION 0301-581	Carlos Roberto Erazo Mejía	Aldea La Tajeada, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra de instalación de energía eléctrica y pintura de Jardín de Niños Renacer.	10/10/2018	5,300.00	-	5,300.00	100%	
116	SECTOR EDUCACION 0301-581	Carlos Roberto Erazo Mejía	Caserío El Zapotillo, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra de construcción de fosa séptica y módulos sanitarios en Jardín de Niños Melitza del Carmen Hernández	12/10/2018	21,540.00	-	21,540.00	100%	
117	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra para sellar ranuras en contorno del muro perimetral del Centro Social Municipal.	15/10/2018	2,000.00	-	2,000.00	100%	
118	SECTOR EDUCACION 0301-581	Carlos Roberto Erazo Mejía	Aldea Pueblo Nuevo, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra de reparación de pila, acera y sellado de techo en Jardín de Niños María Concepción Estrada.	19/10/2018	4,500.00	-	4,500.00	100%	
119	Iluminación de Vías Publicas	Osmin Odilón Jiménez	Aldea La Permuta, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de Iluminación de Calles.	19/10/2018	20,079.00	-	20,079.00	100%	

120	Construcción Mejoramiento de Viviendas	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra para fundir y soldar tubos HG para muro de contención en Vivienda de la Señora Julia Martínez.	22/10/2018	3,500.00	-	3,500.00	100%
121	Mejoramiento de Edificio Municipal	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra para cambiar láminas de Aluzinc y sellado con cemento y silicón en oficina de O.M.M. Y U.M.A. de la Municipalidad.	22/10/2018	850.00	-	850.00	100%
122	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Aldea Tablones Abajo, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra de construcción de dos contrapuertas y seis balcones en el Centro Comunal.	25/10/2018	17,820.00	-	17,820.00	100%
123	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra de construcción de tapadera para pozo de alcantarillado sanitario en el Boulevard Pablo Antonio Colindres.	30/10/2018	4,000.00	-	4,000.00	100%
124	SECTOR SALUD 0302-581	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra para la instalación de canales en el Laboratorio Municipal.	31/10/2018	5,700.00	-	5,700.00	100%

125	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de mano de obra para la instalación de canales en Plaza Cívica Municipal.	31/10/2018	5,000.00	-	5,0000.00	100%	
-----	---	-----------------------	--	--	------------	----------	---	-----------	------	--




CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES 9.00X8.00 M, INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL SUR, COLONIA SANTA ANITA.



ORDEN DE CAMBIO 01

"CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES 9.00X8.00 M, INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL SUR".

Tipo de Contrato		Proyecto		Avance Fisico = 100.00		Departamento:		CHOLUTECA			
Monto Aprobado		Fecha de Inicio		Avance Financiero = 100.00		Municipio:		SANTA ANA DE YUSGUARE			
Monto Contratado L 105,481.57 + L 7,117.90 = L 112,599.47		Fecha de Finalización		Multa Diaria		Monto Ampliación = 0.00		Barrio:			
Duracion del Contr 60 DIAS CALENDARIO		22 de Agosto del 2018		22 de Octubre del 2018		COL. SANTA ANITA					
Hno.	ACTIVIDAD	UNID.	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO CONTRATADO		ORDEN DE CAMBIO ANTERIOR (ACUMULADA)		NUEVA ORDEN DE CAMBIO		CONTRATADO + ORDENES DE CAMBIO ACUMULADAS	
	DESCRIPCIÓN			Cantidad (Lps)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)
PRELIMINARES											
1	Relleno con material selecto	m³	137.00	20.53	2,812.61	-	-	-	-	20.53	2,812.61
2	Trazado y marcado	ml	20.00	39.26	785.20	-	-	-	-	39.26	785.20
3	Excavación de material no calificado	m³	274.00	12.78	3,501.72	-	-	-	-	12.78	3,501.72
SUB-TOTAL PRELIMINARES					7,099.53	-	-	-	-		7,099.53
CIMENTACION											
4	Relleno de material del sitio en zapatas aisladas	m³	30.00	2.30	69.00	-	-	-	-	2.30	69.00
5	Zapata aislada 0.80 x 0.80, e=0.25 , 8 # 4, a.s.	unidad	350.00	5.00	1,750.00	-	-	-	-	5.00	1,750.00
6	Cimentacion de mampostería 0.50x0.70 m	m³	285.00	9.10	2,593.50	-	-	-	-	9.10	2,593.50
7	Cimentacion de mampostería 0.30x0.20 m en acera y corredor	m³	285.00	1.91	544.35	-	-	-	-	1.91	544.35
SUB-TOTAL CIMENTACION					4,956.85	-	-	-	-		4,956.85
ESTRUCTURAS											
8	Solera de 15x20, 4#4, #3@20 concreto 1:2:2, inferior	ml	120.00	26.00	3,120.00	-	-	-	-	26.00	3,120.00
9	Solera de 20x25 m, 6#4 y #3 @ 15 cms, superior	ml	145.00	26.00	3,770.00	-	-	-	-	26.00	3,770.00
10	Solera 20x25, 4#4 Y #3 @ 15 cm, de cierre	ml	139.00	8.48	1,178.72	-	-	-	-	8.48	1,178.72
11	Solera 20x25cm, 2#5+2#3, #2 @20, concreto 1:2:2, Voladizo	ml	155.00	3.00	465.00	-	-	-	-	3.00	465.00
12	Cargador de 15X17 cm, 3#3 Y #2@20 cm, concreto 1:2:2	ml	105.00	1.00	105.00	-	-	-	-	1.00	105.00
13	Batiente de 10X20 2#3, #2 @ 0.20 concreto 1:2:2	ml	150.00	16.35	2,452.50	-	-	-	-	16.35	2,452.50
14	Columna 25x25, 6#4, Y #3@15 cm, concreto 1:2:2	ml	200.00	23.75	4,750.00	-	-	-	-	23.75	4,750.00
15	Castillo 15x15, 4#3 y #2 @ 15,concreto 1:2:2	ml	134.00	3.50	469.00	-	-	-	-	3.50	469.00
SUB-TOTAL ESTRUCTURA					16,310.22	-	-	-	-		16,310.22
PAREDES											
16	Pared de bloque sisada	m³	136.00	60.00	8,160.00	-	-	-	-	60.00	8,160.00
17	Pintura en paredes y elementos estructurales	m²	31.00	121.44	3,764.64	-	-	-	-	121.44	3,764.64
NUEVAS ACTIVIDADES											
18	Tallados de elementos estructurales	ml	128.30	63.00	8,082.90	-	-	128.30	8,082.90	128.30	8,082.90
SUB-TOTAL PAREDES					11,924.64	-	-	-	8,082.90		20,007.54
PISOS											
19	Relleno con material selecto, incluye corredor	m³	137.00	17.32	2,372.84	-	-	-	-	17.32	2,372.84
20	Firme de concreto 1:2:2, e=5cm, refuerzo #2 @30 cm A.S. solo aula	m²	170.00	61.59	10,470.30	-	-	-	-	61.59	10,470.30
21	Piso para acera e=8 cm, incluye aceras y corredor	m²	144.00	32.93	4,741.92	-	-	-	-	32.93	4,741.92
22	Piso granito de 30x30 cm, en aula	m²	122.00	69.44	8,471.68	-	-	-	-	69.44	8,471.68
23	Piso de ladrillo plectrin rojo cruzado 25X25 cm en corredor	m²	115.00	18.30	2,104.50	-	-	-	-	18.30	2,104.50
24	Moldura para piso de granito 30X7cm	ml	42.00	40.11	1,684.62	-	-	-	-	40.11	1,684.62
SUB-TOTAL PISO					29,845.86	-	-	-	-		29,845.86
TECHO											
25	Techo de canaleta de 2"x6" y lamina de aluzinc legitimo	m²	212.32	81.53	17,310.72	-	-	-	-	81.53	17,310.72
SUB-TOTAL TECHO					17,310.72	-	-	-	-		17,310.72



CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES 9.00X8.00 M, INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL SUR, COLONIA SANTA ANITA.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE													
Descripción: Construcción Aula de Clases 9x8 m, Instituto Técnico Vocacional del Sur Ejecutor: Jorge Alcides Fuentes Perez Monto de Contrato: L. 112,599.47				Aldea: N/A Fecha Contrato: 24 de Agosto del 2018 Bo. Colonia: Santa Anita				Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 23 de Septiembre al 22 de Octubre del 2018					
ESTIMACIÓN # 03 POR MANO DE OBRA (FINAL)													
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL			
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	%	
PRELIMINARES													
1.0	Relleno con material selecto	m³	20.53	137.00	L. 2,812.61	20.53	2,812.61			20.53	L. 2,812.61	100.00%	
2.0	Trazado y marcado	ml	39.26	20.00	L. 785.20	26.00	L. 520.00	13.26	L. 265.20	39.26	L. 785.20	100.00%	
3.0	Excavación de material no calificado	m³	12.78	274.00	L. 3,501.72	9.10	L. 2,483.40	3.68	L. 1,008.32	12.78	L. 3,501.72	100.00%	
TOTAL						L. 7,099.53		L. 5,826.01		L. 1,273.52		7,099.53	100.00%
CIMENTACIÓN													
4.0	Relleno de material del sitio en zapatas aisladas	m³	2.30	30.00	L. 69.00	2.30	69.00			2.30	L. 69.00	100.00%	
5.0	Zapata aislada 0.80 x 0.80, e=0.25, 8 # 4, a.s.	unidad	5.00	350.00	L. 1,750.00	5.00	L. 1,750.00			5.00	L. 1,750.00	100.00%	
6.0	Cimentación de mampostería 0.50x0.70 m	m³	9.10	285.00	L. 2,593.50	9.10	L. 2,593.50			9.10	L. 2,593.50	100.00%	
7.0	Cimentación de mampostería 0.30x0.20 m en acera y corredor	m³	1.91	285.00	L. 544.35			1.91	L. 544.35	1.91	L. 544.35	100.00%	
TOTAL						L. 4,956.85		L. 4,412.50		L. 544.35		L. 4,956.85	100.00%
ESTRUCTURAS													
8.0	Solera de 15x20, 4#4, #3@20 concreto 1:2:2, inferior	ml	26.00	L. 120.00	L. 3,120.00	26.00	L. 3,120.00			26.00	L. 3,120.00	100.00%	
9.0	Solera de 20x25 m, 6#4 y #3 @ 15 cms, superior	ml	26.00	L. 145.00	L. 3,770.00	26.00	L. 3,770.00			26.00	L. 3,770.00	100.00%	
10.0	Solera 20x25, 4#4 Y #3 @ 15 cm, de cierre	ml	8.48	L. 139.00	L. 1,178.72	8.48	L. 1,178.72			8.48	L. 1,178.72	100.00%	
11.0	Solera 20x25cm, 2#5+2#3, #2 @ 20, concreto 1:2:2, Voladizo	ml	3.00	L. 155.00	L. 465.00	3.00	L. 465.00			3.00	L. 465.00	100.00%	
12.0	Cargador de 15x17 cm, 3#3 Y #2@20 cm, concreto 1:2:2	ml	1.00	L. 105.00	L. 105.00	1.00	L. 105.00			1.00	L. 105.00	100.00%	
13.0	Baliente de 10X20 2#3, #2 @ 0.20 concreto 1:2:2	ml	16.35	L. 150.00	L. 2,452.50	16.35	L. 2,452.50			16.35	L. 2,452.50	100.00%	
14.0	Columna 25x25, 6#4, Y #3@15 cm, concreto 1:2:2	ml	23.75	L. 200.00	L. 4,750.00	23.75	L. 4,750.00			23.75	L. 4,750.00	100.00%	
15.0	Castillo 15x15, 4#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2	ml	3.50	L. 134.00	L. 469.00	3.50	L. 469.00			3.50	L. 469.00	100.00%	
TOTAL						L. 16,310.22		16,310.22				L. 16,310.22	100.00%
PAREDES													
16.00	Pared de bloque sisada	m²	60.00	L. 136.00	L. 8,160.00	60.00	8,160.00			60.00	L. 8,160.00	100.00%	
17.00	Pintura en paredes y elementos estructurales	m²	121.44	L. 31.00	L. 3,764.64			121.44	L. 3,764.64	121.44	L. 3,764.64	100.00%	
18.00	Tallados de elementos estructurales	ml	128.30	L. 63.00	L. 8,082.90			128.30	L. 8,082.90	128.30	L. 8,082.90	100.00%	
TOTAL						L. 20,007.54		L. 8,160.00		L. 11,847.54		L. 20,007.54	100.00%
PISOS													
19.00	Relleno con material selecto, incluye corredor	m³	17.32	L. 137.00	L. 2,372.84			17.32	L. 2,372.84	17.32	L. 2,372.84	100.00%	
20.00	Firme de concreto 1:2:2, e=5cm, refuerzo #2 @30 cm A.S. solo aula	m²	61.59	L. 170.00	L. 10,470.30			61.59	L. 10,470.30	61.59	L. 10,470.30	100.00%	
21.00	Piso para acera e=8 cm, incluye aceras y corredor	m²	32.93	L. 144.00	L. 4,741.92			32.93	L. 4,741.92	32.93	L. 4,741.92	100.00%	
22.00	Piso granito de 30x30 cm, en aula	m²	69.44	L. 122.00	L. 8,471.68			69.44	L. 8,471.68	69.44	L. 8,471.68	100.00%	
23.00	Piso de ladrillo pedrín rojo cruzado 25X25 cm en corredor	m²	18.30	L. 115.00	L. 2,104.50			18.30	L. 2,104.50	18.30	L. 2,104.50	100.00%	
24.00	Moldura para piso de granito 30X7cm	ml	40.11	L. 42.00	L. 1,684.62			40.11	L. 1,684.62	40.11	L. 1,684.62	100.00%	
TOTAL						L. 29,845.86				L. 29,845.86		L. 29,845.86	100.00%


 INGENIERO CIVIL
 No. 116-17
 20-06-17
 BUREAU OF SERVICES
 No. 116-17


 U.T.M.
 U.T.M.

CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES 9.00X8.00 M, INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL SUR, COLONIA SANTA ANITA.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE																																							
Descripción: Construcción Aula de Clases 9x8 m, Instituto Técnico Vocacional del Sur Ejecutor: Jorge Alcides Fuentes Perez Monto de Contrato: L. 112,599.47			Aldea: N/A Fecha Contrato: 24 de Agosto del 2018 Bo. Colonia: Santa Anita			Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 28 de Septiembre al 22 de Octubre del 2018			 INGENIERO SUPERVISOR C.H. No. 22-06-17-06-06-17																														
ESTIMACIÓN # 03 POR MANO DE OBRA (FINAL)																																							
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL																													
				P.U.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	Cantidad	TOTAL L.																												
TECHO																																							
25.00	Techo de canaleta de 2"x6" y lamina de aluzinc legitimo	m ²	81.53	L. 212.32	L. 17,310.72	81.53	L. 17,310.72			81.53	L. 17,310.72	100.00%																											
	TOTAL				L. 17,310.72		L. 17,310.72				L. 17,310.72	100.00%																											
INSTALACIONES ELECTRICAS																																							
26.00	Circuito de iluminación hasta 15 amp. pvc conduit 1/2" C-40	ml	45.00	L. 16.00	L. 720.00			45.00	L. 720.00	45.00	L. 720.00	100.00%																											
27.00	Suministro e instalación de lamparas fluorescente de 2x40	unidad	6.00	L. 280.00	L. 1,680.00			6.00	L. 1,680.00	6.00	L. 1,680.00	100.00%																											
28.00	Circuito de fuerza hasta 20 amp. pvc conduit 3/4" C-40	ml	35.00	L. 16.25	L. 568.75			35.00	L. 568.75	35.00	L. 568.75	100.00%																											
29.00	Toma corriente doble 110 V interior	unidad	2.00	L. 135.00	L. 270.00			2.00	L. 270.00	2.00	L. 270.00	100.00%																											
30.00	Interruptor doble bajo repello	unidad	1.00	L. 135.00	L. 135.00			1.00	L. 135.00	1.00	L. 135.00	100.00%																											
31.00	Centro de carga de 6 espacios	unidad	1.00	L. 1,327.00	L. 1,327.00			1.00	L. 1,327.00	1.00	L. 1,327.00	100.00%																											
	TOTAL				L. 4,700.75				L. 4,700.75		L. 4,700.75	100.00%																											
PUERTAS Y VENTANAS																																							
32.00	Puerta de lamina troquelada	unidad	1.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00			1.00	L. 2,000.00	1.00	L. 2,000.00	100.00%																											
33.00	Balcones de tubo industrial	m ²	21.04	L. 450.00	L. 9,468.00			21.04	L. 9,468.00	21.04	L. 9,468.00	100.00%																											
	TOTAL				L. 11,468.00				L. 11,468.00		L. 11,468.00	100.00%																											
BANCA DE CONCRETO																																							
34.00	Banca de concreto en corredor	global	1.00	L. 900.00	L. 900.00			1.00	L. 900.00	1.00	L. 900.00	100.00%																											
	TOTAL				L. 900.00				L. 900.00		L. 900.00	100.00%																											
	GRAN TOTAL				L. 112,599.47		34,708.73		60,580.02		112,599.47	100.00%																											
En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor para lo cual firmo y selo.				<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>RETENCION ANTERIOR</th> <th>RETENCION ACTUAL</th> <th>RETENCION ACUMULADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MONTO ESTIMADO</td> <td>52,019.45</td> <td>60,580.02</td> <td>112,599.47</td> </tr> <tr> <td>Retención por Anticipo</td> <td>7,802.92</td> <td>9,087.00</td> <td>16,889.92</td> </tr> <tr> <td>Retención por I.S.R. (12.5%)</td> <td>352.43</td> <td>1,185.00</td> <td>1,537.43</td> </tr> <tr> <td>Retención por Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retención por Multa</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Neto a Pagar</td> <td>43,864.10</td> <td>50,308.02</td> <td>94,172.12</td> </tr> </tbody> </table>								DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA	MONTO ESTIMADO	52,019.45	60,580.02	112,599.47	Retención por Anticipo	7,802.92	9,087.00	16,889.92	Retención por I.S.R. (12.5%)	352.43	1,185.00	1,537.43	Retención por Calidad de Obra				Retención por Multa				Neto a Pagar	43,864.10	50,308.02	94,172.12
DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA																																				
MONTO ESTIMADO	52,019.45	60,580.02	112,599.47																																				
Retención por Anticipo	7,802.92	9,087.00	16,889.92																																				
Retención por I.S.R. (12.5%)	352.43	1,185.00	1,537.43																																				
Retención por Calidad de Obra																																							
Retención por Multa																																							
Neto a Pagar	43,864.10	50,308.02	94,172.12																																				
CONTRATISTA Firma:  Nombre: Jorge Alcides Fuentes Perez FECHA: 22/10/2018	INGENIERO SUPERVISOR  Firma:  Nombre: Ing. Eymar Rivera FECHA: 22/10/2018	COORDINADOR MAMBOCAURE  Firma:  Nombre: Ing. Leonidas FECHA: 22/10/2018	ALCALDE MUNICIPAL  Firma:  Nombre: Eddy Mendez Turcios FECHA: 22/10/18																																				


 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
 MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE
 U.T.M.
 SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS

CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES 9.00X8.00 M, INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL SUR,
COLONIA SANTA ANITA.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



INTERIOR



BANCA


INGENIERO
CIVIL
22-06-17
26-06-17
C.I.C.H. No. 7679

Ing. Eynar Rivera Araujo




CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES 9.00X8.00 M, INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL SUR,
COLONIA SANTA ANITA.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



FACHADA FRONTAL



FACHADA POSTERIOR


INGENIERO CIVIL
22-06-17
28-06-17
Ing. Eynarf Rivera Arag6, No. 1870


MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA DE LOS RIOS
U.T.M.
CALLE MONDOLFO

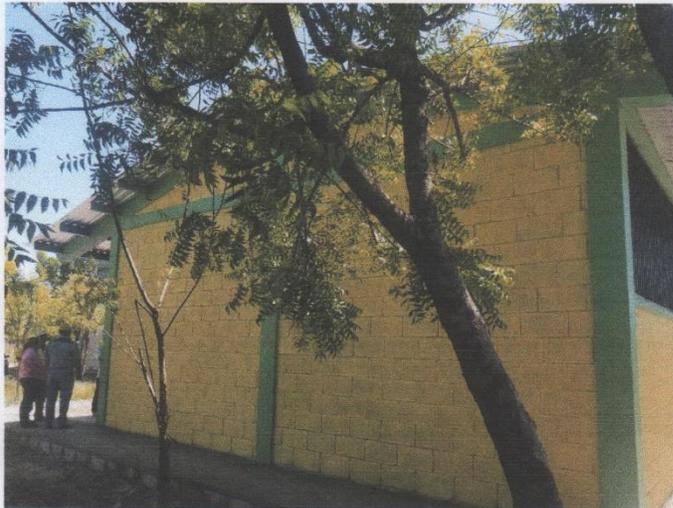
CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES 9.00X8.00 M, INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DEL SUR,
COLONIA SANTA ANITA.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



FACHADA LATERAL




INTERIOR


Ing. Eynar Rivera Araujo





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: munisay88@gmail.com



Acta de Recepción Provisional

Proyecto: **Construcción de Techo en Remodelación y Ampliación Centro Comunal.**


Ubicación: **Aldea Tablones Abajo, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con excepción de lo abajo indicado.

Se acuerda la recepción definitiva para el día: 12/09/2018.


REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:


Ninguna


Edas Mauricio Turcios Serrallón
Alcalde Municipal



12/09/2018
Fecha de Recepción Provisional


REPRESENTANTE
COMUNIDAD


Ing. Leonel Martínez
Supervisor de Obra



Edwin Edgardo Miranda
Rodríguez
Contratista

Tierra de Amigos y Frutas






Municipalidad de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: munisay88@gmail.com



Recepción Definitiva

Proyecto: **Construcción de Techo en Remodelación y Ampliación Centro Comunal.**

Ubicación: **Aldea Tablones Abajo, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del Estado relacionada(s) con la obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

Santa Ana de Yusguare, Choluteca 12/09/2018

Lugar y fecha



Edas Mauricio Turcios




Alcalde Municipal

12/09/2018


Fecha de Recepción Provisional



REPRESENTANTE
COMUNIDAD



Ing. Leonel Martínez
Supervisor de Obra




Edwin Edgardo Miranda
Rodríguez
Contratista

Tierra de Amigos y Frutas


Circular stamp of the Municipality of Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Honduras, with the name U.T.M. and the date 2018.



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: munisay88@gmail.com



Acta de Recepción Provisional


Proyecto: **Remodelación y Ampliación Centro Comunal.**
Ubicación: **Aldea Tablonés Abajo, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con excepción de lo abajo indicado.


Se acuerda la recepción definitiva para el día: 12/09/2018

REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:

Ninguna



Edas Mauricio Turcios Servellón
Alcalde Municipal
 12/09/2018.
Fecha de Recepción Provisional



REPRESENTANTE
COMUNIDAD


Ing. Leonel Martínez
Supervisor de Obra


JUAN CARLOS SERVELLÓN
Juan Carlos Servellón
Méndez
Contratista

Tierra de Amigos y Frutas



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare, Departamento de
Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: munisay88@gmail.com



Recepción Definitiva

Proyecto: **Remodelación y Ampliación Centro Comunal.**

Ubicación: **Aldea Tablones Abajo, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del Estado relacionada(s) con la obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

Santa Ana de Yusguare, Choluteca 12/09/2018.

Lugar y fecha

Edás Mauricio Turcios

Alcalde Municipal



12/09/2018

Fecha de Recepción Provisional

REPRESENTANTE
COMUNIDAD

Ing. Leonel Martínez

Supervisor de Obra




Juan Carlos Servellón

Juan Carlos Servellón
Méndez
Contratista

Tierra de Amigos y Frutas





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: munisay88@gmail.com



Acta de Recepción Provisional

Proyecto: **Construcción Caja Puente.**

Ubicación: **Barrio El Milagro, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con excepción de lo abajo indicado.

Se acuerda la recepción definitiva para el día: 23/03/2018

REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:

Ninguna

Edas Mauricio Turcios Selveillon
Alcalde Municipal



23/03/2018
Fecha de Recepción Provisional

REPRESENTANTE
COMUNIDAD U.T.M.
CHOLUTECA, HONDURAS




Ing. Leonel Martínez
Supervisor de Obra



Edwin Edgardo Miranda Rodríguez
Contratista

Tierra de Amigos y Frutas

U.T.M.
CHOLUTECA, HONDURAS



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare, Departamento de
Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: munisay88@gmail.com



Recepción Definitiva

Proyecto: **Construcción Caja Punte.**


Ubicación: **Barrio El Milagro, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.**
Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor,
cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del
adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y
entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o
la(s) institución(es) del Estado relacionada(s) con la obra ejecutada para que
asuman la responsabilidad que les corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

Santa Ana de Yusguare Choluteca 23/03/2018.


Lugar y fecha




Edas Mauricio Turcios S. *23/03/2018.*
Cayellon Fecha de Recepción Provisional
Alcalde Municipal



REPRESENTANTE
COMUNIDAD




Ing. Leonel Martínez
Supervisor de Obra


Edwin Edgardo Miranda
Rodríguez
Contratista

Tierra de Amigos y Frutas



U.T.M.
COMUNIDAD



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: munisay88@munisay.com



Acta de Recepción Provisional


Proyecto: **Construcción Centro de Capacidades Especiales.**
Ubicación: **Barrio El Centro, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.**
Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con excepción de lo abajo indicado.

Se acuerda la recepción definitiva para el día: 29/06/18


REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:


Se Realizo Ordendum por Mano de obra, #1 por el valor de L. 11,000.00 por Relleno y compactado con material selecto.


Se Realizo Orden de cambio al por el valor de L. 3,480.00 por 1.00 puerta de metal, lamina troquelada de 1 x 2.10 cm y 6.60 M2 de ventanas de aluminio y vidrio fijo.
Estas son las actividades que se realizaron y el Adendum y Orden de cambio al contrato.


Edas Mauricio Turcios S.
Alcalde Municipal


Fecha de Recepción Provisional 29/06/2018



REPRESENTANTE
COMUNIDAD



Ing. Leonel Martínez
Supervisor de Obra



Edwin Edgardo Miranda
Rodríguez
Contratista

Tierra de Amigos y Frutas



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: munisay88@gmail.com



Recepción Definitiva

Proyecto: **Construcción Centro de Capacidades Especiales.**

Ubicación: **Barrio El Centro, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.**
Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del Estado relacionada(s) con la obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

Santa Ana de Yusguare, Choluteca 29/06/2018

Lugar y fecha

Edas Mauricio Turcios S

Alcalde Municipal

29/06/2018
Fecha de Recepción Provisional

REPRESENTANTE
COMUNIDAD

Ing. Leonel Martínez

Supervisor de Obra

Edwin Edgardo Miranda Rodríguez
Contratista

Tierra de Amigos y Frutas
