



República de Honduras

Alcaldía Municipal de Tela

Periodo 2018 - 2022

Tu Municipalidad de Puertas Abiertas

DEPARTAMENTO DE OBRAS

PÚBLICAS

PROYECTOS DE INFRA ESTRUCTURAS

MES DE FEBRERO



WWW.FACEBOOK.COM/MUNICIPALIDADTELA
WWW.TWITTER.COM/AMTELAHN
WWW.INSTAGRAM.COM/MUNICIPALIDADDETELA



MEMORANDUM

Para: **Axel Fabricio Calix**
Oficial de Información Pública

De: Ing. Alex Nolasco
Gerente Obras Públicas

Fecha: 28 DE FEBRERO del 2020

Asunto: **Proyectos de Infraestructura**



La presente es para notificarles la ejecución del mes febrero del 2020, de proyectos de infraestructura. Para el portal de transparencia.

Sin otro particular.

ATTE:



MUNICIPALIDAD DE TELA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS
PERIODO 01-31 DE ENERO DEL 2020


IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO											
CODIGO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION (PROYECTO)	Fecha de finalizacion proyectada	ORDEN DE CAMBIO		MODIFICACION DE CONTRATO		AMPLIACION DE TIEMPO		RESISION DE CONTRATOS					
																SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
46610	Sector Tela nuevo, caso urbano la	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, 180 M.L. DEL BARRIO LA ISLA"	Barrio la Isla	La construccion de este tramo mejorara la infraestructura vial del sector.	Se propone la pavimentación de 180 m.l. de pavimento hidráulico con un ancho de trocha de 7.30 m. y un espesor de 15 cm. Utilizando un concreto de 4,000 PIS. Cabe mencionar que deberá iniciar con el descapote de una capa de suelo mínima de 25 cm, conformar y compactar con material selecto	Mejorar la red vial del sector barrio la Isla, aumentando la plusvalía de las casas y haciendo de Tela un sector turístico con mayor comodidad para el viajero o visitante.	Pavimentacion de concreto Hidrahulico.	mejoramiento vial existente	Departamento de obras Publicas/contratista	Gobierno Central	AGOSTO 2019	824,705.31	70%	1,178,150.44	28 de febrero 2020	x			x					x			
46610	Sector Tela nuevo, caso urbano la	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO, CAIMITOS-CAMPO DE GOLF	Barrio la Isla	Contar con un acceso alterno a la ciudad	Se propone dos puentes de acceso, de 6 metros de ancho y colocados linealmente ya que servirían para cruzar una escorrentía permanente (acceso 1) y un canal de drenaje de aguas lluvias (acceso 2). Este va consistir en instalación de 4 líneas de perfiles tipo H, a ser utilizados como vigas a cada dos metros, cabezales de mampostería en los extremos (4 unidades), fundición de una losa sobre los perfiles. El espesor de la misma será de 30 cm, acero de 5/8@ 20cm. En sentido Long. Y #4 @ en sentido transversal, doble armado. Concreto de 6000 PSI.	Habilitar un acceso olvidado por las autoridades anteriores y que es de mucho riesgo para sus transeúntes y vehículos que usan dicho acceso desde la CA13- la ciudad.	Caja puente de cabezales de piedra y losa de concreto hidrahulico y estructura metalica	Mejorar el acceso existente	Departamento de obras Publicas /contratista	Gobierno Central	AGOSTO 2020	346,208.43	20%	1,731,042.13	31 de marzo	x			x					x			



ANEXOS;



CABEZAL SUR FUNDIDO Y ENCOFRADO DE CABEZAL NORTE

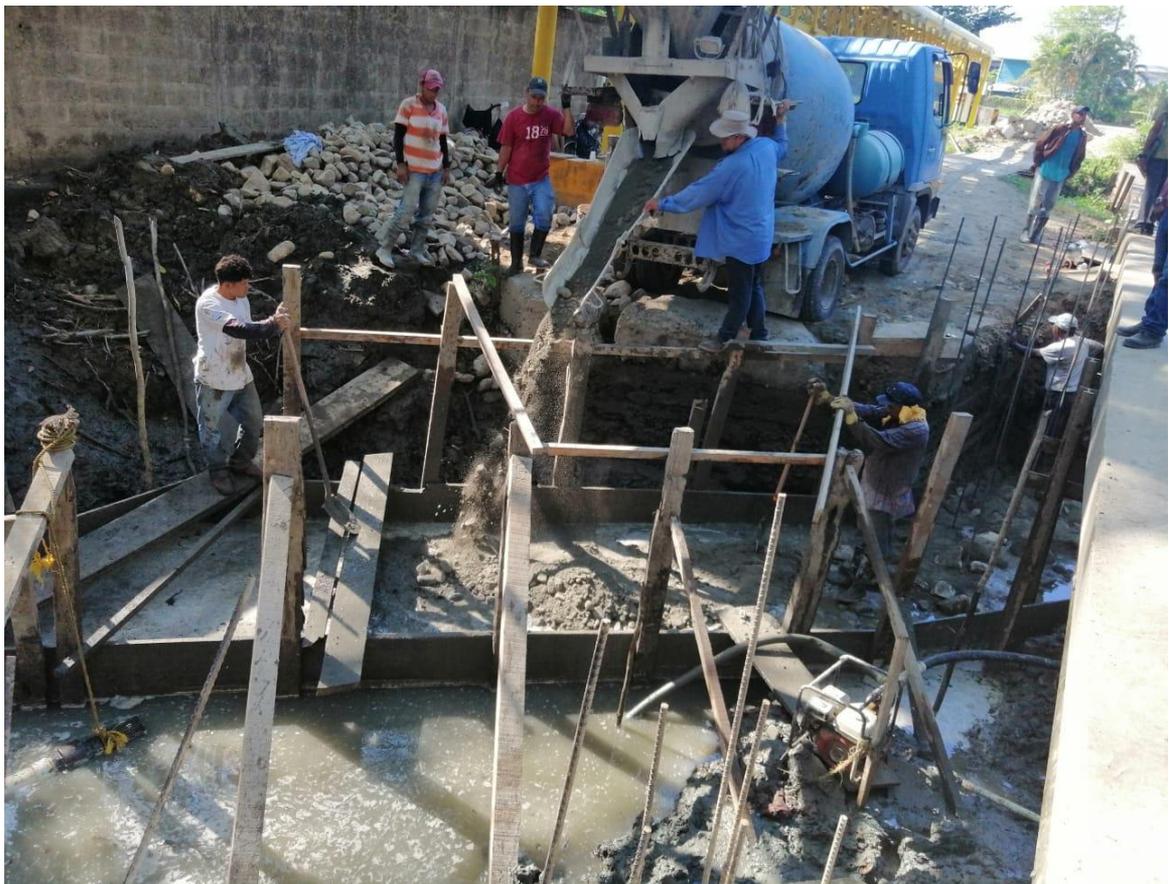

FUNDICION, PARTE DE CABEZAL NORTE



PAVIMENTO DE BARRIO LA ISLA



PAVIMENTO DEL BARRIO LA ISLA , EJECUTADO EN UN 70 % , DEL MONTO TOTAL DE LA PRIMERA ETAPA
