

# República de Honduras Alcaldia Municipal de Tela Periodo 2018 - 2022 Tu Municipalidad de Puertas Abiertas

## **DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**

PROYECTOS DE OBRAS CIVILES

MES DE DICIEMBRE DEL 2019





# **MEMORANDUM**

PARA:

AXEL FABRICIO CALIX
JEFE DE INFORMATICA



DE: ALEX NOLASCO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO: PROYECTOS DE OBRAS CIVILES, CASCO URBANO

REMITIDO PROYECTOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2019, INFORME DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PORTAL DE TRASPARENCIA

# MUNICIPALIDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

## INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS  DEPLODO 01 21 DE DICEMARDE DEL 2019																							
						PERIODO 01-31 DE DICEIMBRE DEL 2019										EJECUCION DEL PROYECTO							
		IDE	NTIFICACIO	ON DEL PROYECTO	)	ELABORACION DEL PROYECTO										OR	RDEN DE CAMBIO MOFICACION DE CONTRATO			AMPLIACION DE TIEMPO		RESICION DE CONTRATOS	
CODIGO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓ N DEL PROYECT O	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN E TERRENO Y ASENTAMIENT	DEL ENCARGAD	FUENTES DE FINANCI AMIENT O	FECHA DE APROBACIO N DEL PRESUPUEST O DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	ESTADO DEL PROYECT O	COSTO DE FINALIZACION ( PROYECTO)	Fecha de finalizacion proyectada	SI NO	JUSTIFICACION S	SI NO	JUSTIFICACION S	I NO JU	USTIFICACION	SI NO	JUSTIFICACION
46610	Sector Tela nuevo, caso urbano la	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, 180 M.L. DEL BARRIO LA ISLA"	Barrio la Isla	este tramo mejorara la	Se propone la pavimentación de 180 m.l. de pavimento hidráulico con un ancho de trocha de 7.30 m. y un espesor de 15 cm. Utilizando un concreto de 4,000 PIS. Cabe mencionar que deberá iniciar con el descapote de una capa de suelo mínima de 25 cm, conformar y compactar con material selecto	Mejorar la red vial del sector barrio la Isla, aumentando la plusvalía de las casas y haciendo de Tela un sector turístico con mayor comodidad para el viajero o visitante.	concreto	mejoramiento vial existente	Departamento de obras Publicas/contra tista	Gobierno Central	AGOSTO 2019	58,907.52	5%	L. 1178,150.44	28 de febrero 2020	x		x				x	
46610	Sector Tela nuevo, caso urbano la	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO, CAIMITOS- CAMPO DE GOLF	Barrio la Isla		Se propone dos puentes de acceso, de 6 metros de ancho y colocados linealmente ya que servirían para cruzar una escorrentía permanente (acceso 1) y un canal de drenaje de aguas lluvias (acceso 2). Este va consistir en instalación de 4 líneas de perfiles tipo H, a ser utilizados como vigas a cada dos metros, cabezales de mampostería en los extremos (4 unidades), fundición de una losa sobre los perfiles. El espesor de la misma será de 30 cm, acero de 5/8@ 20cm. En sentido Long. Y #4 @ en sentido transversal, doble armado. Concreto de 6000 PSI.	Habilitar un acceso olvidado por las autoridades anteriores y que es de mucho riesgo para sus transeúntes y vehículos que usan dicho acceso desde la CA13- la ciudad.	Caja puente de cabezales de piedra y losa de concreto hidrahulico y estructura metalica	existente	Departamento de obras Publicas /contratista	Gobierno Central	AGOSTO 2020	51,931.26	3%	L. 1731,042.13	31 de marzo 2020	x		x				x	
46614	Sector de Tela Viejo	Bacheo del casco urbano	l .	Mejoramiento vial del casco urbano	Consiste en la reparacion de 80 metros cuadros de pavimento de concreto hidrahulico	Mejorar la calidad de vida de los vecinos y megocios vecinos	Reparacion de pavimento de cocreto hidrahulico de 20 cm. De espesor, de 4000 PSI	Mejorar el acceso existente	Departamento de obras Publicas /contratista	Municipali dad de Tela /donante	OCTUBRE 2021	11,999.80	15%	L. 79,998.68	15 de febrero 2020	x		x				x	




Ilustracion1. Remocion de material sobrante.



Ilustracion2. Trabajos de corte de material sobrante.



Ilustracion3. Demolision de estructura existente.

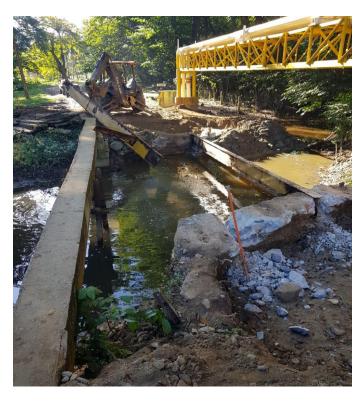

Ilustracion4. Extraccion de vigas H existentes.



Ilustracion5. Demolicion y compactacion de material selecto nuevo.



Ilustracion6. Fundicion de losa de concreto hidraulico Nueva.
