MEMORANDUM **Ingeniería IN-009-2015**

PARA: *Lic. Dilia Martínez*
Oficial de Información Pública

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Departamento

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 28 de Enero del 2016

Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de Avance Físico Mensual de los proyectos en ejecución del mes de Enero del año 2016.

Atentamente,

Cc. Archivo.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE ENERO DEL 2016

PROYECTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO ENERO	ACUMULADO A ENERO	% AVANCE
01	CANALIZACIONES	M^3	485,250	0	0	0	0.0%
02	ESPIGONES	M^3	11,850	0	744	744	6.3%
03	ALCANTARILLAS	ML	180	0	0	0	0.0%
04	BORDOS	M^3	400,000	0	0	0	0.0%

COMISION VALLE DE SULA
ccivs
Ingenieria

Ing. Neil Patrick Díaz R.
Jefe departamento Ingeniería.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Proyectos de Inversión en ejecución

Periodo Enero Año 2016

No	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA	Nº DE CONTRATO
1	Obras de protección y reparación de estructura del Alivio La Fragua II etapa	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES PARAISO	P2-011-2015 CCIVS

COMISION VALLE DE SULA
CCIVS
Ingenieria

ING. NEIL PATRICK DIAZ R.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
CCIVS

CUADRO DE AVANCE FISICO
Año 2016

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Harry Lobo
Periodo: 01 de ENERO al 31 DE ENERO 2016

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada						Avance fisico				Observaciones
		Departamento	Municipio			Descripción	Unidad	Cantidad	Obra Ejecutada Mes Anterior	Obra Ejecutada Mes	Obra Ejecutada Acumulada	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades Acumuladas	% Efectuado Acumulado	
1	Estructuras de Control															
1.1	Obras de Proteccion y reparacion de Estructura del Alivio La fragua II Etapa	Yoro	El Progreso	CONSTRUCTORA PARAISO	P2-011-2015 CCIVS	terraceria	M³	14,910.00	12,710.40	550.00	13,260.40	12,710.40	550.00	13,260.40	88.94%	proyecto en proceso de ejecucion
						concreto premezclado	M³	1,272.00	836.92	80.00	916.92	836.92	80.00	916.92	72.08%	
						gaviones	M³	2,071.00	1,691.00	100.00	1,791.00	1,691.00	100.00	1,791.00	86.48%	
						tablaestaca con polimeros UC.75	M³	144.00	119.60	6.48	126.08	119.60	6.48	126.08	87.56%	
						tablaestaca con polimeros UC.95	M³	160.00	135.04	7.74	142.78	135.04	7.74	142.78	89.24%	
	TOTALES															

Ing. Harry Lobo
Coordinador de Proyectos
CCIVS

Vobo
Ing. Neil Diaz
Jefe Departamento de Ingeniería
CCIVS

COMISION VALLE DE SULA
CCIVS
Ingenieria
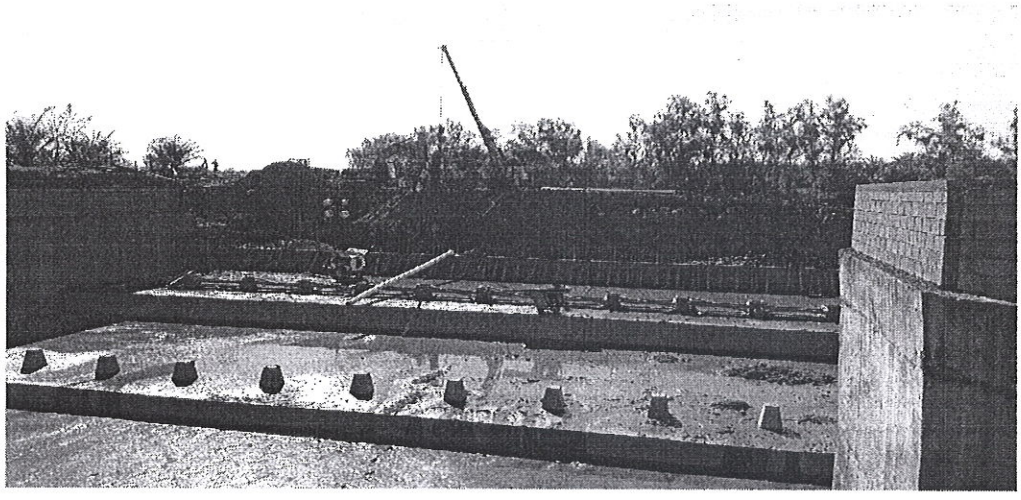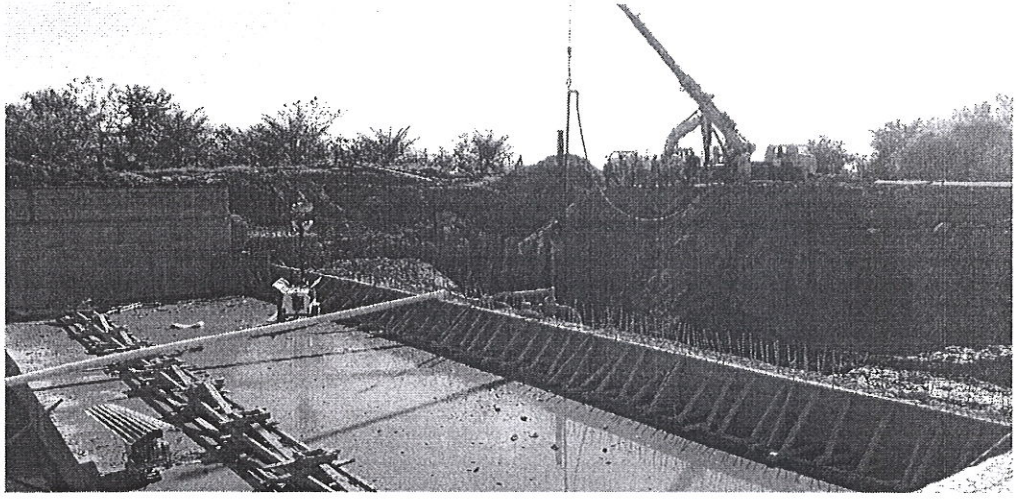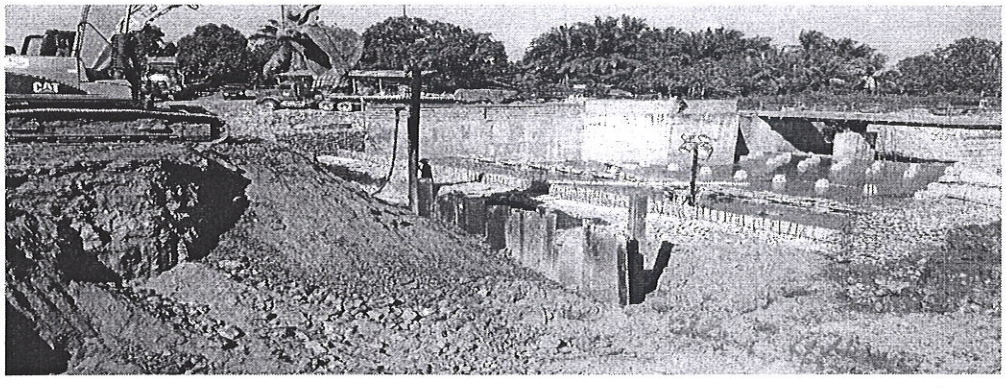
Avance físico Enero 2016 proyecto: Obras de Protección y reparación de Estructura del Alivio La fragua II Etapa
