HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Agricultura y Ganadería
Gobierno de la República

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Informe del estatus de la Cartera de Proyectos ejecutados por la SAG

Julio 2022

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al **31** de **Julio** del Año 2022.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2022, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Proyectos.

Edith Larios
Asesora Ministerial
SAG-UPEG

Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor para contribuir a la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política, se basan en la promoción de un modelo económico alternativo orientado a fortalecer el rol del Estado en la economía, especialmente en las áreas estratégicas y servicios públicos, y formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas a fortalecer los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil/Privada y Social, como las cooperativas, cajas rurales, y los emprendimientos solidarios. En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

a) Ejercer acciones como coordinadora del sector público agroalimentario;
b) Atender las funciones institucionales específicas; y,
c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 4 proyectos que se detallan en el presente documento.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 4 proyectos:

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).
4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).

Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA, OFID y Exim Bank, de la India, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un presupuesto vigente de **L 633,178,283.00** representando un **30.11%** del presupuesto total de la institución **L 2,102,573,096.00.** Los Proyectos de inversión reflejan una ejecución al 31 de julio 2022 de **L 64,411,712.06**

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	Ejecución acumulada al 31 de Julio
Fuente 11: Fondos Nacionales	34,974,001.00	123,687.71	665,209.41
Fuente 21: Crédito Externo	586,204,282.00	64,288,024.35	136,497,977.76
BCIE	216,604,399.00	37,671,152.30	100,881,520.52
OFID	61,149,881.00	-	-
FIDA	118,949,002.00	26,616,872.05	35,616,457.24
INDIA	189,501,000.00	-	-
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	12,000,000.00	-	-
	633,178,283.00	**64,411,712.06**	**137,163,187.17**

Fuente: SIAFI

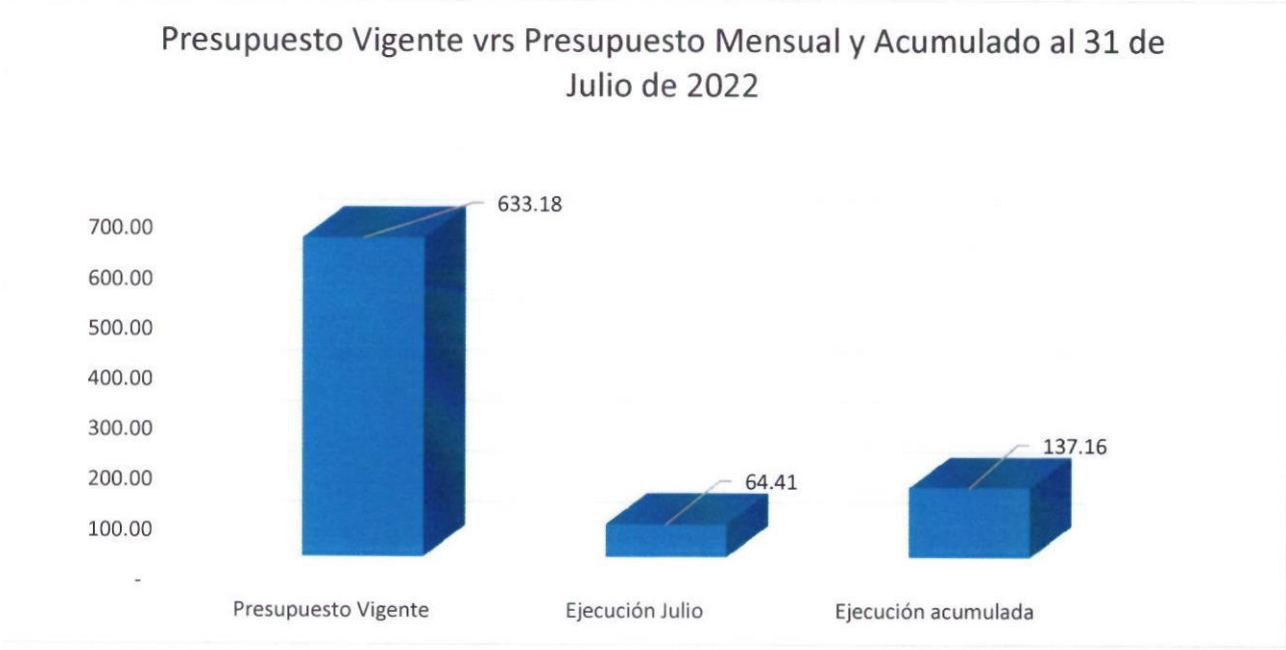

Fuente: Elaboración propia, Datos SIAFI

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián.
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa.
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Olomán.
4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco.
5. Diseño y construcción de Pequeño Riego.

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019. Es relevante destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021), mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.

Es oportuno mencionar que nuevamente se ha dado una nueva ampliación a la ejecución del Proyecto mediante Resolución de Directorio No. DI-160/2021, del 18 de noviembre de 2021, el Directorio del BCIE autorizó ampliar hasta el 29 de noviembre del 2023 el plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo No. 2101, autorizado a la República de Honduras para financiar el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de julio, 2022:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Julio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	27,262,801.00	27,262,801.00	123,687.71	0.45	665,209.41	2.44	26,571,904.99
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	216,604,399.00	216,604,399.00	37,671,152.30	17.39	100,881,520.52	46.57	111,263,135.56
Total	**243,867,200.00**	**243,867,200.00**	**37,794,840.01**	**15.50**	**101,546,729.93**	**41.64**	**137,835,040.55**

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	1,300	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	0	0	0	110	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	2,755	2755	100
	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	0	0	0	110	0	0
	Represas construidas para los sistemas de riego instalados, en tierras agrícolas de los productores /as.	Obra de Infraestructura	0	0	0	2	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	10	0	0	130	0	0
	Grupos empresariales de productores/as organizados, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	0	0	0	5	0	0
Nivel de Ejecución			**Mensual**		**0**	**Anual**		**14**

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	1	0	0	13	3.89	30
Asistencia Técnica y Comercialización	Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial). Aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	3	0	0	16	0	0
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	3	0	0	20	0	0
Organización y Desarrollo Local	Capacitaciones brindadas a Productores y productoras de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias), aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	0	0	0	2	0	0
Gestión Ambiental	Capacitaciones impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas. aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	0	4	0	50	38	76
Nivel de Ejecución			**Mensual**		**0**	**Anual**		**21**

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes de julio:

- Se capacitaron 142 beneficiarios de los proyectos de riego y miembros de actores clave de la gestión ambiental en 4 talleres de buenas prácticas amigables con el ambiente y en protección de cuencas hidrográficas, durante el mes de Julio, con lo que se alcanzó el 97% del cumplimiento en la cantidad de personas a capacitar por la empresa SERTYCO[1].

Problemática que afectó la ejecución en el mes de julio:

- La baja ejecución reflejada en este mes se debe a que a la fecha no se ha contratado a la empresa consultora que realiza dichos trabajos.

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación. El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609,235,000.00.

El Proyecto inició 01/12/2016 y su fecha de finalización es 28/08/2022.

Localización: La zona de intervención del Proyecto es el departamento de El Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de Julio:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos JAMASTRAN
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al 31 de Julio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	189,501,000.00	189,501,000.00	-	0.00	-	0.00	189,501,000.00
TOTAL	**189,501,000.00**	**189,501,000.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**189,501,000.00**

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
JAMASTRÁN

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Proyecto Desarrollo Agrícola bajo Riego Valle de Jamastrán Fase I	Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastrán.	Estación	0	0	0	60	0	0
Nivel de Ejecución			**Mensual**		**0**	**Anual**		**0**

Actividad/Obra	Resultado de Producción		Avance Físico mes de Julio	Ejecución Acumulada

		Unidad de Medida	Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Infraestructura de Riego	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	0	0	0	100	0	0
Nivel de Ejecución			**Mensual**		**0**	**Anual**		**0**

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes de Julio:

- No se cuenta con ninguna actividad relevante para este mes de julio.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de julio:

- Se está en la recopilación de documentos para poder solicitar el desembolso respectivo según avances del contratista.
- Los desembolsos no se han podido realizar en vista que no se han realizado avances según contrato.
- Se han comenzado con las perforaciones de pozos, sin embargo, aún no se tiene el reporte del caudal.

3. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA)

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida,

Cortés y Santa Barbará, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33,000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total de L.574,086,000. El Proyecto inició 15/04/2016 y su fecha de finalización es 30/09/2022.

Localización: La zona de intervención del proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira. Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de Julio:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al 31 de Julio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	118,949,002.00	118,949,002.00	26,616,872.05	22.38	35,616,457.24	29.94	72,019,470.63
Total	**118,949,002.00**	**118,949,002.00**	**26,616,872.05**	**22.38**	**35,616,457.24**	**29.94**	**72,019,470.63**

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
PROLENCA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Programa de Competitividad Rural	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias	Plan de Inversión	10	21	210	65	21	32
	Desembolsos realizados a las Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Cantidad	10	21	210	65	21	32
Nivel de Ejecución			**Mensual**		**210**	**Anual**		**32**

Actividad / Obra	Resultado de Producción		Avance Físico mes de Julio	Ejecución Acumulada

		Unidad de Medida	Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan de Inversión	0	0	0	65	0	0
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas.	Plan	0	0	0	65	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	5	24	480	25	24	96
	Asistencia técnica a Productores(as) rurales de las organizaciones beneficiarias, aplicando medidas de bioseguridad.	Asistencia técnica	0	0	0	65	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II	Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	5	17	340	40	25	63
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola	Kilómetro	0	0	0	1	0	0
	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola (FIDA II)	Kilómetro	0	0	0	19	0	0
	Rehabilitadas hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego (FIDA II)	Hectárea	0	0	0	50	0	0
Nivel de Ejecución			**Mensual**		**103**	**Anual**		**20**

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de julio:

- Se llevó a cabo la misión con el FIDA de apoyo a la implementación del proyecto, se realizó la revisión y primera modificación del POA-PAC 2022.
- Revisión de la propuesta de carta de entendimiento para el fortalecimiento de SAG-DICTA en Intibucá.
- Visitas de campo a las microcuencas para coordinación de actividades de reforestación e instalación de letrinas y eco fogones.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de julio:

- No reportaron ninguna problemática relevante para este mes de julio.

4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)

Objetivo: Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizadas y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

La población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conformaran 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colón.

El Proyecto tiene una inversión total de L. 1, 026,645,518.00.

El Proyecto inició 03/01/2022 y su fecha de finalización es al 31/12/2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en:

- **Departamento de Atlántida:** Jutiapa.
- **Departamento de Yoro:** Olanchito, Jocón y Arenal.
- **Departamento de Colón**: Balfate, Tocoa, Sonaguera, Trujillo; Sabá, Limón, Bonito Oriental, Santa Rosa de Agúan y Santa Fé.
- **Departamento de Olancho:** Guata, Gualaco, Yocón, Jano, Esquipulas del Norte, Mangulile, El Rosario, San Esteban y La Unión.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de julo:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al 31 de Julio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Julio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	7,711,200.00	7,711,200.00	-	0.00	-	0.00	7,711,200.00
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	66,797,831.00	61,149,881.00	-	0.00	-	0.00	61,149,881.00
Fuente 21: Crédito Externo OFID	240,000.00	240,000.00	-	0.00	-	0.00	240,000.00
Fuente 22: Donaciones Externas	12,000,000.00	12,000,000.00	-	0.00	-	0.00	12,000,000.00
Total	**86,749,031.00**	**81,101,081.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**81,101,081.00**

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2022
PROINORTE

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Alianzas comerciales inclusivas y sostenibles suscritas con las organizaciones beneficiadas.	Contrato	0	0	0	1	0	0
	Inversiones productivas financiadas a las organizaciones con el fondo de capitalización.	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0
	Estaciones agroclimáticas instaladas en territorios de las organizaciones beneficiadas.	Estación	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			**Mensual**		**0**	**Anual**		**0**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Julio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Julio	Ejecutado a Julio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Julio	%
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.	Diagnósticos Territoriales elaborados.	Diagnostico	0	0	0	17	0	0
	Cadenas de valor productivas priorizadas.	Análisis	0	0	0	3	0	0

	Diseño de campaña de concientización implementada.	Campaña	0	0	0	1	0	0
Desarrollo Productivo y Resiliencia	Inversiones productivas aprobadas por el comité de inversiones.	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0
	Planes productivos de Inversión Formulados.	Plan de Inversión	0	0	0	1	0	0
	Capacitaciones brindadas a los administradores de las estaciones agroclimáticas.	Capacitación	0	0	0	1	0	0
	Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) elaborados.	Estudio	0	0	0	1	0	0
	Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kits	1	0	0	2	0	0
Nivel de Ejecución			**Mensual**		**0**	**Anual**		**0**

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de julio:

- No se cuenta con ninguna actividad relevante para este mes de julio.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de julio:

- No se ha podido realizar ninguna acción administrativa directa del proyecto por falta de finalización de condiciones previas para desembolso.
- No se tiene aún las condiciones previas para poder obtener el desembolso y realizar pagos.
- Por falta de cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso (FIDA), no se ha podido realizar ejecución técnica.

Conclusiones

- El presupuesto ejecutado en el mes de junio es de L 64,411,712.06 de la cartera de proyectos vigente correspondiente a L 633,178,283.00. Es importante mencionar que la ejecución financiera acumulada al mes de julio es de L 137,163,187.17 la cual corresponde a un 21.66% del vigente.

- Los Proyectos NO lograron la ejecución física y financiera esperada para este mes del presente año. Cabe resaltar que los proyectos en general presentan baja ejecución debido a la falta de

personal técnico, ya que la mayoría de estos empleados laboraban bajo la modalidad de contrato que finalizó el 31 de diciembre del 2021. No obstante, la ejecución financiera de algunos proyectos reflejada en el mes de junio 2022, corresponde a gastos administrativos de sueldos, salarios y pago de estimaciones.

Recomendaciones

- Continuar con un seguimiento constante en conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad Administradora de Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los cuellos de botella que desfasen la ejecución, tanto financiera como física de todos los proyectos de la Cartera de esta Secretaría de Estado.

- Para el año 2022, se debe dar una mayor celeridad a los procesos de adquisiciones para obtener un mejor nivel de ejecución, tanto físico como financiero en los proyectos.

Fecha de Elaboración: 09 de agosto de 2022

Elaborado por: Olman Valeriano Coello / Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.
