2016

INFORME MENSUAL ENERO

MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RESPONSABLE: ING. CLAUDIA ZALDIVAR

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C.A.

INDICE

CONTENIDO **Nº PAG.**

1. EVALUACIONES REALIZADAS.....2

2. PROYECTOS PRESUPUESTADOS.....3

3. PROYECTOS EN EJECUCION.....6

4. PROYECTOS RECEPCIONADOS.....15

5. TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL 21

6. VARIOS.....22

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CO... MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES Honduras, C. A

1. EVALUACIONES REALIZADAS:

La Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de los Departamentos de Desarrollo Social y Mantenimiento Municipal y Proyectos Menores hacen las evaluaciones de las solicitudes de materiales que ingresan a la Municipalidad, para lo cual se hace un estudio socioeconómico (Promotores) y una visita de campo para constatar que lo solicitado está de acuerdo con las necesidades del solicitante.

Mejoramiento de la Red de Distribución Eléctrica en Aldea El Chile (Priorizado): se realiza la inspección del sistema eléctrico de distribución para mejorar las condiciones de este.

Reparación de Sistema de Iluminación en Cancha Multiusos de Barrio Pueblo Nuevo, Sector Pueblo Nuevo: se realiza la inspección del sistema eléctrico para iluminación

2. PROYECTOS PRESUPUESTADOS:

2.1 Salud:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Construcción de Cerco Perimetral Y Canal de Bloque en Centro de Salud (Priorizado)	Aldea Kele-Kele, Sector Ramal de Lima	–	En proceso de Aprobación.
	TOTAL PROYECTOS DE SALUD			–

2.2 Educación:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Construcción de 2 Aulas (Priorizado)	Aldea Amigos del Campo, Sector El Chile	–	En proceso de Aprobación.
2	Construcción Galera en Esc. Francisco Morazán	Aldea Bajamar, Sector Garífuna	–	En proceso de Aprobación.
TOTAL PROYECTOS DE EDUCACION				–

2.3 Red Vial:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Pintura de Bordillos	Desde Boulevard de Cienaguita hasta la Playa	–	En proceso de Aprobación.
2	Pintura de Bordillos y Barandales de Puentes	Desde Redondel de Base Naval hasta Gasolinera UNO	–	En proceso de Aprobación.
3	Pintura de Túmulos	Frente a F.D.R., Frente a Base Naval y calle principal de Barrio El Porvenir	–	En proceso de Aprobación.
TOTAL PROYECTOS DE RED VIAL				–

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras C.A.

2.4 Proyectos Sociales:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Remodelación de Centro Social (Priorizado)	Nuevos Horizontes	–	En proceso de Aprobación.
2	Nuevos Horizontes	Buena Vista, Sector Ecoturístico	–	En proceso de Aprobación.
3	Construcción Centro Social (Priorizado)	Colonia Episcopal El Record	–	En proceso de Aprobación.
4	Construcción Centro Social	Aldea Nola	–	En proceso de Aprobación.
5	Culminación Centro Social (Priorizado)	Remolino El Tigre	–	En proceso de Aprobación.
6	Construcción Centro Social	Aldea Nola, Sector Ramal de Lima	–	En proceso de Aprobación.
7	Construcción Centro Social	Episcopal El Record, Sector El Chile	–	En proceso de Aprobación.
8	Culminación Centro Social (Priorizado)	Aldea Remolino El Tigre, Sector Garífuna	–	En proceso de Aprobación.
TOTAL PROYECTOS SOCIALES				–

2.5 Seguridad Ciudadana:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Reparación de Alumbrado Publico	Barrio Marejada, Sector Península Oeste	–	En proceso de Aprobación.
2	Reparación de Alumbrado publico	Colonia La Roca, Sector Pueblo Nuevo	–	En proceso de Aprobación.
3	Reparación de Alumbrado publico	Sector Sur de Barrio Pueblo Nuevo	–	En proceso de Aprobación.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C. A.

4	Reparación de Alumbrado Publico	Barrio San Isidro 1, 2 y 3 Calle desde 8 a 11 Avenida, Sector Península Oeste	–	En proceso de Aprobación.
5	Reparación de Alumbrado Publico	Barrio San Ramón 4 y 5 Avenida de 2 a 6 Calle, Sector Península Oeste	–	En proceso de Aprobación.
TOTAL PROYECTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA				–

Nota: Los proyectos que no tienen un monto de contrato, están a nivel de presupuesto base.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C. A.

3 PROYECTOS EN EJECUCION:

3.1 Jardín de Niños Gladys Ondina Jhonson (Priorizado), Aldea Banderas Tres, Sector Chameleconcito: Consiste en la construcción de un salón de clases para jardín de niños con paredes de bloques de concreto de 6" repelladas, pulidas y pintadas, estructura de techo metálica y cubierta de techo con lamina de aluzinc, cielo falso de tablayeso, piso de cerámica, cerco perimetral, aula para centro de tecnología infantil, bodega, base para tanque de almacenamiento de agua, tanque de almacenamiento de agua, dos sanitarios, área de juego, rampa de acceso a centro educativo. Dicho proyecto se hizo con contraparte de la fundación Ficohsa siendo el monto total invertido por la Municipalidad de Lps.477,151.62

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C.A.

Responsable: Ing. Claudia Zaldívar

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CO
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C.A.

3.2 Construcción de Cerco Perimetral en Esc. Zacarías Mena, Banderas Tres, Sector Chameleconcito: Con un Monto de L.526,293.02 el cual consiste en el cercado de todo el perímetro de la escuela con bloque de 6" sisado y lechado, pie de amigo en la parte posterior del cerco para darle un mayor refuerzo, columnas y vigas de concreto armado, portón principal vehicular y portón lateral peatonal.

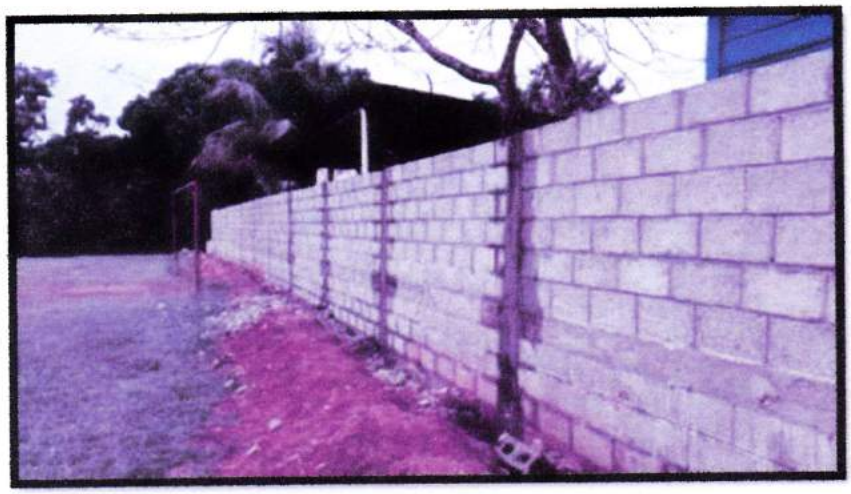

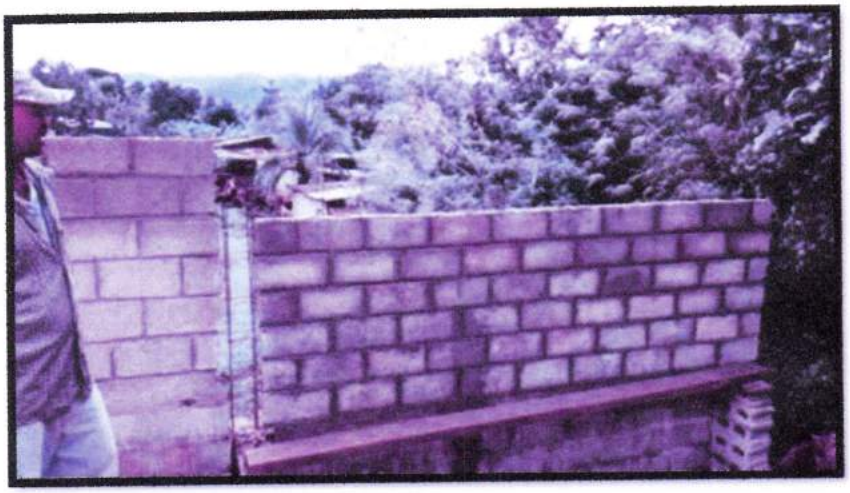

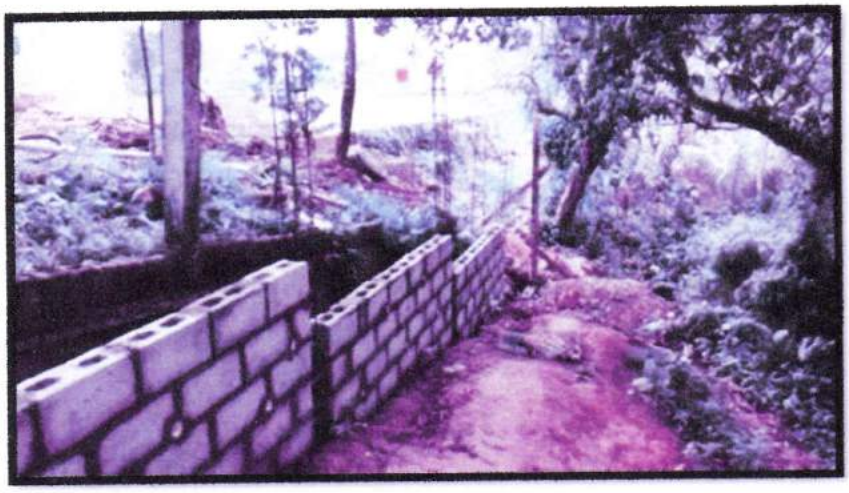

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CO.
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C.A.

3.3 Ampliación de Centro Social, Aldea Caoba, Sector Calan. Consiste de la construcción de cimiento corrido, sobreelevación bloque de 6", elementos estructurales (soleras, castillos,) pared de bloque de 6", piso de concreto, techo con estructura de canaleta, lamina de aluzinc, ventana con tubo estructura y sistema eléctrico.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO C
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras

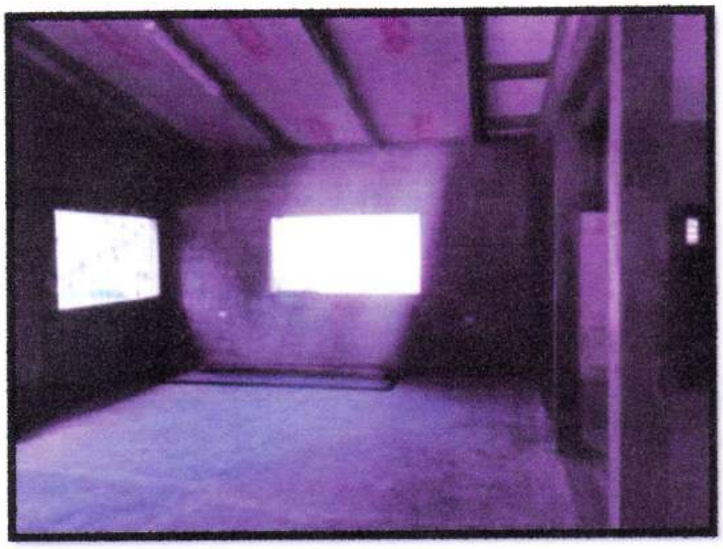

3.4 Empedrado de Calle Principal desde Entrada a Callejón La Financiera hasta Gradas de Acceso Peatonal (Priorizados), Colonia Emsland, Sector Zapadril: Consiste en la construcción de empedrado de 900 m2 espesor de 20 cms, 178 ml de canal de bloque, cruce de calle, y losas de acceso a las propiedades

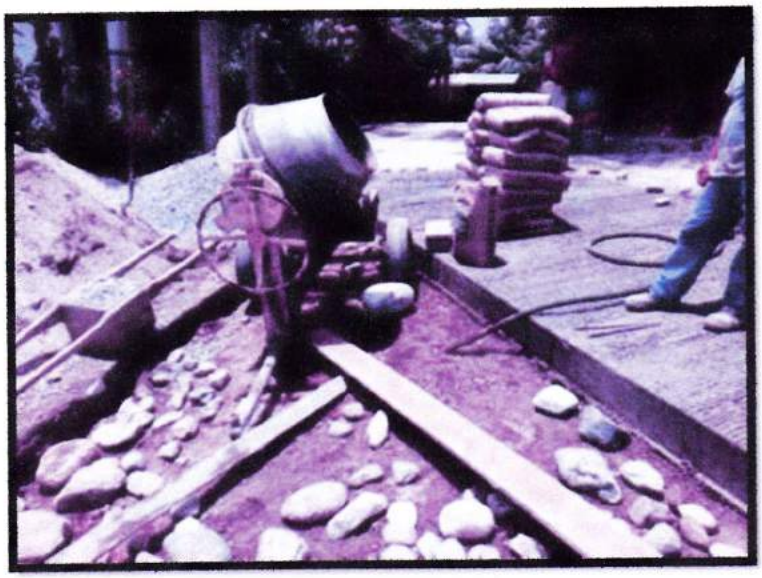

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C. A.

4 PROYECTOS RECEPCIONADOS:

4.1 Construcción de Iglesia Católica "Virgen de los Remedios" de 8.00x12.00manales, Amigos del Campo, Sector El Chile: Consiste en la construcción de cimiento corrido, sobreelevación, solera inferior, superior, castillos, cargador de concreto, jambas, columnas decorativas, paredes de bloque de 6" repelladas pulidas y pintadas, piso de concreto, techo con estructura de canaleta, laminas de aluzin, cielo falso con panelit pintadas, puertas de madera, y sistema eléctrico. Con un monto de Lps. 565539.70

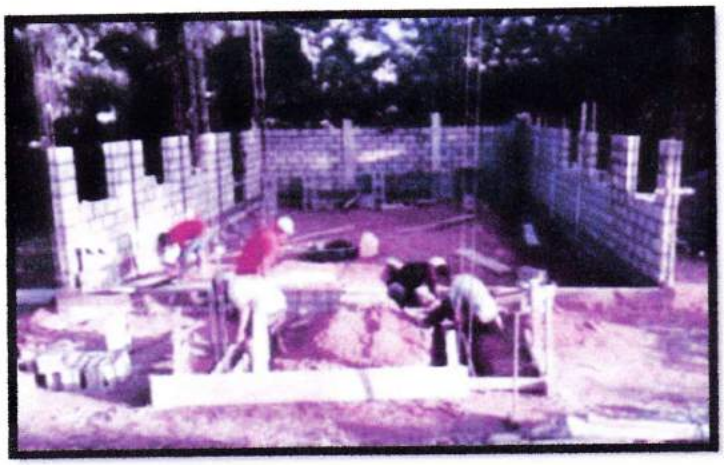

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CO
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras

4.2 Construccion de Caja Puente, Incluye Cabezales, Aletas, Vigas, Losa y Baranda, Brisas de Chameleconcito, Sector Chameleconcito: Consiste en la construccion de caja puente de 7x6 mts con vigas, cabezales de mamposteria, aletas de proteccion, baranda y relleno en las aproximaciones de la caja. Con un monto de Lps. 414,583.29

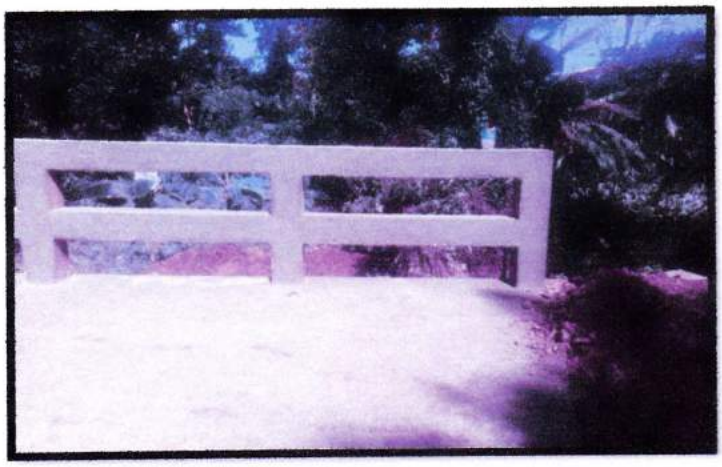

4.3 Mejoramiento de 170 Metros de Red Primaria de 1 Fase y Reemplazo de Dispositivos de Protección de Transformador de 37.5 kVA, Aldea Bajamar, Sector Garifuna: Consiste en el reemplazo de herrajes aisladores y dispositivos de protección a lo largo de 70 metros de línea primaria y transformador de 37.5 kVA que alimenta el sector.Con un monto total de Lps70,913.00

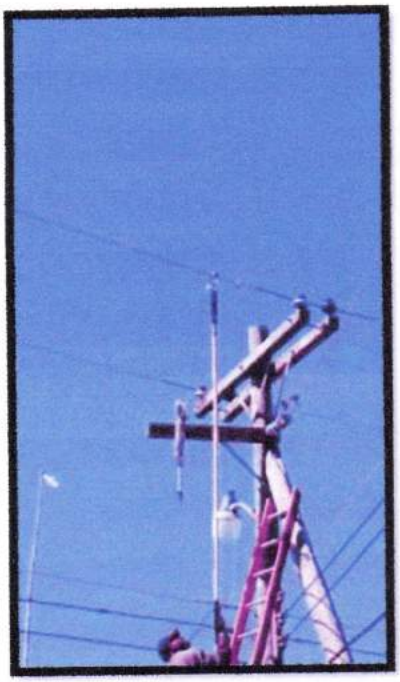

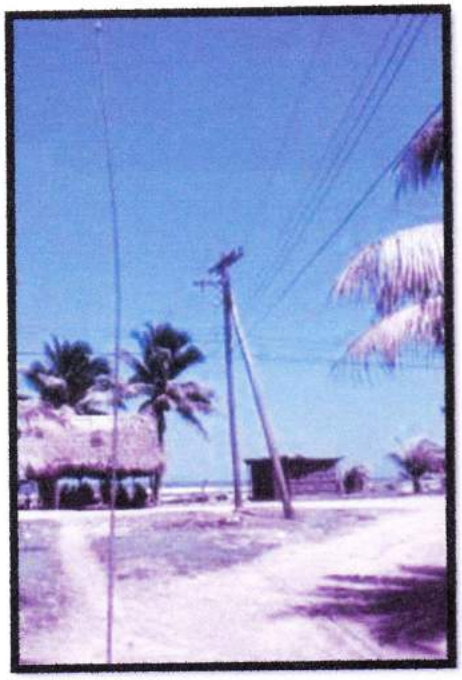

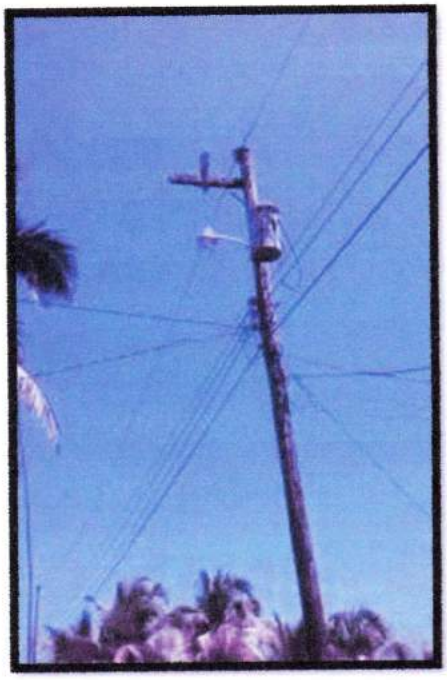

4.4 Reparación De Alumbrado Público en Colonia La Unión y Aldea El Bum, Sector Baracoa: Consiste en la instalación de 9 lámparas nuevas de 100 watts tipo canasta con su respectivo brazo, la instalación de 9 lámparas nuevas de 250 watts tipo cobra con su respectivo brazo y la instalación de 1 retenida de banco. Con un monto total de Lps79,400.00

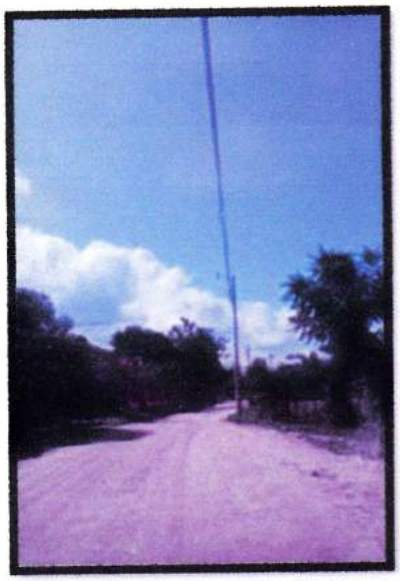

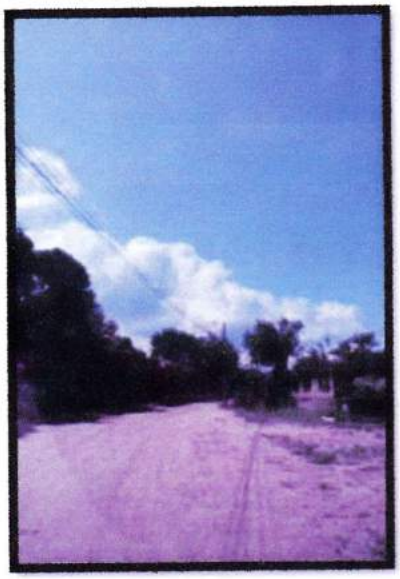

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CO
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C.A.

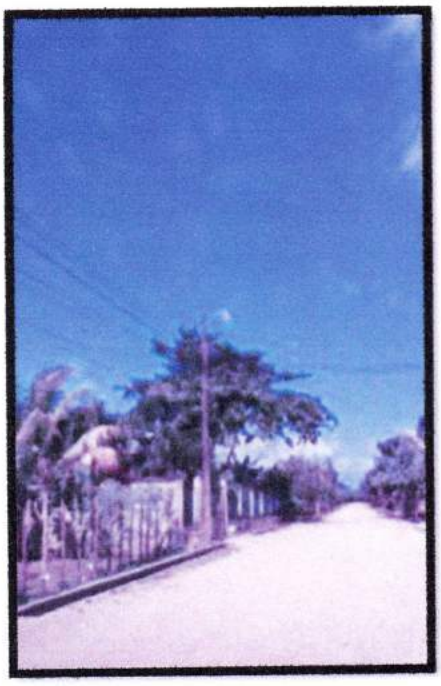

5 TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL:

5.1 Elaboración de Ataúdes para donación. Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se realiza la entrega de ataúdes para las personas de escasos recursos económicos las cuales no pueden costear el precio de un ataúd.

MES	NUMERO DE ATAUDES
Enero	10
Total	**10**

5.2 Elaboración de Botiquines de Primeros Auxilios. Se elaboraron botiquines de primeros auxilios para diferentes oficinas municipales, esto en conjunto con el Sindicato de Empleados Municipales quienes dieron el material para su elaboración.

6 VARIOS:

- **Entrega de Equipo:** Se dotó a los ingenieros supervisores e inspectores de casos y chalecos como parte del equipo de seguridad que deben portar para la realización de las evaluaciones e inspecciones de proyectos.

- **Capacitación a Promotores:** Como parte del compromiso para mejorar la calidad de los proyectos desarrollados en el municipio, la Gerencia de Planificación y Desarrollo coordino una capacitación en la que el personal de Proyectos Menores instruyeron de manera general a los promotores de área en como detectar algunos errores en los procesos constructivos y con ello poder corregir o evitar a tiempo fallas en los proyectos. Se les hablo sobre la calidad de materiales, como identificarlos, errores comunes en los procesos constructivos (como detectarlos), como leer e interpretar especificaciones; todo esto con el fin de que los promotores también se involucren mas con los proyectos y sean vigilantes de los mismos.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO C
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C. A

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-31 de Enero del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#222/14	Orlando Antonio Corea	Proyectos Sociales	Construccion de Iglesia Catolica "Virgen de los Remedios" de 8.00x12.00m	Amigos del Campo, Sector El Chile	Proveer de un espacio fisico para las reuniones de los miembros de la Iglesia.	Construccion de cimiento corrido, sobreelevacion, solera inferior, superior, castillos, cargador de concreto, jambas, columnas decorativas, paredes de bloque de 6" repelladas pulidas y pintadas, piso de concreto, techo con estructura de canaleta, laminas de aluzin, cielo falso con panelit pintadas, puertas de madera, y sistema electrico.
#02/15	Gladys Sofia Terrero	Red vial	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, INCLUYE CABEZALES, ALETAS, VIGAS, LOSA Y BARANDA	BRISAS DEL CHAMELECONCITO	Proveer a la comunidad de un mejor acceso, mas seguro y comodo	Construccion de caja puente de 7x6 mts con vigas, cabezales de mamposteria, aletas de proteccion, baranda y relleno en las aproximaciones de la caja
#47/15	Juan Antonio Escobar Figueroa	Red vial	EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL DESDE ENTRADA A CALLEJÓN LA FINANCIERA HASTA GRADAS DE ACCESO PEATONAL, (PRIORIZADO)	COLONIA EMSLAND	Proveer a la comunidad de un mejor acceso, mas seguro y comodo	Construccion de empedrado de 900 m2 espesor de 20 cms, 178 ml de canal de bloque, cruce de calle, y losas de acceso a las propiedades
#59/15	Danilo Gutierrez	Sector Sanamientos/ Drenaje	Colocacion de Alcantarilla Para Drenaje de Agua Contiguo a la Cancha de Futbol	Colonia Miraflores, Sector Medina	Drenar las aguas de la cancha	Suministro e Instalacion de Alcantarillas, construccion de cajas de registro
#84/15	Berta Lidia Hernandez	Educacion	Construccio de Cerco Perimetral en Esc Zacarias Alvarado Mena	Banderas Tres, Sector Chameleconcito	delimitar el predio del centro basico y brindad mayor seguridad a los estudiantes	demolicion de cimientos, castillos, Construcción de cimientos, paredes de bloque sisado, soleras, tallado de elementos, portón de acceso.

Ing. Claudia Zaldívar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-31 de Enero del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#90/15	Jorge Alberto Coto	Educacion	Jardin de Niños Gladis Ondina Jhonson	Banderas Tres, Sector Chameleconcito	Mejorar las condiciones en la que los preescolares reciben clases	Construccion de aula de clases, construccion de aula de computo, bodega de alimentos, sanitarios, cerco perimetral, tanque de almacenamiento de agua, area de juegos
#91/15	Lilian Yasmina Rugama	Proyectos Sociales	Ampliacion de Centro Social	Aldea Caoba, Sector Calan	contar con un area mas grande para poder realizar diversas actividades de la comunidad.	Construccion de cimiento corrido, sobreelevacion bloque de 6", elementos estructurales (soleras, castillos,) pared de bloque de 6", piso de concreto, techo con estructura de canaleta, lamina de aluzinc, ventana con tubo estructura y sistema electrico.
#01/16	Joel Antonio Trejo	Seguridad Ciudadana	Mejoramiento d 170 metros de red primaria de 1 fase y reemplazo de dispositivos de protección de transformador de 37.5 kva	Aldea Baja Mar, Sector Garifuna	Mejorar las condiciones de la red de suministro eléctrico	Consiste en el reemplazo de herrajes aisladores y dispositivos de protección a lo largo de 70 metros de línea primaria y transformador de 37.5 kVA que alimenta el sector.
#02/16	Geremias David Garcia	Seguridad Ciudadana	Reparación de alumbrado público	Colonia La Unión y Aldea El Bum, Sector Baracoa	Mejorar las condiciones de alumbrado publico del sector	Consiste en la instalación de 9 lámparas nuevas de 100 watts tipo canasta con su respectivo brazo, la instalación de 9 lámparas nuevas de 250 watts tipo cobra con su respectivo brazo y la instalación de 1 retenida de banco.

Ing. Claudia Zaldívar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C. A.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-31 de Enero del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#03/16	Fernando Alberto Meza	Sector Sanamientos/ Drenaje	Suministro e Instalacion de Tuberia SDR Cal. 26 y Construccion de Cabezales en Esc 19 de Octubre	Aldea San Antonio, Sector Ecoturistico	Evitar que la calle se dañe debido al agua que circula, asi mismo mejorar el acceso a la escuela.	Suminstro e Instalacion de tuberia SDR cal 26, construccion de cabezal con concreto y varilla

Ing. Claudia Zaldívar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C. A.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/ ELABORACION DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-31 de Enero del 2016

Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
#222/14	Proveer de un espacio fisico para las reuniones de los miembros de la Iglesia.	NO APLICA	NO APLICA	Orlando Antonio Corea +504 9718-2317	L. 535,063.70	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de Noviembre de 2015	100%	L. 565,539.70	4 de Febrero de 2016
#02/15	Provee a la comunidad de un mejor acceso, mas seguro y comodo	NO APLICA	Alteración por excavaciones.	Gladys Sofia Terrero	L. 377,041.03	Fondos Municipales	15 de Diciembre de 2015	100%	L. 414,583.29	21 de enero del 2016
#47/15	Provee a la comunidad de un mejor acceso, mas seguro y comodo	NO APLICA	Alteración por excavaciones conformacion	Juan Antonio Escobar Figueroa 32719424	L. 863,000.00	Fondos Municipales	14 de Mayo de 2015	85%	L. 863,000.00	05 de febrero del 2016
#59/15	Drenar las aguas de la cancha	NO APLICA	NO APLICA	Danilo Gutierrez +504 9946-8553	L. 982,526.14	Fondos Municipales	27 de Noviembre de 2015	100%	L. 999,113.54	17 de Enero de 2016
#84/15	delimitar el predio del centro basico y brindad mayor seguridad a los estudiantes	NO APLICA	NO APLICA	Berta Lidia Hernandez +504 9989-9992	L. 513,116.80	Fondos Municipales	27 de Noviembre de 2015	75%	L. 513,116.80	8 de Febrero de 2016
#90/15	Proveer a los preescolares de un lugar con optimas condiciones para su educacion	NO APLICA	NO APLICA	Jorge Alberto Coto	L. 676,662.54	Fundacion Ficohsa/ Municipalidad de Puerto Cortes	14 de Diciembre de 2015	50%	L. 676,662.54	26 de Febrero de 2016
#91/15	contar con un area mas grande para poder realizar diversas actividades de la comunidad.	NO APLICA	NO APLICA	Lilian Yasmina Rugama	L. 199,074.97	Fondos Municipales	14/12/2015	80%	L. 199,074.97	15 de Febrero de 2016
#01/16	Evitar que se produscan daños a los habitantes por la caida de la linea primaria	NO APLICA	NO APLICA	Joel Antonio Trejo	L. 70,913.00	Municipalidad de Puerto Cortés	11 de Enero del 2016	100%	L. 70,913.00	18 de Enero del 2016
#02/16	Mejorar las condiciones de alumbrado publico para brindar mayor seguridad a los habitantes	NO APLICA	NO APLICA	Geremias David Garcia	L. 79,400.00	Municipalidad de Puerto Cortés	11 de Enero del 2016	100%	L. 79,400.00	19 de Enero del 2016

Ing. Claudia Zaldivar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/ ELABORACION DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Periodo: 01-31 de Enero del 2016

Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
#03/16	Evitar que la calle se dañe debido al agua que circula, asi mismo mejorar el acceso a la escuela.	NO APLICA	NO APLICA	Ferando Alberto Meza, +504 9628-6338	L. 27,155.00	Fondos Municipales	21 de Enero de 2016	100%	L. 27,155.00	29 de Enero de 2016

Ing. Claudia Zaldívar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-31 de Enero del 2016

CÓDIGO #222/14- Construccion de Iglesia Catolica "Virgen de los Remedios" de 8.00x12.00m

Orden de cambio No. 1 , Valor Negativo -L. 30,476.00

Ampliación de Monto del Contrato

RAZONES

1. Debido que al momento de excavar hemos encontrado material de mala calidad por lo cual vemos la necesidad de excavar aun mas, asi mismo agregar una hilada de sobreelevacion , y ya que no existia un paso para acarrear los materiales, decidimos mejorar el unico paso existente, y se debio realizar dicho traslado de materiales de forma manual, ya que es un paso peatonal.

CÓDIGO #02/15- CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, INCLUYE CABEZALES, ALETAS, VIGAS, LOSA Y BARANDA

Orden de cambio No. 1 , Valor Negativo -L. 37,542.26

Ampliación de Monto del Contrato

RAZONES

Se ve la necesidad de construir pie de amigo para proteccion del cerco, asi mismo tallar solera inferior para mayor estetica del mismo.

CÓDIGO #59/15- Colocacion de Alcantarilla Para Drenaje de Agua Contiguo a la Cancha de Futbol

Orden de cambio No. 1 , Valor Negativo -L. 16,587.40

Ampliación de Monto del Contrato

RAZONES

1. Se vio necesario realizar la construccion de una caja de conexcion y la instalacion de alcantarilla para unirlo al canal existente y asi evitar que las aguas inunden la cancha

Ing. Claudia Zaldívar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES
Honduras, C.A.
