ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ
UNIDAD DE SUPERVISION MUNICIPAL

"INFORME"

Informe De Supervisión
ESTIMACION Nª2

PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED
UBICADO EN LA CRUZ Y CERRO CHATO MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Contratista:
DICONELEC S. DE R.L.

Alcalde Municipal
Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos

Aguanqueterique La Paz, 04 de diciembre de 2023

MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA

Aguanqueterique La Paz, Miércoles 04 de diciembre de 2023

Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos
Alcalde Municipal de Aguanqueterique La Paz

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED**

UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE LA CRUZ Y CERRO CHATO, estando este ejecutado al 75.0%
Por lo tanto, se puede proceder con el trámite correspondiente al pago de **SEGUNDA ESTIMACION POR UN VALOR DE UN MILLON SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTE Y TRES CENTAVOS**

(L. 1,061,385.23)

A Favor de CONSTRUCTORA DICONELEC S. DE R.L. representada legalmente por el gerente general Javier Fermín Calix

Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.

Abner Israel Perdomo Medina
Unidad de Supervisión Municipal
Técnico de Proyectos Alcaldía Municipal de Aguanqueterique

MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA

Aguanqueterique La Paz, Miércoles 04 de diciembre de 2023

Depto. Presupuesto y Contabilidad
Depto. Tesorería

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED**

UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE LA CRUZ Y CERRO CHATO, estando este ejecutado al 75.0%
Por lo tanto, se puede proceder con el trámite correspondiente al pago de **SEGUNDA ESTIMACION POR UN VALOR DE UN MILLON SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTE Y TRES CENTAVOS**

(L. 1,061,385.23)

A Favor de CONSTRUCTORA DICONELEC S. DE R.L. representada legalmente por el gerente general Javier Fermín Calix

Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.

Erlin Omar Rodríguez Ramos
Alcalde Municipal De Aguanqueterique

ESTIMACION NO. 2

MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE,LA PAZ

PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED

UBICACIÓN:LA CRUZ Y CERRO CHATO MUNICIPIO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.

EJECUTOR : DICONELEC S. DE R.L.

ESTIMACION No. 2 **Periodo: del 16 de noviembre al 1 de diciembre de 2023**

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO LA CRUZ	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANT	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	ESTRUCTURA A-II-5 (p/34.5 KV)	C/U	4.00	7,828.00	L. 31,312.00	4.00	31,312.00		0.00	4.00	31,312.00	100.00
2	ESTRUCTURA A-II-1 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	3,090.00	L. 6,180.00	2.00	6,180.00		0.00	2.00	6,180.00	100.00
3	ESTRUCTURA A-II-2 (p/34.5 KV)	C/U	4.00	5,253.00	L. 21,012.00	4.00	21,012.00		0.00	4.00	21,012.00	100.00
4	ESTRUCTURA A-II-4 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	5,047.00	L. 10,094.00	2.00	10,094.00		0.00	2.00	10,094.00	100.00
5	ESTRUCTURA A-I-6 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	8,858.00	L. 8,858.00	1.00	8,858.00		0.00	1.00	8,858.00	100.00
6	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	6.00	1,478.05	L. 8,868.30	6.00	8,868.30		0.00	6.00	8,868.30	100.00
7	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	9.00	1,648.92	L. 14,840.28	9.00	14,840.28		0.00	9.00	14,840.28	100.00
8	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	1.00	2,417.37	L. 2,417.37	1.00	2,417.37		0.00	1.00	2,417.37	100.00
9	ESTRUCTURA B-II-1A	C/U	1.00	1,385.16	L. 1,385.16	1.00	1,385.16		0.00	1.00	1,385.16	100.00
10	ESTRUCTURA B-II-8B	C/U	1.00	2,614.97	L. 2,614.97	1.00	2,614.97		0.00	1.00	2,614.97	100.00
11	DETALLE DE NEUTRO B-I-3	C/U	3.00	1,198.92	L. 3,596.76	3.00	3,596.76		0.00	3.00	3,596.76	100.00
12	DETALLE DE NEUTRO B-I-4	C/U	4.00	599.58	L. 2,398.33	4.00	2,398.33		0.00	4.00	2,398.33	100.00
13	DETALLE DE NEUTRO B-I-1	C/U	2.00	556.20	L. 1,112.40	2.00	1,112.40		0.00	2.00	1,112.40	100.00
14	RETENIDA E-I-2 (SOLO CABLE DE EI2)	C/U	20.00	978.50	L. 19,570.00	20.00	19,570.00		0.00	20.00	19,570.00	100.00
15	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	6.00	949.34	L. 5,696.04	6.00	5,696.04		0.00	6.00	5,696.04	100.00
16	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	13.00	3,193.00	L. 41,509.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
17	CABLE # 2 ACSR S/F	C/U	2,642.00	47.38	L. 125,177.96	2,000.00	94,760.00	642.00	30,417.96	2,642.00	125,177.96	100.00
18	CABLE # 1/0 ACSR S/F	C/U	4,110.00	50.47	L. 207,431.70	3,000.00	151,410.00	1,110.00	56,021.70	4,110.00	207,431.70	100.00
19	CABLE # 1/0 AWG,TW	C/U	1,526.00	51.5	L. 78,589.00	1,000.00	51,500.00	526.00	27,089.00	1,526.00	78,589.00	100.00
20	TRANSFOR. DE 15 KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	2.00	67,079.01	L. 134,158.02		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)		2.00	9,373.00	L. 18,746.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTALCOSTO DIRECTO				**L. 745,567.30**		**437,625.62**		**113,528.66**		**551,154.28**	**73.92**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS				L. 44,734.04		26,257.54	-	6,811.72		33,069.26	73.92
	UTILIDAD DEL PROYECTO				L. 74,556.73		43,762.56		11,352.87		55,115.43	73.92
	TOTAL TRAMO LA CRUZ			-	**864,858.07**		**507,645.72**		**131,693.25**		**639,338.97**	**73.92**
1	ESTRUCTURA A-II-5 (p/34.5 KV)	C/U	9.00	7,828.00	70,452.00		0.00	9	70,452.00	9.00	70,452.00	100%
2	ESTRUCTURA A-II-1 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	3,090.00	3,090.00		0.00	1	3,090.00	1.00	3,090.00	100%
3	ESTRUCTURA A-II-2 (p/34.5 KV)	C/U	5.00	5,253.00	26,265.00		0.00	5	26,265.00	5.00	26,265.00	100%
4	ESTRUCTURA A-II-4 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	5,047.00	10,094.00		0.00	2	10,094.00	2.00	10,094.00	100%
5	ESTRUCTURA A-II-6 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	8,858.00	8,858.00		0.00	1	8,858.00	1.00	8,858.00	100%
6	ESTRUCTURA A-I-5 (p/34.5 KV)	C/U	3.00	4,537.15	13,611.45		0.00	3	13,611.45	3.00	13,611.45	100%
7	ESTRUCTURA A-I-1 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	1,751.00	3,502.00		0.00	2	3,502.00	2.00	3,502.00	100%
8	ESTRUCTURA A-I-2 (p/34.5 KV)	C/U	14.00	3,113.94	43,595.12		0.00	14	43,595.12	14.00	43,595.12	100%
9	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	2,996.24	5,992.48		0.00	2	5,992.48	2.00	5,992.48	100%
10	ESTRUCTURA A-I-6 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	5,195.61	5,195.61		0.00	1	5,195.61	1.00	5,195.61	100%
11	ESTRUCTURA B-II-2A	C/U	4.00	979.41	3,917.63		0.00	4	3,917.63	4.00	3,917.63	100%
12	ESTRUCTURA B-II-5A	C/U	1.00	1,099.24	1,099.24		0.00	1	1,099.24	1.00	1,099.24	100%

13	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	14.00	1,478.05	20,692.70		0.00	14	20,692.70	14.00	20,692.70	100%
14	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	27.00	1,648.92	44,520.75		0.00	27	44,520.75	27.00	44,520.75	100%
15	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	4.00	2,417.37	9,669.48		0.00	4	9,669.48	4.00	9,669.48	100%
16	ESTRUCTURA B-II-1A	C/U	5.00	1,385.16	6,925.82		0.00	5	6,925.82	5.00	6,925.82	100%
17	ESTRUCTURA B-II-8B	C/U	1.00	2,614.97	2,614.97		0.00	1	2,614.97	1.00	2,614.97	100%
18	DETALLE DE NEUTRO B-I-3 COM GRAPA	C/U	5.00	1,198.92	5,994.60		0.00	5	5,994.60	5.00	5,994.60	100%
19	DETALLE DE NEUTRO B-I-4	C/U	6.00	599.58	3,597.50		0.00	6	3,597.50	6.00	3,597.50	100%
20	DETALLE DE NEUTRO B-I-1	C/U	2.00	556.20	1,112.40		0.00	2	1,112.40	2.00	1,112.40	100%
21	RETENIDA E-I-i	C/U	18.00	3,619.21	65,145.85	18	65,145.85		0.00	18.00	65,145.85	100%
22	RETENIDA E-I-2	C/U	46.00	3,892.58	179,058.50	46	179,058.50		0.00	46.00	179,058.50	100%
23	RETENIDA E-I-2 SOLO CABLE E2	C/U	15.00	978.50	14,677.50	15	14,677.50		0.00	15.00	14,677.50	100%
24	RETENIDA E-I-3	C/U	1.00	10,818.09	10,818.09		0.00	1	10,818.09	1.00	10,818.09	100%
25	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	14.00	949.34	13,290.77		0.00	14	13,290.77	14.00	13,290.77	100%
26	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	30.00	3,193.00	95,790.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0%
27	CABLE # 2 ACSR S/F	C/U	4,804.00	47.38	227,613.52		0.00	4804	227,613.52	4,804.00	227,613.52	100%
28	CABLE # 1/0 ACSR S/F	C/U	5,621.00	50.47	283,691.87		0.00	5621	283,691.87	5,621.00	283,691.87	100%
29	CABLE # 1/0 AWG,TW	C/U	5,861.00	51.5	301,841.50		0.00	5861	301,841.50	5,861.00	301,841.50	100%
30	TRANSFOR. DE 15 KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	5.00	67,079.01	335,395.05		0.00		0.00	0.00	0.00	0%
31	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)		2.00	9,373.00	18,746.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0%
	SUB TOTALCOSTO DIRECTO CERRO CHATO				1,836,869.39		258,881.85		1,128,056.49		1,386,938.34	76%
	GASTOS ADMINISTRATIVOS				110,212.16		15,532.91		67,683.39		83,216.30	76%
	UTILIDAD DEL PROYECTO				183,686.94		25,888.18		112,805.65		138,693.83	76%
	TOTAL TRAMO CERRO CHATO				2,130,768.50		300,302.94		1,308,545.53		1,608,848.48	76%
	TOTAL LA CRUZ Y CERRO CHATO				2,995,626.57		807,948.67		1,440,238.78		2,248,187.44	75%

DESCRIPCIÓN	Acumulado Anterior	Ejecutado Actual	Acumulado Total
MONTO ESTIMADO	807,948.67	1,440,238.78	2,248,187.44
Retención por Anticipo	149,470.50	266,444.17	415,914.67
Retención por I.S.R.		0.00	0.00
Retencion por calidad de obra		112,409.37	112,409.37
Resumen	658,478.17	1,061,385.23	1,719,863.40
Neto a Pagar en esta estimacion		1,061,385.23	

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponde a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato solicito se proceda a pagar al contratista para lo cual firmo la presente.

CONTRATISTA	SUPERVISOR UTM	VISTO BUENO ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ING. JAVIER CALIX	NOMBRE: ABNER ISRAEL PERDOMO	NOMBRE: ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS
FECHA: 1/12/23	FECHA: 1/12/23	FECHA: 1/12/23

1. Antecedentes

El Municipio de Aguanqueterique La Paz, se encuentra ubicado en la zona baja del canal seco.

Por su ubicación Aguanqueterique este municipio se encuentra en la zona sur del departamento de La Paz y además cuenta con alto nivel de vulnerabilidad. Ya que la población carece del servicio de energía eléctrica.

En repetidas ocasiones la comunidad manifiesta haber realzado la solicitud para que las autoridades prioricen el desarrollo de un proyecto eléctrico. Sin embargo, hasta hoy no había sido posible.

A través de los fondos financiados por la alcaldía se pretende llegar a las comunidades más necesitadas y que carecen de este servicio básico.

1.- **Resumen de la situación actual:**

NOMBRE: ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED
UBICADO EN: LA CRUZ Y CERRO CHATO MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
Bbeneficiarios: La comunidad **LA CRUZ Y CERRO CHATO**, consta de unas 80 familias y en total se encuentran unas 240 personas, según se ha entrevistado con miembros de la comunidad.
Comunidad Solicitante: miembros de patronato y del comité coordinador para solicitar dicho proyecto.
Duración: 120 Días.
Situación Actual del Proyecto: ejecutado en un **75.0%.**

Costo Total del Proyecto Presupuestado: L. **2,995,626.57**
Monto Solicitado por esta estimación: L. 1,061,385.23
Fuente Financiera: Municipalidad de Aguanqueterique 100%

2. Conclusiones y recomendaciones:

- El proyecto está ejecución al 75.0 % y presenta muy buena calidad de obra, por lo que se adjunta el cuadro de estimación, para dar fe.
- Las cantidades de la obra fueron verificadas en campo y comparadas en la estimación presentada.
- Se recomienda a la comunidad hacer vigilancia para evitar pérdidas y daños a las obras previo la recepción por parte de la alcaldía.

- Se utilizó todo el equipo necesario para una buena ejecución y buena calidad de las obras.

3. Observaciones

1. Las cantidades de obra restantes fueron cobradas en esta segunda estimación.
2. El tramo de la comunidad de Cerro Chato obtuvo un avance estimado del 76% según cálculos estimados en la presente estimación (segunda).

4. REGISTRO FOTOGRAFICO LA CRUZ

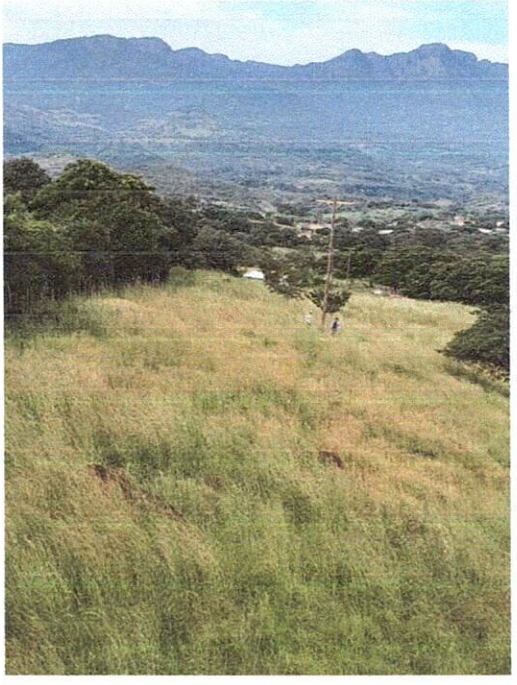

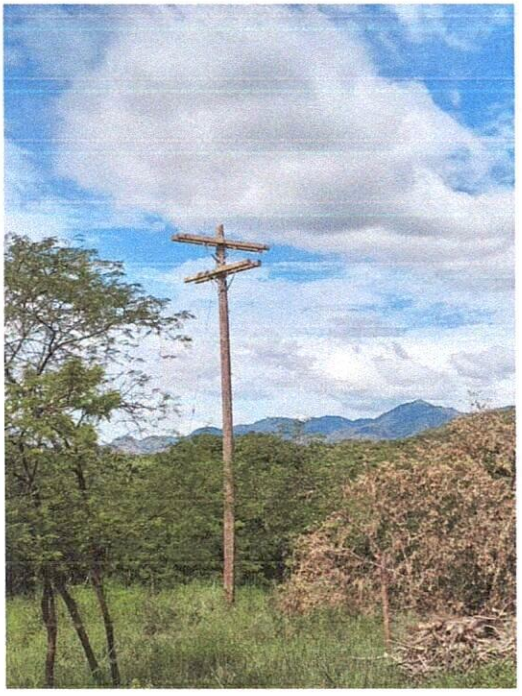

REGISTRO FOTOGRAFICO LA CRUZ

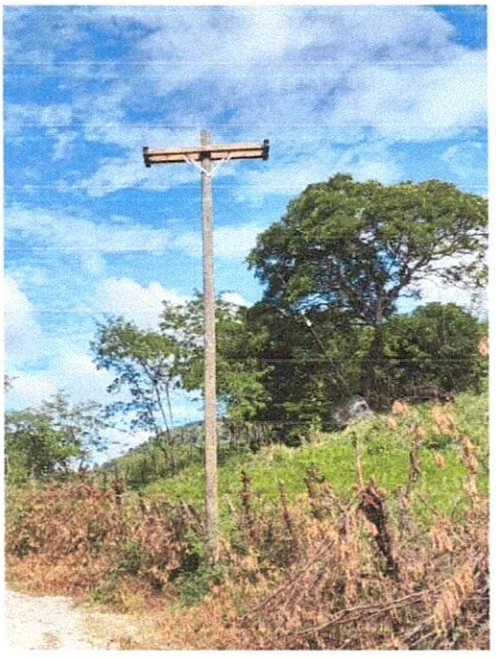

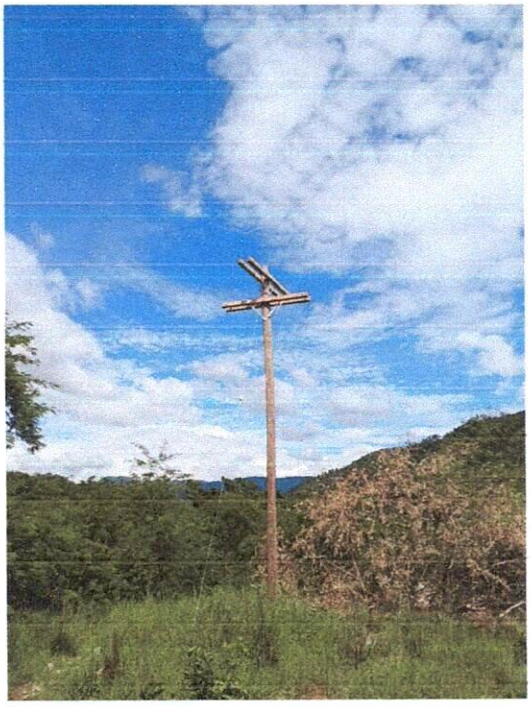

REGISTRO FOTOGRAFICO LA CRUZ

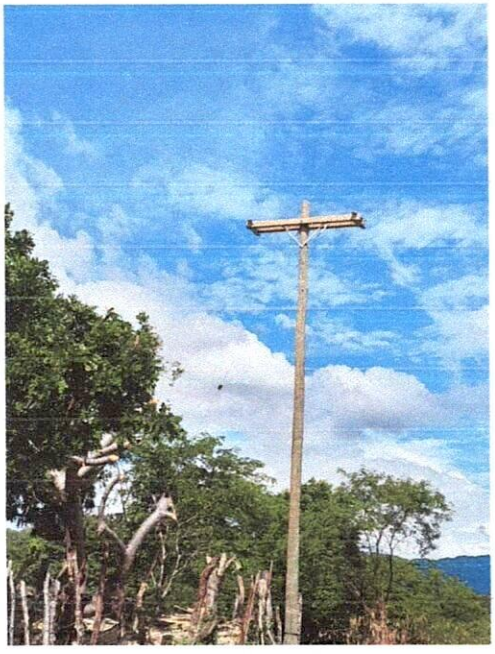

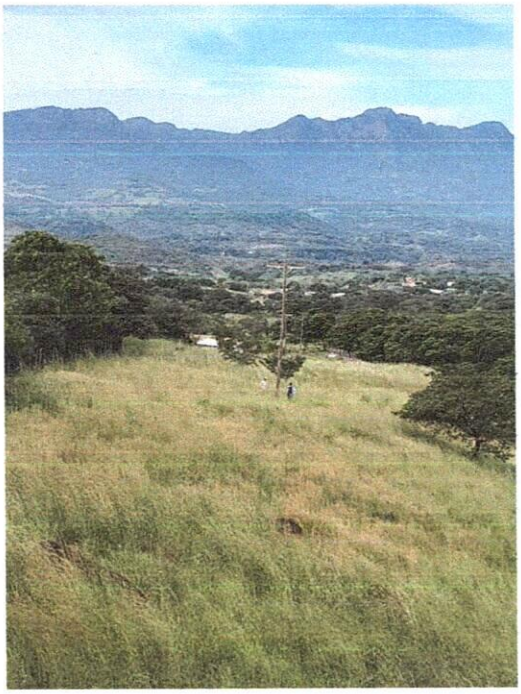

REGISTRO FOTOGRAFICO LA CRUZ

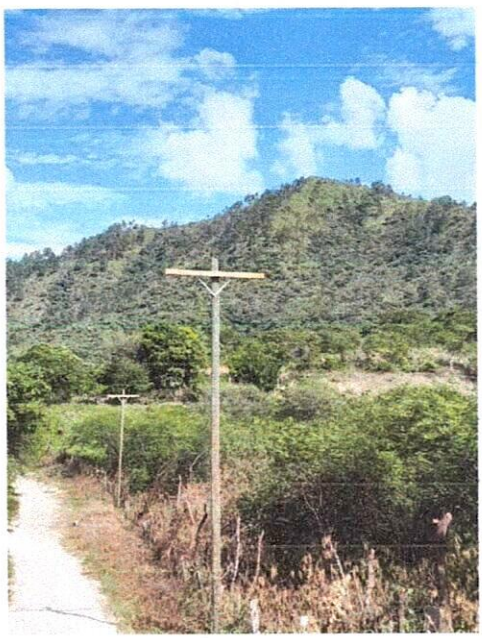

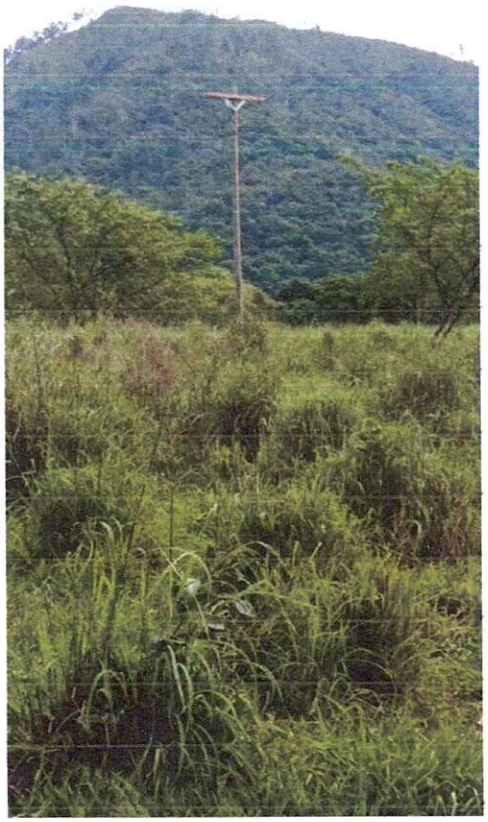

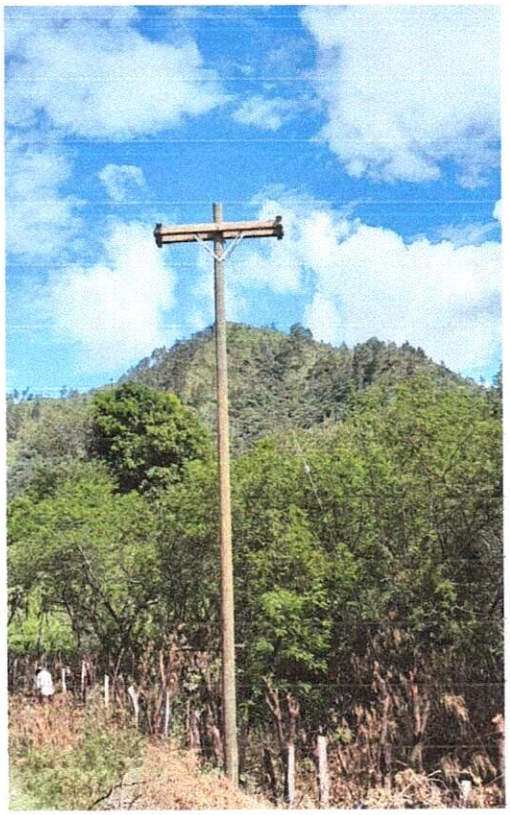

ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE LA CRUZ Y CERRO CHATO

AUTORIZACION

Marcala La Paz 04 de noviembre de 2023

Sr. Erlin Omar Rodriguez Ramos
Alcalde Municipal de Aguanqueterique
Su Oficina

Estimado señor alcalde

El motivo de la presente es Para Autorizar al **Ing. Javier Fermín Calix Manueles**, Con IDENTIDAD: 1208-1973-00223, con residencia en el municipio de Marcala La Paz, y en mi condición de Gerente General de Diseños y Construcciones Electromecánicas, Sociedad de Responsabilidad Limitada **DICONELEC S. DE R. L. con RTN: 08019006502892,** a quien se **AUTORIZA** Para que pueda hacer retiro de cheque a nombre de **Javier Fermín Calix Manueles**, por pago de SEGUNDA ESTIMACION del contrato **DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED UBICADO EN LA CRUZ Y CERRO CHATO MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.** Por el valor de **UN MILLON SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 23/100 (L.1,061,385.23)**

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DICONELEC GERENCIA MARCALA, LA PAZ

Ing. Javier Fermín Calix
Gerente General DICONELEC S. DE R.L.
Tel. 9928-2931

ALCALDÍA MUNICIPAL
MARCALA, LA PAZ

PERMISO
PARA OPERACION DE NEGOCIO

NUMERO 1090-2023

VALIDO PARA 20 23

PROPIETARIO: JAVIER FERMIN CALIX MANUELES

UBICACIÓN: BARRIO BUENA VISTA, MARCALA, LA PAZ

Conforme al Reglamento para la Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en este Municipio, el (la) Alcalde(sa) Municipal concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en sitio visible.

CLASE DE NEGOCIO: DICONELEC S. DE R.L

Actividad Principal DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS

No. de Solicitud 1090-2023

FECHA DE VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Dada en la ciudad de MARCALA, a los 23 días del mes de ENERO de 20 23

JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ALCALDE(SA) MUNICIPAL

BANMA/BID PON 06.FC

Wondershare PDFelement

Escaneado con CamScanner

Wondershare PDFelement

República de Honduras
Servicio de Administracion de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 2017/04/21

RTN: 08019006502892

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SRL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Scanned by CamScanner

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-87578

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SRL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006502892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-87578 en fecha 14/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25717569735 de fecha 11/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA,** para el período 202301, según Declaración 35748779026, presentada el 24/03/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-23-10500-87578** o mediante el siguiente código QR:

Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/12/2023
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: ALEX.MAMZANARES

Orden de Pago No.: 4931
L.: 1,061,385.23

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1068
Fecha de Emision: 5/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER FERMIN CALIX MANUELES Id/RTN: 12081973002231
La Cantidad en Letras: UN MILLON SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A SEGUNDA ESTIMACION A PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED UBICADO EN LA CRUZ Y CERRO CHATO, AGUANQUETERIQUE LA PAZ.
POR LA CANTIDAD DE L.1,061,385.23

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de sistema eléctrico en las Comunidades de la Cruz, Cerro Chato y Carboneras	1,061,385.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,061,385.23
	Monto Total:	**1,061,385.23**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,061,385.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,061,385.23**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Javier Calix
Identidad No.: 1008197300223

0s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdjI7HFOxAOKnyIkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpQId6luYkoHGdeCb6B+ItmJC/P2Vsihiq8PkPGlHmjKB7xLEy6oKwcJDeLWq/w+7C6S//
ImmECDWSqtEDEIPGb2q2Ai6z/0LdT3fxgZfWHAtoM=

DICONELEC
ENERGÍA PARA HONDURAS

Diseños y Construcciones Electromecánicas S. de R.L.

Bo. El Centro, Zona San Miguel,
Marcala la Paz.
Tel: 3357-4865
RTN. 08019006502892
diconelec@gmail.com

No. FACTURA
000-001-01-00
001383

Nombre.	Municipalidad Aguanqueterique
R.T.N	12079011346364
Direccion.	B. El Centro, Frente a Parque Central
Dia / Mes / Año	05 / 12 / 2023
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia:	

Can.	Descripcion	Precio Unit.	Total
	Pago Segunda Estimación Proyecto de Electrificación con Interconexión a la Red ubicado en La Cruz y Cerro Chato municipio de Aguanqueterique, Departamento de Lempira		1,061,385.23

CAI: 852162-720B48-8B43AE-F0F3F3-24567C-58
Rango autorizado: 000-001-01-00001351 AL 000-001-01-00001550

SON Lps: un millon sesenta y un mil trescientos ochenta y cinco con 23/00

Fecha Limite Emision: 03/08/2024
Fecha de Recepcion: 03/08/2023

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DICONELEC GERENCIA MARCALA, LA PAZ

Entregado

Recibido

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,061,385.23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPRENTA: IDEAS • CEL.: 9984-5959 / 9588-6355 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 05011990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA

El Banco de Occidente, S.A. Por medio de la presente, **HACE CONSTAR QUE EL SR: JAVIER FERMIN CALIX MANUELES Con Identidad No 1208 1973 00223**, Es cliente de Nuestra Institución y cuenta con cuenta de ChequesNo 11-302-001153-7 de la cual en la actualidad no cuenta con chequera propia por extravio.

Y para los fines que al interesado convengan se extiende la presente en la ciudad de Marcala La Paz, a los Veintitres días del mes de Diciembre del año dos mil Veintitres.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA MARCALA, LA PAZ

BESSY ARGUETA RIVERA
FUNCIONARIO
BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
MARCALA, LA PAZ
