ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ

UNIDAD DE SUPERVISION MUNICIPAL

"INFORME"

Informe De Supervisión

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON

LUGAR: RANCHO GRANDE, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

Contratista:
INGENIUM S DE R.L.

Alcalde Municipal
Señor. Erlin Omar Rodríguez Ramos

Aguanqueterique La Paz, martes 21 de noviembre de 2023

ESTIMACIÓN DE PAGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

CODIGO AGUANQ-07-2023

PROYECTO: PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE

UBICACIÓN: COMUNIDAD RANCHO GRANDE, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

EJECUTOR : CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R. L.

ESTIMACION: NUMERO DOS

PERIODO DEL: 6/9/2023 HASTA 1/11/2023 56.00 DIAS

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN ESTE PERIODO		ACUMULADO ANTERIO Y ESTE PERIODO		% AVANCE
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	47.00	L 25.00	L 1,175.00	47.00	L 1,175.00		L -	47.00	L 1,175.00	100%
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	16.47	L 301.88	L 4,971.96	16.47	L 4,971.96		L -	16.47	L 4,971.96	100%
3	REMOCION DE CAPA VEGETAL(INC. ACARREO 20 MTS)	M3	26.40	L 105.42	L 2,783.09	26.40	L 2,783.09		L -	26.40	L 2,783.09	100%
4	ACARREO DE MATERIAL(DESPERDICIOS)	M3	53.59	L 178.49	L 9,565.28	53.59	L 9,565.28		L -	53.59	L 9,565.28	100%
5	RELLENO COMP.CON MATERIAL SELECTO (IN.ACARREO)	M3	16.34	L 651.19	L 10,640.44	0.00	L -	16.34	L 10,640.44	16.34	L 10,640.44	100%
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4Nu3, Nu2 @ 20 cm	UNID	13.00	L 654.36	L 8,506.68	13.00	L 8,506.68		L -	13.00	L 8,506.68	100%
7	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA ARENA	M3	14.85	L 1,880.91	L 27,931.51	14.85	L 27,931.51		L -	14.85	L 27,931.51	100%
8	SOLERA DE 20 X 20 , 4No.3 y No. 2 @ 15 cm, CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 416.83	L 14,172.22	34.00	L 14,172.22		L -	34.00	L 14,172.22	100%
9	BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 8 CM	M.L	12.55	L 122.40	L 1,536.12	0.00	L -	12.55	L 1,536.12	12.55	L 1,536.12	100%
10	SOLERA DE 15 X 15, 3#3, 2#@ 15 CM, CONCRETO 1:2:2	M.L	10.50	L 227.45	L 2,388.23	10.50	L 2,388.23		L -	10.50	L 2,388.23	100%
11	CASTILLO 15 X 15 4 # 3, Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L	38.60	L 347.47	L 13,412.34	38.60	L 13,412.34		L -	38.60	L 13,412.34	100%
12	CASTILLO 15 X 15, 3 No.3 y No2 @ 20 , CONCRETO 1:2:2	M.L	8.64	L 286.53	L 2,475.62	8.64	L 2,475.62		L -	8.64	L 2,475.62	100%
13	LOSA DE LIBRERO 0.6 X 0.1 MTS (PULIDA)	M.L	8.00	L 583.75	L 4,670.00	8.00	L 4,670.00		L -	8.00	L 4,670.00	100%
14	LIBRERO EMPOTRADO KINDER	UNID	1.00	L 19,931.18	L 19,931.18	0.00	L -	1.00	L 19,931.18	1.00	L 19,931.18	100%
15	SOLERA 15 X 20 4Nu3 Y Nu2@ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 348.44	L 11,846.96	34.00	L 11,846.96		L -	34.00	L 11,846.96	100%
16	SOLERA 20 X 25, 4#3, 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL	M.L	22.84	L 644.79	L 14,727.00	0.00	L -	22.84	L 14,727.00	22.84	L 14,727.00	100%
17	CARGADOR DE 10 X 15 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L	1.15	L 251.62	L 289.36	1.15	L 289.36		L -	1.15	L 289.36	100%
18	BATIENTE DE 10 X 20 CM, 2#3; #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M.L	8.55	L 220.60	L 1,886.13	0.00	L -	8.55	L 1,886.13	8.55	L 1,886.13	100%
19	PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO 15(INHABILITADA)	M2	73.77	L 638.13	L 47,074.85	73.77	L 47,074.85		L -	73.77	L 47,074.85	100%
20	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	21.38	L 1,444.55	L 30,884.48	0.00	L -	21.38	L 30,884.48	21.38	L 30,884.48	100%
21	PUERTA METALICA (1X2.10m). TUBO IND.3/4, LAM 1/16	UNID	1.00	L 6,246.84	L 6,246.84	0.00	L -	1.00	L 6,246.84	1.00	L 6,246.84	100%
22	PISO GRANITO TERRAZO 30 X 30	M2	73.64	L 766.58	L 56,450.95	0.00	L -	73.64	L 56,450.95	73.64	L 56,450.95	100%
23	TECHO CANALETA 6", LAM ALUMINIZADA ONDULADA AULA	M2	108.63	L 565.23	L 61,400.93	0.00	L -	108.63	L 61,400.93	108.63	L 61,400.93	100%
24	CIELO FALSO DE PVC CON PERFIL DE ALUMINIO	M2	73.64	L 551.04	L 40,578.59	0.00	L -	73.64	L 40,578.59	73.64	L 40,578.59	100%
25	PIZARRA DE FORMICA 2.4 X 1.20(SUM/INST)	UNID	1.00	L 4,537.71	L 4,537.71	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0%
26	ENTABICADO BLOQUE 30 CM (REPE/PUL)(***)	M.L	17.70	L 444.94	L 7,875.44	0.00	L -	17.70	L 7,875.44	17.70	L 7,875.44	100%
27	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	85.77	L 15.59	L 1,337.15	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0%
28	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e= 2 CM MORTERO DE 1:4	M2	191.39	L 224.98	L 43,058.92	0.00	L -	191.39	L 43,058.92	191.39	L 43,058.92	100%
29	PINTURA DE ACEITE	M2	191.39	L 76.80	L 14,698.75	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0%
MODULO DE AULA DE 9 X 8					**L 467,053.75**		**L 151,263.10**		**L 295,217.03**		**L 446,480.13**	**96%**
30	TRAZADO Y MARCADO	M.L	9.38	L 25.00	L 234.50	0.00	L -	9.38	L 234.50	9.38	L 234.50	100%
31	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	10.67	L 301.88	L 3,221.06	0.00	L -	2.70	L 815.08	2.70	L 815.08	25%
32	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM DE CAMA ARENA	M3	8.49	L 1,880.91	L 15,968.93	0.00	L -	2.70	L 5,078.46	2.70	L 5,078.46	32%
33	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC.M2	M2	11.88	L 783.71	L 9,310.47	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0%
34	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	11.49	L 131.05	L 1,505.76	0.00	L -	3.60	L 471.78	3.60	L 471.78	31%
35	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM CODALEADO FINO	M2	86.58	L 431.47	L 37,356.67	0.00	L -	24.00	L 10,355.28	24.00	L 10,355.28	28%

MODULO DE ACERAS AULAS Y CIRCULACION					**L 67,597.40**		**L -**		**L 16,955.09**		**L 16,955.09**	**25%**
36	INTERRUPTOR DOBLE	UNID	2.00	L 438.68	L 877.36	0.00	L -	2.00	L 877.36	2.00	L 877.36	100%
37	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	2.00	L 398.67	L 797.34	0.00	L -	2.00	L 797.34	2.00	L 797.34	100%
38	BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)(INHABILITADA)	UNID	1.00	L 3,604.68	L 3,604.68	0.00	L -	1.00	L 3,604.68	1.00	L 3,604.68	100%
39	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UNID	1.00	L 4,139.60	L 4,139.60	0.00	L -	1.00	L 4,139.60	1.00	L 4,139.60	100%
40	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	1.00	L 328.44	L 328.44	0.00	L -	1.00	L 328.44	1.00	L 328.44	100%
41	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP POLIDUCTO	M.L	55.00	L 69.33	L 3,813.15	0.00	L -	55.00	L 3,813.15	55.00	L 3,813.15	100%
42	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP TUBERIA EMT	M.L	26.00	L 101.39	L 2,636.14	0.00	L -	26.00	L 2,636.14	26.00	L 2,636.14	100%
43	CIRCUITO DE ILUM.HASTA 20 AMP, POLIDUCTO	M.L	15.00	L 69.33	L 1,039.95	0.00	L -	15.00	L 1,039.95	15.00	L 1,039.95	100%
44	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE	M.L	-	L 169.68	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0%
45	SUM/INST DE LUMINARIA DE TECHO LED	UNID	9.00	L 1,901.67	L 17,115.03	0.00	L -	9.00	L 17,115.03	9.00	L 17,115.03	100%
MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS					**L 34,351.69**		**L -**		**L 34,351.69**		**L 34,351.69**	100%
46	ASTA DE BANDERA CON ASIENTO DE MAMPOSTERIA	UNID	1.00	L 5,897.32	L 5,897.32		L -	0.00	L -	0.00	L -	0%
MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS					**L 5,897.32**		**L -**		**L -**		**L -**	0%
SUB-TOTAL					**L 574,900.16**		**L 151,263.10**		**L 346,523.81**		**L 497,786.92**	87%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7%					**L 40,243.01**		**L 10,588.42**		**L 24,256.67**		**L 34,845.08**	87%
UTILIDAD 13%					**L 74,737.02**		**L 15,126.31**		**L 34,652.38**		**L 49,778.69**	67%
TOTAL					**L 689,880.19**		**L 176,977.83**		**L 405,432.86**		**L 582,410.69**	84%

SUPERVISORA	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE: CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE
FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023	FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	AGUANQ-06-2023
NOMBRE DEL PROYECTO:	PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE
DEPARTAMENTO:	LA PAZ
MUNICIPIO:	AGUANQUETERIQUE

FUENTE FINANCIAMIENTO:	FONDOS TRANSFERENCIA	SEGUNDA ESTIMACION DEL:	6/9/2023	AL:	1/11/2023

MONEDA	LPS
Monto Inicial de Contrato	713,836.27
Anticipo del 20% del Monto del Contrato	
Monto Acumulado por O/C	
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	713,836.27
Monto de Segunda Estimacion	405,432.86

VoBo _____
Supervisor

		% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	405,432.86	56.80%	1.25	71.00%	0.00	0.00
	713,836.27					

	405,432.86	UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL	I.S.R 12,5%
Retencion de Impuesto Sobre La Renta	0	0.00	405,432.86	0.00	0.00	0.00
		Nota:Contratista con abonos a cuenta (Ver constancia)				

RESUMEN

Monto Estimado	**405,432.86**
Menos Deduccion de Anticipo	**0.00**
Menos Deduccion 5% Calidad de Obra	**20,271.64**
Menos Otras Deducciones	
TOTAL A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION	**385,161.22**

DARVIN ULICE RODRIGUEZ CHEVEZ
NOMBRE SUPERVISOR

UNIDAD TECNICA INTERMUNICIPAL MAG SURPAZ UTI
SUPERVISOR

Aguanqueterique La Paz, martes 21 de noviembre de 2023

Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos
Alcalde Municipal de Aguanqueterique La Paz

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON**
UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE, estando este ejecutado al 58.80% de su totalidad
Por lo tanto, doy paso a los respectivos encargados(as) de los departamentos de Contabilidad y Presupuesto y departamento de Tesorería realizar el trámite correspondiente al pago de **SEGUNDA ESTIMACION POR UN VALOR DE TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON VEINTE Y DOS CENTAVOS (L.385,161.22)**

A Favor de CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L. representada legalmente por la

Ing. Yessica Del Socorro Medina Claros.

Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.

Abner Israel Perdomo Medina
Unidad de Supervisión Municipal
Técnico de Proyectos Alcaldía Municipal de Aguanqueterique

MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA

Aguanqueterique La Paz, martes 21 de noviembre de 2023

Depto. Presupuesto y Contabilidad
Depto. Tesorería

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON**
UBICADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE, estando este ejecutado al 58.80% de su totalidad
Por lo tanto, doy paso a los respectivos encargados(as) de los departamentos de Contabilidad y Presupuesto y departamento de Tesorería realizar el trámite correspondiente al pago de **SEGUNDA ESTIMACION POR UN VALOR DE TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON VEINTE Y DOS CENTAVOS (L.385,161.22)**

A Favor de CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L. representada legalmente por la

Ing. Yessica Del Socorro Medina Claros.

Agradeciendo su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026 AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

Erlin Omar Rodríguez Ramos
Alcalde Municipal De Aguanqueterique

Antecedentes

El Municipio de Aguanqueterique La Paz, se encuentra ubicado en la zona baja del canal seco.

La alcaldía municipal de Aguanqueterique, buscando priorizar las necesidades de la población llevo a cabo la ejecución del proyecto, mencionado en este informe;

Con el objetivo de brindar un acondicionamiento seguro a las escuelas beneficiadas.

Descripción del proyecto

En este tipo de proyecto, se pretende dar respuestas a las necesidades de escuelas con ambiente seguro para lo cual según las especificaciones técnicas y contractuales el proyecto consta de las siguientes actividades, contratadas, según estimación

1.- Resumen de la situación actual:

NOMBRE: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON
UBICADO EN: LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE
Beneficiarios: ALUMNADO GENERAL
Financiamiento: ALCADIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE
Duración: 120 Días.
Situación Actual del Proyecto: ejecutado en un **58.80%**

Costo Total del Proyecto Presupuestado: L. **713,836.27**
Monto Solicitado por esta estimación: L.385,161.22

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto está ejecutándose con las mejores condiciones y presenta muy buena calidad de obra, se adjunta el cuadro de actividades realizadas
- Las cantidades de la obra fueron verificadas en campo y comparadas en la estimación presentada.
- Se recomienda a la comunidad hacer vigilancia para evitar pérdidas y daños a las obras previo la recepción por parte de la alcaldía
- Se utilizó todo el equipo necesario para una buena ejecución y buena calidad de las obras.

3. MATERIAL FOTOGRAFICO

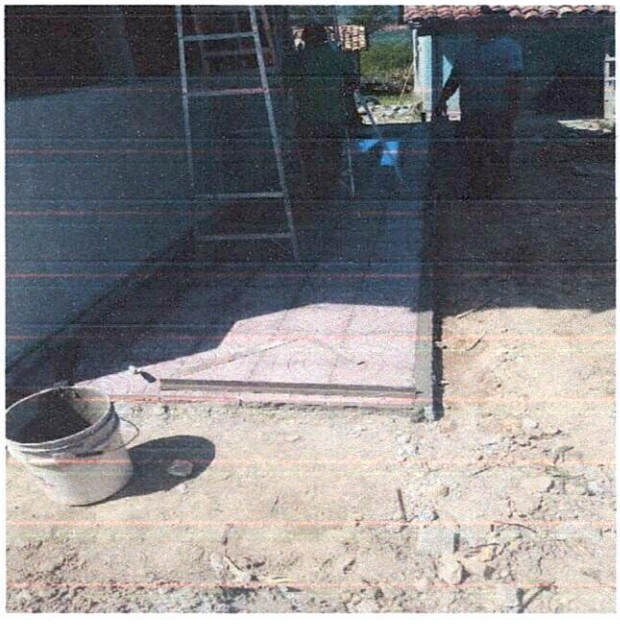

MATERIAL FOTOGRAFICO

MATERIAL FOTOGRAFICO

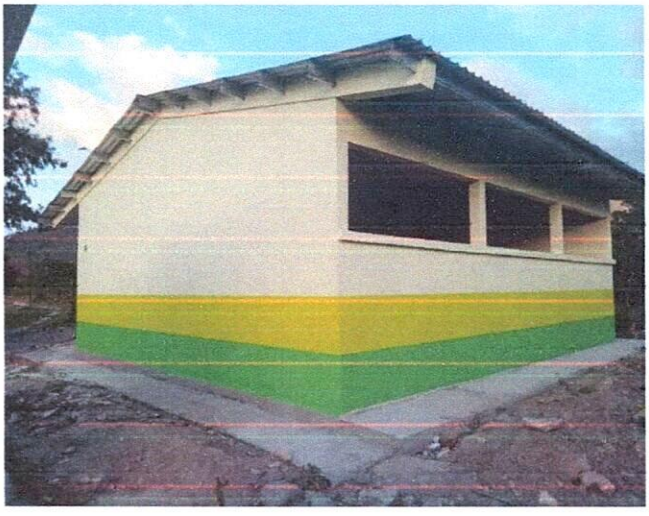

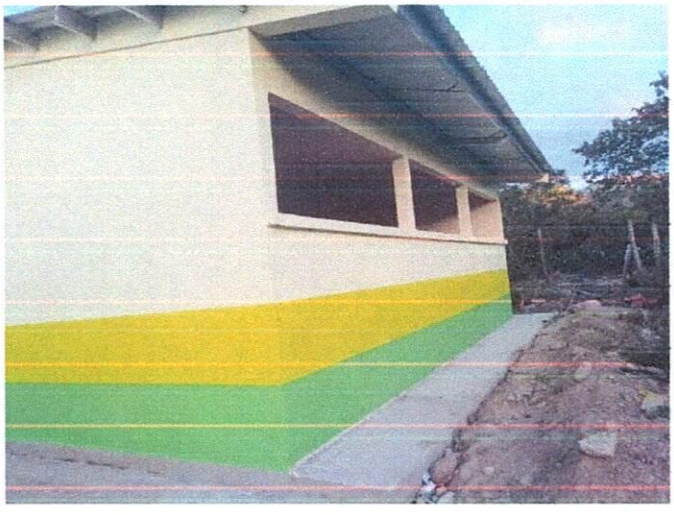

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión:11/02/2019

RTN: 08019018064932

CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☑	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

Ministra Directora

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3123418 Transacción: 3DD2BC

República de Honduras
Secretaria de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 12011985004816

YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo		Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador		Productor Alcoholes Licores	
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas		Importador Alcoholes Licores	
Prestamista			

Fecha de Emisión: 20110209

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario acuerdo 43 Publicada el 18 de Enero de 1973

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 584615 Transaccion: BB7B4A

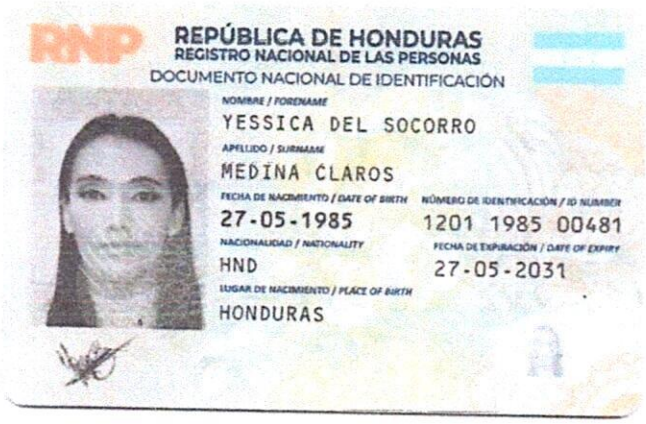
RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE / FORENAME
YESSICA DEL SOCORRO
APELLIDO / SURNAME
MEDINA CLAROS
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
27-05-1985
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1201 1985 00481
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
27-05-2031
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

RNP
3400000004461805
DOMICILIO / ADDRESS
LA PAZ
LA PAZ
COMISIONADOS PROPIETARIOS
I<HND0050968978<<<<<<<<<<<<<<<
8505279F3105272HND<<<<<<<<<<<8
MEDINA<CLAROS<<YESSICA<DEL<SOC

Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2451-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 27/10/2021 12:54:43 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Cristian Emilio -Castillo Mateo, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 25228 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2451-2022 en el área de actividad relativa a Consultoria,Obras . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.** Con **R.T.N. 08019018064932** y con domicilio en la Ciudad de La Paz, Departamento de La Paz y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 24 enero 2022, 16:13 Válido por 1095 días.

Código Verificación:

Código de Verificación:

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE. DIRECTOR POR LEY de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE
DIRECTOR POR LEY

CC.DALD

Verificar en:
http://www.honducompras.gob.hn

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:
http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion

Fecha de Emisión: 24 enero 2022, 16:13 Válido por 1095 días.

Código Verificación:

Sociedad Mercantil Nacional	**CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
No. de Resolución	**2451-2022**
No. de Certificación	**2451**
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	**24/01/2025**
Área de Actividad	**Consultoria,Obras**
Rubro	**Supervisi¿n de proyectos, obras y construcci¿n.**
Registro Tributario Numérico	**08019018064932**
Certificación del Órgano Societario	**Yessica del Socorro Medina Claros , Rody Emiro Medina Claros , Diana Waldina Medina Claros**
Domicilio Legal	**Honduras, La Paz, La Paz**
Dirección	**Boulevard, La merced.**
Teléfono	**27742008**
Correo Electrónico	**constructoraingenium@hotmail.com**

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PGR
Procuraduría General de la República

CONSTANCIA
SM-2023-1784

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Juridica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....CONSTRUCTORA INGENIUM S DE R.L
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 04 TOMO: 04 DEP: LA PAZ
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....1201198500481
R.T.N.....08019018064932
REPRESENTANTE LEGAL.....YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: PARA TRAMITES DE PAGO EN MUNICIPALIDADES Y PRECALIFICACIONES CON INSTITUCIONES DEL GOBIERNO PARA PRESENTARSE ANTE: ALCALDIAS

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de septiembre del 2023

ABG. MARIO ALEXIS MORAZÁN AGUILERA
SECRETARIO GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

munilapazcontroltributario1@gmail.com TELEFONO. 2774-2523/95559928

PERMISO DE OPERACIÓN NUMERO
464

Permiso De Operación De Negocio

Propietario Representante **YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS**

Nombre del Negocio: **"CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L."**

Tipo de negocio: **EMPRESA CONSTRUCTORA**

Actividad principal: **CONSTRUCCIÓN**

Dirección: **BARRIO LA MERCED, LA PAZ, LA PAZ**

Emisión: **08/03/2023** Valido hasta el: **31/12/2023**

La Municipalidad de La Paz, El Alcalde Municipal extiende permiso de operación, el cual deberá ser colocado en un lugar visible. La Paz, La Paz 08 de Marzo del 2023.

JOSE ANIBAL FLORES AYALA
ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026
LA PAZ, LA PAZ

José Aníbal Flores Ayala
Alcalde Municipal
2022-2026

RENOVAR ESTE PERMISO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO PROXIMO

NOTA: FAVOR NOTIFICAR POR ESCRITO EL CIERRE DE SU NEGOCIO

Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/11/2023
Hora : 06:34 p.m.
USUARIO: ALEX.MAMZANARES

Orden de Pago No.: 4903

L.: 385,161.22

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1039

Fecha de Emision: 27/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019018064932

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA CRISTOBAL COLON UBICADA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE AGUANQUETERIQUE, POR LA CANTIDAD DE L.385,161.22

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 000 001 47110 11-001-01	Construcion de edificio de Escuela Cristobal Colon en la Comunidad Rancho Grande	385,161.22

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	385,161.22
	Monto Total:	**385,161.22**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	385,161.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**385,161.22**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Yessica Medina

Identidad No.: 4201-1985-00481

0s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdjl7HFOxAOKnylkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpOId6luYkoHGdeCb6B+ItmJC/P2Vsihiq8PkPGlHmjKB7xLEy6oKwcJDeLWq/w+7C6S//ImmECDWSqtEDEIPGb2q2Ai6z/0LdT3fxgZfWHAtoM=

CONSTRUTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

R.T.N. 08019018064932
Barrio La Merced, media cuadra al sur del Parque Mabuchi
Ishisuque, casa color beige, La Paz, La Paz, Honduras C.A.
Cel.: 3184-1319 E-mail: constructoraingenium@hotmail.com

CAI: 7DCA8F-36C416-D04C83-0A3682-3237A4-55
Factura No. 000-001-01-00000339

Día	Mes	Año
27	11	23

Cliente: Alcaldía Municipal de Aguanqueterique

R.T.N.: 12029011346364

Dirección: Bº El Centro

Imprenta y Servicios Multiples La Paz, R.T.N. 12011978002898; Cel.:9952-8360; Barrio La Concepcion, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.	
	Pago de 2da Estimación del Proyecto construcción de Edificio de Escuela Cristobal Colon ubicada en la Comunidad de Rancho Grande, Aguanqueterique			385,161.	22
	Total				

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 a 000-001-01-00000350
Fecha Limite de Emisión: 14/02/2024
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Contado ☐
Crédito ☐

Datos del Cliente Exonerado:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados		
Sub-Total L.		
Importe Exento / I.S.V. T 0 L.		
Importe Exonerado L.		
Alícuota 0% L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	385,161.	22

Cant. en Letras: _____

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

11-701-001572-9
ALCALDIA MUNIC. DE AGUANQUETERIQUE
(TRANSFERENCIAS)
FRENTE A PLAZA CENTRAL, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ TEL. 31473766/33898593

CHEQUE No. 84535442

COMAYAGUA, COMAYAGUA 27 Noviembre 2023
Lugar y Fecha

Constructora Ingenium S DE R L — L385,161.22
Páguese a la orden de

Trescientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y uno con 22/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01701079⑆00117010015729⑈84535442

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
