ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Marcovia, 13 de marzo de 2025

NOTA INFORMATIVA

Por medio de la presente envío documentación final del proceso de **Licitación Privada LP-01-2024** para el proyecto de **Construcción de Pavimento con concreto ciclópeo en San José de las Conchas, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca**.

Sin otro particular.

José Daniel Maldonado
Admón. Unidad de Infraestructura

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/02/2025
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: JEISI.BORJAS

Orden de Pago No.: 46830

L.: 423,640.98

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8961

Fecha de Emision: 20/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: 13125

Paguese a: VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ Id/RTN: 0601198405972

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO AL SE?OR VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ESTIMACION #4 DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO e=20cm EN SAN JOSE DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA TOTAL A PAGAR L. 423,640.98

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 016 000 001 47210 15-013-01	Construcción de Pavimento con Concreto Ciclope en San José De Las Conchas en el Municipio de Marcovia, departamento de Choluteca (caminos Productivos)	423,640.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	423,640.98
	Monto Total:	**423,640.98**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	423,640.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**423,640.98**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA 2022 2026 PRESUPUESTO CHOLUTECA HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA 2022 2026 CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA 2022 2026 TESORERIA CHOLUTECA, HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.: 0601198405972

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypw[illegible]VgnhCyQs6X+G74MMXm3IRj+Qs6VrvkjIrOgwVsJTIhEInUz3NrEA5gQz4d1OHTrzIftyxkBw0z736GVq/mh5f17
KXIIYZKf8iJICTA3xoyV8xm8S2e2kIZDjf7sfxp6M=

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 20 **MES** Febrero **AÑO** 2025

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Vasco Adalid Aguilar Alvarez

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 423,640.98
Cuatrocientos Veintitres mil Seiscientos cuarenta
Con Noventa y ocho centavos
POR CONCEPTO DE: cancelación de estimación #4
del contrato construcción de pavimento con concreto
Ciclopeo e=20cm

SOLVENCIA MUNICIPAL
IDENTIDAD NO, 0601 1972

FIRMA

VO BO ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Para: José Nahun Calix
Alcalde Municipal

De: Lic. José Daniel Maldonado
Unidad de Infraestructura

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 20 de febrero de 2025

Sirva la presente para solicitarle Autorice el pago al señor **Vasco Adalid Aguilar Álvarez,** por concepto de pago de cancelación Estimación # 4 del contrato **"Construcción de Pavimento con concreto ciclópeo e=20cm en San José de las Conchas"**, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Valor del contrato más adenda ---------- L. 1, 854, 113.81

Valor inicial del contrato	L.	1, 492, 321.19
Valor de Estimación N° 1	L.	438, 897.07
Valor de Estimación N° 2	L.	446, 223.39
Valor de Estimación N° 3	L.	223, 111.70
Valor de Estimación N° 4	L.	306, 778.58
Saldo anterior pendiente	L.	77, 310. 45
Deducción 20% anticipo	L.	15, 462.09
Sub- Total	L.	61, 848.36
Mas valor de ADENDA	L.	361, 792.62
Total a pagar	L.	423, 640.98

Total a pagar (Cuatrocientos Veintitrés Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras con Noventa y Ocho Centavos).

Cc. Archivo

RNP
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
VASCO ADALID
AGUILAR ALVAREZ
26-08-1984
0601 1984 05972
HND
26-08-2031
HONDURAS

RNP
340000004190751
MARCOVIA
CHOLUTECA
I<HND0047935466<<<<<<<<<<<<<<<
8408266M3108262HND<<<<<<<<<<<4
AGUILAR<ALVAREZ<<VASCO<ADALID<

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08011984059720

VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamistas	

Fecha de Emisión: 20130528

[illegible] Art. 2, 3 y 5 del Decreto Nº [illegible] del [illegible] de Enero de [illegible], reformado [illegible] Art. 12 del Decreto Nº 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 15 del Decreto Nº [illegible] de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 68 del Decreto 28-97, Art. 39 del Decreto [illegible] Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 5 Decreto de Ley Nº 14 del [illegible] de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20860 y su [illegible] No [illegible] Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de [illegible] cualquier cambio en los datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario [illegible] obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento [illegible]-112-1049707 [illegible]

Servicio de Administración de Rentas

Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ**

con Registro Tributario Nacional: **06011984059720**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 02/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SEGUROS CREFISA
Aseguramos tu tranquilidad!

POLIZA DE FIANZA

Póliza No.:	**ZC-FC-111170-2024**	**Desde:**	**02/12/2024**	**A las 12 horas del Mediodía.**
Fecha de Emisión:	**02/12/2024**	**Hasta:**	**02/12/2025**	**A las 12 horas del Mediodía.**

Afianzado: **VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ**
Domicilio: **CHOLUTECA,CHOLUTECA**

Beneficiario: **ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA CHOLUTECA**
Domicilio: **MARCOVIA, CHOLUTECA**

Suma Afianzada: **L 92,800.00**

FIANZA DE CALIDAD DE OBRA
CONDICIONES GENERALES

Garantía a favor de **"ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA CHOLUTECA "**, para garantizarle que el afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, reparará o corregirá cualquier falla o defecto de construcción por mano de obra o materiales empleados por el afianzado, en el proyecto: **"PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO e=20 CM EN SAN JOSE DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUETCA, REPUBLICA DE HONDURAS".** Garantía que asciende a la cantidad de: **L 92,800.00 (NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100),**

CLÁUSULA ESPECIAL: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.

SEGUROS CREFISA, S.A., que en lo sucesivo se denominará la Compañía garantiza por la presente póliza a favor del beneficiario (arriba mencionado), el cumplimiento por parte del afianzado (también arriba mencionado),

Las Condiciones Particulares que se agreguen a esta póliza, con el consentimiento de las partes contratantes se entienden que hacen parte del seguro otorgado según los términos de este documento.

Las Condiciones Generales adjuntas que se agregan a esta Fianza, con el consentimiento de las partes contratantes forman parte integrante de la presente Póliza

En fe de lo cual por Seguros Crefisa, se firma y sella en la Ciudad de:
TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 de Diciembre del 2024

SEGUROS CREFISA S.A. DEPTO DE FIANZAS 1163 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Firma Autorizada

VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ INGENIERO CIVIL 10-03-10 23-03-10 C I C H N° 4933

Afianzado

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.

Tel. 2722-2071 / 2722-2072

Acta de Recepción Definitiva

Proyecto: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA."**

Ubicación: San José de las Conchas, Marcovia, Choluteca.

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del Estado relacionada(s) con la obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

Marcovia, Choluteca 2 de diciembre del 2024

Lugar y fecha

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA 2022 2026 JOSÉ ARTHUN CALIX ALCALDE CHOLUTECA, HONDURAS

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA 2022 2026 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CHOLUTECA, HONDURAS

Supervisor alcaldía

VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ INGENIERO CIVIL 18-03-10 23-03-10

Ejecutor

INFORME DE AVANCE DE OBRA

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA."

Alcaldia Municipal de Marcovia

UBICACIÓN: San Jose de Las Conchas, Municipio de Marcovia, Departamento Choluteca.

Constructor Obras civiles
ING. VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ CICH 4833

MARCOVIA, CHOLUTECA 2 DE DICIEMBRE DEL 2024

Contenido

1) INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 4
1.1. Nombre del Proyecto 4
1.2. Financiamiento 4
1.3. Unidad Ejecutora 4
1.4. Descripción de las obras de construcción 4
1.5. Localización del Proyecto 4
2) INFORME DE CONSTRUCCION 5
2.1. Periodo del informe: 5
2.2. El resumen del contrato de construcción: 5
2.3. Breve análisis del cumplimiento del programa de trabajo 5
2.4. Las actividades realizadas 5
2.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA 7
2.6. Equipo y herramientas del contratista: 7
2.7. Estado del tiempo 8
2.8. Programa de trabajo 8
3) INFORME DE LA SUPERVISION 8
3.1. Ente supervisor 8
3.2. La supervisión realizó las siguientes actividades: 8
4) OBSERVACIONES 9
5) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9
6) INFORME FOTOGRAFICO 10

Marcovia, Choluteca 2 de diciembre del 2024

Sr. Alcalde

Jose Nahun Calix Alvarez

Distinguido alcalde:

Adjunto remito a usted el informe #5 final de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.** "correspondiente al periodo del 26 de noviembre al 2 de ciciembre del 2024.

Acorde y conforme a las cláusulas contractuales del contrato

Sin otro particular

Atentamente,

Daniel Maldonado
Infraestructura

1) INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA."

1.2. Financiamiento

Alcaldía municipal de Marcovia 100%

1.3. Unidad Ejecutora

Alcaldía municipal de Marcovia

1.4. Descripción de las obras de construcción

Construcción pavimento ciclópeo de 4.5 m de ancho y 20 cm de espesor desde muelle hasta calle principal.

1.5. Localización del Proyecto

El proyecto se construye en el departamento de Choluteca, municipio de Marcovia en San Jose de las Conchas

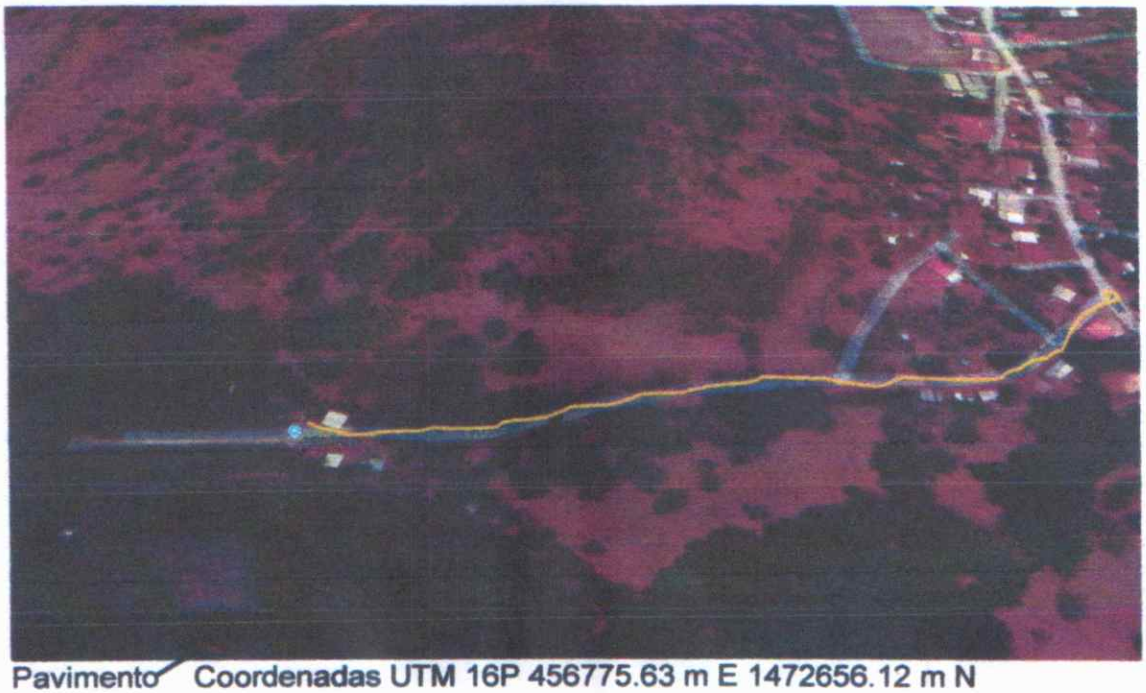

Pavimento Coordenadas UTM 16P 456775.63 m E 1472656.12 m N

2) INFORME DE CONSTRUCCION

2.1. Periodo del informe:

Este informe se elabora con las actividades realizadas en el proyecto durante el 7 al 13 de noviembre del 2024.

2.2. El resumen del contrato de construcción:

CONCEPTO	CONTRATISTA
Nombre de contratista	**Vasco Adalid Aguilar Alvarez**
Fecha de Inicio	18 de octubre 2024
Fecha de Terminación	18 de enero del 2024
Monto contractual	Lps. 1,492,321.19
Modificaciones de plazo (indicar nuevas fechas de terminación)	Lps. 1,854,113.81
Modificaciones en monto (indicar nuevo monto contractual)	Lps. 1,854,113.81
Monto ejecutado	Lps. 1,854,113.81
Monto facturado	Lps. 1,415,010.73
% de avance físico programado	80%
% de avance físico Ejecutado	100%
Monto de avance financiero programado	Lps. 1,244624.83
Plazo contractual Original	90 días
Plazo contractual modificado	No se ha modificado

2.3. Breve análisis del cumplimiento del programa de trabajo

Durante este perdió han caído tormentas muy fuentes lo cual afecta el avance de la obra pero esto no ha retrasado la ejecución de la obra .

2.4. Las actividades realizadas

Se han realizado las siguientes actividades durante este período:

No.	Renglon	CONTRATADO + ADENDA DE CONTRATO		ESTIMACIÓN ACUMULADA
		unidad	Cantidad	% de Avance
1	PRELIMINARES			
1.1	Limpieza de Terreno	M2	1739.88	100%

1.2	Excavacion de Material	M3	173.99	100%
1.3	Trazado y Maracado	ML	386.64	100%
	SUBTOTAL			100%
2	**RELLENO Y CONFORMACION**			
2.1	Relleno y compactado con material selecto	M3	86.99	100%
	SUBTOTAL			100%
3	**CONCRETO CICLOPEO**			
3.1	Concreto Ciclopeo e=20 cm proporcion 1:2:3	m3	347.98	100%
	SUBTOTAL			100%
4	**Obras Finales**			
4.1	Limpieza Final	JRD	1.00	100%
	SUBTOTAL			100%
	TOTAL CONTRATO INICIAL			100%
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA			
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Excavacion de Material	M3	6.00	100%
1.2	Trazado y Maracado	ML	6.00	100%
	SUBTOTAL			100%
2	**RELLENO Y CONFORMACION**			
2.1	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	5.20	100%
	SUBTOTAL			100%
3	**CONCRETO CICLOPEO**			
3.1	Concreto Ciclopeo e=20 cm proporcion 1:2:3	M3	3.11	100%
-	**SUBTOTAL**	-	-	100%
4	**Obras Finales**			
4.1	alcantarilla tubo de 24 pulgadas	ml	6.00	100%
-	**SUBTOTAL**	-	-	100%
	TOTAL ALCALTARILA			100%
	RELLENO DE MATERIALE SELECTO PARA BASE			
1	**RELLENO Y CONFORMACION**			
1.1	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	148.06	100%
	TOTAL RELLENO DE MATERIAL PARA BASE			100%
	BORDILLO 15X15 CMS			
1	**BORDILLO 15X15 CMS**			
1.1	BORDILLO 15X15 NO. @30 CM Y 1 HORIZONTAL	ML	47.00	100%
	TOTAL BORDILLO 15X15 CMS			100%
	TALUDES LATERALES			
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Excavacion de Material	M3	43.60	100%

1.2	Trazado y Maracado	ML	386.64	100%
-	SUBTOTAL	-	-	100%
2	RELLENO Y CONFORMACION			
2.1	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	60.50	100%
-	SUBTOTAL	-	-	100%
	TOTAL TALUDES LATERALES			100%
	VADO			
1	PRELIMINARES			
1.1	Excavacion de Material	M3	4.95	100%
-	SUBTOTAL	-	-	100%
2	RELLENO Y CONFORMACION			
2.1	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	23.42	100%
			SUBTOTAL	100%
3	CONCRETO CICLOPEO			
3.1	Concreto Ciclopeo e=20 cm proporcion 1:2:3	M3	11.05	100%
-	SUBTOTAL	-	-	100%
	TOTAL VADO			100%
	TOTAL CONTRATADO + ADENDA DE CONTRATO			100%

2.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA

1 ingeniero residente
1 maestro de obra
3 albañiles
10 ayudantes
3 conductores
1 operador de retroexcaadora

2.6. Equipo y herramientas del contratista:

#	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Vehículo 4x4	1 unidad	Buen estado	ninguna
2	Plantas Generadoras	1 unidades	Buen estado	ninguna
3	Palas	12 unidades	Buen estado	ninguna
4	Piochas	2 unidades	Buen estado	ninguna
5	Barras	3 unidades	Buen estado	ninguna
6	Almáganas	3 unidades	Buen estado	ninguna
7	Serrucho	1 unidades	Buen estado	ninguna
8	Alicates	3 unidades	Buen estado	ninguna
9	Martillos	3 unidades	Buen estado	ninguna
10	Cubetas	8 unidades	Buen estado	ninguna
11	Puntas y cinceles	8 unidades	Buen estado	ninguna

12	Grifas	6 unidades	Buen estado	ninguna
13	Niveles	2 unidades	Buen estado	ninguna
14	Escuadras	3 unidades	Buen estado	ninguna
15	Sierras circulares	2 unidades	Buen estado	ninguna
16	taladros	1 unidades	Buen estado	ninguna
17	Motosierra	1 unidad	Buen estado	ninguna
18	Carretillas de mano	4 unidades	Buen estado	ninguna
19	Camión de 4 toneladas	1 unidad	Buen estado	ninguna
20	Volqueta de 15 m3	2 unidades	Buen estado	ninguna
21	Retroexcavadora	1 unidad	Buen estdo	ninguna

2.7. Estado del tiempo

Lluvias fuertes han caído en este periodo de no ser por estas lluvias el proyecto estaría en un mejor porcentaje de avance.

2.8. Programa de trabajo

Se adjunta la copia en los anexos, del programa de trabajo.

3) INFORME DE LA SUPERVISION

3.1. Ente supervisor

Las instituciones responsables de la supervisión son Alcaldía municipal de Marcovia y SIT con las cuales se ha sostenido constante comunicación y se han sostenido varias reuniones de trabajo.

3.2. La supervisión realizó las siguientes actividades:

Durante este periodo se ha tenido comunicación vía teléfono, correo electrónico y de manera presencial con los supervisores, se ha tenido la supervisión de la ing. Osmany Aguilera representante de SIT, también se ha tenido la visita de técnicos municipales y del alcalde municipal y de parte de la comunidad hemos tenido el acompañamiento de le presidente de los pescadores Carlos Peña para verificar el avance de la obra realizaron las siguientes actividades:

- Verificación de las actividades de las obras ejecutadas.
- Se hizo un control fotográfico del proyecto para tener a futuro el álbum fotográfico conforme avanza el proyecto.
- Inspección de los materiales a usar por el contratista para corroborar la calidad

4) OBSERVACIONES

El volumen de relleno considerado en la obra es de solo 5 cm lo cual dejaría una base no acta par el pavimento por lo cual al alcadia ha aprobado un volumen extra el cual será definido por los niveles y estará entre 15 y 20 cm.

Se ha instalado una alcantarilla de 24 pulgadas para aliviar un paso de agua natural que podría dañar la obra en el futuro.
Se construyeron obras tipo vado para el pase de agua lluvia.

5) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La obra está finalizada y entregada ya nuestro equipo técnico y el supervisor de SIT ya hicimos la visita final y se ha recibido la obra a satisfacción .

6) INFORME FOTOGRAFICO

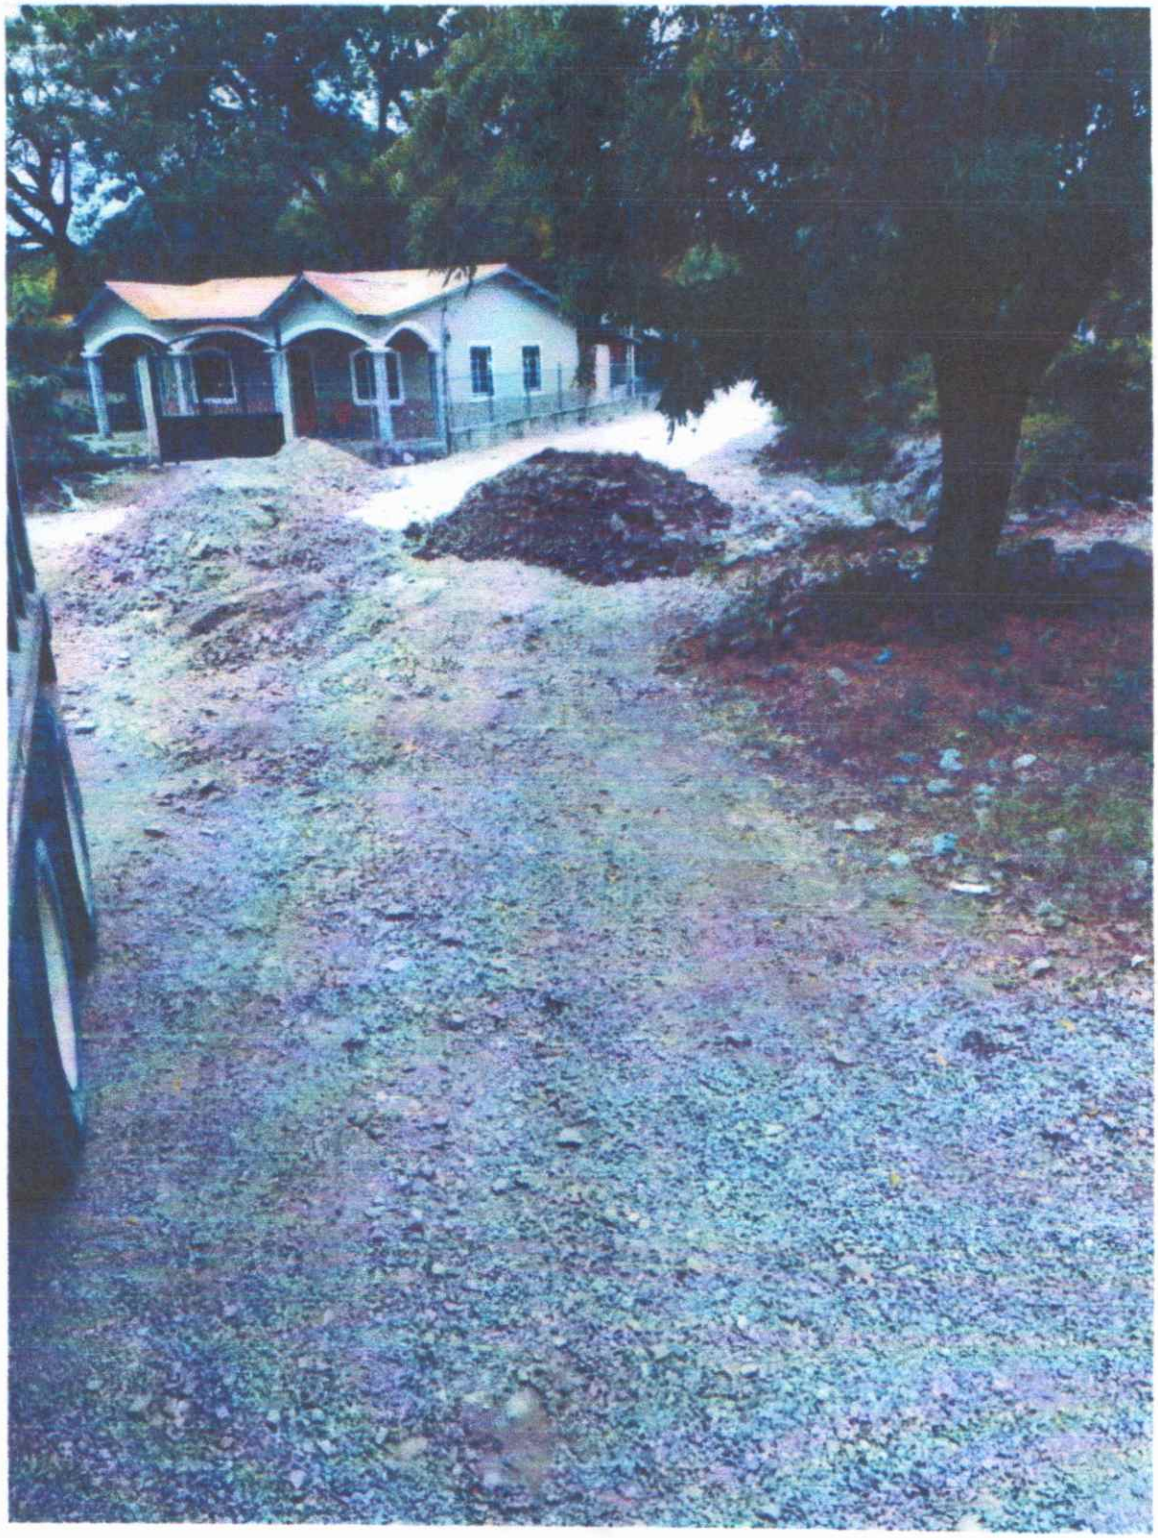

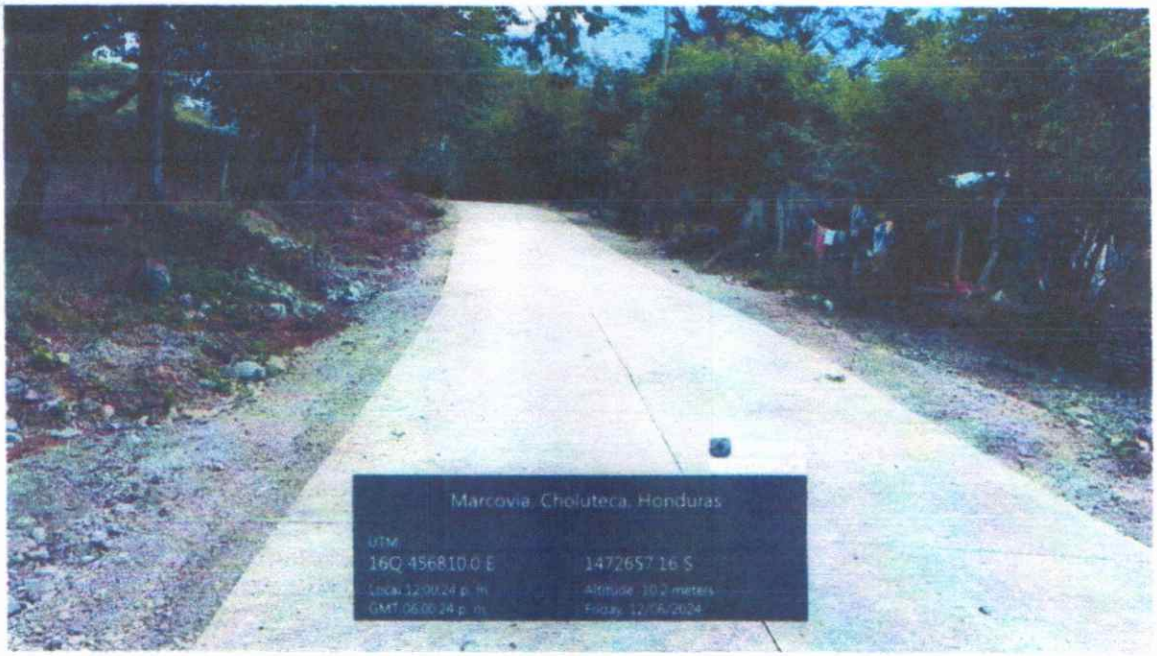
Marcovia, Choluteca, Honduras
UTM
16Q 456810.0 E
1472657.16 S

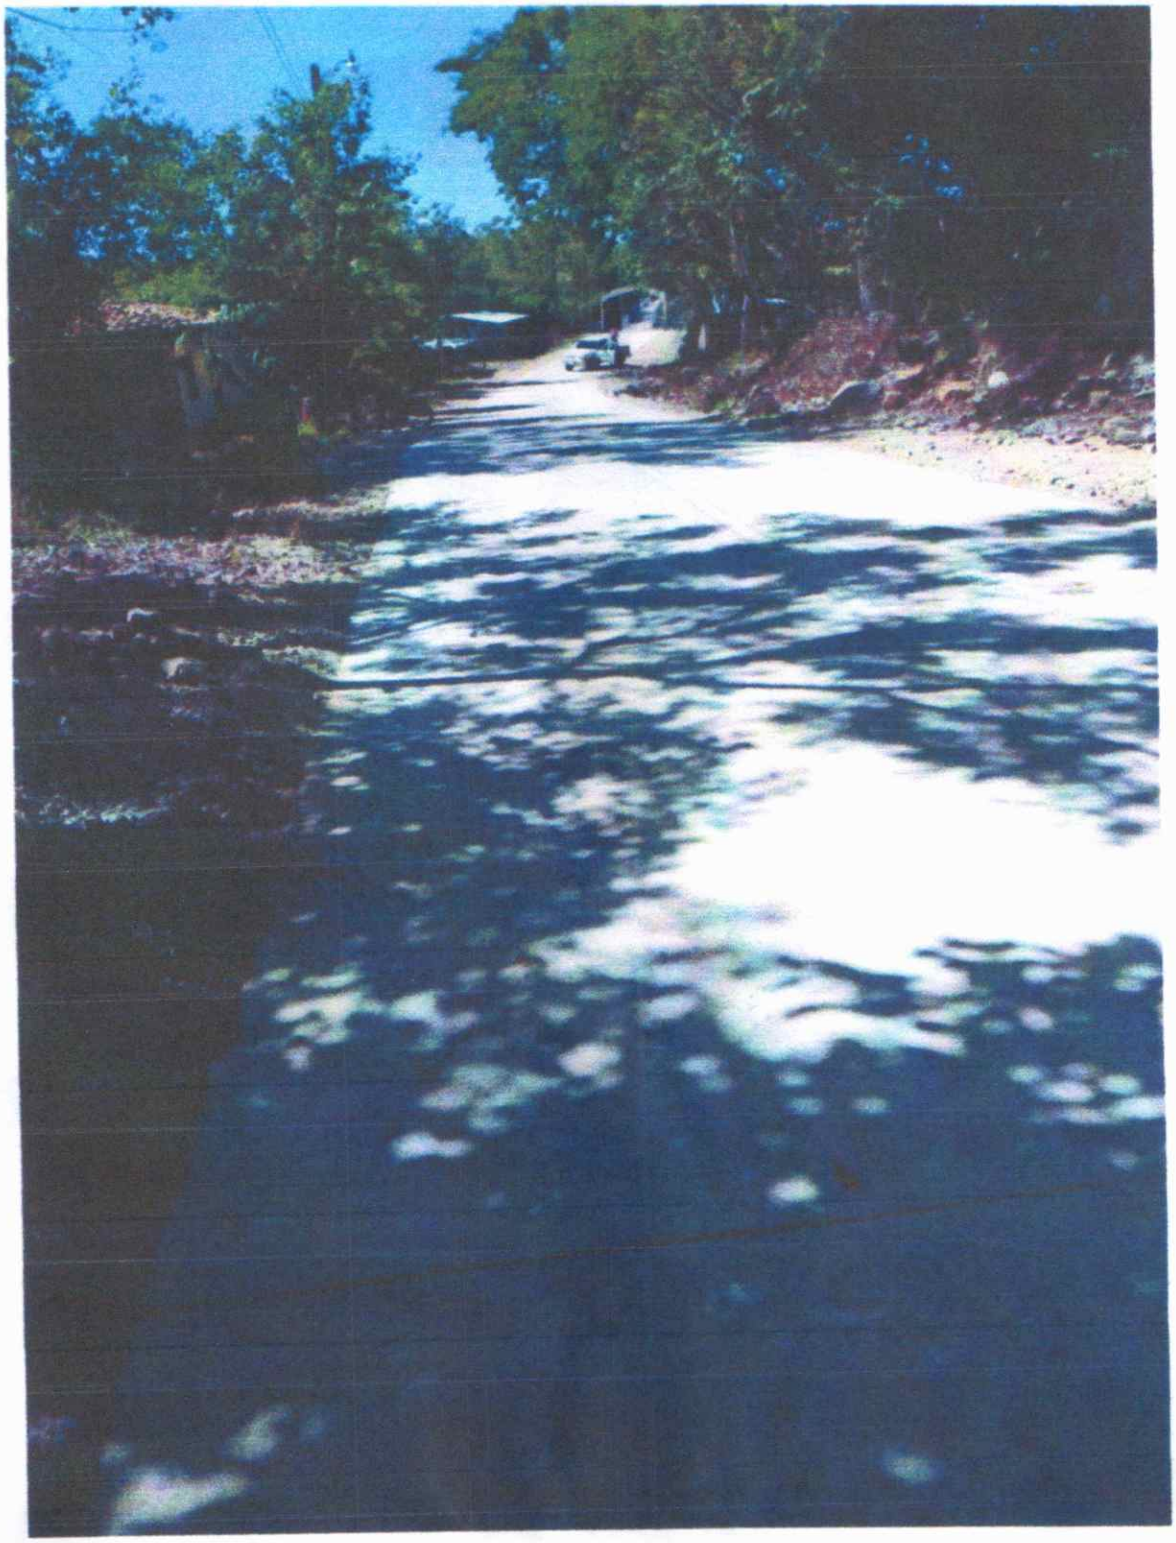

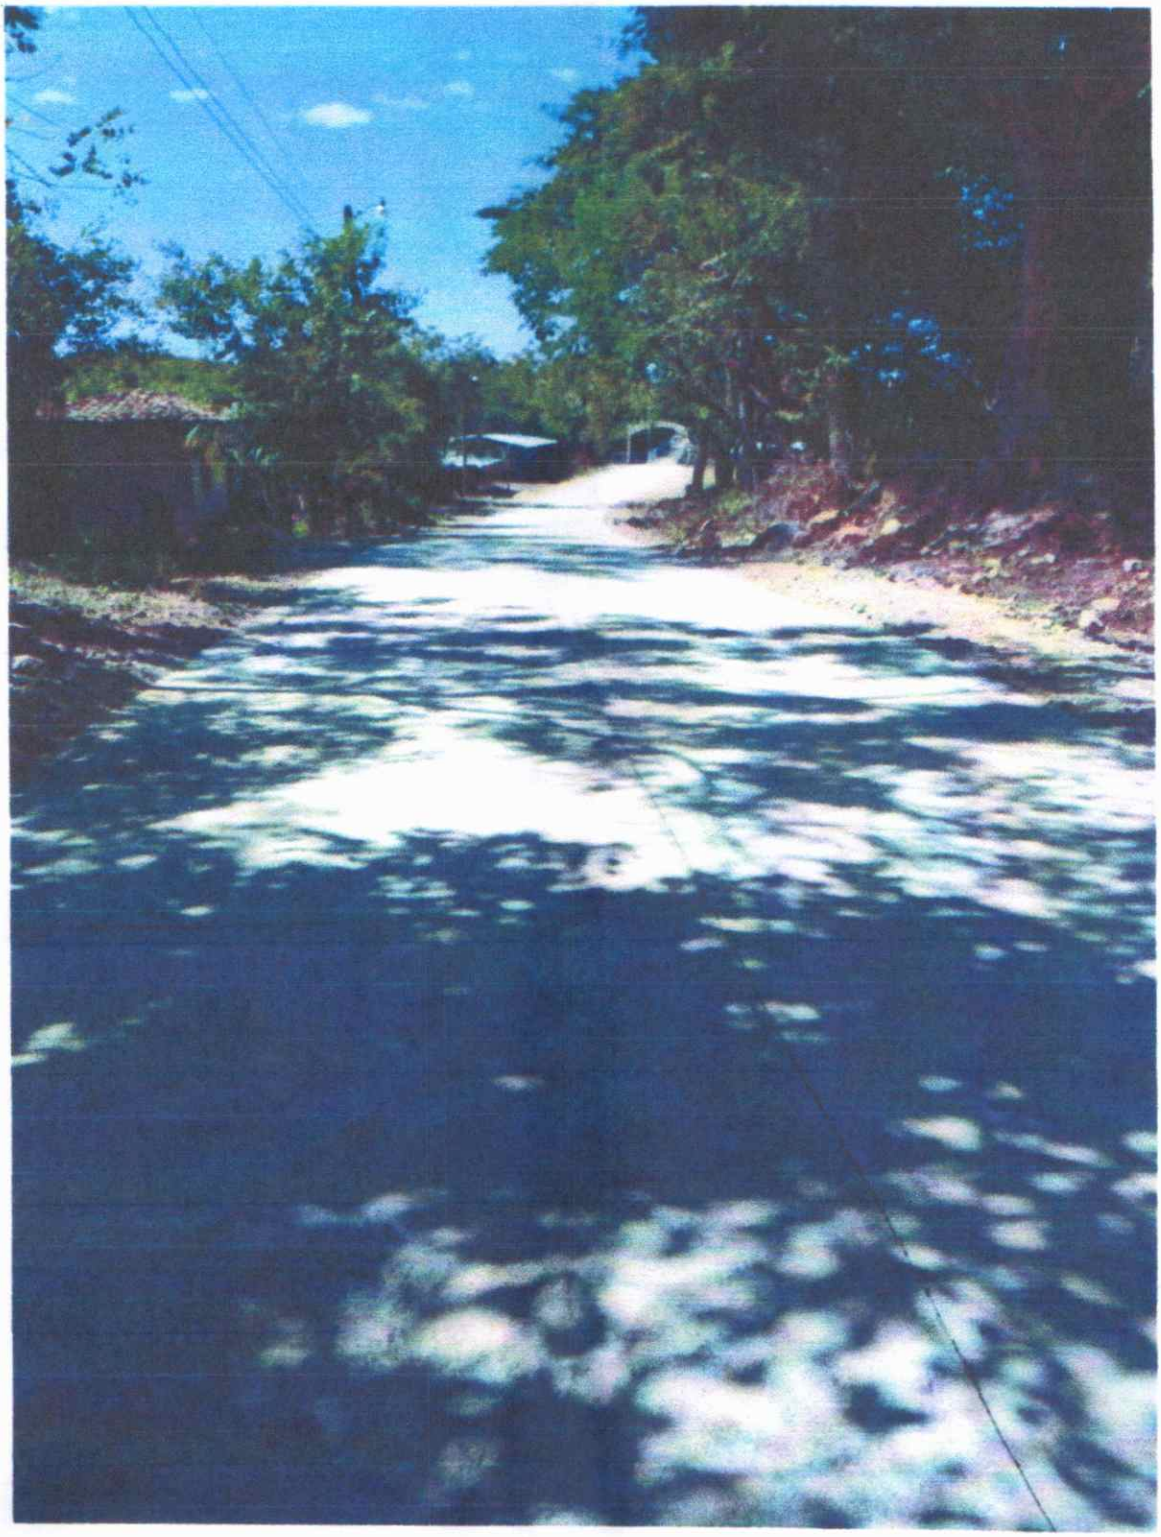

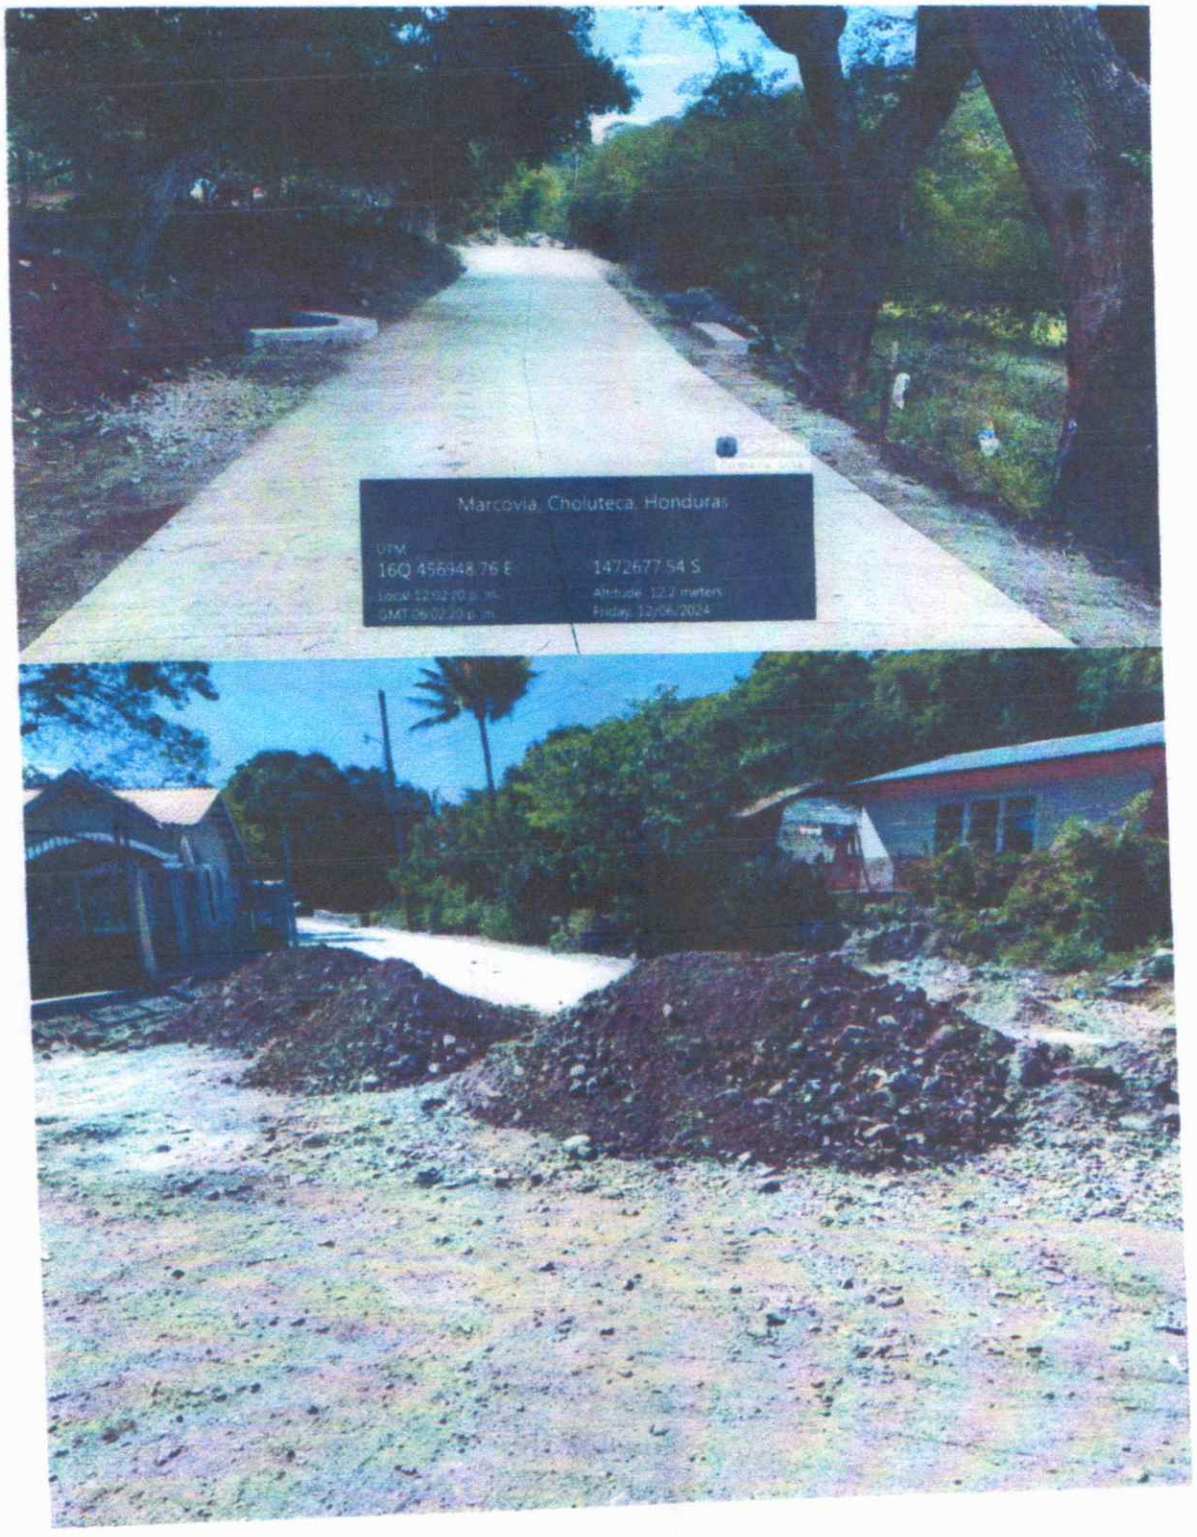
Marcovia, Choluteca, Honduras
UTM
16Q 456948.76 E
1472677.54 S
Altitude: 12.2 meters
Friday, 12/06/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072

Estimacion de Avance de obra

Contrato de Obras: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA."

Ubicación: SAN JOSE DE LAS CONCHAS, MARCOVIA, CHOLUTECA.

Nombre del Contratista: Vasco Adalid Aguilar Alvarez

Estimación No.5 FINAL

fecha 26/11/2024

No.	Rengion	CONTRATADO + ADENDA DE CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR				ESTA ESTIMACIÓN				ESTIMACIÓN ACUMULADA				POR EFECTUAR			
		unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Cantidad	P. Unitario	Total	% de Avance	Cantidad	P. Unitario	Total	% de Avance	Cantidad	P. Unitario	Total	% de Avance	Cantidad	P. Unitario	Total	% de Avance
1	PRELIMINARES																				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	1739.88	L 7.70	L 13,397.08	1739.88	7.70	13,397.08	100%		L 7.70	L -	0%	1,739.88	L 7.70	L 13,397.08	100%	-	7.70	L -	0%
1.2	Excavacion de Material	M3	173.99	L 481.25	L 83,732.69	173.99	481.25	83,732.69	100%		L 481.25	L -	0%	173.99	L 481.25	L 83,732.69	100%	-	481.25	L -	0%
1.3	Trazado y Maracado	ML	386.64	L 33.46	L 12,938.13	386.64	33.46	12,938.13	100%		L 33.46	L -	0%	386.64	L 33.46	L 12,938.13	100%	-	33.46	L -	0%
	SUBTOTAL				L 110,067.90			110,067.90	100%			L -	0%			L 110,067.90	100%			L -	0%
2	RELLENO Y CONFORMACION																				
2.1	Relleno y compactado con material selecto	M3	86.99	L 1,001.55	L 87,124.83	86.99	1,001.55	87,124.83	100%		L 1,001.55	L -	0%	86.99	L 1,001.55	L 87,124.83	100%	-	L 1,001.55	L -	0%
	SUBTOTAL				L 87,124.83			87,124.83	100%			L -	0%			L 87,124.83	100%			L -	0%
3	CONCRETO CICLOPEO																				
3.1	Concreto Ciclopeo e=20 cm proporcion 1:2:3	m3	347.98	3,718.53	1,293,973.46	327.50	3,718.53	1,217,818.00	94%	20.48	L 3,718.53	L 76,155.46	6%	347.98	L 3,718.53	L 1,293,973.46	100%	-	L 3,718.53	L -	0%
	SUBTOTAL				L 1,293,973.46			1,217,818.00	94%			L 76,155.46	6%			L 1,293,973.46	100%			L -	0%
4	Obras Finales																				
4.1	Limpieza Final	JRD	1.00	1,155.00	L 1,155.00	0.00	1,155.00	-	0%	1.00	L 1,155.00	1,155.00	100%	1.00	L 1,155.00	1,155.00	100%	-	L 1,155.00	L -	0%
	SUBTOTAL				L 1,155.00			-	0%			L 1,155.00	100%			L 1,155.00	100%			L -	0%
	TOTAL CONTRATO INICIAL				L 1,492,321.19			1,418,010.73	95%			L 77,310.46	5%			L 1,492,321.19	100%			L -	0%
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA																				
1	PRELIMINARES																				
1.1	Excavacion de Material	M3	6.00	L 481.25	L 2,887.50		481.25	-	0	6	481.25	2887.5	1	6	481.25	2887.5	100%	0	481.25	-	-
1.2	Trazado y Maracado	ML	6.00	L 33.46	L 200.78		33.46	-	0	6	33.463	200.778	1	6	33.463	200.778	100%	0	33.463	-	-
	SUBTOTAL				L 3,088.28			-	0%			L 3,088.28	100%			L 3,088.28	100%			L -	0%
2	RELLENO Y CONFORMACION																				
2.1	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	5.20	L 1,001.55	L 5,212.40		1,001.55	-	0%	5.20	L 1,001.55	L 5,212.40	100%	5.20	L 1,001.55	L 5,212.40	100%	-	L 1,001.55	L -	0%
	SUBTOTAL				5212.40			-	0%			L 5,212.40	100%			L 5,212.40	100%			L -	0%
3	CONCRETO CICLOPEO																				
3.1	Concreto Ciclopeo e=20 cm proporcion 1:2:3	M3	3.11	L 3,718.53	L 11,564.62		3,718.53	-	0%	3.11	L 3,718.53	L 11,564.62	100%	3.11	L 3,718.53	L 11,564.62	100%	-	L 3,718.53	L -	0%
	SUBTOTAL				L 11,564.62			-	0%			L 11,564.62	100%			L 11,564.62	100%			L -	0%
4	Obras Finales																				
4.1	alcantarilla tubo de 24 pulgadas	ml	6.00	L 3,125.00	L 18,750.00		3,125.00	-	0%	6.00	L 3,125.00	L 18,750.00	100%	6.00	L 3,125.00	L 18,750.00	100%	-	L 3,125.00	L -	0%
	SUBTOTAL				L 18,750.00			-	0%			L 18,750.00	100%			L 18,750.00	100%			L -	0%
	TOTAL ALCALTARILLA				L 38,615.90			L 0.00	0%			L 38,615.90	100%			L 38,615.90	100%			0%	0%
	RELLENO DE MATERIALE SELECTO PARA BASE																				
1	RELLENO Y CONFORMACION																				
1.1	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	148.06	L 1,001.55	L 148,285.76		1,001.55	-	0%	148.06	L 1,001.55	L 148,285.76	100%	148.06	L 1,001.55	L 148,285.76	100%	-	L 1,001.55	L -	0%
	TOTAL RELLENO DE MATERIAL PARA BASE				L 148,285.76			-	0%			L 148,285.76	100%			L 148,285.76	100%			L -	0%
	BORDILLO 15X15 CMS																				
1	BORDILLO 15X15 CMS																				
1.1	BORDILLO 15X15 NO. @30 CM Y 1 HORIZONTAL	ML	47.00	L 286.15	L 13,449.05		286.15	-	0%	47.00	L 286.15	L 13,449.05	100%	47.00	L 286.15	L 13,449.05	100%	-	L 286.15	L -	0%
	TOTAL BORDILLO 15X15 CMS				L 13,449.05			-	0%			L 13,449.05	100%			L 13,449.05	100%			L -	0%
	TALUDES LATERALES																				
1	PRELIMINARES																				
1.1	Excavacion de Material	M3	43.60	L 481.25	L 20,982.50		481.25	-	0	43.6	481.25	20982.5	100%	43.6	481.25	20982.5	100%	0	481.25	-	-
1.2	Trazado y Maracado	ML	386.64	L 33.46	L 12,938.13		33.46	-	0	386.64	33.463	12938.13432	100%	386.64	33.463	12938.13432	100%	0	33.463	-	-
	SUBTOTAL				L 33,920.63			-	0%			L 33,920.63	100%			L 33,920.63	100%			L -	0%
2	RELLENO Y CONFORMACION																				
2.1	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	60.50	L 1,001.55	L 60,594.15		1,001.55	-	0%	60.50	L 1,001.55	L 60,594.15	100%	60.50	L 1,001.55	L 60,594.15	100%	-	L 1,001.55	L -	0%
	SUBTOTAL				L 60,594.15			-	0%			L 60,594.15	100%			L 60,594.15	100%			L -	0%
	TOTAL TALUDES LATERALES				L 94,514.78			-	0%			L 94,514.78	100%			L 94,514.78	100%			-	0%

VAYO

1	PRELIMINARES																				
1.1	Excavacion de Material	M3	4.95	L 481.25	L 2,382.19		481.25	-	0%	4.95	L 481.25	L 2,382.19	100%	4.95	L 481.25	L 2,382.19	100%	-	L 481.25	L -	0%
	SUBTOTAL				L 2,382.19			-	0%			L 2,382.19	100%			L 2,382.19	100%			L -	0%
2	RELLENO Y CONFORMACION																				
2.1	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	23.42	L 1,001.55	L 23,455.80		1,001.55	-	0%	23.42	L 1,001.55	L 23,455.80	100%	23.42	L 1,001.55	L 23,455.80	100%	-	L 1,001.55	L -	0%
				SUBTOTAL	L 23,455.80			-	0%			L 23,455.80	100%			L 23,455.80	100%			L -	0%
3	CONCRETO CICLOPEO																				
3.1	Concreto Ciclopeo e=20 cm proporcion 1:2:3	M3	11.05	L 3,718.53	L 41,089.74		3,718.53	-	0%	11.05	L 3,718.53	L 41,089.74	100%	11.05	L 3,718.53	L 41,089.74	100%	-	L 3,718.53	L -	0%
	SUBTOTAL				L 41,089.74			-	0%			L 41,089.74	100%			L 41,089.74	100%			L -	0%
	TOTAL VADO				L 66,927.72			-	0			L 66,927.72	100%			L 66,927.72	100%			-	-
	TOTAL CONTRATADO + ADENDA DE CONTRATO				L 1,854,113.81			L 1,415,010.73	76%			L 439,103.08	24%			L 1,854,113.81	100%			-	0%

Monto Ejecutado este Periodo	439,103.08
Monto a amortizar	77,310.45
Amortización Anticipo	15,462.09
Retención del ISR	-
Total a pagar en este periodo	**423,640.98**

Monto Contratado	L	1,854,113.81
I Estimación	L	438,897.07
II Estimación	L	446,223.39
III Estimación	L	223,111.70
IV Estimacion	L	306,778.58
IV Estimacion	L	439,103.08
Retenciones Acumuladas		
Pagos Totales Acumulados	L	1,854,113.81
Saldo por Pagar	L	-

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS

José Daniel Maldonado
Proyectos Alcaldía

VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ
INGENIERO CIVIL

Vasco Adalid Aguilar Alvarez
Contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

José Nahum Calix Alvarez
Alcalde Municipal

ADENDA DE CONTRATO

NOMBRE DEL PROYECTO: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA."**

UBICACION: ubicado en la comunidad de San José de Las Conchas, Marcovia, Choluteca

NÚMERO DE ADENDA DE CONTRATO: **01-2024** FECHA: **miércoles 27 de noviembre del 2024**

OTORGADA ENTRE LAS PERSONAS QUE SE MENCIONAN EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA. - PARTES INTERVINIENTES. - Concurren a la suscripción de la presente ampliación presupuestaria las siguientes personas:

a) **José Nahún Calix Álvarez** en representación DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA.

b) **Vasco Adalid Aguilar Álvarez** en representación de sí mismo.

SEGUNDA. - ANTECEDENTES Y OBJETO. - Al amparo de la cláusula contenidas en el Contrato de Obra Pública, clausula séptima: **Enmiendas y Ordenes de Cambio** del contrato de financiamiento, la Alcaldía Municipal de Marcovia determina la modificación y adenda de actividades del proyecto denominado **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA."**

Las cantidades contratadas iniciales se detallan a continuación:

No.	Renglón	CONTRATADO + ADENDA DE CONTRATO			
		unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	1739.88	L. 7.70	L 13,397.08
1.2	Excavación de Material	M3	173.99	L. 481.25	L 83,732.69
1.3	Trazado y Marcado	ML	386.64	L. 33.46	L 12,938.13
	SUBTOTAL				L 110,067.90
2	RELLENO Y CONFORMACION				
2.1	Relleno y compactado con material selecto	M3	86.99	L. 1,001.55	L 87,124.83
	SUBTOTAL				L 87,124.83

3	CONCRETO CICLOPEO				
3.1	Concreto Ciclópeo e=20 cm proporción 1:2:3	m3	347.98	3,718.53	1,293,973.46
	SUBTOTAL				L 1,293,973.46
4	Obras Finales				
4.1	Limpieza Final	JRD	1.00	1,155.00	L 1,155.00
	SUBTOTAL				L 1,155.00
	TOTAL CONTRATO INICIAL				L 1,492,321.19

Las cantidades contratadas finales se detallan a continuación:

No.	Renglón	CONTRATADO + ADENDA DE CONTRATO			
		unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza de Terreno	M2	1739.88	L. 7.70	L 13,397.08
1.2	Excavación de Material	M3	173.99	L. 481.25	L 83,732.69
1.3	Trazado y Marcado	ML	386.64	L. 33.46	L 12,938.13
	SUBTOTAL				L 110,067.90
2	RELLENO Y CONFORMACION				
2.1	Relleno y compactado con material selecto	M3	86.99	L. 1,001.55	L 87,124.83
	SUBTOTAL				L 87,124.83
3	CONCRETO CICLOPEO				
3.1	Concreto Ciclópeo e=20 cm proporción 1:2:3	m3	347.98	3,718.53	1,293,973.46
	SUBTOTAL				L 1,293,973.46
4	Obras Finales				
4.1	Limpieza Final	JRD	1.00	1,155.00	L 1,155.00
	SUBTOTAL				L 1,155.00
	TOTAL CONTRATO INICIAL				L 1,492,321.19
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA				
1	PRELIMINARES				
1.1	Excavación de Material	M3	7.3	L. 481.25	L. 3,513.13
1.2	Trazado y Marcado	ML	6.00	L. 33.46	L. 200.78
	SUBTOTAL				L. 3,713.90
2	RELLENO Y CONFORMACION				
2.1	Relleno y compactado con material selecto	M3	6.1	L. 1,001.55	L. 6,109.46
	Subtotal				L. 6,109.46
3	CONCRETO CICLOPEO				
3.1	Concreto Ciclópeo para cabezales proporción 1:2:3	M3	2.7	L. 3,718.53	L. 10,041.94
	SUBTOTAL				L. 10,041.94
4	TUBERIAS				
4.1	Alcantarilla tubo de 24 pulgadas	ML	6.00	L. 3,125.00	L. 18,750.00
	SUBTOTAL				L. 18,750.00
	TOTAL ALCALTARILA				L. 38,615.30

RELLENO DE MATERIALE SELECTO PARA BASE					
1	**RELLENO Y CONFORMACION**				
1.1	Relleno y compactado con material selecto	M3	148.06	L. 1,001.55	L. 148,285.76
TOTAL RELLENO DE MATERIAL PARA BASE					**L. 148,285.76**
BORDILLO 15X15 CMS					
1	**BORDILLO DE 15X15 CMS**				
1.1	Bordillo 15x15 no. 3 @30 cm y 1 horizontal	ML	47.00	L. 286.15	L. 13,449.05
TOTAL BORDILLO 15X15 CMS					**L. 13,449.05**
TALUDES LATERALES					
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Excavación de Material	M3	43.60	L. 481.25	L. 20,982.50
1.2	Trazado y Marcado	ML	386.64	L. 33.46	L. 12,938.13
	SUBTOTAL				**L. 33,920.63**
2	**RELLENO Y CONFORMACION**				
2.1	Relleno y compactado con material selecto	M3	60.50	L. 1,001.55	L. 60,594.15
	SUBTOTAL				**L. 60,594.15**
TOTAL TALUDES LATERALES					**L. 94,514.78**
VADO					
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Excavación de Material	M3	4.95	L. 481.25	L. 2,382.19
	SUBTOTAL				**L. 2,382.19**
2	**RELLENO Y CONFORMACION**				
2.1	Relleno y compactado con material selecto	M3	23.42	L. 1,001.55	L. 23,455.80
				SUBTOTAL	**L. 23,455.80**
3	**CONCRETO CICLOPEO**				
3.1	Concreto Ciclópeo proporción 1:2:3 en las rampas y en orilla de losa del pavimento (como cimentación para evitar socavación)	M3	11.05	L. 3,718.53	L. 41,089.74
	SUBTOTAL				**L. 41,089.74**
TOTAL VADO					**L. 66,927.72**
TOTAL CONTRATADO + ADENDA DE CONTRATO					**L 1,854,113.81**

TERCERA. - CONFORMIDAD. - Las partes otorgantes manifiestan su plena conformidad con las cláusulas del presente documento que forma parte integrante e indivisible del contrato de financiamiento referido suscribiendo en fe de ello en la ciudad de Marcovia, departamento de Choluteca a los 27 días del mes de noviembre del año 2024.

José Nahún Cálix Alvarez
ALCALDE MUNICIPAL DE MARCOVIA

Vasco Adalid Aguilar Alvarez
CONTRATISTA

VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ

Bo. San Pedro Sur, 2.5 cuadras al oeste de Pollos Campeón
Choluteca, Honduras, C.A. // RTN. 06011984059720
TEL. (+504) 3207-3016 // E-mail: vaaa2006@hotmail.es

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES:

000-001-04-00000375

POR L. 423,640.98

Recibí de: Alcaldia Municipal de Marcovia RTN: 06079995201200

La suma neta de: cuatrocientos veintitres mil seiscientos cuarenta 98/100

Por concepto de: Cancelación Esti Final Proy. Constr. Concreto Ciclopeo e=20cm San José de las Conchas

CAI: 23207B-C80B4A-11A9E0-63BE03-0909E0-A4

20 de Feb del 2025

Total por Honorarios:

Total de la Retención:

Total Neto Recibido: 423,640.98

FIRMA

Fecha límite de Emisión 27/09/2025
Rango Autorizado: 000-001-04-00000351 al 000-001-04-00000400

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0809-1953-000127 // SEP-2024 // 1COP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MARCOVIA

Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica, Marcovia, Choluteca, Tels. 2722-2071, 2722-2072

Cuenta N°.: 11-501-001904-3

CHEQUE No. 00013125

Marcovia 20 Febrero 2025
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: Vasco Adalid Aguilar Alvarez — L 423,640.98

Cantidad en letras: Cuatrocientos veintitres mil seiscientos cuarenta con 98/100 Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA — JOSE NAHUN CALIX — ALCALDE — CHOLUTECA, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA — TESORERIA — CHOLUTECA, HONDURAS

⑆0150107⑆001150001904⑈00013125

13125

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
	Pago por concepto cancelación estimación #4 construcción concreto ciclopeo e=20cm San jose de las conchas		
	TOTAL		423,640.98

VOUCHER

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
				0601198400477

VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ — INGENIERO CIVIL — 18-03-10 — 23-03-10 — CICH N° 4813

N°00013125

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-0700, /CR (12-19) • 55585-01 • EN01190002BHN

16005

Municipalidad de Marcovia, Choluteca

Comprobante de Pago

RTN: 0607999520120O

No. Recibo: 166807 **Fecha Recibo:** 20/02/2025

Identidad: 0601198405972

Nombre: Vasco Adalid Aguilar Alvarez

Dirección: marcovia

Detalle: PAGO DE SOLVENCIA

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111101	Impuesto Personal	1.00	1,525.11
11111617	Tasa Ambiental	1.00	10.00
		Total:	1,535.11

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
311535(Febrero-2025).

Firma y Sello Tesorero

ALCALDIA MUNICIPAL
DE MARCOVIA
2022-2026
CHOLUTECA, HONDURAS
TESORERIA

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería
