MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PERIODO: 1-31 DE JULIO DE 2017

Encargado de ejecución del proyecto.	**Municipalidad de Tomalá, Lempira**
Sector/Subsector	Infraestructura Social
Nombre del Proyecto	Ampliación y reparación del centro de salud, Tomalá.
Ubicación del Proyecto	Barrio El centro, Tomalá Lempira, frente al Parque central y Edificio municipal.
Propósito	El propósito principal es crear una edificación con los estándares de la secretaria de salud, estas instalaciones deben de cumplir con estándares mínimos de áreas y espacios para poder brindar a la población una calidad en el servicio de salud, además que el personal cuente con los espacios necesarios para poder brindar la atención a la población.
Descripción del proyecto.	En vista de las condiciones en las que se encontraba el edificio del centro de salud, se vio la necesidad de hacer una remodelación completa de toda la instalación. Se realizarán las siguientes actividades. ✓ Se construirá muro perimetral. ✓ Se construirán los módulos de promoción y Tuberculosis. ✓ Se reemplazarán todas las ventanas, puertas, portones y balcones. ✓ Se reemplazará piso existente en mal estado. ✓ Se reemplazará techo por losa aligerada con tubo estructural y lamina aluminizada, para la colocación de esta losa se reforzará la primera planta con 24 columnas de concreto reforzado. ✓ Se cambiará el repello, pulido y pintura de toda la edificación. ✓ Se cambiará el sistema eléctrico de toda la edificación. ✓ Se cambiarán todos los accesorios hidrosanitarios. ✓ Se construirá techo en los módulos nuevos. ✓ Se construirá un quiosco y una bodega ✓ Compra de mobiliarios médicos: dos camillas para examen médico, gradas para cama, 3 bancos giratorios, balanza para peso de recién nacidos, una refrigeradora para la conservación de biológicos.

MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-31 DE JULIO DE 2017

Avances del proyecto en el mes de mayo.	**En el periodo del mes de Julio de 2017 se presentaron distintos avances en las diferentes actividades en ejecución:** ✓ **Se han iniciado los trabajos de Pulido de paredes.** ✓ **Se han fundido los firmes de piso de la sala de espera, odontología, bodega, farmacia, preclínica.** ✓ **Se han iniciado los trabajos de colocación del muro perimetral de bloque de concreto.** ✓ **Se ha iniciado la colocación de las cajas para las instalaciones electricas.** ✓ **Se han colocado las paredes internas de la sala de vacunas y la pared que divide el pasillo con el salón de reuniones.** ✓ **Se han pulido y tallado los boquetes de ventanas en el interior de la edificación.**
	No se tiene un impacto ambiental en este proyecto, más que los residuos sólidos provenientes de demoliciones, los cuales son llevados a lugares de disposición final.
Impacto del terreno y asentamiento.	NO APLICA
Detalles del encargado del proyecto	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Fuentes de financiamiento	✓ Embajada del Japón en Honduras. ✓ Municipalidad de Tomalá.
Porcentaje de avance del proyecto.	80%
Fecha de finalización estimada	septiembre de 2017

MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-31 DE JULIO DE 2017

Memoria Fotográfica del Proyecto

Finalizacion del pulido en paredes exteriores	Construcción del muro perimetral.

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-31 DE JULIO DE 2017

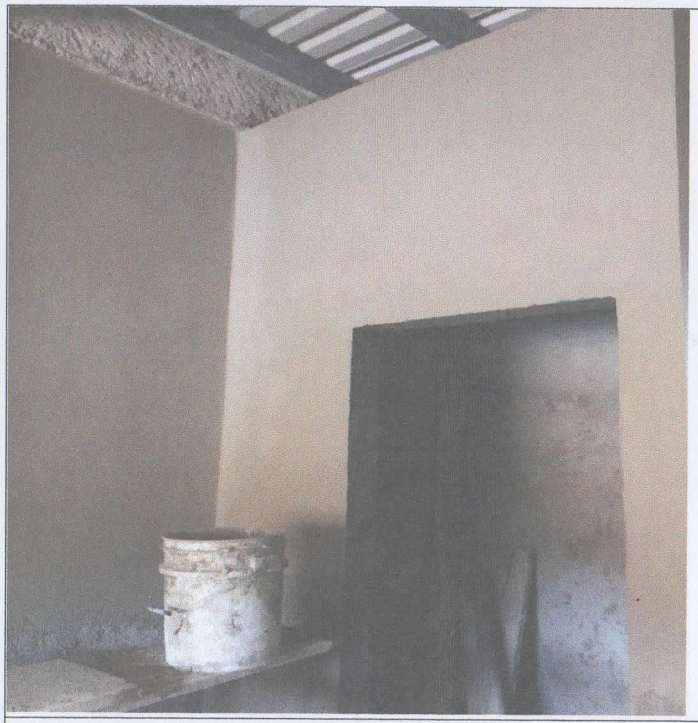	
Pulido de paredes interiores.	Fundición de firme de piso con un espesor de 10 cm.

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
TOMALA, LEMPIRA
