UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

DPLP

Informe de Proyectos de Inversión. Diciembre 2017

I. Identificación del Proyecto

Propietario del proyecto:	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Sector, Sub sector:	Gobernabilidad y Descentralización
Nombre del Proyecto:	Construcción del Edificio de aulas Nº 14 de la UPNFM, Campus Central
Ubicación del Proyecto:	Tegucigalpa, Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán
Propósitos:	Demanda satisfecha de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.
Descripción del Proyecto:	El proyecto "Construcción del Edificio de aulas N°14 de la UPNFM", servirá para generar mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo de espacios Pedagógicos adecuados a las exigencias del entorno educativo en que se desenvuelve el Centro de Investigación Educativa.

II. Elaboración del Proyecto

Alcance del proyecto:	Mejorar en un 5% el acceso a Educación Superior en el área de la docencia de la población de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.
Impacto ambiental:	El proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial
Impacto en el terreno y asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se desarrollará el proyecto.
Detalles del contacto:	Nombre, Nahum Valladares nvalladares@upnfm.edu.hn (504)22353206
Fuentes de financiamiento:	Tesoro Nacional
Propuesta del Proyecto	L. 36,246,000.00
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	2013
Estado actual del proyecto	**Etapa de Construcción**
Costo de financiación(proyectada):	L. 38,158,282.70

III. Ejecución del Proyecto

Relación de la planificación con los productos entregados de manera trimestral:	Se han hecho avances significativos en la obra con relación al mes anterior como se muestra en las fotografías.
Variación en el costo total del proyecto:	No se puede determinar ya que el proyecto se encuentra en ejecución.
Variación en el alcance y duración del proyecto:	Ninguna
Razones de los cambios	Ninguna

Responsable de la elaboración del informe (nombre y firma)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Jinmy Alexander Bertrand

Diciembre de 2017

Fotografías del avance del proyecto:

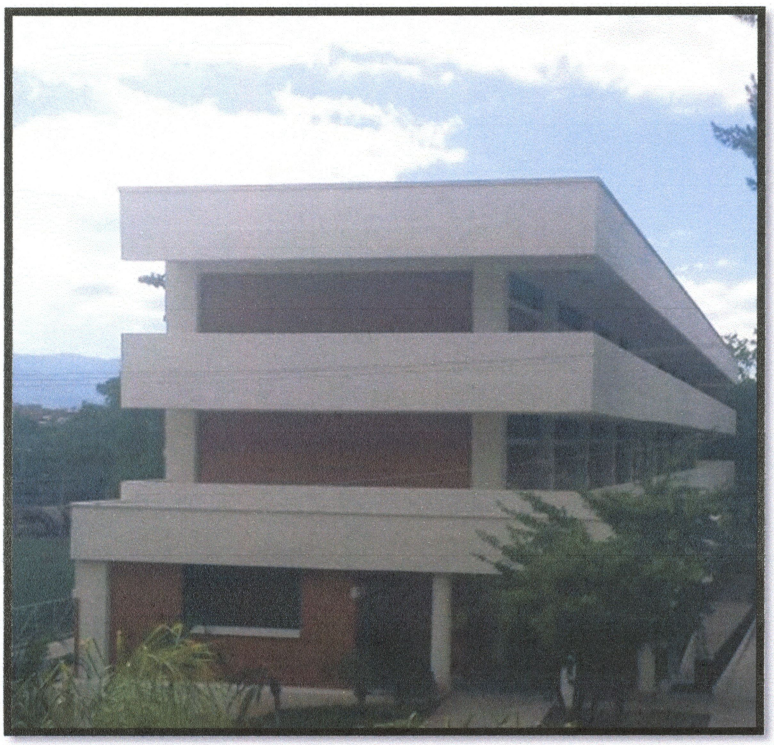

I. Identificación del Proyecto

Propietario del proyecto:	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Sector, Sub sector:	Desarrollo e inclusión social
Nombre del Proyecto:	Construcción y equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Ubicación del Proyecto:	Nacaome, Departamento de Valle
Propósito:	Mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación docente en la zona sur, procurar crear las condiciones óptimas para el desarrollo de la labor administrativa y académica con calidad.
Descripción del Proyecto:	El proyecto "Construcción y equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM", servirá para generar mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo de espacios Pedagógicos adecuados a las exigencias del entorno educativo en que se desenvuelve el Centro Universitarios Regional de Nacaome.

II. Elaboración del Proyecto

Alcance del proyecto:	Mejorar en un 5% el acceso a Educación Superior en el área de la docencia de la población de Nacaome, Departamento de Valle.
Impacto ambiental:	El proyecto no generará impactos negativos en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial
Impacto en el terreno y asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se ejecutará el proyecto.
Detalles del contacto:	Nombre: Nahúm Valladares nvalladares@upnfm.edu.hn (504)22353206
Fuentes de financiamiento:	Tesoro Nacional
Propuesta del Proyecto	L. 49,001,200.00
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Según nota de prioridad N° 000000216 oficio DGIP-036 -16, mayo 2016
Estado actual del proyecto	**Etapa de pre inversión**
Costo de financiación (proyectada 2016):	L. 13,000,000.00
Fecha de finalización (proyectada):	Septiembre de 2018

III. Ejecución del Proyecto

Relación de la planificación con los productos entregados de manera trimestral:	Se han ejecutado el proyecto conforme a la descripción inicial del mismo.
Variación en el costo total del proyecto:	No se puede determinar ya que el proyecto se encuentra en ejecución.
Variación en el alcance y duración del proyecto:	Ninguna
Razones de los cambios	Ninguna

Responsable de la elaboración del informe (nombre y firma)

Jhimy Alexander Bertrand

Diciembre de 2017

Fotografías del proyecto:

I. Identificación del Proyecto

Propietario del proyecto:	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Sector, Sub sector:	Desarrollo e inclusión social
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Ubicación del Proyecto:	San Pedro Sula, Cortés
Propósito:	Mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación docente en la zona norte, procurar crear las condiciones óptimas para el desarrollo de la labor administrativa y académica con calidad.
Descripción del Proyecto:	Este proyecto consiste en la construcción de un Edificio de Talleres de 3 niveles, en el campus regional de San Pero Sula, el cual vendrá a satisfacer las necesidades de espacios educativos requeridos por las diferentes unidades de la institución y en especial para el desarrollo de las actividades de la carrera de Educación Técnica Industrial. El Edificio de Talleres constará de otros espacios de construcciones requeridos para el buen funcionamiento de otras carreras.

II. Elaboración del Proyecto

Alcance del proyecto:	Mejorar en un 5% el acceso a Educación Superior en el área de la docencia de la población del departamento de Cortés
Impacto ambiental:	El proyecto no generará impactos negativos en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial
Impacto en el terreno y asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se ejecutará el proyecto.
Detalles del contacto:	Nombre: Nahúm Valladares nvalladares@upnfm.edu.hn (504)22353206
Fuentes de financiamiento:	Tesoro Nacional
Propuesta del Proyecto	L. 33,264,000.00
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Según Código BIP de 004600002500 año 2015
Estado actual del proyecto	**Etapa de pre inversión**
Costo de financiación	L 400,000.00

Responsable de la elaboración del informe (nombre y firma)

Jimmy Alexander Bertrand

Diciembre de 2017
