José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ

Honduras C.A.

Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020
Hora : 08:56 a.m.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PAVIMENTACION CALLE BARRIO CAÑABRAVAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	PUNTA GORDA	15	15	47210	23201807,689.479		0.00	0.00	115,334.21	0.00	923,073.68	876,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,920.00	95.00 %	46,153.68	4.00 %	EN PROCESO	PAVIMENTACION CALLE BARRIO CAÑABRAVAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA
2	PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT HILL	LUCY POINT	15	15	47210	232011,000,000.009		0.00	0.00	142,807.15	0.00	1,142,857.15	1,085,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,714.29	94.00 %	57,142.86	5.00 %	TERMINADO	PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT HILL
3	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	POLITILLY BIGHT	15	15	47210	032020.000		0.00	0.00	97,625.00	0.00	97,625.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,625.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT
4	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL HIGUERO	15	15	47210	23201997,863.489		0.00	0.00	495,313.95	0.00	1,492,977.13	108,736.72	0.00	0.00	0.00	0.00	108,736.72	7.00 %	1,384,240.41	92.00 %	EN PROCESO	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
5	PROYECTO DE TERRACERIA Y DRENAJES	CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE EL BIGHT	15	15	47210	062020.000		0.00	0.00	897,712.57	0.00	897,712.57	808,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00	808,585.70	90.00 %	89,126.87	9.00 %	EN PROCESO	PROYECTO DE TERRACERIA Y DRENAJES EN EL BIGHT

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ

Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2020
Hora : 08:56 a.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							2,805,352.95	0.00	0.00	1,748,892.58	0.00	4,554,245.53	2,977,581.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977,581.71		1,576,663.82			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GILBERT CARRISON DILBERT GREEN
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ROLANDO GOMEZ ORELLANA
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjlhiTeWOMbtPjRorS6D76RaPNKnn/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCQSgvzTEa37PDzDK
JYF61cckXhvlVR5JffF25ka3xrDWOofzlH+sy+ZbzAtgAB/OEydQrBzYJXYi3Qjluu+1V/KeOD89W1In1FlpCAmkzl6QqmkKpe1UVUPUNFKXI4LFXf3bt1ZKUhgC0XKeSY3nqB
Z7nANKoLFaWyPSiUIPe+dC2FhQnCEm\/NEn1Kq4xDXtk+XkWCLixY0tNrQuMCY=

José Santos Guardiola, Islas De la Bahía, 06 de enero de 2020.

PERFIL DE PROYECTO

PROYECTO: TERRACERÍA Y PAVIMENTACIÓN CALLE SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA, MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA

FINANCIMIENTO

Y

EJECUTOR: MUNICIPALIDAD JOSÉ SANTOS GUADIOLA

ELABORADO: UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, JOSÉ SANTOS GUARDIOLA.

ING. ALBIN CASTELLÓN

I. PERFIL DEL PROYECTO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Nombre del proyecto: Terracería y Pavimentación Calle Secundaria De La Comunidad de Punta Gorda, Municipio De Santos Guardiola, Islas De La Bahía.

Tipo de proyecto: Pavimentación.

Localización del proyecto:

- País: Honduras.
- Región: zona norte.
- Departamento: Islas de la bahía.
- Municipio: José Santos Guardiola.
- Comunidad: Punta Gorda, Oak Ridge.

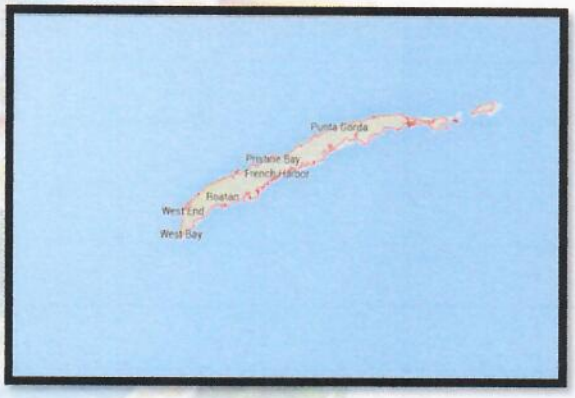

Viabilidad del proyecto: Los recursos financieros para llevar a cabo este proyecto serán facilitados por la Municipalidad de Santos Guardiola en un 100%, los costos para realizar los estudios previos a la ejecución del proyecto serán gestionado y canalizado a través de la alcaldía municipal de Santos Guardiola.

Todos los gastos del proyecto aportado por la municipalidad son sustentables con las transferencias gubernamentales y el aporte comunitario que se llevara a cabo.

2. INFORMACIÓN GENERAL

Duración: El proyecto se llevará a cabo en el trascurso de 1 mes, su probable inicio de ejecución será en el primer trimestre del año 2020.

Costo aproximado del proyecto: La ejecución del proyecto Terracería y Pavimentación Calle Secundaria De La Comunidad de Punta Gorda, Municipio De Santos Guardiola, Islas De La Bahía, tendrá un costo aproximado de Lps. 928, 514.81 según presupuesto realizado por Unidad Técnica.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos con la ejecución de este proyecto serán los habitantes de la Comunidad de Punta Gorda, Municipalidad de Santos Guardiola.

II. MARCO DE REFERENCIA

1. Antecedentes

1.1 Problemas a resolver, necesidades a satisfacer (situación del problema)

Actualmente la Comunidad de Punta Gorda tiene problemas con la calle que es el acceso hacia la comunidad Cañabraval, que se encuentra en mal estado por lluvias y falta de drenajes ya que erosionan la calle, por lo que se dificulta para transitar ya sea los peatones o los vehículos que por esta circulan

Este proyecto viene hacer prioridad para los habitantes por lo que solicitan el mejoramiento de la calle.

1.2 Alternativa de solución

Para darle una solución a la problemática que tiene la comunidad con el mal estado de la calle se hizo el estudio y un analices del costo que este tendría en el que se llegó a la conclusión la pavimentación de un tramo de calle de 154.00 metros lineales de 4.88 de ancho y un tramo de 36.20 metros lineales con un ancho de 3.15 metros. También se colocaran las obras de drenajes para evacuar las aguas lluvias.

También servirá como obra preventiva para la protección de obras futuras que puedan desarrollarse en la zona de influencia del proyecto.

1.3 Justificación de la alternativa seleccionada

Con la implementación de este proyecto cumplimos con los objetivos y metas trazadas y así tener un Municipio en óptimas condiciones.

Actualmente en el Departamento de Islas de la Bahía, Municipio de Santos Guardiola se han desarrollado proyectos de Mejoramiento de la red vial como ser pavimentación de calle, señalizaciones de calles y mejoramiento de la red vial no pavimentada de tal forma que se encuentre en buen estado en todo momento del año por lo que con este proyecto se sigue la misma línea de mejoramiento ya que la red vial está en buen estado y este proyecto viene ayudar a estos proyectos.

Uno de los factores importante para que un país tenga un desarrollo eficiente es mantener las calles en buen estado de esta forma evitamos atrasos y daños a terceros, buscando que los diferentes sectores puedan ser accesibles tanto a los que lo están poblando como a los que nos visitan.

Con el propósito de elevar el nivel en la infraestructura, y para satisfacer la demanda actual y futura de servicios que el país requiere, se vuelve indispensable y altamente prioritario, la ejecución del proyecto antes mencionado.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Objetivo General

Pavimentación Calle Secundaria De La Comunidad de Punta Gorda, Municipio De Santos Guardiola, Islas De La Bahía

1.2 Objetivos específicos

- Evitar daños a terceros.
- Mantener la red vial del municipio en buen estado

1.3 Metas

- Culminar el proyecto antes mencionados bajo los términos enmarcados en la formulación y planificación del proyecto.

IV. ANEXOS

V. MAPA DE UBICACIÓN DEL SITIO DE CONSTRUCCIÓN

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldíasantosguardiola@gmail.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

UBICACIÓN DEL SITIO DE CONTRUCCIÓN

Ruta: El proyecto se encuentra en uno de los barrios del municipio de Santos Guardiola que se encuentra en la Comunidad de Punta Gorda pasando por la calle principal y tomando la calle que va hacia el norte de la comunidad hasta llegar al barrio cañabraval

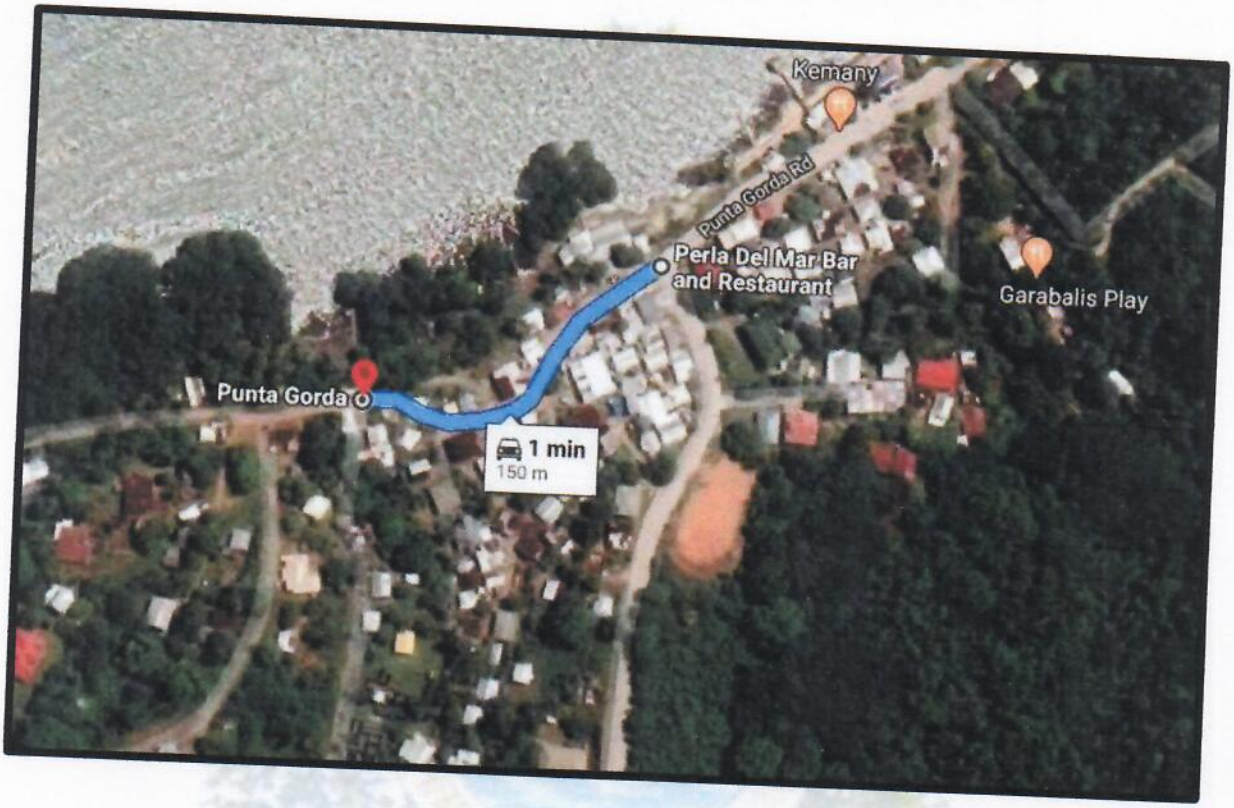

VI. PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

PRESUPUESTO

PROYECTO: Terracería y Pavimentación Calle Secundaria De La Comunidad de Punta Gorda, Municipio De Santos Guardiola, Islas De La Bahía.

UBIACIÓN: Comunidad de Punta Gorda, Municipio de Santos Guardiola

FECHA: lunes 06 de enero de 2020

Santos Guardiola, Islas de la Bahía, Honduras, C.A.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
	TERRACERÍA Y PAVIMENTANCIÓN					
1	**GENERALES**					
1.1	Movilización de equipo	Viajes	2.00	6,341.08	L.	12,682.16
1.2	Limpieza Preliminar	Días	2.00	4,005.75	L.	8,011.50
	TOTAL GENERALES				L.	**20,693.66**
2	**BASE COMPACTADA**					
2.1	Colocación de material selecto	m3	101.66	785.00	L.	79,805.81
2.2	Conformación y Compactación de Base (e= 10 cms)	m3	129.83	480.86	L.	62,431.26
					L.	**142,237.06**
3	**PAVIMENTACIÓN**					
3.1	Trazado y Marcado Nivel Capa de Rodadura (e= 15 cms)	m2	865.55	4.58	L.	3,964.22
3.2	Suministro y Colocación de Concreto Hidraulico 4000 PSI (e= 15 cms)	m2	865.55	841.80	L.	728,619.99
3.3	Corte de Junta Transversales y Longitudinales	m.l	442.52	22.92	L.	10,142.48
3.4	Curado Losa de Concreto	m2	865.55	9.29	L.	8,040.96
3.5	Acero de Refuerzo Longitudinal #4@0.50 metros L=50 cms	Kgs	255.64	20.17	L.	5,156.26
3.6	Acero de Refuerzo Transversal #4@0.30 metros L=50 cms	Kgs	478.94	20.17	L.	9,660.17
	TOTAL PAVIMENTO				L.	**765,584.08**
	TOTAL DEL PROYECTO				**L.**	**928,514.81**

NOTAS:

* Espesor de Base Compactada= 10 Centimetros
* Espesor de Pavimento= 6.00 Pulgadas
* Cumple con los procedimientos de Contratación Directa basado en la Ley de Contratación del estado, Capitulo IV, Sección Sexta, Articulo 63, Numeral 3, y Según las Disposiciones Generales de Presupuesto 2020.
* Se recomienda a la administración realizar 3 cotizaciones con empresas o contratistas individuales debidamente autorizados para la realización
* Solicitar garantía de cumplimiento del contrato del 15 % del monto del contrato.
* Una vez finalizado el contrato se solicitara la garantía de Calidad de Obra por 5% del monto del contrato.
* Anticipó si lo hubiere es del 15% del monto del contrato como maximo y solicitar garantía de anticipo por la cantidad pagada.

VII. FOTOGRAFÍAS

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

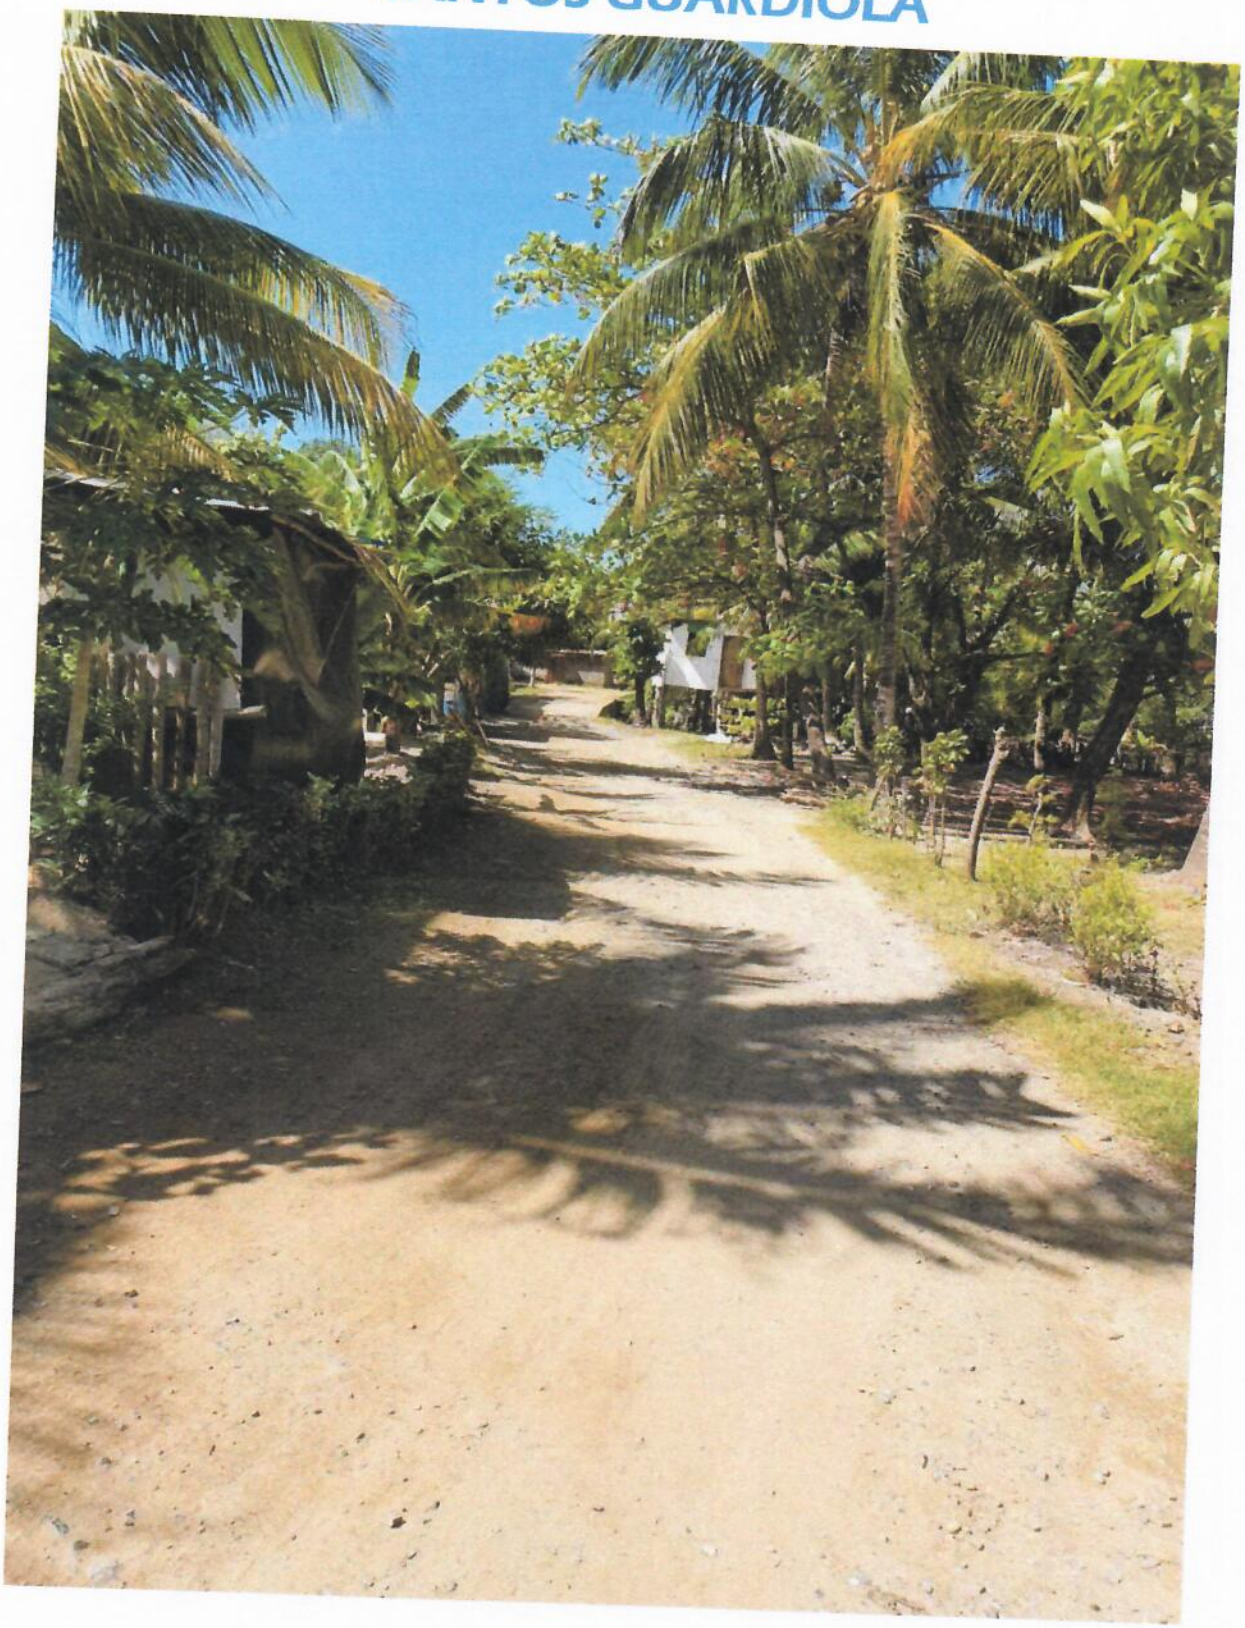

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldíasantosguardiola@gmail.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldiasantosguardiola@gmail.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

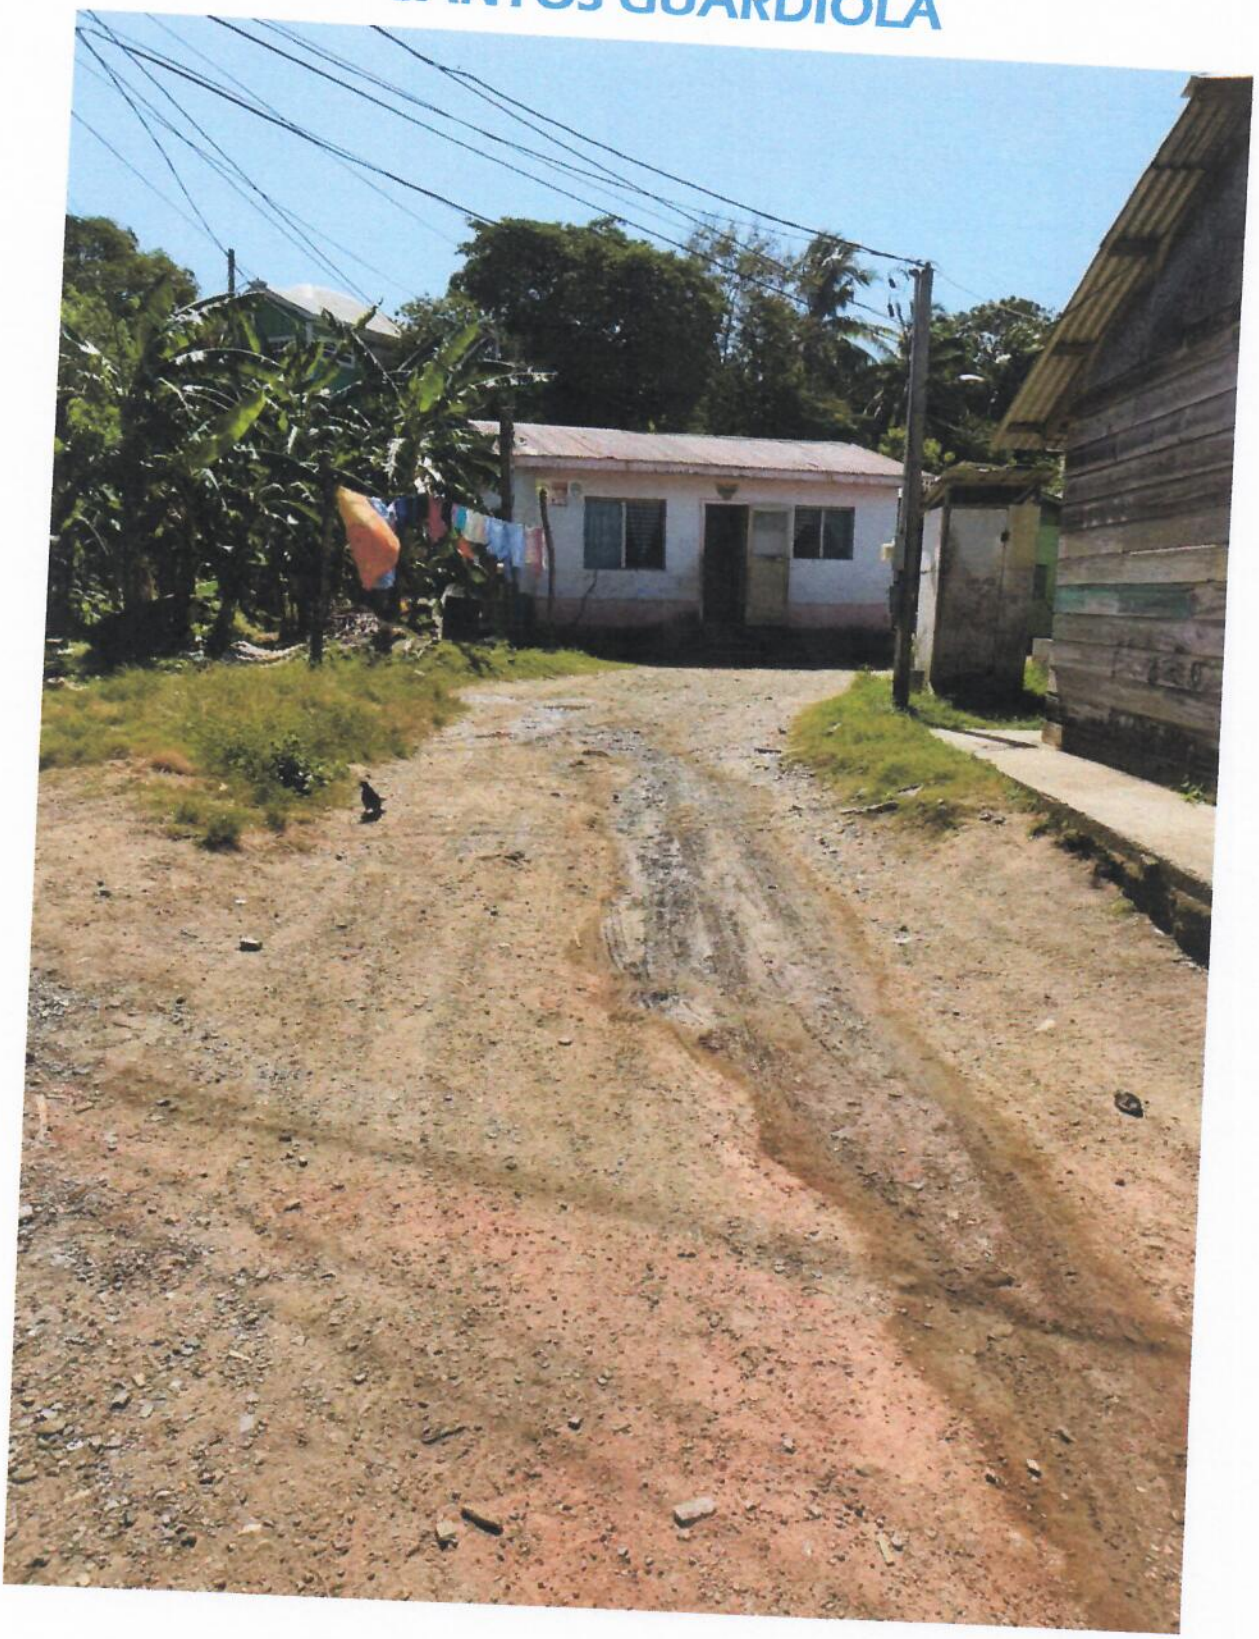

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldíasantosguardiola@gmail.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

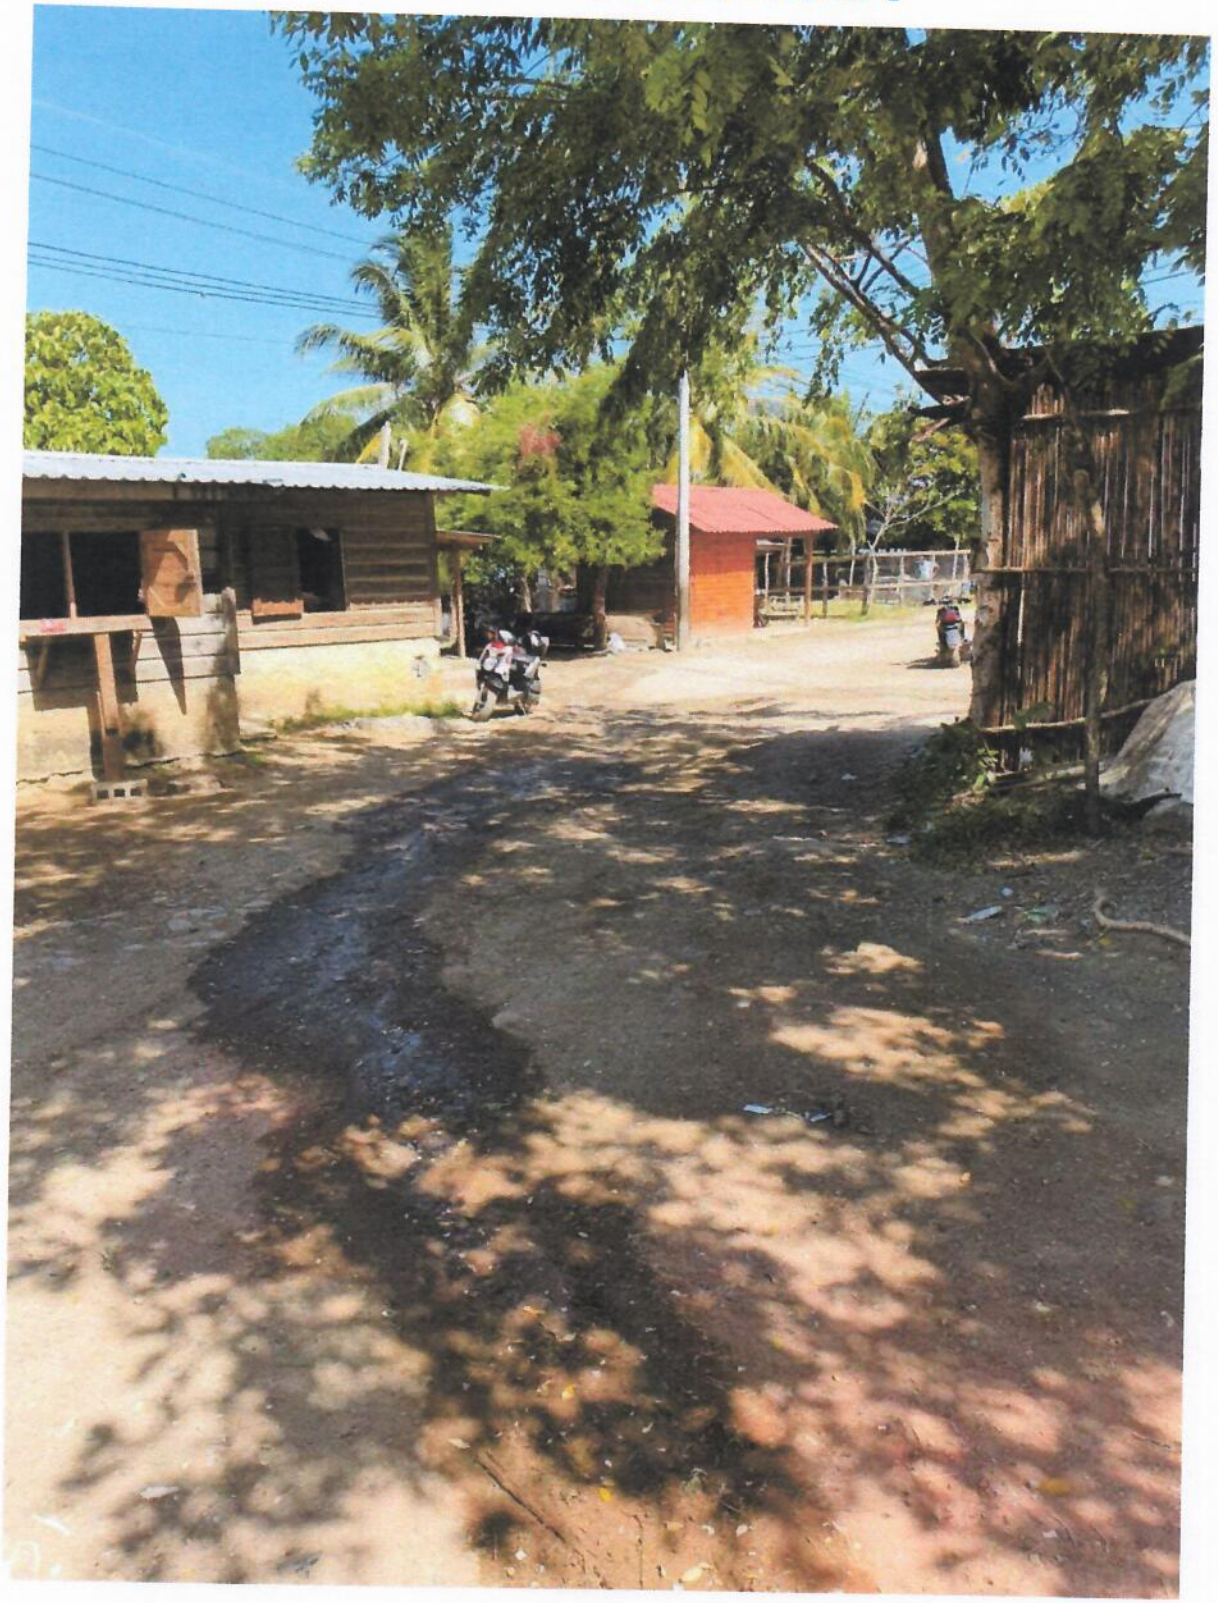

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldíasantosguardiola@gmail.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

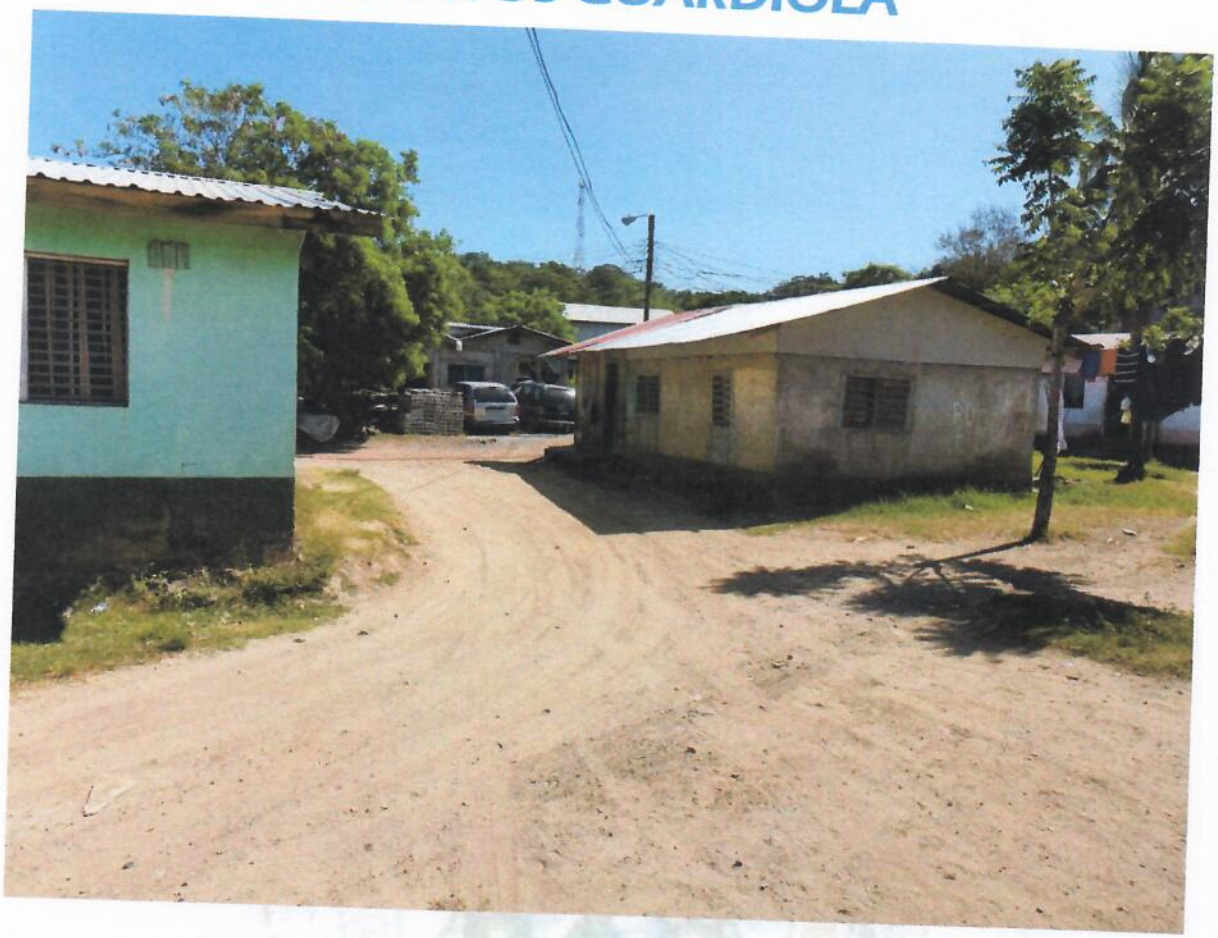

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldíasantosguardiola@gmail.com

TERRACERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL BARRIO CAÑABRAVAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

CONTRATISTAS:

EDWARD WILLORD BELCARIES

19 DE FEBRERO 2020

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. EL PROYECTO

II.1 Generalidades y Ubicación del Proyecto

II.2 Referencias geográficas del Proyecto

III. FOTOGRAFÍAS

I. RESUMEN EJECUTIVO

Con la implementación de este proyecto cumplimos con los objetivos y metas trazadas y así tener un Municipio en óptimas condiciones.

Actualmente en el Departamento de Islas de la Bahía, Municipio de Santos Guardiola se han desarrollado proyectos de Mejoramiento de la red vial como ser pavimentación de calle, señalizaciones de calles y mejoramiento de la red vial no pavimentada de tal forma que se encuentre en buen estado en todo momento del año por lo que con este proyecto se sigue la misma línea de mejoramiento ya que la red vial está en buen estado y libre de desecho sólidos y este proyecto viene ayudar a estos proyectos.

Uno de los factores importante para que un país tenga un desarrollo eficiente es saber eliminar todo el desecho producido por el consumismo y de esta forma se logra un ambiente libre de gases o solidos que afectan el bien estar del ser humano, contribuyendo con estos tipos de proyectos se genera mano de obra y se logra desarrollar el municipio de José Santos Guardiola, un municipio que va en desarrollo turístico y crecimiento poblacional.

Con el propósito de elevar el nivel en la infraestructura, y para satisfacer la demanda actual y futura de servicios que el país requiere, se vuelve indispensable y altamente prioritario, la ejecución del proyecto antes mencionado.

II. EL PROYECTO

II.1 Generalidades y Ubicación del Proyecto

Actualmente la Comunidad de Punta Gorda tiene problemas con la calle que es el acceso hacia la comunidad Cañabraval, que se encuentra en mal estado por lluvias y falta de drenajes ya que erosionan la calle, por lo que se dificulta para transitar ya sea los peatones o los vehículos que por esta circulan.

Para darle una solución a la problemática que tiene la comunidad con el mal estado de la calle se hizo el estudio y un analices del costo que este tendría en el que se llegó a la conclusión la pavimentación de un tramo de calle de 154.00 metros lineales de 4.88 de ancho y un tramo de 36.20 metros lineales con un ancho de 3.15 metros. También se colocarán las obras de drenajes para evacuar las aguas lluvias.

También servirá como obra preventiva para la protección de obras futuras que puedan desarrollarse en la zona de influencia del proyecto.

Durante este periodo hasta la fecha hay un avance físico de 100.00 % y un avance financiero de 0.00 %.

II.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se presenta la ubicación del proyecto:

TERRACERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL BARRIO CAÑABRAVAL EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA

IV. FOTOGRAFIAS

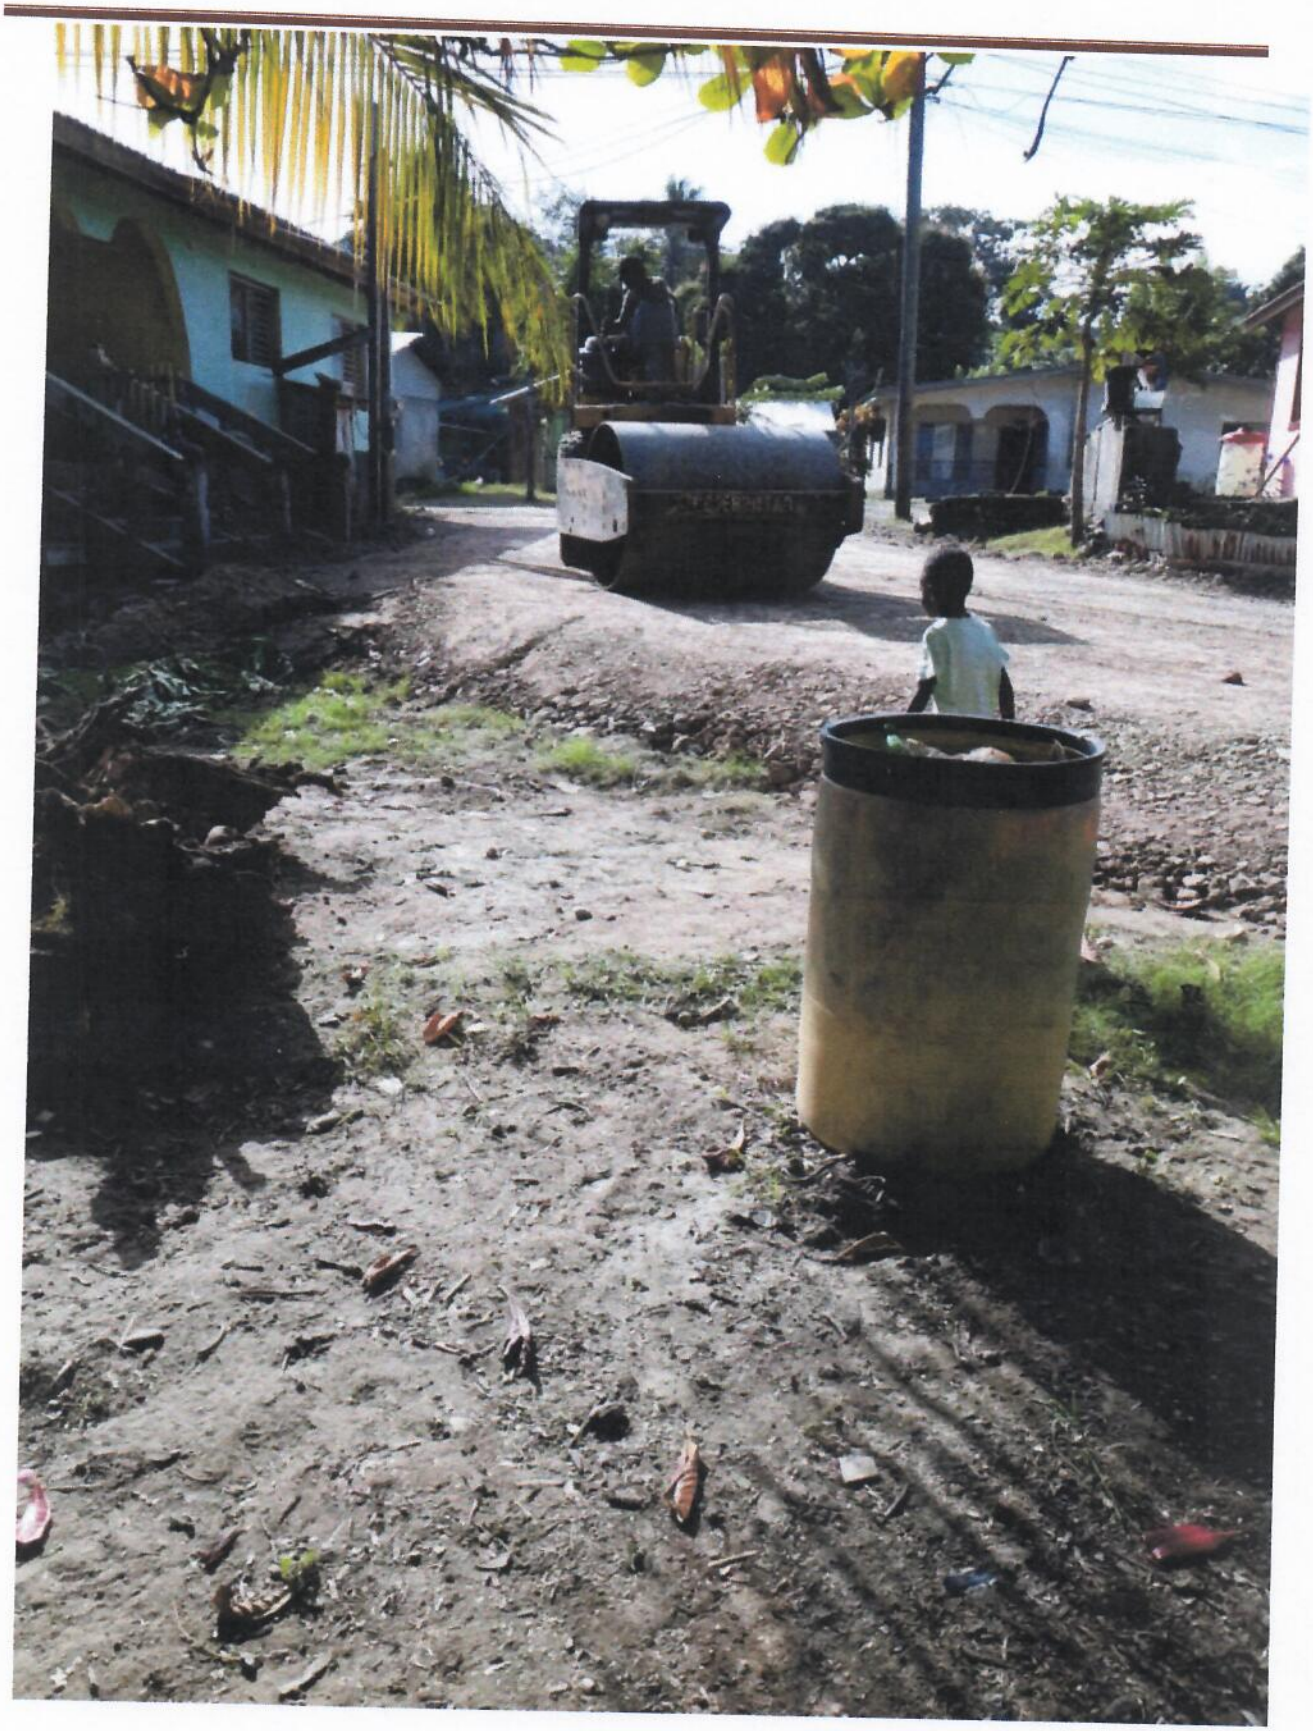

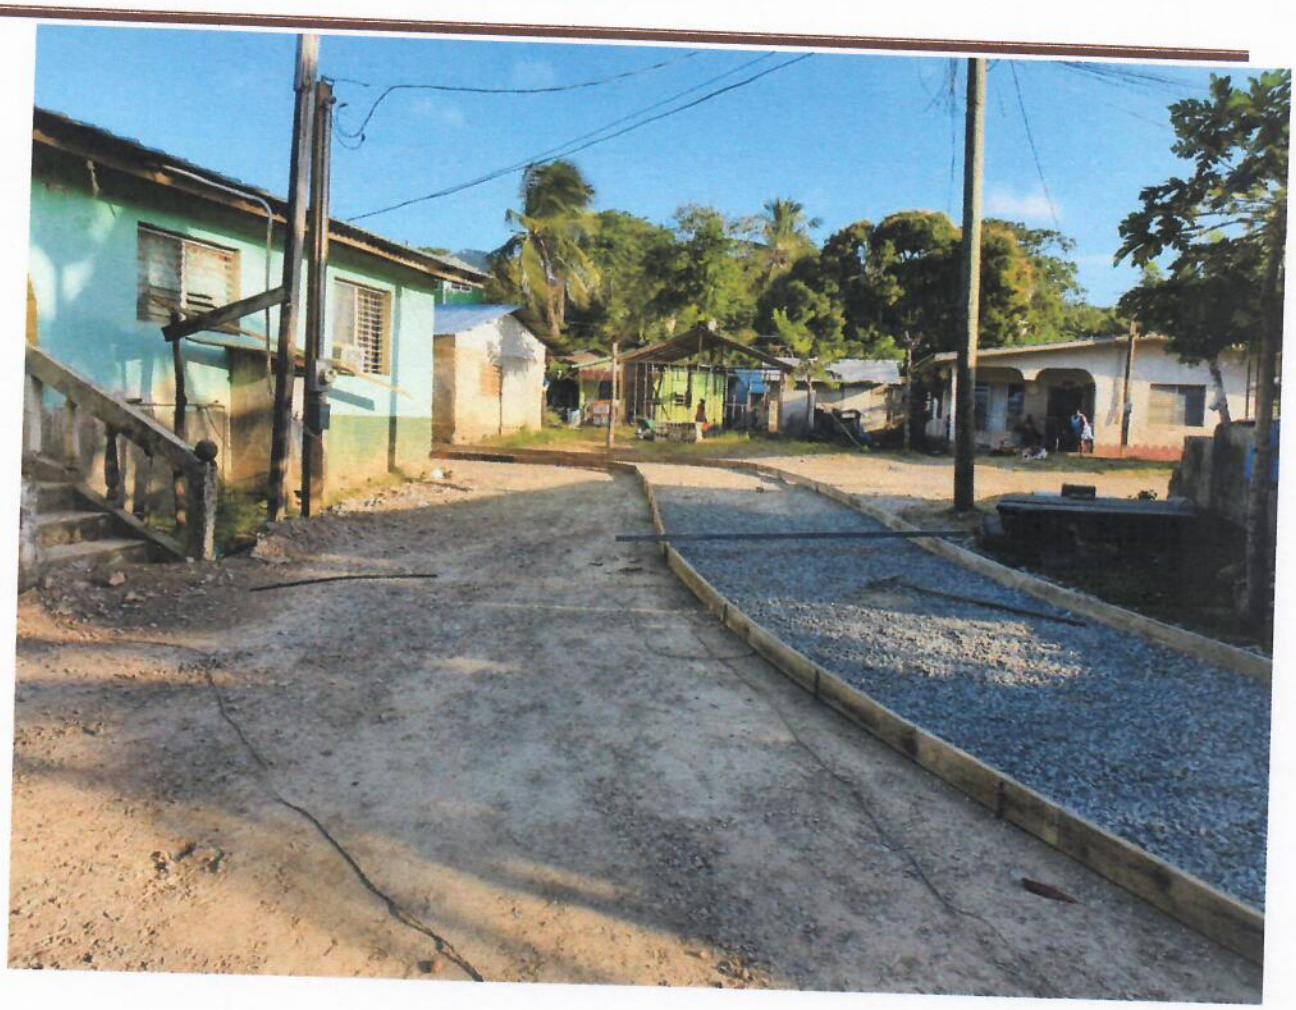

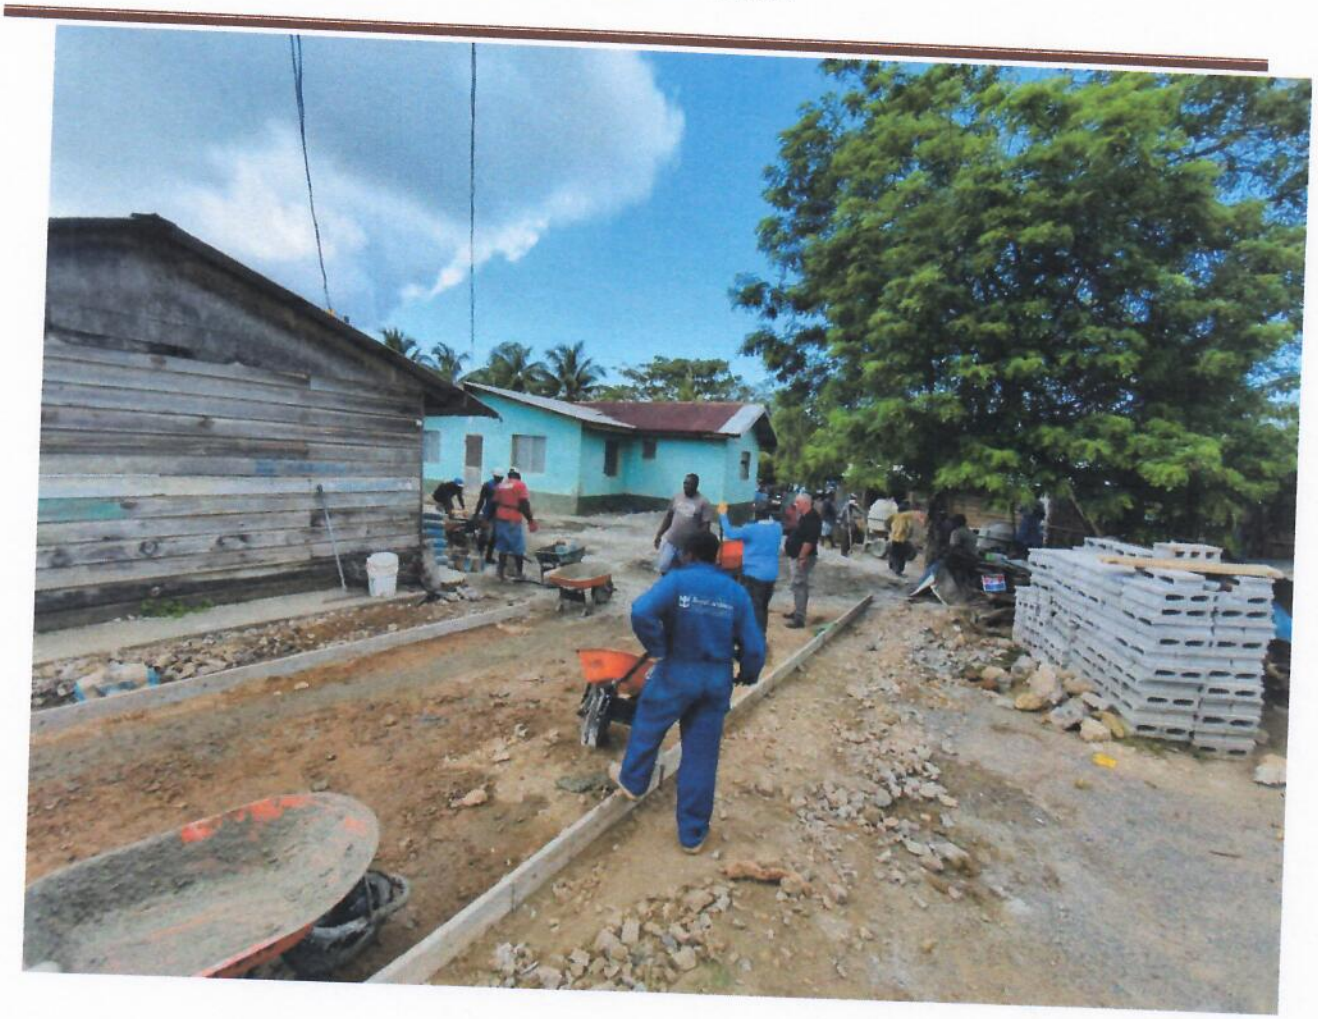

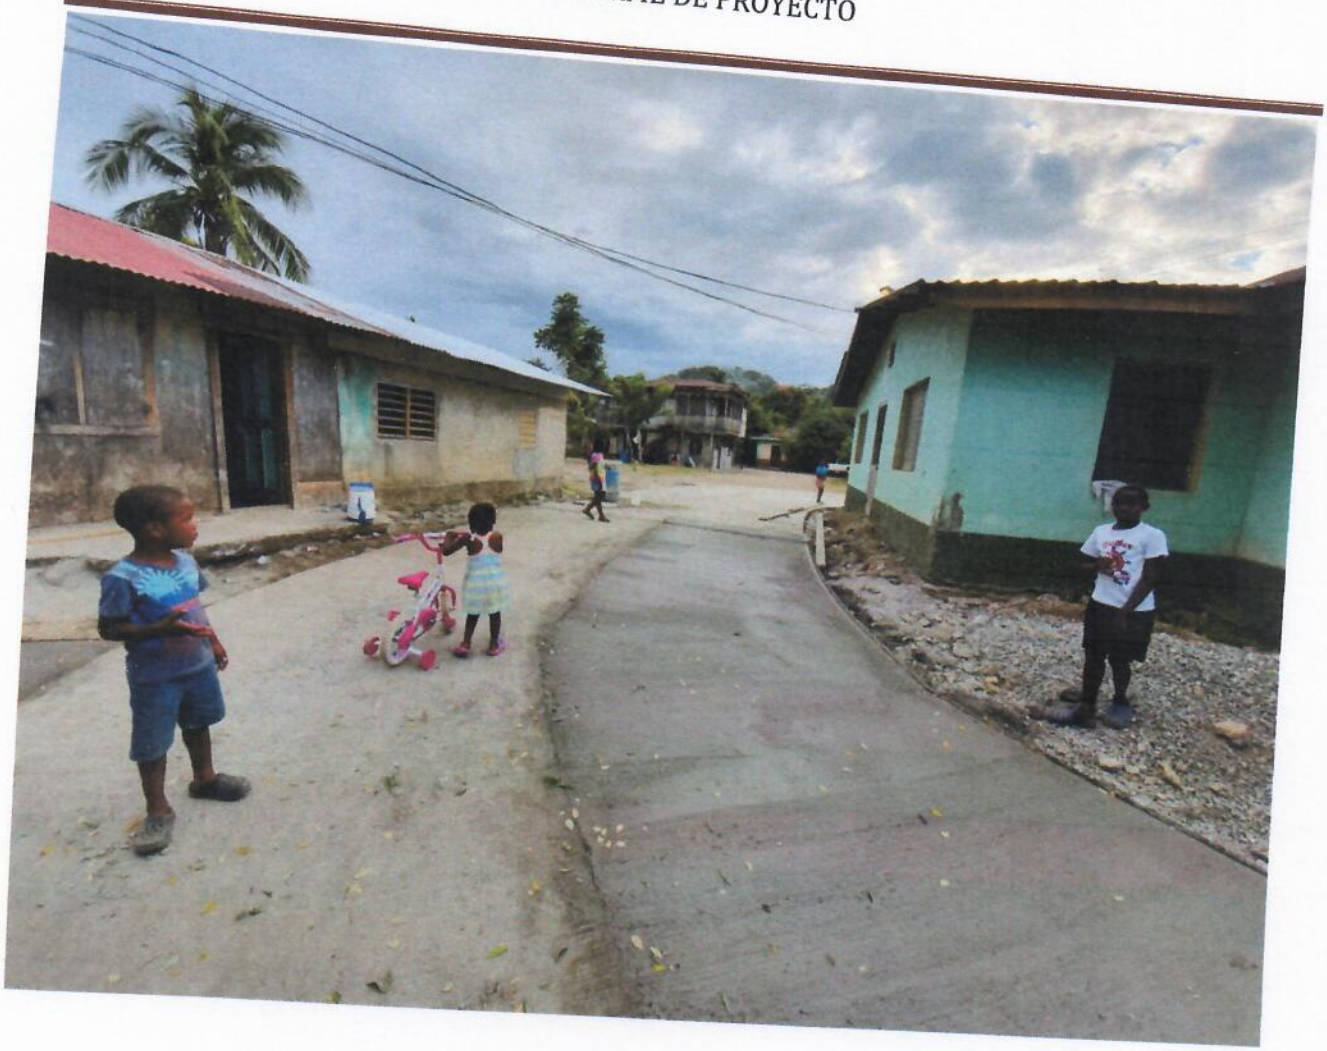

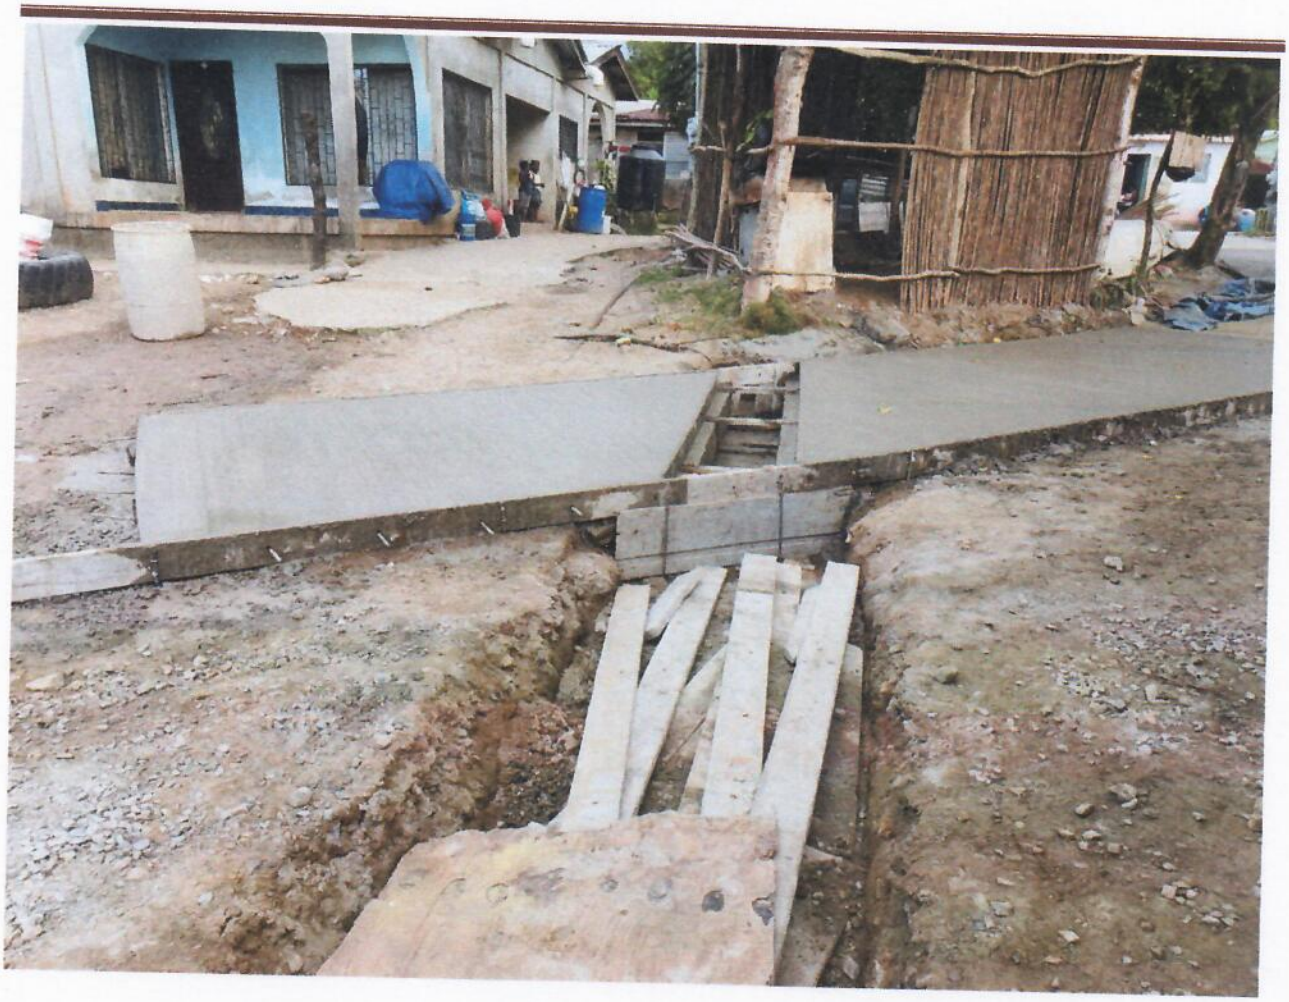

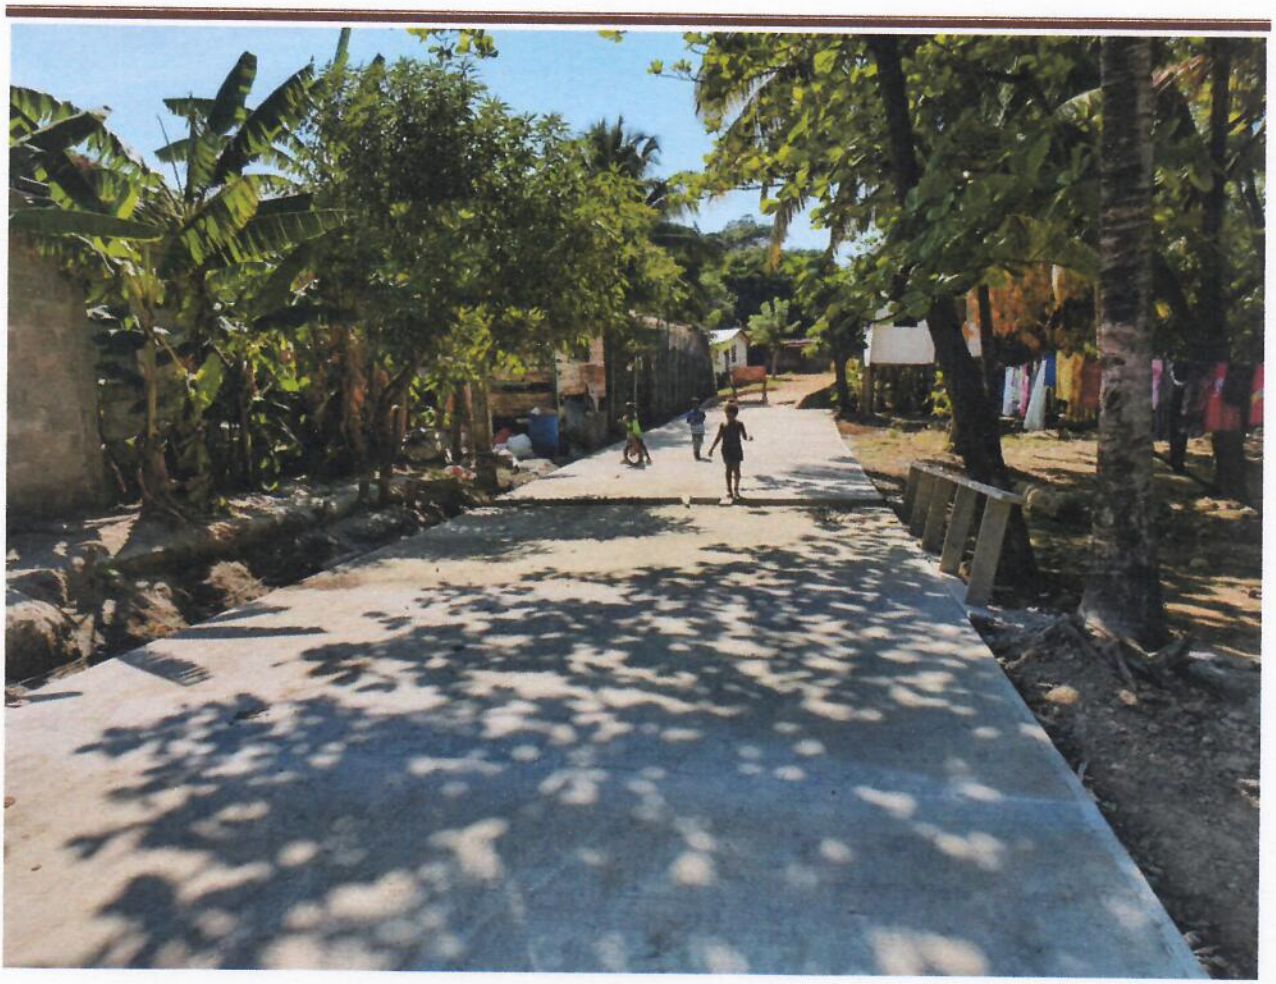

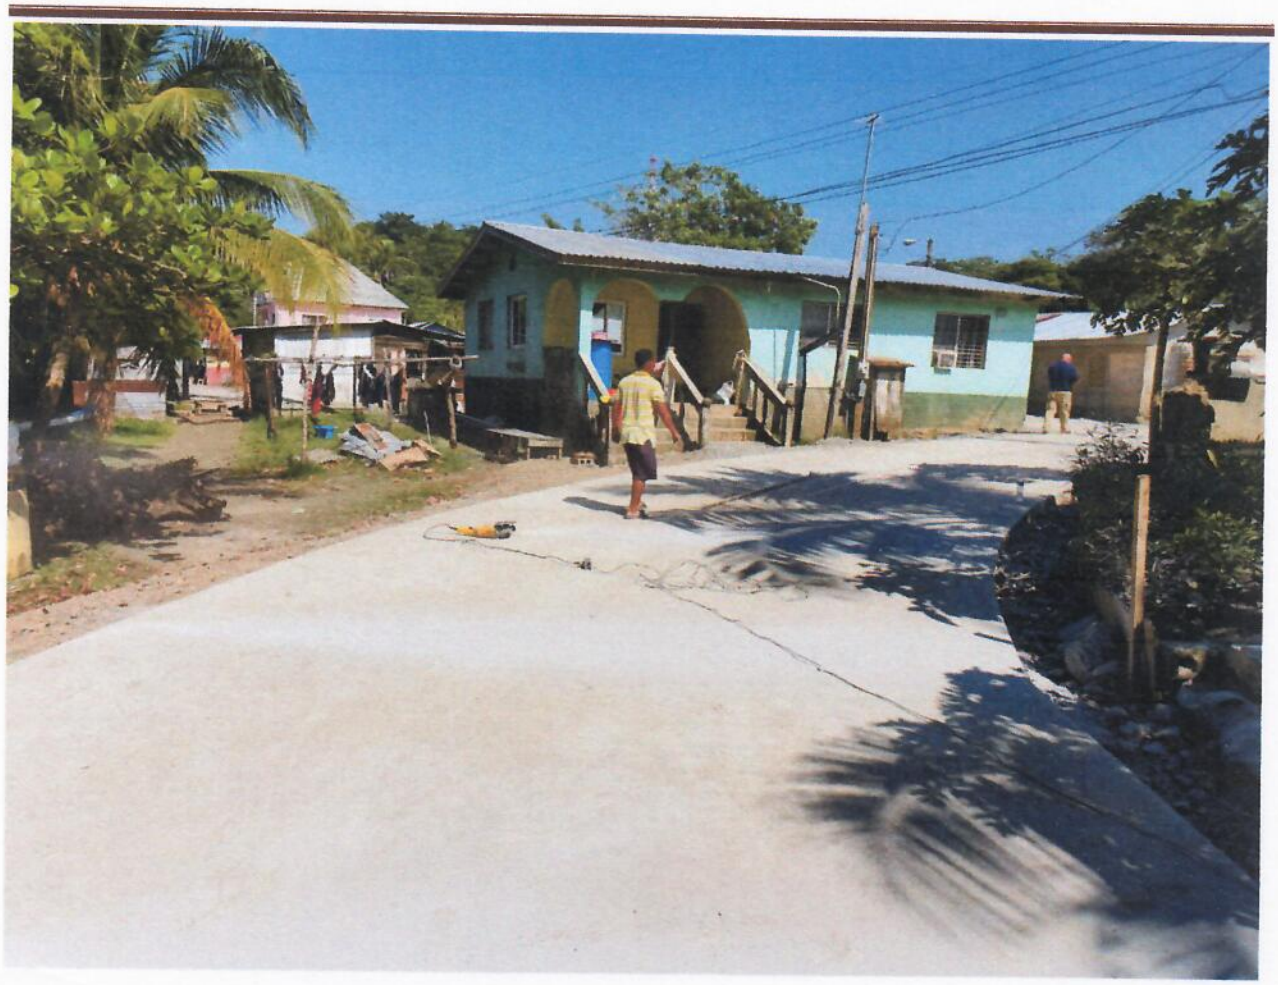

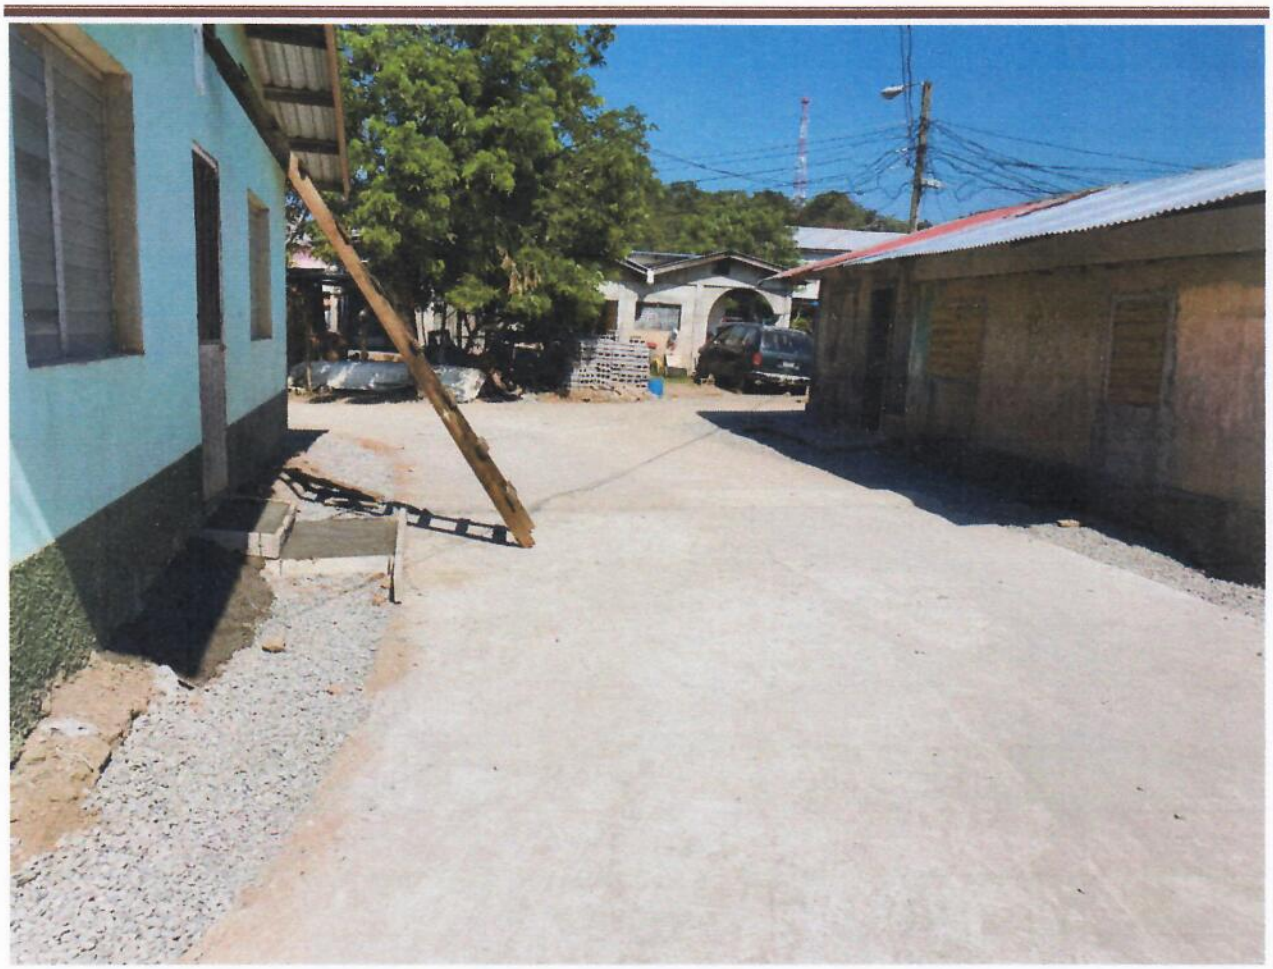

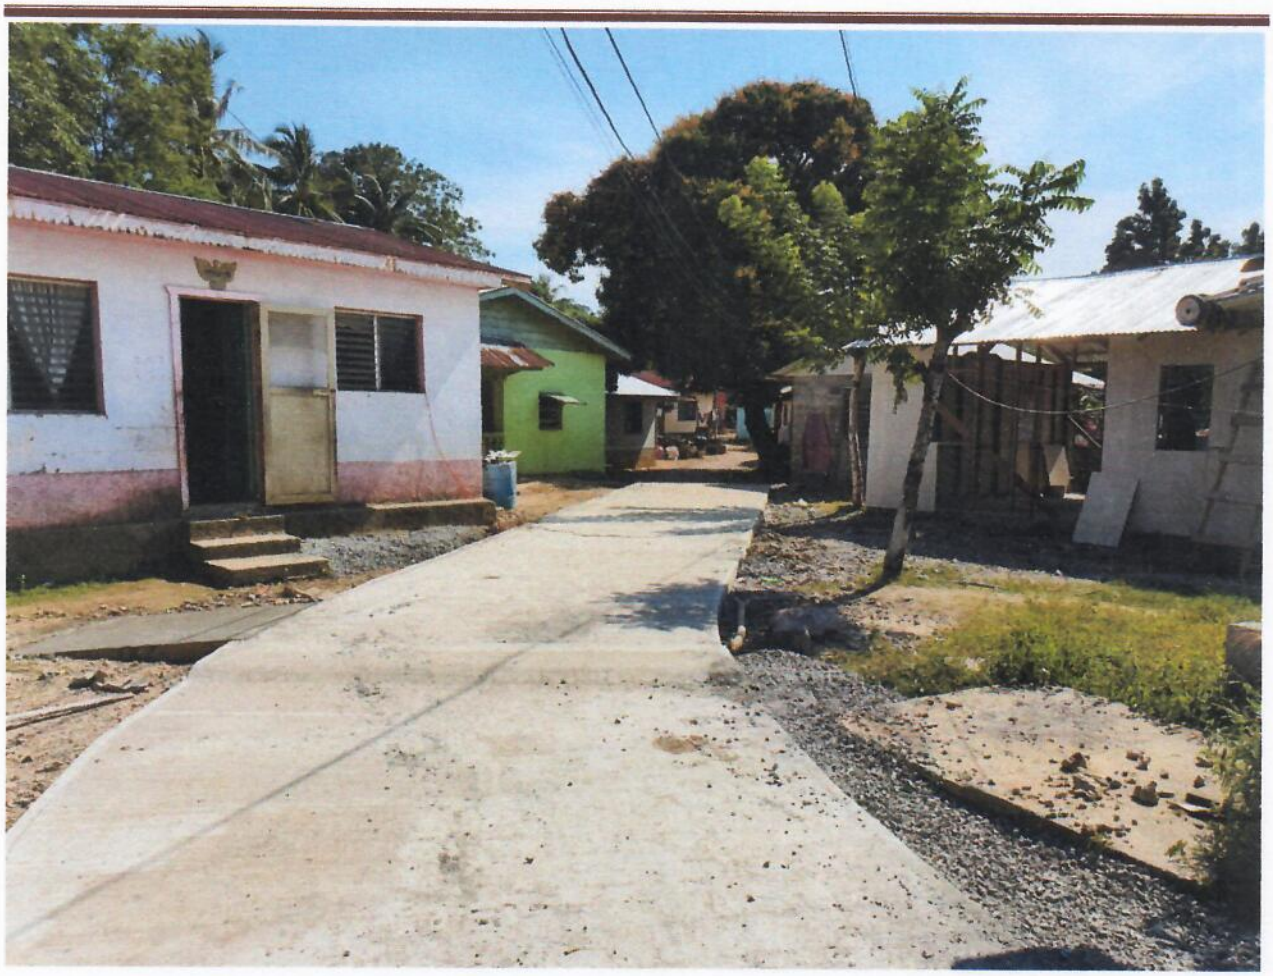

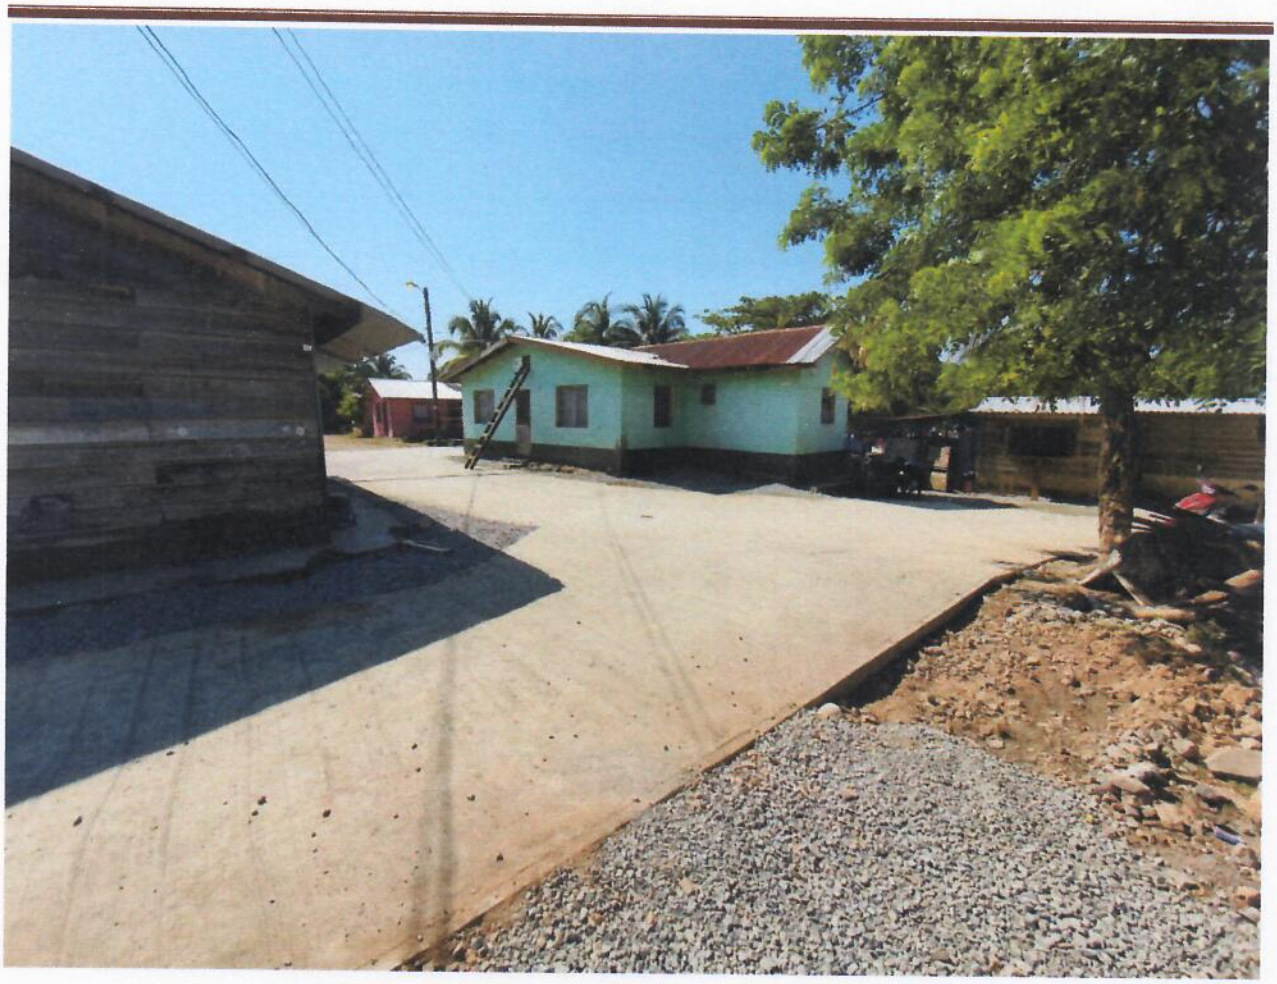

José Santos Guardiola, Islas De la Bahía, 06 de enero de 2020.

PERFIL DE PROYECTO

PROYECTO: TERRACERÍA Y PAVIMENTACIÓN CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT HILL, MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA

FINANCIMIENTO

Y

EJECUTOR: MUNICIPALIDAD JOSÉ SANTOS GUADIOLA

ELABORADO: UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, JOSÉ SANTOS GUARDIOLA.

ING. ALBIN CASTELLÓN

I. PERFIL DEL PROYECTO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Nombre del proyecto: Terracería Y Pavimentación Calle En La Comunidad De Lucy Point Hill, Municipio De Santos Guardiola, Islas De La Bahía.

Tipo de proyecto: Pavimentación.

Localización del proyecto:

- País: Honduras.
- Región: zona norte.
- Departamento: Islas de la bahía.
- Municipio: José Santos Guardiola.
- Comunidad: Lucy Point Hill.

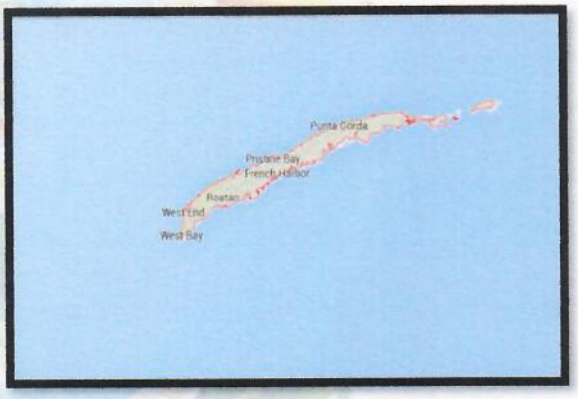

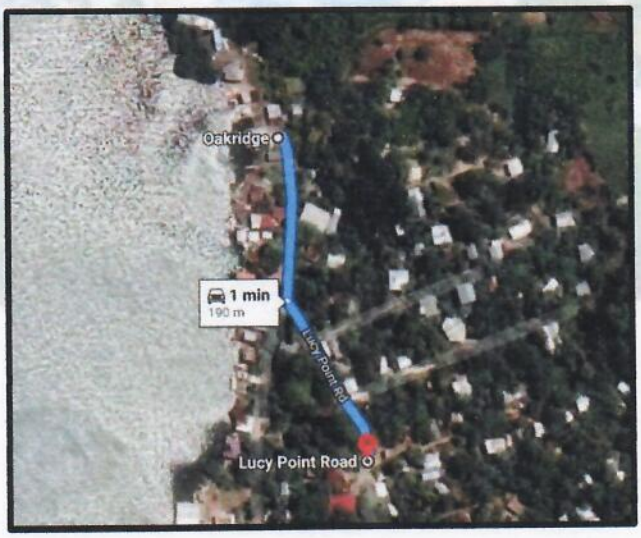

Viabilidad del proyecto: Los recursos financieros para llevar a cabo este proyecto serán facilitados por la Municipalidad de Santos Guardiola en un 100%, los costos para realizar los estudios previos a la ejecución del proyecto serán gestionado y canalizado a través de la alcaldía municipal de Santos Guardiola.

Todos los gastos del proyecto aportado por la municipalidad son sustentables con las transferencias gubernamentales y el aporte comunitario que se llevara a cabo.

2. INFORMACIÓN GENERAL

Duración: El proyecto se llevará a cabo en el trascurso de 1 mes, su probable inicio de ejecución será en el primer trimestre del año 2020.

Costo aproximado del proyecto: La ejecución del proyecto Terracería Y Pavimentación Calle En La Comunidad De Lucy Point Hill, Municipio De Santos Guardiola, Islas De La Bahía, tendrá un costo aproximado de Lps. 999, 951.16 según presupuesto realizado por Unidad Técnica.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos con la ejecución de este proyecto serán los habitantes de la Comunidad de Lucy Point Hill, Municipalidad de Santos Guardiola.

II. MARCO DE REFERENCIA

1. Antecedentes

1.1 Problemas a resolver, necesidades a satisfacer (situación del problema)

Actualmente la Comunidad de Luci Point Hill tiene problemas con la calle ya que por sus elevadas pendiente se pone en mal estado rápidamente por lluvias y falta de drenajes ya que erosionan la calle, por lo que se dificulta para transitar ya sea los peatones o los vehículos que por esta circulan

Este proyecto viene hacer prioridad para los habitantes por lo que solicitan el mejoramiento de la calle.

1.2 Alternativa de solución

Para darle una solución a la problemática que tiene la comunidad con el mal estado de la calle se hizo el estudio y un analices del costo que este tendría en el que se llegó a la conclusión la pavimentación de un tramo de calle de 190.00 metros lineales de 4.88 de ancho. También se colocarán las obras de drenajes para evacuar las aguas lluvias.

También servirá como obra preventiva para la protección de obras futuras que puedan desarrollarse en la zona de influencia del proyecto.

1.3 Justificación de la alternativa seleccionada

Con la implementación de este proyecto cumplimos con los objetivos y metas trazadas y así tener un Municipio en óptimas condiciones.

Actualmente en el Departamento de Islas de la Bahía, Municipio de Santos Guardiola se han desarrollado proyectos de Mejoramiento de la red vial como ser pavimentación de calle, señalizaciones de calles y mejoramiento de la red vial no pavimentada de tal forma que se encuentre en buen estado en todo momento del año por lo que con este proyecto se sigue la misma línea de mejoramiento ya que la red vial está en buen estado y este proyecto viene ayudar a estos proyectos.

Uno de los factores importante para que un país tenga un desarrollo eficiente es mantener las calles en buen estado de esta forma evitamos atrasos y daños a terceros, buscando que los diferentes sectores puedan ser accesibles tanto a los que lo están poblando como a los que nos visitan.

Con el propósito de elevar el nivel en la infraestructura, y para satisfacer la demanda actual y futura de servicios que el país requiere, se vuelve indispensable y altamente prioritario, la ejecución del proyecto antes mencionado.

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Objetivo General

Terracería Y Pavimentación Calle En La Comunidad De Lucy Point Hill, Municipio De Santos Guardiola, Islas De La Bahía

1.2 Objetivos específicos

- Evitar daños a terceros.
- Mantener la red vial del municipio en buen estado

1.3 Metas

- Culminar el proyecto antes mencionados bajo los términos enmarcados en la formulación y planificación del proyecto.

IV. ANEXOS

V. MAPA DE UBICACIÓN DEL SITIO DE CONSTRUCCIÓN

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

UBICACIÓN DEL SITIO DE CONTRUCCIÓN

Ruta: El proyecto se encuentra en uno de los barrios del municipio de Santos Guardiola que se encuentra en la Comunidad de Lucy Point pasando por la calle principal y tomando la calle que va hacia el sur de la comunidad hasta llegar al barrio lucy point hill

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldíasantosguardiola@gmail.com

VI. PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

PRESUPUESTO

PROYECTO: Terracería Y Pavimentación Calle en la Comunidad de Lucy Point Hill
UBIACIÓN: Comunidad De Lucy Point, Municipio De Santos Guardiola
FECHA: lunes 06 de enero de 2020

Santos Guardiola, Islas de la Bahía, Honduras, C.A.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	**GENERALES**					
1.1	Movilización de Equipo	Global	1.00	7,888.16	L.	7,888.16
	TOTAL GENERALES				**L.**	**7,888.16**
2	**BASE COMPACTADA**					
2.1	Trazado y Marcado Nivel de Base (e= 10 cms)	M2	950.00	47.35	L.	44,982.50
2.2	Conformación y Compactación de Base (e= 10 cms)	M3	95.00	1,260.03	L.	119,702.85
	TOTAL BASE COMPACTADA				**L.**	**164,685.35**
3	**PAVIMENTACIÓN**					
3.1	Trazado y Marcado Nivel Capa de Rodadura (e= 15 cms)	M2	927.20	47.35	L.	43,902.92
3.2	Suministro y Colocación de Concreto Hidraulico 3500 PSI (e= 15 cms)	M2	927.20	794.20	L.	736,382.24
3.3	Corte de Junta Transversales y Longitudinales	ML	499.07	40.00	L.	19,962.67
3.4	Curado Losa de Concreto	M2	927.20	15.00	L.	13,908.00
	TOTAL PAVIMENTO				**L.**	**814,155.83**
4	**OBRAS DE DRENAJES**					
4.1	Excavación con retroexcavadora	M3	9.76	15.64	L.	152.65
4.2	Colocación de Caja Puente bloque de 8 pulg	Unidad	2.00	6,534.59	L.	13,069.18
	TOTAL PAVIMENTO				**L.**	**13,221.83**
	TOTAL DEL PROYECTO				**L.**	**999,951.16**

NOTAS:

* Espesor de Base Compactada= 10 Centimetros
* Espesor de Pavimento= 6.00 Pulgadas
* Cumple con los procedimientos de Contratación Directa basado en la Ley de Contratación del estado, Capitulo IV, Sección Sexta, Articulo 63, Numeral 3, y Según las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019, Articulo 72, inciso "1".
* Se recomienda a la administración realizar 3 cotizaciones con empresas o contratistas individuales debidamente autorizados para la realización del proyecto.
* Solicitar garantía de cumplimiento del contrato del 15 % del monto del contrato.
* Una vez finalizado el contrato se solicitara la garantía de Calidad de Obra por 5% del monto del contrato.
* Anticipó si lo hubiere es del 15% del monto del contrato como maximo y solicitar garantía de anticipo por la cantidad pagada.

Elaborado por:
Ing. Albin Castellón
Unidad Técnica Municipal

c.c Administrador
c.c Tesorería

VII. FOTOGRAFÍAS

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldíasantosguardiola@gmail.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

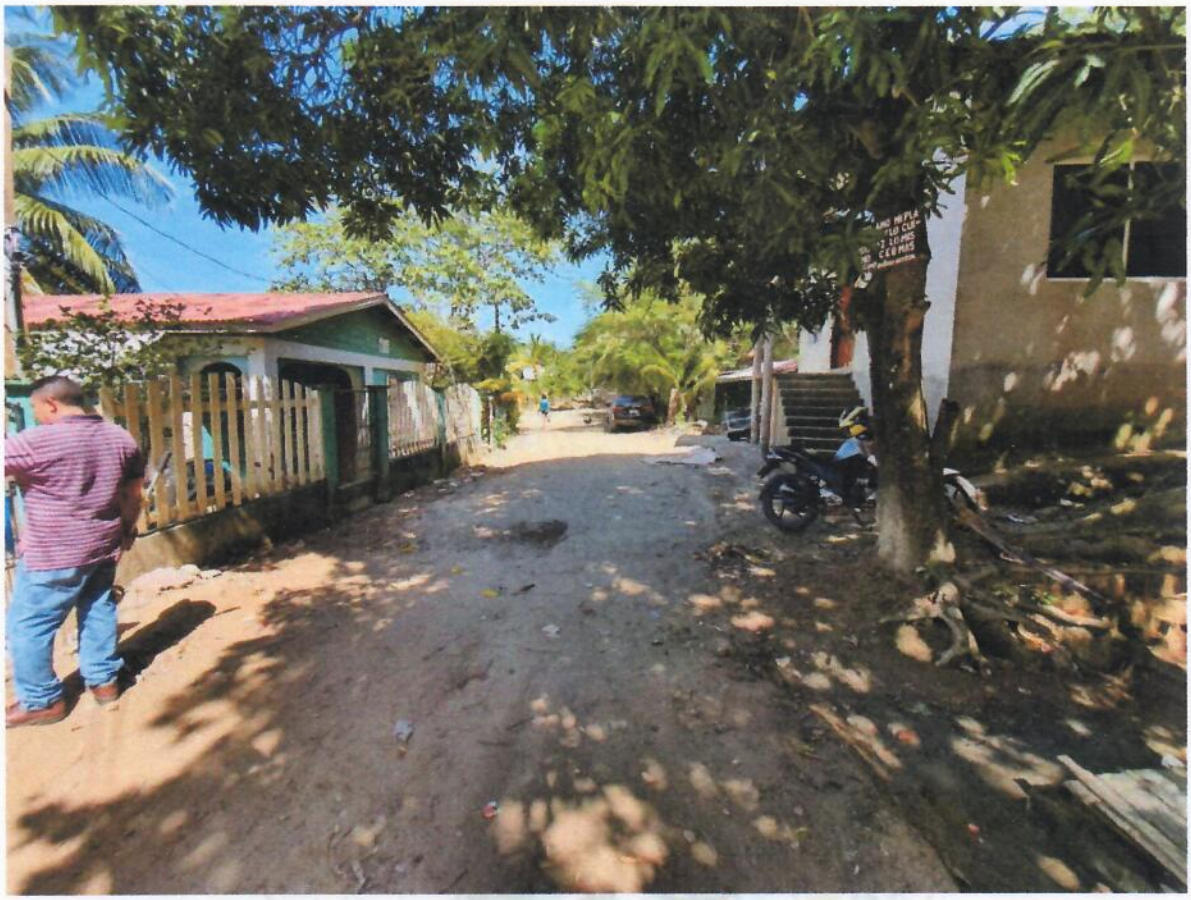

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldiasantosguardiola@gmail.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldíasantosguardiola@gmail.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

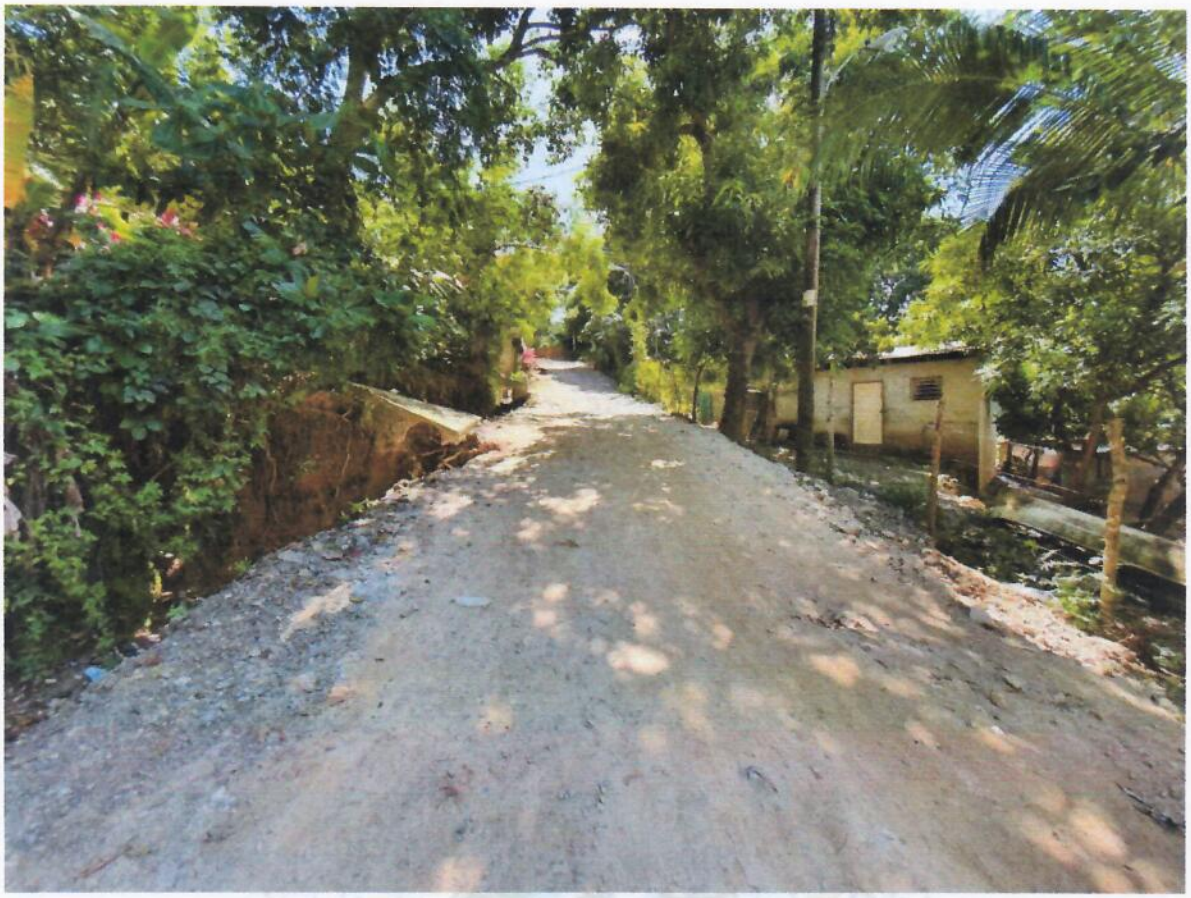

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldíasantosguardiola@gmail.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldíasantosguardiola@gmail.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldiasantosguardiola@gmail.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

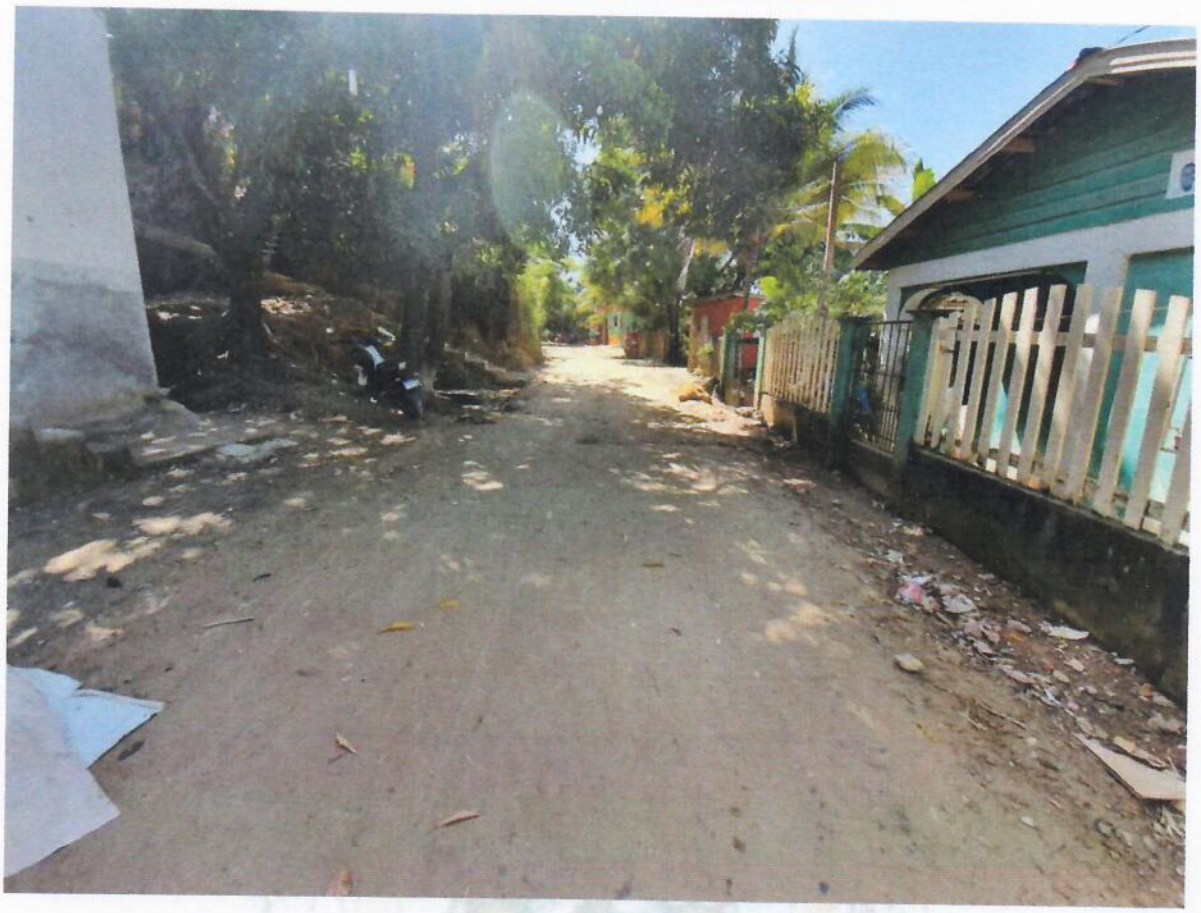

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldíasantosguardiola@gmail.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

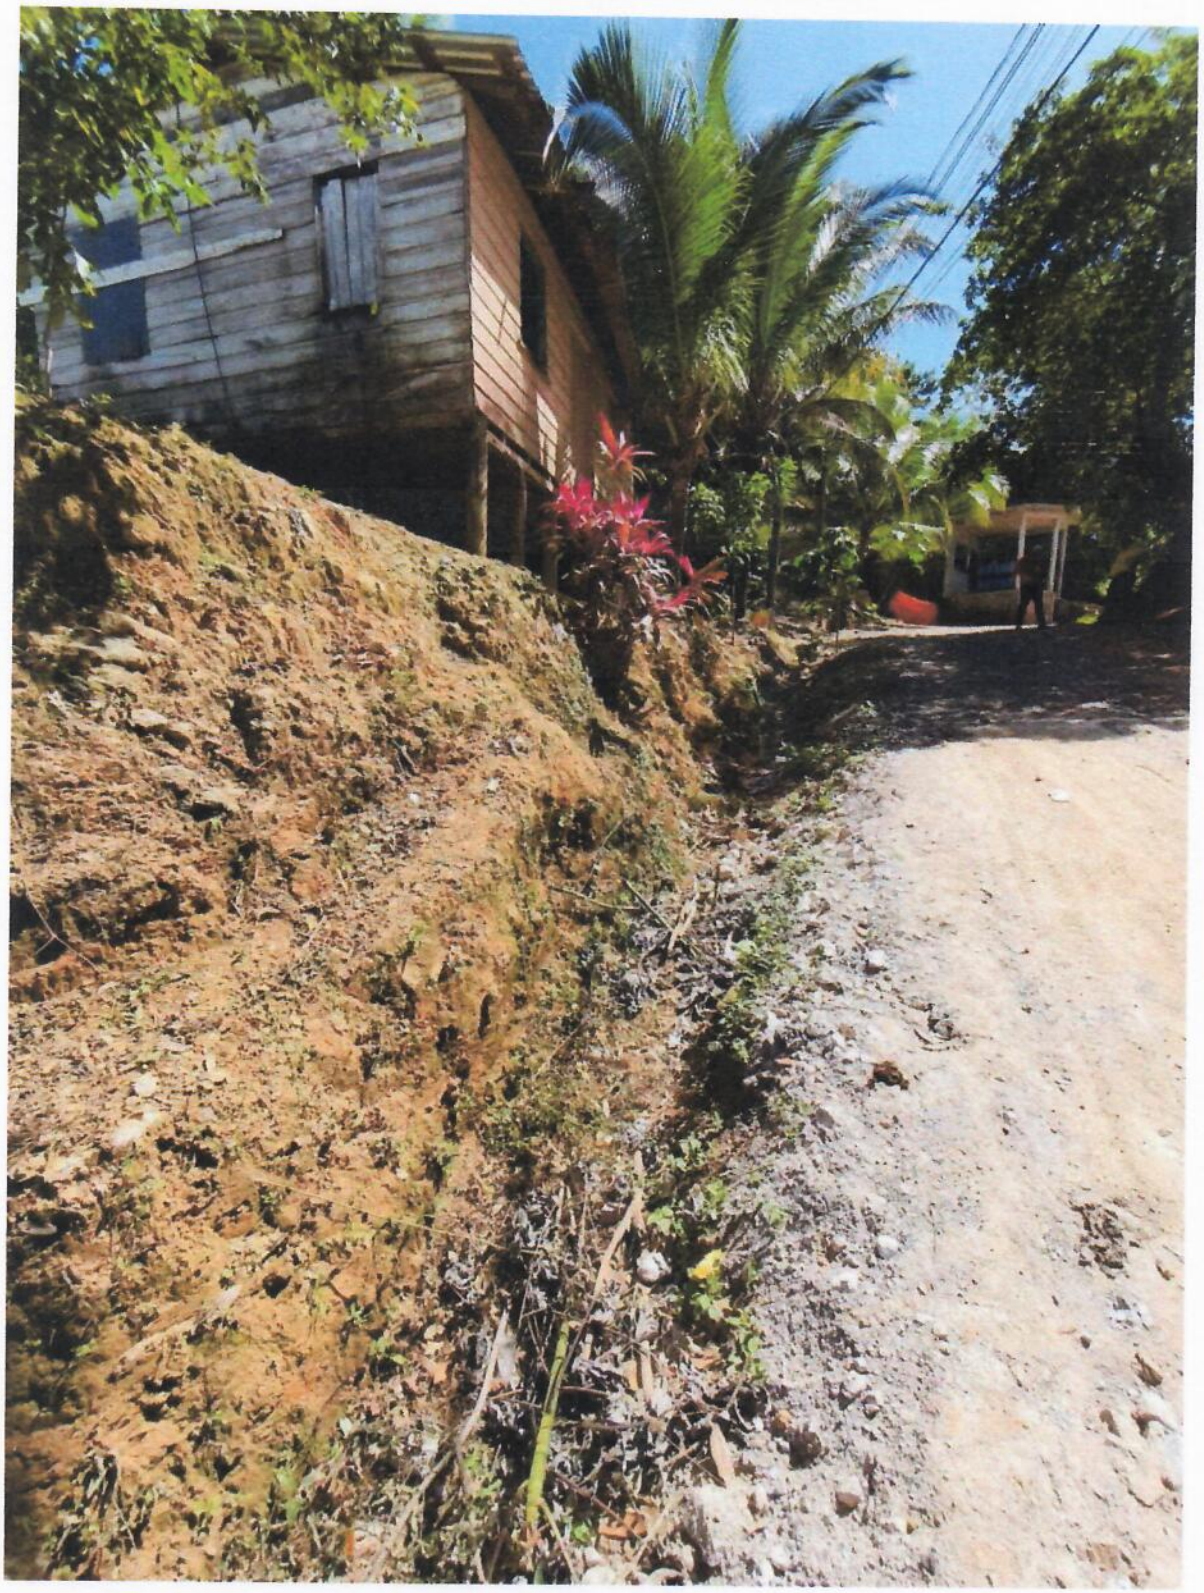

JUNTOS RESCATEMOS SANTOS GUARDIOLA
Islas de la Bahía, Teléfono: 2435-2183 Fax: 243535-2428
Alcaldiasantosguardiola@gmail.com

REPORTE FINAL DE OBRA

Terracería Y Pavimentación Calle en la Comunidad de Lucy Point Hill
Comunidad De Lucy Point, Municipio De Santos Guardiola

Un pavimento de concreto es una estructura que permite disipar eficientemente las solicitaciones del tránsito, bien sea peatonal o vehicular. Una vez se ha preparado la subestructura, se ha verificado su densidad y las cotas del terreno definidas, se inició con las actividades de pavimentación. A continuación se describen las consideraciones que se tomaron en cuenta para llevar a cabo el proceso constructivo del pavimento de concreto en la comunidad de Lucy Point.

Se ejecutó un plan de manejo de aguas superficiales y no superficiales l, para identificar las correctas pendientes de la calle, cajas puentes cunetas entre otras. Se procedió al corte y nivelación de las áreas que requerían un cambio de pendiente o mejoramiento de superficie, se conformó la superficie y luego se procedió a mejorar la superficie con suelo cemento, posterior a esto se compacto para mejorar la capacidad soportante de la superficie.

Se procedió a colocar el encofrado con madera revisando que estuviera libre de materiales que pudieran ensuciar el concreto a colocar, igualmente se verifico el desnivel a utilizar para el correcto bombeo de las aguas lluvias. Se revisó el correcto bombeado o colocado del concreto, vibrándolo para asegurar que el aire contenido en el concreto salga y no quedara atrapado.

Al terminar se procedió a dar un acabado escobillado para mejorar irregularidades en la superficie para mejorar la adherencia con los peatones y vehículos.

Actividades de campo realizadas

1. Corte y nivelación de terracería
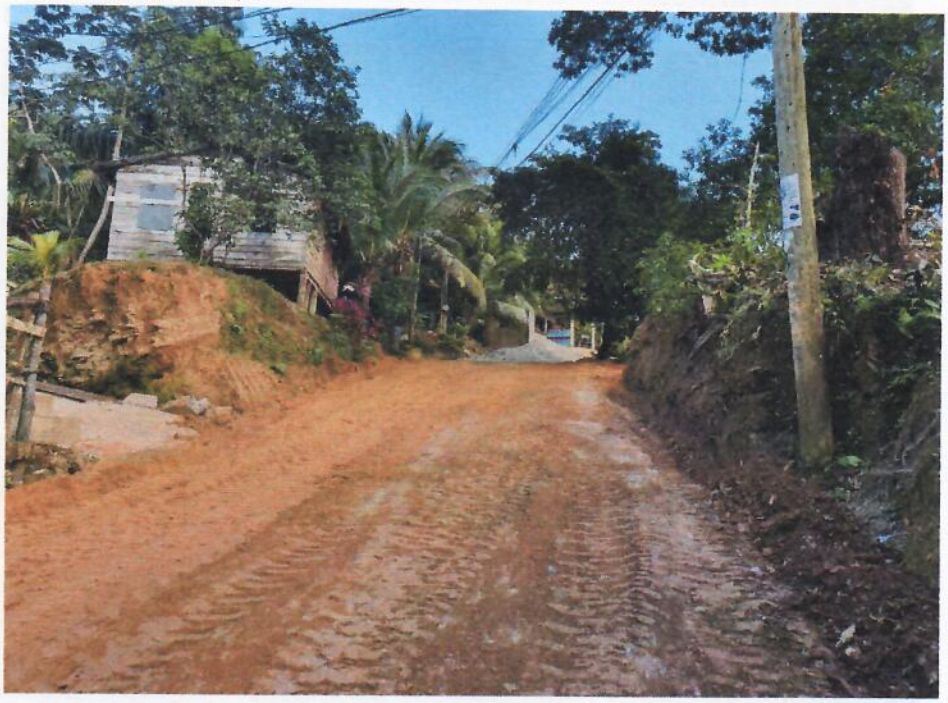
2. Conformación de superficie
