MEMORANDUM **Ingeniería**

Para: Licda. Dilia Martínez
Oficial de información pública

De: Ing. Neil Patrick Díaz Rodríguez
Jefe departamento Ingeniería

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

Asunto: Lo descrito

Fecha: 02 de septiembre de 2020

Por este medio le hago remisión en formato físico y digital el informe mensual de avance físico financiero de los proyectos de inversión en ejecución correspondiente al mes de agosto del 2020.

Muy atentamente.

CC: Dirección Ejecutiva
CC: Archivo

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA INSEP

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de sula

Departamento de ingeniería

Resumen de la Ejecución Fisisca y finaciera de proyectos

Periodo: Mes de Agosto 2020

PROGRAMA 22: Obras para el Control de Inundaciones del Valle de Sula				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES VIGENTES		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE MES		ACUMULADO A LA FECHA		% AVANCE	
INST.	GA	UE	ACT/OBRA			Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera
120	08	38	002	CANALIZACIONES	M³	166,300	L. 19,646,000	92,519	L. 16,460,968	0	L. -	92,519	L. 16,460,968	56%	84%
120	08	38	004	ESPIGONES	M³	143,164	L. 42,558,373	0	L. -	0	L. -	0	L. -	0%	0%
120	08	38	006	ALCANTARILLAS	ML	181	L. 11,280,000	0	L. -	0	L. -	0	L. -	0%	0%
120	08	38	008	BORDOS	M³	234,500	L. 16,625,000	0	L. -	0	L. -	0	L. -	0%	0%

Ing. Neil Patrick Díaz Rodriguez
Jefe Depto. Ingeniería

LEYENDA:
INST. = Institucion
GA = Gerencia Administrativa
UE = Unidad Ejecutora
ACT/OBRA = Actividad / obra

OBSERVACIONES: El avance financiero reflejado es de conformidad con los precios contractuales y al avance fisico parcial a la fecha de 4 proyectos de arrastre del año 2019, no hay producción en éste mes por la suspensión temporal de las actividades por la emergencia nacional decretada en PCM-021-2020 por el Gobierno Central por la pandemia del Coronavirus.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA INSEP

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE AGOSTO 2020

PROYECTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	NUEVA CANTIDAD VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO AGOSTO	ACUMULADO AGOSTO	% AVANCE
02	CANALIZACIONES	M^3	166,300	92,519	0	92,519	55.6%
04	ESPIGONES	M^3	143,164	0	0	0	0.0%
06	ALCANTARILLAS	ML	181	0	0	0	0.0%
08	BORDOS	M^3	234,500	0	0	0	0.0%



Ing. Neil Patrick Díaz R.
Jefe departamento Ingeniería.

Observaciones: La ejecución física del mes de agosto de 2020 corresponden a 4 Proyectos de arrastre del año 2019, no hay producción en éste mes por la suspensión temporal de las actividades por la emergencia nacional decretada en PCM-021-2020 por el Gobierno Central por la pandemia del Coronavirus.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

Proyectos de Inversión en ejecución
Periodo Agosto Año 2020

No	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA	Nº DE CONTRATO
1	Construcción de sistema de drenaje pluvial y obras de control de sedimentación de las quebradas Jocomico y Tatumbla II etapa	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV	P2-004-2019 CCIVS
2	Mejoramiento de area Hidraulica, Canal Maya Gualiqueme desde Bocatoma La Puntilla	COSOBRI S.de R.L.	P2-010-2019-CCIVS
3	Canalizacion y Obrasde proteccion en Rio Guaymitas, Sector Aldea Guaymitas	CONSTRUCTORA UNIVERSAL S de R.L.	P2-023-2019 CCIVS
4	Canalizacion y Obras de Proteccion Margenes del rio Tegucigalpita, etapa 1	CONDELTA S.A.de C.V	P2-014-2019 CCIVS

**Proyectos en suspensión temporal por emergencia Nacional por Pandemia de COVID 19

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

ING. NEIL PATRICK DIAZ R.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

CUADRO DE AVANCE FISICO

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Diana Margarita Avilez Rojas **Año 2020**

Periodo: 01 al 31 de agosto 2020

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Monto del contrato	Saldo 2019-2020	Monto Obra adicional	Nuevo Monto del Contrato	Obra Contratada					Avance fisico				Avance financiero				Observaciones
		Departamento	Municipio							Descripción	Unidad	Cantidad	Obra adicional	Nuevas cantidades	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades acumuladas	% Fisico efectuado acumulado	Acumulado anterior	Este periodo	Acumulado	% Financiero efectuado acumulado	
1	Canalizaciones.																						
1.1	Construcción de sistema de drenaje pluvial y obras de control de sedimentación de las quebradas Jocomico y Taturnbla II etapa	Yoro.	El Negrito	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS, S. de R.L de C.V.	P2-004-2019 CCIVS	L. 6,362,753.89	L. 1,478,862.23	0.00	L. 0.00	Concreto Ciclopeo en Canal (65% conc. 3000 PSI, 35% piedra),(canal abierto,Pasos vehiculares en parte superior de muros para apoyo de losas, Canal Jocomico, que incluye losa de piso y anclaje),(incluye muros en todo la caja de puente L=16.00 ml).	M3	1,818.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	57.76%	L854,122.50	L0.00	L. 854,122.50	57.76%	Proyecto sin ejecucion ya que durante el mes de julio se vio afectado por la cuarentena a nivel nacional apartir del mes de marzo por la crisis mundial (pandemia por el COVID 19) (Proyecto migrado del año 2019, ejecucion real con un porcentaje del 93.00%)

Ing. Diana Margarita Avilez Rojas
Coordinador Poyectos
CCIVS

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

Vo.Bo.Ing. Neil Patrick Diaz Rodriguez
Jefe Departamento de Ingenieria
CCIVS

PROGRAMAS Y PROYECTOS

IDENTIFICACION DE PROYECTO	
Propietario del Proyecto	Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Sector, Sub-Sector	Infraestructura Productiva
Nombre del Proyecto	Construcción de sistema de drenaje pluvial y obras de control de sedimentación de las quebradas Jocomico y Tatumbla II etapa
Ubicación del Proyecto	Jurisdicción de El Negrito, departamento de Yoro.
Propósito	La construcción del sistema de drenaje pluvial y obras de control de sedimentación en las quebradas de Jocomico y Tatumbla que nacen en la zona alta de las montañas que arrastran gran cantidad de sedimentos de formación areno - limosa sin cohesión (muy poca plasticidad).
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en: 1.Excavación común y conformación de material en un volumen de 8,497.00 metros cúbicos, 2.Concreto ciclópeo en Canal con relación 65% concreto de 3000 PSI, y 35% piedra de rio, un volumen de 1,868.00 metros cúbicos, utilizando piedra fina libre de intemperismo con un tamaño entre 6 y 8 pulgadas, según detalle previsto en planos; 3. Junta de control en canal de concreto ciclópeo, e= 2 mm, ancho promedio de 25 cms. 4. Construcción de 10 pasos vehiculares con losa de concreto reforzado 3000 PSI. (4.00x3.40x0.20mts), acero grado 40; 5. Construcción de 480.00 metros cúbicos de escollera de piedra en una longitud de 16.00 metros lineales.
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto	Obras de Proteccion.
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles de Contactos (Nombre Completo,	Ing. Neil Díaz. Dirección B° El Benque 7 y 8 calle 8Ave. Tel. 25579066
Fuentes de Financiamiento	Fondos Nacionales
Presupuesto del Proyecto (Estimado)	Lps. 7,631,105.86
Fecha de Aprobación de Presupuesto del Proyecto	05 de febrero de 2019
Estado del Proyecto (Actual)	En Ejecucion
Costo de Finalización (Proyectado)	Lps. 6,362,753.89
Fecha de Finalización (Proyectada)	19 de Marzo de 2020
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No se ha realizado actividad en la obra ya que el contratista suspendio labores desde la segunda quincena del mes de marzo del 2020 acatando las dispociones emitidas por las autoridades con las medidas de cuarentena para evitar la propagacion del COVID 19, durante este mes de agosto se inicio reaperturo la fase I.
Variación en el Costo Total del Proyecto	Ninguna
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto	Ninguna
Razones de los Cambios antes mencionados	Mediante decreto ejecutivo PCM-005-2020 del 10 de febrero se declaro en estado de emergencia santiraia en todo el territorio nacional, por la pandemia mundial del COVID-19, el cual hasta este mes de agosto ha tenido presencia en Honduras con mas de 59,000 infectados y mas de 1,800 muertos por lo cual se ha permanecido en cuarentena desde el pasado16 de marzo de 2020;por lo que todas las obras han detenido sus labores.

AVANCE FISICO AGOSTO 2020

Proyecto: Construcción de sistema de Drenaje Pluvial y Obras de Control de las Quebradas Jocomico y Tatumbla II Etapa"

Jurisdicción: El Negrito	Departamento: Yoro.	1 /4.

COMUNICADO DE PRENSA

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras y en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), con relación a toque de queda absoluto, los informes de avance de la Fuerza Honduras y la baja en la presión hospitalaria, a la opinión pública comunica:

1. Que, se determinó extender el **Toque de Queda Absoluto en todo el territorio hondureño, desde el domingo 09 de agosto a las 09:00 pm hasta el domingo 23 de agosto a las 11:00 pm**; y avanzar con la Fase I del Proceso de Apertura Gradual y Responsable a los que se incluyen los municipios de: El Progreso, Yoro y La Ceiba, Atlántida. Los demás municipios que están en fase 0 continúan hasta nuevas disposiciones; autorizando únicamente para apertura a supermercados, farmacias, bancos, cooperativas, ferreterías, sistema financiero en general, restaurantes del pilotaje, mercados autorizados y el sector maquilador, quienes atenderán a sus clientes según calendario de circulación nacional, así como por el último dígito de su cédula de identidad, pasaporte o carné de residente (extranjeros) con extensión de horario de 06:00 am a 08:00 pm.

Calendario de Circulación Nacional

Día	Transitar Desde	Transitar Hasta	Terminación de identidad, pasaporte o carné de residente (extranjeros)	Sectores Autorizados en fase 0
Lunes 10/agosto	6:00 AM	8:00 PM	1	Bancos Cooperativas Sistema Financiero Farmacias Gasolineras Supermercados Ferreterías Mercados autorizados y Restaurantes incluidos en el pilotaje El resto del país continua en Fase 1 del Proceso de Apertura Inteligente
Martes 11/agosto	6:00 AM	8:00 PM	2	
Miércoles 12/agosto	6:00 AM	8:00 PM	3	
Jueves 13/agosto	6:00 AM	8:00 PM	4	
Viernes 14/agosto	6:00 AM	8:00 PM	5	
Sábado y Domingo (15/16 de agosto)			NADIE CIRCULA	
Lunes 17/agosto	6:00 AM	8:00 PM	6	
Martes 18/agosto	6:00 AM	8:00 PM	7	
Miércoles 19/agosto	6:00 AM	8:00 PM	8	
Jueves 20/agosto	6:00 AM	8:00 PM	9	
Viernes 21/agosto	6:00 AM	8:00 PM	0	
Sábado y Domingo (22/23 de agosto)			NADIE CIRCULA	

La atención especial para adultos mayores, mujeres embarazas y personas con discapacidad según terminación de su cédula de identidad, pasaporte o carné de residente (extranjeros):
- Todos los comercios autorizados a nivel nacional 07:00 am a 09:00 am
- Sistema bancario 09:00 am a 10:00 am

Se les recuerda que tambien serán atendidos durante el resto del día

Medidas de bioseguridad OBLIGATORIAS en todos los sectores autorizados
Mascarillas
Gel
Distanciamiento
Toma de temperatura

2. Reafirmamos que a nivel nacional con base en el PCM 078-2020, **LA EXCEPCIÓN** a esta medida aplica a las instituciones allí detalladas, al igual que al personal que conforman SINAGER entre ellos salud, Alcaldías Municipales, transporte de carga, combustible, productos agrícolas, alimentos perecederos, transporte de hospitales públicos y privados, productos médicos, transporte de seguridad y emergencia, servicios y distribuidores de agua (SANAA), tren de aseo, transporte de autobuses contratado, sector construcción así mismo Secretarías de Estado y Direcciones autorizadas, así mismo a nivel nacional el sector construcción con su respectivo salvoconducto.

3. Los únicos salvoconductos autorizados son los digitales, emitidos a través de la plataforma oficial www.serviciospoliciales.gob.hn, por lo que no se permitirá circulación con otro tipo de documento. La Policía Nacional de Honduras reitera su compromiso y disposición de servicio a la sociedad y pide acatar las recomendaciones preventivas y permanecer en sus hogares.

El Ocotal FM. 09 de agosto de 2020

¡Nuestro compromiso Servir y Proteger!

Comunicados de la policía Nacional y SINAGER de toques de queda absoluto mes de Agosto del 2020; 0% de avance físico.

AVANCE FISICO AGOSTO 2020

Proyecto: Construcción de sistema de Drenaje Pluvial y Obras de Control de las Quebradas Jocomico y Tatumbla II Etapa"

Jurisdicción: El Negrito	Departamento: Yoro.	2/4.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Fase 0
Del 10 de agosto al 23 de agosto de 2020

Departamento	Municipio
Atlántida	Tela
Colón	Trujillo Sabá Tocoa Bonito Oriental
Francisco Morazán	Reitoca San Buenaventura Santa Lucía
Gracias a Dios	Puerto Lempira Brus Laguna
Intibucá	La Esperanza Intibucá
La Paz	La Paz San José Santa María
Santa Bárbara	Las Vegas Trinidad

Departamento	Municipio
Choluteca	Orocuina Pespire San Antonio de Flores
Cortés	Omoa Pimienta Potrerillos
El Paraíso	Danlí Morocelí
Ocotepeque	Ocotepeque Sinuapa
Olancho	Juticalpa
Valle	Nacaome Amapala Langue San Francisco de Coray San Lorenzo

policianacional.gob.hn @PoliciaHonduras Policía Nacional de Honduras Policía Nacional de Honduras Policía Nacional Honduras

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

Comunicados de la policía Nacional y SINAGER de toques de queda absoluto mes de agosto del 2020; 0% de avance físico.

AVANCE FISICO AGOSTO 2020

Proyecto: Construcción de sistema de Drenaje Pluvial y Obras de Control de las Quebradas Jocomico y Tatumbla II Etapa"

Jurisdicción: El Negrito Departamento: Yoro. 3/4.

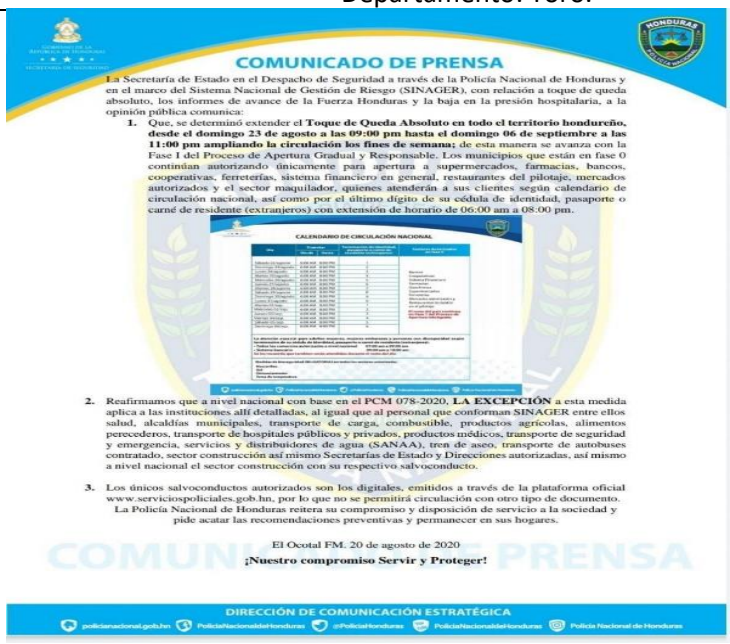

COMUNICADO DE PRENSA

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras y en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), con relación a toque de queda absoluto, los informes de avance de la Fuerza Honduras y la baja en la presión hospitalaria, a la opinión pública comunica:

1. Que, se determinó extender el **Toque de Queda Absoluto en todo el territorio hondureño, desde el domingo 23 de agosto a las 09:00 pm hasta el domingo 06 de septiembre a las 11:00 pm ampliando la circulación los fines de semana;** de esta manera se avanza con la Fase I del Proceso de Apertura Gradual y Responsable. Los municipios que están en fase 0 continúan autorizando únicamente para apertura a supermercados, farmacias, bancos, cooperativas, ferreterías, sistema financiero en general, restaurantes del pilotaje, mercados autorizados y el sector maquilador, quienes atenderán a sus clientes según calendario de circulación nacional, así como por el último dígito de su cédula de identidad, pasaporte o carné de residente (extranjeros) con extensión de horario de 06:00 am a 08:00 pm.

CALENDARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL

2. Reafirmamos que a nivel nacional con base en el PCM 078-2020, **LA EXCEPCIÓN** a esta medida aplica a las instituciones allí detalladas, al igual que al personal que conforman SINAGER entre ellos salud, alcaldías municipales, transporte de carga, combustible, productos agrícolas, alimentos perecederos, transporte de hospitales públicos y privados, productos médicos, transporte de seguridad y emergencia, servicios y distribuidores de agua (SANAA), tren de aseo, transporte de autobuses contratado, sector construcción así mismo Secretarías de Estado y Direcciones autorizadas, así mismo a nivel nacional el sector construcción con su respectivo salvoconducto.

3. Los únicos salvoconductos autorizados son los digitales, emitidos a través de la plataforma oficial www.serviciospoliciales.gob.hn, por lo que no se permitirá circulación con otro tipo de documento.

La Policía Nacional de Honduras reitera su compromiso y disposición de servicio a la sociedad y pide acatar las recomendaciones preventivas y permanecer en sus hogares.

El Ocotal FM. 20 de agosto de 2020

¡Nuestro compromiso Servir y Proteger!

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

policianacional.gob.hn PoliciaNacionaldeHonduras @PoliciaHonduras PoliciaNacionaldeHonduras Policía Nacional de Honduras

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

Comunicados de la policía Nacional y SINAGER de toques de queda absoluto mes de julio del 2020; 0% de avance físico.

AVANCE FISICO AGOSTO 2020

Proyecto: Construcción de sistema de Drenaje Pluvial y Obras de Control de las Quebradas Jocomico y Tatumbla II Etapa"

Jurisdicción: El Negrito Departamento: Yoro. 4/4.

Reunión en sitio de proyecto con Contratista y personal técnico de Alcaldía Municipal de El Negrito (5 ago 2020).

CUADRO DE AVANCE FISICO

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Gerson Eberton Cortes Nolasco **Año 2020**

Periodo: 01 al 31 de Agosto 2020

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Monto del contrato	Saldo Pendiente 2019-2020	Monto Obra adicional	Nuevo Monto del Contrato	Obra Contratada					Avance fisico				Avance financiero				Observaciones
		Departamento	Municipio							Descripción	Unidad	Cantidad	Obra adicional	Nuevas cantidades	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades acumuladas	% Fisico efectuado acumulado	Acumulado anterior	Este periodo	Acumulado	% Financiero efectuado acumulado	
1	Canalizaciones																						
1.1	Canalizacion y Obras de Proteccion en Rio Guaymitas, Sector Aldea Guaymitas.	Yoro	El Progreso	CONSTRUCTORA UNIVERSAL S. de R.L.	P2-023-2019 CCIVS	L. 8,005,667.00	L. 8,005,667.00	L. 620,840.00	L. 8,626,507.00	Canalizacion y Obras de Proteccion	M3	22,259.00	1,496.00	23,755.00	21,380.00	0.00	21,380.00	90.00%	L7,763,856.30	L0.00	L. 7,763,856.30	90.00%	se emitio una suspensión por decreto ejecutivo PCM 021 2020
3	Alcantarillas																						
4	Bordos de Contencion																						

Ing. Gerson Eberton Cortes Nolasco
Coordinador Poyectos
CCIVS

VoBo
Ing. Neil Patrick Diaz Rodriguez
Jefe Departamento de Ingenieria
CCIVS

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

PROGRAMAS Y PROYECTOS

IDENTIFICACION DE PROYECTO	
Propietario del Proyecto	Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Sector, Sub-Sector	Infraestructura Productiva
Nombre del Proyecto	"CANALIZACION Y OBRAS DE PROTECCION EN RIO GUAYMITAS, SECTOR ALDEA GUAYMITAS.".
Ubicación del Proyecto	Jurisdicción de El Progreso, departamento de Yoro.
Propósito	Proteger las márgenes del rio Guaymitas con una estructura de escollera de piedra, reconstrucción de andenes y la sobreelevación de bordo para evitar daños de mayor relevancia y evitar daños a los sectores circunvecinos de esta zona.
Descripción del Proyecto	Las actividades a realizar consisten en la protección en ambas márgenes del rio Guaymitas con una longitud de 800.00 metros lineales; mediante la ejecución de las siguientes actividades: 1. Corte, Conformación del Cauce del Rio y Conformación de anden con material del sitio (con un volumen de corte de 9,597.00 metros cúbicos se realizara el tendido y conformación de material con tractor, 800.00 metros lineales, ancho de plantilla 30.00 metros, taludes 1.5:1 el volumen adicional de 4,211.00 metros cúbicos, conformar talud en ambas márgenes del rio, con un volumen de conformación de anden de 5,386.00 metros cúbicos, con talud 1:1 según plano de diseño CCIVS); 2. Construcción de escollera de piedra en una longitud de 800.00 metros lineales comprendidos entre las estaciones denominadas 0+000 a la 0+800, con un volumen de roca de 18,227.00 metros cúbicos. Los parámetros de diseño son los siguientes: corona de escollera 2.50 metros, taludes relación 1.5:1, profundidad variable, rocas mayores o igual a 1.00 metros de diámetro, angulares con buen peso específico y de tal calidad que no se desintegren al estar expuestas al agua o a la intemperie, la cual el Contratista comprará, cortará, cargará y transportará desde un banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor de 21.00 kilómetros. El colocado de la roca será tal como lo indican los planos constructivos, cuyos vacíos serán rellenados con piedra de menor tamaño para su acuñación y asegurar la estabilidad de la protección, la roca se extraerá únicamente por medios de voladura, bajo los requerimientos técnicos y de seguridad que se exigen para este tipo de procedimientos y bajo la autorización del Ingeniero Supervisor. El trabajo deberá ser entregado libre de malezas completamente establecido y en pleno desarrollo.
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto	Obras de Proteccion.
Impacto Ambiental	
Impacto en el Terreno y Asentamientos	
Detalles de Contactos (Nombre Completo, No.	Ing. Neil Díaz. Dirección B° El Benque 7 y 8 calle 8Ave. Tel. 25579066
Fuentes de Financiamiento	Fondos Nacionales
Presupuesto del Proyecto (Estimado)	L. 10,355,082.97
Fecha de Aprobación de Presupuesto del Proyecto	27 de Julio de 2019
Estado del Proyecto (Actual)	En Ejecucion
Costo de Finalización (Proyectado)	Lps. 9,026,828.00
Fecha de Finalización (Proyectada)	Proyecto suspendido por decreto ejecutivo PCM-021-2020
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos	De conformidad
Variación en el Costo Total del Proyecto	Se realizo una modificacion de contrato por ampliacion de tiempo y incremento de costo en 12.75 % del valor de contrato original.
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto	La modificación de contrato contempla aumento construccion de escollera de piedra y rectificacion de cauce del rio.
Razones de los Cambios antes mencionados	La modificación de contrato contempla aumento construccion de escollera de piedra y rectificacion de cauce del rio.

Avance físico Agosto 2020 proyecto: Canalización y Obras de Protección en Rio Guaymitas, Sector Aldea Guaymitas; proyecto suspendido por decreto ejecutivo PCM-021-2020.

La Gaceta

DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Sección A

SUMARIO

Poder Ejecutivo

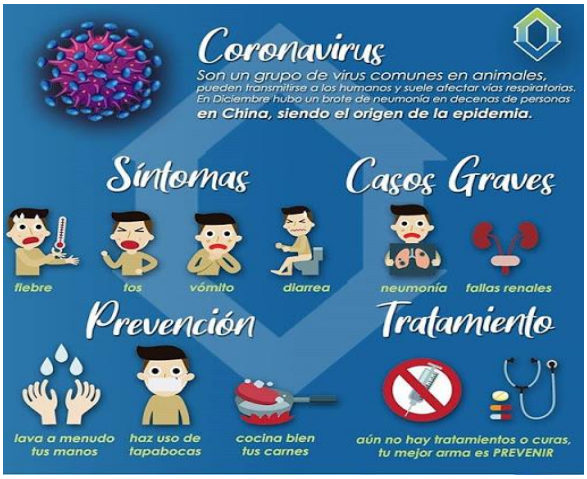

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

CUADRO DE AVANCE FISICO

Ingeniero Coordinador de Proyectos: ING HARRY LOBO **Año 2020**

Periodo: 01 al 31 de Agosto 2020

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Monto del contrato	saldo pendiente 2019-2020	Monto Obra adicional	Nuevo Monto del Contrato	Obra Contratada					Avance fisico				Avance financiero				Observaciones
		Departamento	Municipio							Descripción	Unidad	Cantidad	Obra adicional	Nuevas cantidades	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades acumuladas	% Fisico efectuado acumulado	Acumulado anterior	Este periodo	Acumulado	% Financiero efectuado acumulado	
2	Canalizacion																						
2.1	Mejoramiento de area hidraulica , canal gualiqueme desde bocatoma - la puntilla	Cortes	Puerto Cortes	Cosobri S. de R.L.	P2-010-2019 CCIVS	L. 8,407,188.38	L. 2,014,340.63	L. 0.00	L. 8,407,188.38	Canalizacion	M3	28,690.00	0.00	28,690.00	5,738.00	0.00	5,738.00	20.00%	L402,868.00	L0.00	L. 402,868.00	20.00%	Por dispocision del Estado de Honduras debido a la pandemia Covid -19 que se ha propagado exponencialmente en diferentes departamentos del pais se continua en estado de emergencia con suspension de garantias constitucionales a nivel nacional (toques de queda,cuarentena, fase 1 de apertura region 3).En este periodo no se reporta avance fisico ni financiero en la obra. Se solicito a la Jefatura de Ingenieria nombramiento de cuadrilla para revision topografica final. Se solicito a la empresa Contratista revisaran sus fianzas de C.C. y ampliaran en caso esten vencidas , se les solicito a los contratistas presentar nota para ampliacion de tiempo junto con cronogramas de ejecucion de obra pendiente por realizar , se solicito protocolos de bioseguridad para ser implementrados en la obra. En Este periodo se reporto por parte de la Supervision e inspector niveles bajos en canal gualiqueme.
2.3	Canalizacion y obras de proteccion margenes de rio tegucigalpita , etapa I	Cortes	Omoa	CONDELTA S.A de C.V.	P2-014-2019 CCIVS	L. 11,135,639.00	L. 9,465,293.15	L. 0.00	L. 11,135,639.00	Canalizacion	M3	26,871.00	0.00	26,871.00	4,563.10	0.00	4,563.10	16.98%	L1,609,100.28	L0.00	L. 1,609,100.28	17.00%	Por dispocision del Estado de Honduras debido a la pandemia Covid -19 que se ha propagado exponencialmente en diferentes departamentos del pais se continua en estado de emergencia con suspension de garantias constitucionales a nivel nacional (toques de queda,cuarentena, fase 1 de apertura region 3, exceptuando Omoa que quedo en fase 0).En este periodo no se reporta avance fisico ni financiero en la obra. Se reviso documentacion modificacion 1 ,protocolo de bioseguridad para implementacion en proyecto, cronogramas de ejecucion y notas solicitando ampliacion de tiempo para su reinicio . Se les solicito a los Contratistas ampliar la fianza de C.C en caso estar vencidas , En Este periodo se reporto por parte de la Supervision e inspector niveles bajos del rio tegucigalpita.

Ing. Harry Lobo
Coordinador Poyectos
CCIVS

VoBo Ing. Neil Patrick Diaz Rodriguez
Jefe Departamento de Ingenieria
CCIVS

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

PROGRAMAS Y PROYECTOS

IDENTIFICACION DE PROYECTO	
Propietario del Proyecto	Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Sector, Sub-Sector	Infraestructura Productiva
Nombre del Proyecto	“Canalizacion y obras de proteccion en margenes de rio tegucigalpita , Etapa 1”.
Ubicación del Proyecto	Jurisdicción de Omoa, departamento de Cortes.
Propósito	Canalizacion y obras de proteccion en margenes de rio tegucigalpita , Etapa 1
Descripción del Proyecto	Canalizacion y obras de proteccion en margenes de rio tegucigalpita , Etapa 1
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto	Canalizacion y obras de proteccion en margenes de rio tegucigalpita , Etapa 1
Impacto Ambiental	
Impacto en el Terreno y Asentamientos	
Detalles de Contactos (Nombre Completo, No. Telefónico, Correo, entre otros)	Ing. Neil Díaz. Dirección B° El Benque 7 y 8 calle 8Ave. Tel. 25579066
Fuentes de Financiamiento	Fondos Nacionales
Presupuesto del Proyecto (Estimado)	L. 14,330,413.20
Fecha de Aprobación de Presupuesto del Proyecto	marzo de 2019
Estado del Proyecto (Actual)	en ejecucion
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 11,135,639.00
Fecha de Finalización (Proyectada)	actualmente suspendido por alerta roja en el pais
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	si
Variación en el Costo Total del Proyecto	si
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto	si
Razones de los Cambios antes mencionados	proyecto suspendido por alerta roja en el pais por pandemia covid -19

PROGRAMAS Y PROYECTOS

IDENTIFICACION DE PROYECTO	
Propietario del Proyecto	Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Sector, Sub-Sector	Infraestructura Productiva
Nombre del Proyecto	“Mejoramiento de area hidraulica , canal gualiqueme desde bocatoma - la puntilla ”.
Ubicación del Proyecto	Jurisdicción de Puerto, departamento de Cortes.
Propósito	Mejoramiento de area hidraulica , canal gualiqueme desde bocatoma - la puntilla
Descripción del Proyecto	Limpieza y canalizacion en canal gualiqueme desde bocatoma -la puntilla
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto	Mejoramiento de area hidraulica , canal gualiqueme desde bocatoma - la puntilla
Impacto Ambiental	
Impacto en el Terreno y Asentamientos	
Detalles de Contactos (Nombre Completo, No. Telefónico, Correo, entre otros)	Ing. Neil Díaz. Dirección B° El Benque 7 y 8 calle 8Ave. Tel. 25579066
Fuentes de Financiamiento	Fondos Nacionales
Presupuesto del Proyecto (Estimado)	L. 8,407,188.38
Fecha de Aprobación de Presupuesto del Proyecto	marzo de 2019
Estado del Proyecto (Actual)	en ejecucion
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 8,407,188.38
Fecha de Finalización (Proyectada)	actualmente suspendido por alerta roja en el pais
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	si
Variación en el Costo Total del Proyecto	si
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto	si
Razones de los Cambios antes mencionados	proyecto suspendido por alerta roja en el pais por pandemia covid - 19

Avance físico agosto 2020 proyecto: Mejoramiento de área hidráulica, canal gualiqueme desde bocatoma - la puntilla.

Por disposición del Estado de Honduras debido a la pandemia Covid -19 que se ha propagado exponencialmente en diferentes departamentos del país se continua en estado de emergencia con suspensión de garantías constitucionales a nivel nacional (toques de queda, cuarentena, fase 1 de apertura región 3).En este periodo no se reporta avance físico ni financiero en la obra. Se solicitó a la Jefatura de Ingeniería nombramiento de cuadrilla para revisión topográfica final. Se solicitó a la empresa Contratista revisaran sus fianzas de C.C. y ampliaran en caso estén vencidas, se les solicito a los contratistas presentar nota para ampliación de tiempo junto con cronogramas de ejecución de obra pendiente por realizar, se solicitó protocolos de bioseguridad para ser implementados en la obra. En Este periodo se reportó por parte de la Supervisión e inspector activación del canal gualiqueme producto de las lluvias en occidente del país.

Fotos actuales enviadas por inspector de campo y contratista

Nivel actual canal gualiqueme aguas arriba de puente

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

Nivel actual canal gualiqueme aguas abajo de puente

Avance físico agosto 2020 proyecto: Canalización y obras de protección en márgenes de rio Tegucigalpita, etapa I.

Por disposición del Estado de Honduras debido a la pandemia Covid -19 que se ha propagado exponencialmente en diferentes departamentos del país se continua en estado de emergencia con suspensión de garantías constitucionales a nivel nacional (toques de queda, cuarentena, fase 1 de apertura región 3, exceptuando Omoa que quedo en fase 0).En este periodo no se reporta avance físico ni financiero en la obra. Se revisó documentación modificación 1, protocolo de bioseguridad para implementación en proyecto, cronogramas de ejecución y notas solicitando ampliación de tiempo para su reinicio. Se les solicito a los Contratistas ampliar la fianza de C.C en caso estar vencidas, En Este periodo se reportó por parte de la Supervisión e inspector niveles bajos del rio Tegucigalpita. Fotos actuales enviadas por inspector de campo

Nivel actual del rio Tegucigalpita aguas arriba de puente

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

Nivel actual del rio Tegucigalpita aguas abajo de puente

Zonas monitoreadas

Vertedor Nola , aldea Nola , margen izquierda del rio Ulúa, bajos de Baracoa Cortes.

Vertedor La ragua, aldea Fragua, margen derecha del rio Ulúa, bajos de Baracoa Cortes.

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

aldea Remolino , margen izquierda del rio Ulúa, bajos de Baracoa Cortes.
