Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/02/2024
Hora : 04:03 p.m.
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Orden de Pago No.: 6395
L.: 68,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5141
Fecha de Emision: 15/2/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 00005433
Paguese a: WUILSON ARNALDO ALVARADO ORELLANA    Id/RTN: 1617198800399
La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Primera estimación a contrato No. 02-2024 proyecto construcción de Kinder en Comunidad Nueva Victoria (Mano de Obra). Retención del 12.5% sobre utilidad presentada.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 15 01 004 000 001 47210 11-001-01 | Construccion Kinder Aldea Nueva Victoria | 68,700.00 |

**RETENCIONES**

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 202 | RETENCION DE ISR | 5,050.00 |
| | **Total de retenciones:** | **5,050.00** |

**RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS**

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 68,700.00 |
| | **Monto Total:** | **68,700.00** |

**RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 68,700.00 |
| - RETENCIONES | 5,050.00 |
| **TOTAL** | **63,650.00** |

Firma y Sello de Presupuestario    Firma y Sello de Alcalde (sa)    Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE PROTECCION, SANTA BARBARA
ALCALDIA MUNICIPAL TESORERÍA PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
WUILSON ARNALDO ALVARADO ORELLANA

Recibido por:
Identidad No.: 1617-1988-00399

0s+js/j9JmfCbpnTjYr3tahrlsqJC2Y6dqiZZFmfSubQvXuZysSKvKB0NHgsoOyhaSlnaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsvqrcbVIgvx8Dmz+tDC1ONpH8TKdAyTVvz8p8
JUQV7+GHpeP4CIAF0j/R6L1+cPQWu62v4DpBtdBwfyjwrK5HF4 PA==

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Primera estimación a contrato No. 02-2024 proyecto construcción de Kínder en Comunidad Nueva Victoria (Mano de Obra). Retención del 12.5% sobre utilidad presentada.

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE Primera estimación a contrato No. 02-2024 proyecto construcción de Kínder en Comunidad Nueva Victoria (Mano de Obra). Retención del 12.5% sobre utilidad presentada. | | 63,650.00 | |

**CHEQUE No.** 00005433 **BALANCE**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERÍA PROTECCION, SANTA BARBARA

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE PROTECCION, SANTA BARBARA

ALCALDIA MUNICIPAL ARNALDO ALVARADO ORELLANA PROTECCIÓN S.B.

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

**ALCALDIA MUNICIPAL**
**PROTECCION SANTA BARBARA**

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

**CHEQUE No.** 00005433

PROTECCIÓN 15 de febrero de 2024
Lugar y Fecha

WUILSON ARNALDO ALVARADO ORELLANA
Páguese a la orden de

L 63,650.00

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

**BANPAIS**
*BANCO DEL PAIS, S.A.*

Firma(s)

⑆01001150⑆00010800002650⑈00005433

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Primera estimación a contrato No. 02-2024 proyecto construcción de Kinder en Comunidad Nueva Victoria (Mano de Obra). Retención del 12.5% sobre utilidad presentada.

| CUENTA Y SUB-CUENTA | CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE Primera estimación a contrato No. 02-2024 proyecto construcción de Kinder en Comunidad Nueva Victoria (Mano de Obra). Retención del 12.5% sobre utilidad presentada. | | 63,650.00 | |

**CHEQUE No.** 00005433 **BALANCE**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE PROTECCION, SANTA BARBARA

WILSON ARNALDO ALVARADO ORELLANA PROTECCIÓN, S.B.

HECHO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME

**WUILSON ARNALDO ALVARADO ORELLANA**
R.T.N. 1617198803996
Tel: 9888-9701
E-mail: arnaldoorellana157@gmail.com
Barrio San Cristobal, Frente a Pulperia Manjivar, Calle Principal, Protección, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 2661-3949
R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

**CAI:** A0282D-E6D6FC-3442A2-A07485-CCA949-52

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**

Lps. 63,650.00

**No. 000-001-04-00 Nº 000113**

Recibí de: municipalidad proteccion R.T.N. 1617-99954390040

Dirección: Barrio al centro DIA 14 MES 02 AÑO 24

La Suma de: Sesenta y tres mil Seiscientos cincuenta Lempiras

Por concepto de: Construccion de Kindar en comunidad Nueva victoria primera estimacion

| | | |
|---|---|---|
| Monto Honorarios Brutos Percibidos | L. | |
| Monto Retención en su caso | L. | |
| Monto Neto Recibido | L. | |

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/06/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000101 A 000-001-04-00000150 F/RECEPCIÓN: 06/06/2023 Onginal: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 30/05/2017

**RTN: 16171988003996**

WUILSON ARNALDO ALVARADO ORELLANA
Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ventas-Selectivo | ☐ | Productores Importadores de Cigarrillos | ☐ |
| Importador | ☐ | Productor Alcoholes Licores | ☐ |
| Exportador | ☐ | Distribuidor Alcoholes Licores | ☐ |
| Imprentas | ☐ | Importador Alcoholes Licores | ☐ |
| Prestamista | ☐ | | |

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
WUILSON ARNALDO

APELLIDO / SURNAME
ALVARADO ORELLANA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
22-09-1988

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1617 1988 00399

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
22-09-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 162 de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002 , Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 9 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art 30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario

**SAR**

Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

**"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"**

Número de Documento SAR-412- 2601640 Transacción: 112600



RNP

3400000001910258

DOMICILIO / ADDRESS
PROTECCION
SANTA BARBARA

CONDICIONES RESTRICTIVAS

I<HND0019102252<<<<<<<<<<<<<<<
8809221M3109225HND<<<<<<<<<<<8
ALVARADO<ORELLANA<<WUILSON<ARN

**Municipalidad de Protección Santa Barbara**

**Honduras C.A.**

**Tel:2625-2903**

HONDURAS

# INVITACION A COTIZAR

Municipio de Protección, Departamento de Santa Bárbara, 15 de enero 2024.

Señor: **Wilson Arnaldo Alvarado**

REF: **PROYECTO:**
**""CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA.""**
**"Mano de Obra"**

Estimado Señor (a)

La Municipalidad de Protección, Departamento de Santa Bárbara, le invita a participar en la Cotización del proyecto: ***PROYECTO:***
**CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA.""**
**"Mano de Obra"**

financiado por La Municipalidad, en El Municipio de Protección, Departamento de Santa Bárbara. En esta Cotización participan Contratistas seleccionados de la lista corta para la ejecución de este proyecto con experiencia en este tipo de proyecto.

La Recepción y apertura de Ofertas se hará en las Oficinas de la Sede de la Municipalidad, *Protección, Santa Bárbara*, el 22 de enero de 2024.

Atentamente,

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
PROTECCION, SANTA BÁRBARA

**JOSE ANTONIO GUILLEN**
**ALCALDE MUNICIPAL**

PROTECCION S.B.
WILSON ARNALDO ORELLANA

Especificaciones

# ""CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA.""
# "Mano de Obra"

**LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO.**

Previo al replanteo o marcación de los edificios **EL CONTRATISTA** efectuará la limpieza del terreno de malezas, escombros, residuos de construcción, etc., si los hubiere. . Existe una construcción que deban demolerse y deberá presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren nidos de hormigas (hormiguero) deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como insectos y otros EL CONTRATISTA deberá eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la demolición de la construcción existente.

**Trazado y enmarcado**

EL CONTRATISTA suministrará la mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el supervisor de obra. Se utilizarán estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de 1" x 3" como mínimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demás construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes.

EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

**INSTALACION SANITARIA.**

Se instalara 3 inodoros y 3 lavamanos Los trabajos se harán en un todo de acuerdo a las necesidades presentadas en el centro de educación con las indicaciones que impartan la Supervisión de la Obras sobre instalaciones a pedestal con asiento y tapa de plástico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de P.V.C. rígido Los inodoros en construcciones en el nivel inicial primera infancia (preescolar) serán de tamaño normal.

Los lavamanos a instalar son Mediano Con pedestal.

**Instalación de Agua Potable.**

**Normalización.**

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presión y cantidad para su utilización en los sanitarios, facilitando el alejamiento rápido de las aguas servidas de la superficie del suelo Las cañerías de alimentación del sistema, que deban ir enterradas, serán protegidas a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.

**EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI DURO)**

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos constituirán en la excavación de material Semi Duro, para la construcción de los baños, se puede extraer con herramientas Manuales utilizar para la excavación. En cualquier tipo de suelos desde arcilla pasando por limos hasta arenas y gravas. Estarán de acuerdo con las dimensiones y niveles que indican los planos.

**CIMENTACION DE MAMPOSTERIA**

La actividad consiste en la Construcción de cimientos de mampostería de 80x50 cm Para nivelar terreno que ayude a afianzar los arranques de la cerca del muro perimetral del cerco.

**PARED DE BLOQUE DE 5 PULG**

Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque de 5 pulg para la construcción de los baños ligado con mortero de cemento con una proporción 1:4 Toda la pared deberá construirse a plomo de acuerdo a las dimensiones y líneas generales .

**REPELLO 1.4, E=2CM Y AFINADO.**

Esta actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2cm con afinado de interior en la cerca de protección, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación. Se fijarán guías maestras verticales de (reglas de madera) se aplicará el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar.

**CERÁMICA ESMALTADA**

Los pisos serán de cerámica esmaltada, tamaño (en relación al área a cubrir) y color a determinar por la fiscalización, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros daños posibles. No deberán presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberán ser hechos a máquina Serán fijadas con mezcla adhesiva especial para cerámica.

**PINTURA.**

Este trabajo consistirá en colocar pintura en paredes interior y exterior de la cerca.

Antes de su utilización en obra el contratista deberá suministrar los materiales necesarios para la aplicación de la pintura en los sitios y de calidad y colores indicados en los planos y debidamente aprobadas por el supervisor.

**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:**

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.10 mts armada con varilla 3/8 a/c 20 cms en ambos sentidos. Para la fabricación del concreto se utilizará mano de obra mesclando todos los componentes en un lugar fisco adecuado parte de los agregados gruesos, Cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad. Mortero, y materia extraña. Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se podrá realizar solo con autorización por escrito

del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación.

**PUERTAS DE BAÑOS**

Se consulta la instalación de puertas de madera sellado con silicona anti hongos en todo su contorno, incluye marcos de madera fijos a tabiques separadores. Estos elementos se instalarán en cubículos de inodoros.

**REMATES DE TERMINACION**

Para una recepción conforme de la obra el Contratista deberá considerar todo tipo de sellos en puertas, de artefactos sanitarios, acabado y pulidos de soldaduras, acabados de pinturas, distanciamiento degradas y en general todos los aspectos que den cuenta de una buena calidad de la obra ejecutada.

**Municipalidad de Protección Santa Barbara**

**Honduras C.A.**

**Tel:2625-2903**

HONDURAS

# INVITACION A COTIZAR

Municipio de Protección, Departamento de Santa Bárbara, 15 de enero 2024.

Señor: *ING. KRISTIAN ENOC GRANADOS*

REF: **PROYECTO:**

**""CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA.""**

**"Mano de Obra"**

Estimado Señor (a)

La Municipalidad de Protección, Departamento de Santa Bárbara, le invita a participar en la Cotización del proyecto: ***PROYECTO:***

**CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA.""**

**"Mano de Obra"**

financiado por La Municipalidad, en El Municipio de Protección, Departamento de Santa Bárbara. En esta Cotización participan Contratistas seleccionados de la lista corta para la ejecución de este proyecto con experiencia en este tipo de proyecto.

La Recepción y apertura de Ofertas se hará en las Oficinas de la Sede de la Municipalidad, *Protección, Santa Bárbara*, el 22 de enero de 2024.

Atentamente,

ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION, SANTA BARBARA ALCALDE

**JOSE ANTONIO GUILLEN**
**ALCALDE MUNICIPAL**

CONSTRUCTORA INGECO TEL: 9975-7342 INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN

Especificaciones

# ""CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA.""
# "Mano de Obra"

## LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcación de los edificios **EL CONTRATISTA** efectuará la limpieza del terreno de malezas, escombros, residuos de construcción, etc., si los hubiere. . Existe una construcción que deban demolerse y deberá presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren nidos de hormigas (hormiguero) deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como insectos y otros EL CONTRATISTA deberá eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la demolición de la construcción existente.

**Trazado y enmarcado**

EL CONTRATISTA suministrará la mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el supervisor de obra. Se utilizarán estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de 1" x 3" como mínimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demás construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes.

EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

**INSTALACION SANITARIA.**

Se instalara 3 inodoros y 3 lavamanos Los trabajos se harán en un todo de acuerdo a las necesidades presentadas en el centro de educación con las indicaciones que impartan la Supervisión de la Obras sobre instalaciones a pedestal con asiento y tapa de plástico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de P.V.C. rígido Los inodoros en construcciones en el nivel inicial primera infancia (preescolar) serán de tamaño normal.

Los lavamanos a instalar son Mediano Con pedestal.

**Instalación de Agua Potable.**

**Normalización.**

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presión y cantidad para utilización en los sanitarios, facilitando el alejamiento rápido de las aguas servidas de la superficie del suelo Las cañerías de alimentación del sistema, que deban ir enterradas, serán protegidas a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno.

**EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI DURO)**

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Estos trabajos constituirán en la excavación de material Semi Duro, para la construcción de los baños, se puede extraer con herramientas Manuales utilizar para la excavación. En cualquier tipo de suelos desde arcilla pasando por limos hasta arenas y gravas. Estarán de acuerdo con las dimensiones y niveles que indican los planos.

**CIMENTACION DE MAMPOSTERIA**

La actividad consiste en la Construcción de cimientos de mampostería de 80x50 cm Para nivelar terreno que ayude a afianzar los arranques de la cerca del muro perimetral del cerco.

**PARED DE BLOQUE DE 5 PULG**

Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque de 5 pulg para la construcción de los baños ligado con mortero de cemento con una proporción 1:4 Toda la pared deberá construirse a plomo de acuerdo a las dimensiones y líneas generales .

**REPELLO 1.4, E=2CM Y AFINADO.**

Esta actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2cm con afinado de interior en la cerca de protección, antes de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación. Se fijarán guías maestras verticales de (reglas de madera) se aplicará el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar.

**CERÁMICA ESMALTADA**

Los pisos serán de cerámica esmaltada, tamaño (en relación al área a cubrir) y color a determinar por la fiscalización, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros daños posibles. No deberán presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberán ser hechos a máquina Serán fijadas con mezcla adhesiva especial para cerámica.

**PINTURA.**

Este trabajo consistirá en colocar pintura en paredes interior y exterior de la cerca.

Antes de su utilización en obra el contratista deberá suministrar los materiales necesarios para la aplicación de la pintura en los sitios y de calidad y colores indicados en los planos y debidamente aprobadas por el supervisor.

**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:**

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.10 mts armada con varilla 3/8 a/c 20 cms en ambos sentidos. Para la fabricación del concreto se utilizara mano de obra mesclando todos los componentes en un lugar fisco adecuado parte de los agregados gruesos, Cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad. Mortero, y materia extraña. Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se podrá realizar solo con autorización por escrito

CONSTRUCTORA INGECO
TEL: 9976-7342
INGENIERIA - CONSTRUCCIÓN

del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación.

**PUERTAS DE BAÑOS**

Se consulta la instalación de puertas de madera sellado con silicona anti hongos en todo su contorno, incluye marcos de madera fijos a tabiques separadores. Estos elementos se instalarán en cubículos de inodoros.

**REMATES DE TERMINACION**

Para una recepción conforme de la obra el Contratista deberá considerar todo tipo de sellos en puertas, de artefactos sanitarios, acabado y pulidos de soldaduras, acabados de pinturas, distanciamiento degradas y en general todos los aspectos que den cuenta de una buena calidad de la obra ejecutada.

# WILSON ARNALDO ALVARADO

## COTIZACIÓN MANO DE OBRA

### Proyecto:

**""CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA.""**

**"Mano de Obra"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Atencion:* | *JOSE ANTONIO GUILLEN/ALCALDE MUNICIPAL* | | | |
| Fecha de Cotizacion | 22/1/2024 | | | |
| | | *Válidez:* | *30* | *días* |
| DESCRIPCION | UNIDADES | PRECIO/U | CANTIDAD | TOTAL |
| Trabajo de albañileria | Jornal | 600 | 73.00 | 43800 |
| Tabajo de soldador | Jornal | 550 | 16 | 8800 |
| Trabajo de fontanero | Jornal | 500 | 3 | 1500 |
| Trabajo electricista | Jornal | 600 | 1 | 600 |
| Trbajo de carpintaero | Jornal | 600 | 22 | 13200 |
| Trabajo de peon | Jornal | 300 | 101 | 30300 |
| Trabajo de ayudante | Jornal | 350 | 101 | 35350 |
| Trabajo de armador de hierro | Jornal | 550 | 7 | 3850 |
| Trabajo de pintor | Jornal | 500 | 6 | 3000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL..... | | | | L. 140,400.00 |

| | |
|---|---|
| **Valor del Proyecto** | **L. 140,400.00** |

**CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 00/100**

| | |
|---|---|
| *Nombre:* | *WILSON ARNALDO ALVARADO* |
| *Dirección:* | *PROTECCION, Bº San Cristobal* |
| *Identidad* | *1617-1988-00399* |
| *RTN:* | *1617198800399-6* |
| *Teléfono/fax:* | *9888-9701* |

FIRMA

SELLO

WILSON ARNALDO ALVARADO

## DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo Wilson Arnaldo Alvarado, mayor de edad, de estado civil Soltero, de nacionalidad, hondureña con Domicilio en barrio San Cristóbal , Protección Santa Bárbara y con Tarjeta de Identidad/pasaporte **No. 1617-1988-00399**, actuando en mi condición de representante legal de ingeniería y construcción HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidad es a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

"ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las Circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas.

Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; **y,**

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la Inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación."

En fe de lo cual firmo la presente en el Municipio de Protección , Departamento de Santa Barbara, a los 22 días de mes de enero de 2024.

WILSON ARNALDO ALVARADO ORELLANA
PROTECCIÓN

Firma: _____

**Wilson Arnaldo Alvarado**

# INGECO

## COTIZACIÓN MANO DE OBRA

### Proyecto:

""CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA."" "Mano de Obra"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Atencion:* | *JOSE ANTONIO GUILLEN/ALCALDE MUNICIPAL* | | | |
| Fecha de Cotizacion | 22/1/2024 | | | |
| | *Válidez:* | | *30* | *días* |
| DESCRIPCION | UNIDADES | PRECIO/U | CANTIDAD | TOTAL |
| Trabajo de albañileria | Jornal | 660.00 | 73.00 | L48,180.00 |
| Tabajo de soldador | Jornal | 600.00 | 16.00 | L9,600.00 |
| Trabajo de fontanero | Jornal | 600.00 | 3.00 | L1,800.00 |
| Trabajo electricista | Jornal | 650.00 | 1.00 | L650.00 |
| Trbajo de carpintaero | Jornal | 650.00 | 22.00 | L14,300.00 |
| Trabajo de peon | Jornal | 350.00 | 101.00 | L35,350.00 |
| Trabajo de ayudante | Jornal | 400.00 | 101.00 | L40,400.00 |
| Trabajo de armador de hierro | Jornal | 600.00 | 7.00 | L4,200.00 |
| Trabajo de pintor | Jornal | 560.00 | 6.00 | L3,360.00 |
| TOTAL..... | | | | L. 157,840.00 |

| | |
|---|---|
| Valor del Proyecto | L. 157,840.00 |

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100

| | |
|---|---|
| *Nombre:* | *ING. KRISTIAN ENOC GRANADOS* |
| *Dirección:* | *Chalmeca Copan* |
| *Identidad* | *ID. 0413-198100817* |
| *RTN:* | *RTN:0413-1981008171* |
| *Teléfono/fax:* | *9975-7342* |

FIRMA

ING. KRISTIAN ENOC GRANADOS

INGECO CONSTRUCCIÓN TEL.: 9975-7342 INGENIERÍA + CONSTRUCCIÓN

## DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo **KRISTIAN ENOC GRANADOS**, mayor de edad, de estado civil Casado, de nacionalidad, hondureña con Domicilio en la Chalmeca la entrada Copan y con Tarjeta de Identidad/pasaporte **No. 0413-198100817** actuando en mi condición de representante legal de ingeniería y construcción HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidad es a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

"ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las Circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado, de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas.

Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Subprocurador General de la República, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación."

En fe de lo cual firmo la presente en la Comunidad de Chalmeca, La entrada Departamento de Copan, a los 22 días de mes de enero de 2024.

Firma: _____

**KRISTIAN ENOC GRANADOS**

CONSTRUCTORA INGECO
TEL: 99147342
INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN

## Acta de Apertura de oferta

### PROYECTO: "CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA." "Mano de Obra"

Se llevó a cabo un proceso de cotización para la contratación del proyecto: cotización " **CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA." "Mano de Obra** "Municipio de Protección, Departamento de Santa Bárbara en las oficinas de la Municipalidad en presencia de la comisión de verificación de ofertas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Jonatán Alvarado Rodríguez | Desarrollo Comunitario |
| 3 | Jose Antonio Guillen | Alcalde |
| 4 | Felicita del Cid | Regidora |
| 5 | Sandra Patricia López | Secretaria |
| 6 | Rosmery Sarmiento | Regidora |
| 7 | Wilmer Alexis Fuentes | Contador |

Categoría: Contratación con Cotizaciones, se verifico que las cotizaciones no presentarían alteraciones manchones o borrones.

Proveedores y comparación de precios:

| N° | cantidad | unidad | descripcion | ING. KRISTIAN ENOC GRANADOS | | WUILSON ARNALDO ALVARADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | P. Unitario | Total | P. unitario | Total |
| 1 | 73.00 | Jornal | Trabajo de albañileria | L660.00 | L48,180.00 | L 600.00 | 43800 |
| 2 | 16.00 | Jornal | Tabajo de soldador | L600.00 | L9,600.00 | L 550.00 | 8800 |
| 3 | 3.00 | Jornal | Trabajo de fontanero | L600.00 | L1,800.00 | L 500.00 | 1500 |
| 4 | 1.00 | Jornal | Trabajo electricista | L650.00 | L650.00 | L 600.00 | 600 |
| 5 | 22.00 | Jornal | Trbajo de carpintaero | L650.00 | L14,300.00 | L 600.00 | 13200 |
| 6 | 101.00 | Jornal | Trabajo de peon | L350.00 | L35,350.00 | L 300.00 | 30300 |
| 7 | 101.00 | Jornal | Trabajo de ayudante | L400.00 | L40,400.00 | L 350.00 | 35350 |
| 8 | 7.00 | Jornal | Trabajo de armador de hierro | L600.00 | L4,200.00 | L 550.00 | 3850 |
| 9 | 6.00 | Jornal | Trabajo de pintor | L560.00 | L3,360.00 | L 500.00 | 3000 |
| | | | TOTAL | | L157,840.00 | | L140,400.00 |
| | | | | | | | |

Fecha: **22 de enero 2024**

Jonatán Alvarado Rodríguez

Wilmer Alexis Fuentes

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
PROTECCION, SANTA BARBARA

Felicita del Cid

Sandra Patricia López

Jose Antonio Guillen

Municipalidad de Protección Santa Barbara

Honduras C.A.

Tel:2625-2903

HONDURAS

## ""CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA.""

"Mano de Obra"

| N° | cantidad | unidad | descripcion | ING. KRISTIAN ENOC GRANADOS | | WUILSON ARNALDO ALVARADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | P. Unitario | Total | P. unitario | Total |
| 1 | 73.00 | Jornal | Trabajo de albañileria | L660.00 | L48,180.00 | L 600.00 | 43800 |
| 2 | 16.00 | Jornal | Tabajo de soldador | L600.00 | L9,600.00 | L 550.00 | 8800 |
| 3 | 3.00 | Jornal | Trabajo de fontanero | L600.00 | L1,800.00 | L 500.00 | 1500 |
| 4 | 1.00 | Jornal | Trabajo electricista | L650.00 | L650.00 | L 600.00 | 600 |
| 5 | 22.00 | Jornal | Trbajo de carpintaero | L650.00 | L14,300.00 | L 600.00 | 13200 |
| 6 | 101.00 | Jornal | Trabajo de peon | L350.00 | L35,350.00 | L 300.00 | 30300 |
| 7 | 101.00 | Jornal | Trabajo de ayudante | L400.00 | L40,400.00 | L 350.00 | 35350 |
| 8 | 7.00 | Jornal | Trabajo de armador de hierro | L600.00 | L4,200.00 | L 550.00 | 3850 |
| 9 | 6.00 | Jornal | Trabajo de pintor | L560.00 | L3,360.00 | L 500.00 | 3000 |
| | | | TOTAL | | L157,840.00 | | L140,400.00 |
| | | | | | | | |

ISV-INCLUIDO

fecha ---------- 22/1/2024

ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION, SANTA BARBARA ALCALDE

Jose Antonio Guillen

Jonatan Alvarado Rodriguez

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD PROTECCION, SANTA BARBARA

Wilmer Beltis Fuentes

SECRETARIA MUNICIPAL Municipalidad de Protección

Sandra Patricia Lopez

Felicita del cid

# NOTA DE ADJUDICACIÓN

**23 DE ENERO DE 2024**

| | |
|---|---|
| **Procedimiento:** | **Cotización:**<br>**"CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA."**<br>**"Mano de Obra"** |

Oferentes participantes de la contratación antes referida.

Estimado señor: **WILSON ARNALDO ALVARADO**

Por medio de la presente, le comunico que después del análisis de cotización se le adjudica el proyecto la contratación referida en el encabezado de esta carta.

Monto en números: **L. 140,400.00**

Monto en letra: **CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS EXACTOS**

En espera de que se presente en las oficinas de la Municipalidad para la firma del contrato.

No habiendo más que tratar, aprovecho la oportunidad para saludarles.

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
PROTECCION, SANTA BARBARA

José Antonio Guillen
Alcalde Municipal

WILSON ARNALDO ALVARADO ORELLANA
PROTECCIÓN, S.B.

## UTILIDAD

Señores de la Municipalidad de Protección Santa Bárbara por medio de la presente yo WILSON ARNALDO ALVARADO con identidad ***1617-1988-00399*** por este medio presento la utilidad del contrato

Proyecto: "CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA (Mano de Obra)

.

| | |
|---|---|
| ***costo del proyecto*** | 140,400.00 |
| *gastos de mano de obra.* | 100,000.00 |
| *utilidad* | 40,400.00 |
| *impuesto sobre la renta 12.5%* | 5,050.00 |

Para los fines que el interesado estime conveniente extiendo la presente en el Municipio de Protección a los 24 días del mes de enero del año 2024.

WILSON ARNALDO ALVARADO ORELLANA
WILSON ARNALDO ALVARADO
PROTECCIÓN. S.B.

**WILSON ARNALDO ALVARADO**

**Contratista**

CONTRATO DE MANO DE OBRA SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y EL MAESTRO DE OBRA QUE EJECUTARA LA OBRA FISICA DEL PROYECTO: **"CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA (Mano de Obra)** BAJO LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE PROTECCION.

Nosotros: **JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA**, Alcalde Municipal, casado, con identidad No **1617-1982-00221**, nacionalidad hondureña, vecino del Municipio de Proteccion, Santa Barbara en su condición de **CONTRATANTE**, estando por lo tanto facultado para celebrar este contrato, y que en lo sucesivo se denominará " **La Municipalidad**" por una parte y por la otra **Wuilson Arnaldo Alvarado**, mayor de edad, soltero, contratista, hondureño y con domicilio en **Barrio San Cristobal Proteccion Santa Barbara**, con Tarjeta de Identidad No. **1617-1988-00399**, y quien en lo sucesivo se denominará **"CONTRATISTA"**, hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos el presente **CONTRATO**, el cual se regirá por las condiciones y términos que ambas partes hemos convenido en las siguientes cláusulas:**PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.** El presente Contrato tiene por objeto contratar los servicios de **"EL MAESTRO DE OBRA"** para que realice trabajos de obra civil para la ejecución del proyecto: **" CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA (Mano de Obra)** Protección, Departamento:**Santa Bárbara. SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA": 1)** Trabajar bajo las órdenes de la Municipalidad, con dedicación exclusiva al proyecto y a tiempo completo mientras dure su contrato. **2)** Asegurar la adquisición de materiales comprados por la municipalidad requeridos en la ejecución del proyecto, y que éstos sean conforme a las especificaciones del proyecto; **3)** Incentivar y motivar a los beneficiarios para que cumplan de forma adecuada con sus aportes comunitarios acordado si existieran. 4) Efectuar el cierre de actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto según el Expediente Técnico; **8)** Mantener una coordinación de acciones con el Supervisor Municipal, **9)** Y otras de acuerdo a la naturaleza de el trabajo que conlleven a una adecuada ejecución del

proyecto. **TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto a otorgarse por este contrato es de **CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 00/100 ( L. 140,400.00 )** que constituye: el monto de mano de Obra para cubrir los trabajos del proyecto que se detallan a continuacion:

| DESCRIPCION | UNIDADES | PRECIO/U | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de albañileria | Jornal | 600 | 73.00 | 43800 |
| Tabajo de soldador | Jornal | 550 | 16 | 8800 |
| Trabajo de fontanero | Jornal | 500 | 3 | 1500 |
| Trabajo electricista | Jornal | 600 | 1 | 600 |
| Trbajo de carpintaero | Jornal | 600 | 22 | 13200 |
| Trabajo de peon | Jornal | 300 | 101 | 30300 |
| Trabajo de ayudante | Jornal | 350 | 101 | 35350 |
| Trabajo de armador de hierro | Jornal | 550 | 7 | 3850 |
| Trabajo de pintor | Jornal | 500 | 6 | 3000 |
| **TOTAL**..... | | | | **L. 140,400.00** |

1. se realizara DEDUCCION Por el 12.5% del Impuesto Sobre la Renta según utilidad:

| | |
|---|---|
| ***costo del proyecto*** | 140,400.00 |
| ***gastos de mano de obra.*** | 100,000.00 |
| ***utilidad*** | 40,400.00 |
| ***impuesto sobre la renta 12.5%*** | 5,050.00 |

2. **CUARTA: FORMA DE PAGO. "EL CONTRATISTA"** recibira los pagos conforme los avances fisicos de la obra y sera despues de la aceptacion satisfactoria por parte de la Municipalidad quien tienen a su cargo la inspección final y recepción definitiva de la obra.-**QUINTA: ORDEN DE INICIO.** Se considera como fecha oficial de inicio de la obra 24 DE enero DE 2024. **SEXTA: PLAZO.** El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra en un plazo de 45 dias del calendario contados a partir de la Orden de Inicio. **SEPTIMA: RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.**a) Controlar

cotidianamente la asistencia y el trabajo cumplido por parte del contratista y pagarle conforme a lo establecido en el presente contrato.; b) verificar con él contratista las cuadrillas de trabajo y las compras a realizar; c) Organizar comisiones especializadas para la organización de tareas, adquisiciones, manejo y control de materiales en bodega; d) Pagar las estimaciones del CONTRTISTA según el avance de obra; **NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL.** 1) EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y civiles que se deriven al contratar con terceras personas para la prestación de servicios en la Ejecución del Proyecto; 2) EL CONTRATISTA libera de toda responsabilidad a la Municipalidad en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos realizados como empleados del contratista. **DECIMA: CAUSAS DE RESOLUCION Y RESCISIÓN DEL CONTRATO. RESOLUCION.** Este contrato podrá ser resuelto por las siguientes causas: 1) Mutuo acuerdo 2) Fuerza mayor; 3) Caso fortuito. **RESCISIÓN:** El contrato podrá ser rescindido por las siguientes causas: 1) Incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas estipuladas en este contrato; 2) En caso de evidente negligencia por parte del contratista en la ejecución de la obra **DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO.** Forman parte de este contrato y se tienen por incorporados al mismo, con igual fuerza obligatoria los siguientes documentos: a) cotizacion, b)analisis de precios, c) nota y constancia de adjudicacion, d) orden de inicio, **DECIMA SEGUNDA: PROHIBICION.** Se prohíbe al contratista la subrogación o

subcontratación de los servicios por los cuales ha sido contratado; **DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS.** En caso de existir cualquier controversia derivada del presente contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos "EL CONTRATISTA" renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de la Municipalidad. **DECIMA CUARTA:** Ambas partes manifiestamos estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato.

En fe de lo cual y para constancia, suscribimos ante testigos, el presente contrato en original y dos (2) copias del mismo contenido, en el Municipio de Protección, a los 23 días del mes de Enero de 2024.

Sello: ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE PROTECCION, SANTA BARBARA

Sello: WILSON ARNALDO ALVARADO ORELLANA PROTECCIÓN, S. B.

**Jose Antonio Guillen**
**Alcalde Municipal**

**Wuilson Arnaldo Alvarado**
**Contratista**

**Municipalidad de Protección Santa Barbara**

**Honduras C.A.**

**Tel:2625-2903**

HONDURAS

# ORDEN DE INICIO

Proyecto de Infraestructura

**Por este medio se autoriza el inicio del proyecto: "CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA (Mano de Obra)"**

**DEPARTAMENTO**: Santa Bárbara

**MUNICIPIO:** Protección

**EJECUTOR: WILSON ARNALDO ALVARADO**

**FUENTE**: Transferencia y fondos propios municipales

Se establece como fecha oficial de inicio el día 24 de enero de 2024.

Protección, S.B

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
PROTECCION, SANTA BARBARA

**Jose Antonio Guillen**
Alcalde Municipal

Municipalidad De
Protección, Santa Bárbara
HONDURAS C.A.
R.T.N. 10170005400040

## ESTIMACIÓN DE AVANCE DE PROYECTO

OBRA:
""CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD NUEVA VICTORIA.""
"Mano de Obra"

UNIDAD RESPONSABLE:
Muncipalidad de Proteccion Santa Barbara

FECHA: 14/2/2024

PERIODO: DEL: 24 de enero de 2024
AL: 14 de febrero de 2024

contrato MUNIPSB-2-2024

ESTIMACIÓN: 1

MAESTRO DE OBI WUILSON ARNALDO ALVARADO

| ITEM | OBRA Y CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA | | | | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTIM. ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | TOTAL A LA FECHA | | |
| | Trabajo de albañileria | Jornal | 73 | | 48.00 | 48.00 | 600.00 | L. 28,800.00 |
| | Tabajo de soldador | Jornal | 16 | | | | 550.00 | |
| | Trabajo de fontanero | Jornal | 3 | | 1.00 | 1.00 | 500.00 | L. 500.00 |
| | Trabajo electricista | Jornal | 1 | | | | 600.00 | |
| | Trbajo de carpintaero | Jornal | 22 | | 10.00 | 10.00 | 600.00 | L. 6,000.00 |
| | Trabajo de peon | Jornal | 101 | | 48.00 | 48.00 | 300.00 | L. 14,400.00 |
| | Trabajo de ayudante | Jornal | 101 | | 48.00 | 48.00 | 350.00 | L. 16,800.00 |
| | Trabajo de armador de hierro | Jornal | 7 | | 4.00 | 4.00 | 550.00 | L. 2,200.00 |
| | Trabajo de pintor | Jornal | 6 | | | | 500.00 | |

| | |
|---|---|
| SUMA DE ESTA HOJA | L. 68,700.00 |
| I.S.R 12.5% | L. 5,050.00 |
| ANTICIPO DEL 15% | |
| SUMA TOTAL | L. 63,650.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION, SANTA BARBARA
ALCALDE

ELABORO
JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ
SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA MUNICIPALIDAD

APROBO
JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL

**Municipalidad de Proteccion Santa Bárbara**

**Honduras C.A.**

**R.T.N 16179995439040**

HONDURAS

# INFORME

**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE KÍNDER EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VICTORIA –PROTECCION S.B.**

**FECHA:** 13/02/24

**LUGAR DEL EVENTO:** LA COMUNIDAD DE NUEVA VICTORIA, PROTECCIÓN S.B.

**NÚMERO DE PARTICIPANTES INVOLUCRADOS:** CONTRATISTA Y EQUIPO DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE PROTECCION S.B.

**OBJETIVO:**

- **Acondicionar el Plantel y Construir edificio del KÍNDER DE LA COMUNIDAD DE NUEVA VICTORIA tal Centro Educativo Contara con Espacio pedagógicamente diseñado para la educación y la recreación, Para Poder Atender A la Población Estudiantil Que Se Ha Incrementado, y por tal razón de acuerdo a la demanda de aulas de clases con las condiciones adecuadas para recibir la educación más básica Haciendo necesaria y obligatoria La construcción de las Instalaciones De Dicho Centro Educativo.**
- **Apoyar el desarrollo de la educación de los niños en su inicio del conocimiento de las letras escolares al construir el edificio en la comunidad de Nueva Victoria para recibir el pan del saber.**

---

**Observaciones/Comentarios**

El Sr. **José Antonio Guillen Alcalde** Y **Corporación Municipal De Proteccion SB.** Acordó Contratar Los Servicios Del contratista **WILSON ARNALDO ALVARADO** (Mano De Obra) Para Realizar Trabajos De Obra Civil Para La Ejecución Del Proyecto: -MUNIPSB-2-2024

El Trabajo Consistió En Hacer y acondicionar el espacio físico (Plantel) donde se está construyendo el edificio del kínder.
(Se Adjuntan Medios De Verificación Fotográficas)

Se Beneficiara A Un Total De 30 Alumnos De La Comunidad De nueva victoria Proteccion S.B. Y Al Mismo Tiempo Crear Un Espacio Seguro, Digno Y Con Mas Lugar Para El Esparcimiento Y Diversión Del Alumnado.

Tal Proyecto Se Hace Con Una Visión de apoyar al 100% la educación infantil debido a que **la educación nos cambia la vida** y esta administración municipal destina los fondos necesarios del presupuesto reconoce e invierte en el legado a las futuras generaciones invirtiendo en la construcción de Aulas Escolares Debido A La Demanda Por El Crecimiento Estudiantil En La Comunidad.

A la fecha se reporta una primera estimación de avance de la obra del: 30%

(Se adjunta nota de estimación)

Habiendo iniciado el proyecto de construcción del kínder de la comunidad de nueva victoria el día 24 enero del 2024.

Tal proyecto se llevara a cabo con fondos de transferencia municipal y fondos propios municipales.

**INFORMACIÓN FINANCIERA:**

**VALOR DEL PROYECTO.....Lps.140.400.00 (CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS EXACTOS)**

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION S.B. DESARROLLO COMUNITARIO

**JONATÁN ALVARADO**

**DESARROLLO COMUNITARIO**
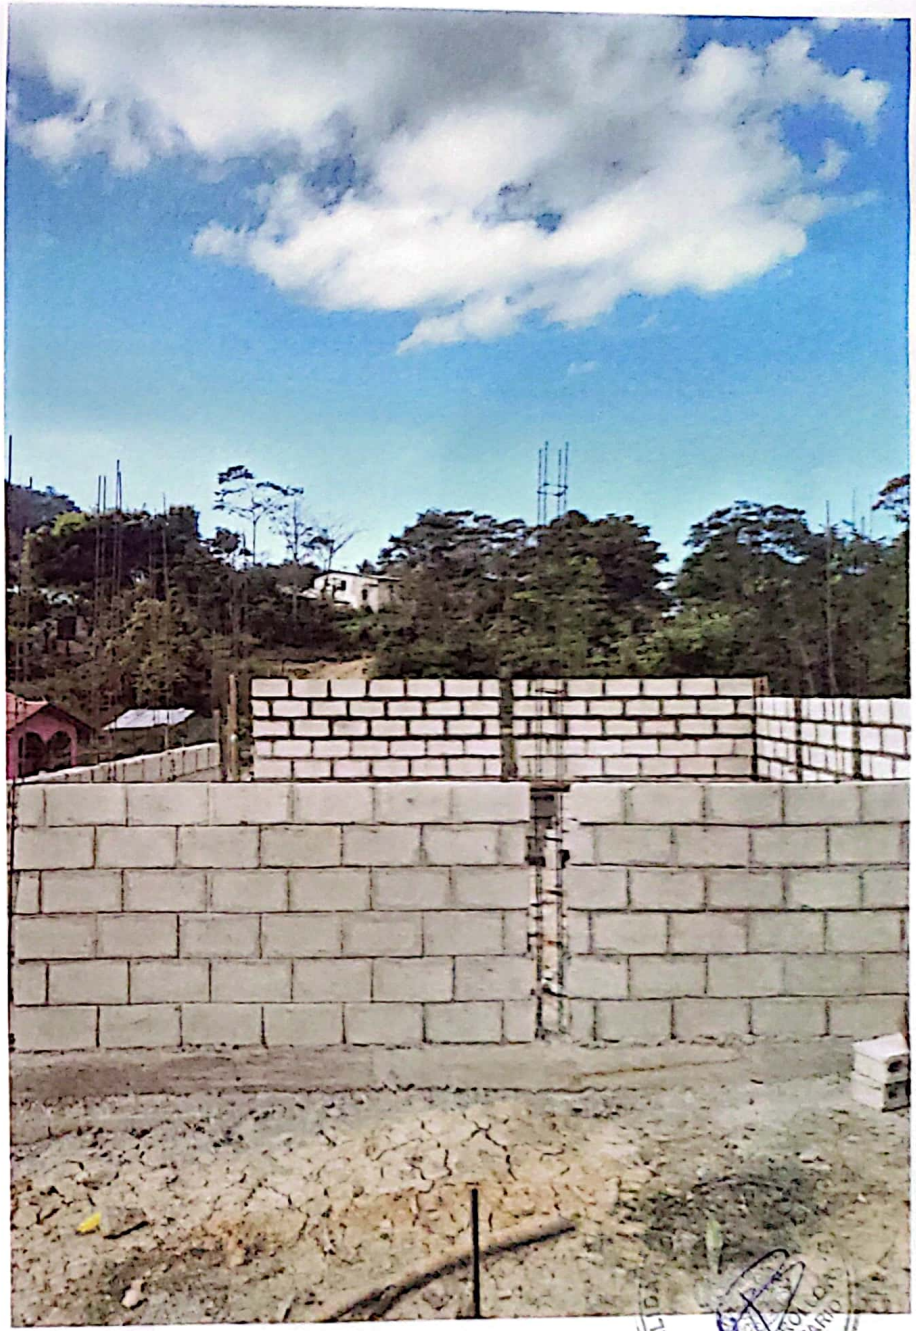
**ALCALDÍA DE PROTECCIÓN S.B.**
