



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



ADENDUM DE CONTRATO N°004-2021

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Señor **LEVI LÓPEZ FERNÁNDEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número 1626-1972-00126, RTN 16261972001266 , y de este domicilio, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente **ADENDUM AL CONTRATO N° 030-2020 CONTRATO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCION DEL PROYECTO DE"RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN EL BARRIO TEMPISQUE, TRINIDAD, S.B.**, el cual se regirá bajo las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES:** **LA MUNICIPALIDAD** con fecha 08 de diciembre del año 2020 firmó con **EL CONTRATISTA** el contrato N°030-2020 respectivo para **CONTRATO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCION DEL PROYECTO DE"RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN EL BARRIO TEMPISQUE, TRINIDAD, S.B**, por un monto de ciento ochenta y un mil cuarenta y ocho con treinta dos centavos (**Lps. 181,048.32**), de acuerdo al monto de la oferta presentada, el cual se realizaría en un lapso de tiempo de 21 días calendario a partir del 09 de diciembre hasta el 29 de diciembre del presente año. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL ADENDUM:** Realizar la ampliación de tiempo de **CONTRATO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCION DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN EL BARRIO TEMPISQUE, TRINIDAD, S.B**, de la fecha de finalización del contrato, contados a partir del 30 de diciembre del año 2020, hasta el 21 de enero del 2021 ya que el contratista se atrasó durante la ejecución debido a la realización de obras adicionales, no contempladas en las actividades, ni tiempo establecido como ser:



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



1. Canalización de aguas negras.
2. Demolición de pozos de inspección que no cumplan con el nivel necesario para la nueva red.
3. Construcción de pozo de inspección adicional
4. Suspensión de labores por condición climatológicas.

CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El presente contrato no sufrirá incremento de su monto contractual por el siguiente valor el cual se detalla de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (LPS)
1.00	PRELIMINARES	GLOBAL	1.00	L.5,000.00	5,000.00
2.00	TOPOGRAFIA	GLOBAL	1.00	L.12,000.00	12,000.00
3.00	DISEÑO DE CAMBIO DE LINEA DEL COLECTOR	GLOBAL	1.00	L.15,000.00	15,000.00
4.00	EXCAVACION	M3	322.80	L .104.00	33,571.20
5.00	DESINSTALACION Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 10	ML	110.00	L.23.64	2,600.40
6.00	CONFORMADO DE ZANJA	ML	269.00	L.14.50	3,900.50
7.00	CAMA DE LIMO DE 10 CM DE ESPESOR	M3	16.14	L. 260.00	4,196.40
8.00	INSTALACION DE TUBERIA DE 10	ML	269.00	L.14.50	3,900.50
9.00	RELLENO DE LIMO, 10 CM SOBRE LA CORONA DEL TUBO	M3	43.28	L.260.00	11,252.80
10.00	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	M3	250.17	L.156.00	39,026.52
11.00	CONSTRUCCION DE POZOS	UNIDAD	4.00	L.3,900.00	15,600.00
12.00	DIRECCION DEL PROYECTO	GLOBAL	1.00	L.30,000.00	30,000.00
13.00	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD	1.00	L.5,000.00	39,026.52
	TOTAL MANO DE OBRA ,EQUIPO Y DIRECCION DEL			LPS.	181,048.32



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD


SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL



PROYECTO				
----------	--	--	--	--

CLAUSULA CUARTA: ACEPTACION: Queda entendido que el resto de las cláusulas del contrato inicialmente firmado se mantienen vigentes y que deberá ser respetado y cumplido de acuerdo a sus lineamientos. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS DE ESTE ADENDUM DE CONTRATO:** Forman parte de este Adendum de contrato: 1) El contrato original y sus cláusulas. 2) Solicitud de Adendum entregada por **EL CONTRATISTA**. Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente Adendum de Contrato y lo suscriben en el municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, a los Treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020). Quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes



MANUEL LEOPOLDO REGALADO
ALCALDE MUNICIPAL
TRINIDAD, SANTA BARBARA



LEVI LÓPEZ FERNÁNDEZ
CONTRATISTA

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA

Trinidad, Santa Bárbara, 28 de diciembre de 2020

Señor
MANUEL LEOPOLDO REGALADO
Alcalde
Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara
Su Oficina

Estimado Sr. Alcalde

Un cordial saludo a través de la presente, deseándole éxitos en sus labores cotidianas, a la vez informarle que actualmente estoy ejecutando la Reconstrucción del Colector de Aguas Negras, con numero de Contrato 030-2020, ubicado en Barrio El Tempisque, de este municipio.

Durante la ejecución se han requerido de la realización de obras adicionales, no contempladas en las actividades ni tiempo establecidos en el contrato como ser:

1. Canalización de aguas negras
2. Demolición de pozos de inspección que no cumplieran con el nivel necesario para la nueva red.
3. Construcción de pozo de inspección adicional
4. Suspensión de labores por condiciones climatológicas (lluvias).

Por lo que solicito ampliación de tiempo al Contrato por 20 días calendario para poder concluir la reconstrucción del colector de aguas negras en el sector indicado.

Agradeciendo de antemano la atención brindada,

Atentamente,



Levi López Fernández

Ingeniero Civil
CICH-7031

PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS
UBICACIÓN: BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.
FECHA: 09 DE MARZO DE 2021
PRESENTADO POR: SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA.

ESTIMACION No.3 DE AVANCE DE OBRA.

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR			AVANVE ESTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			%
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	
1	Preliminares	Global	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	5,000.00	100.00
2	Topografía	Global	1.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1.00	12,000.00	12,000.00	100.00
3	Diseño de Cambio de Línea del Colector	Global	1.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1.00	15,000.00	15,000.00	100.00
4	Excavación	m ³	322.80	104.00	33,571.20	322.80	104.00	33,571.20	0.00	104.00	0.00	322.80	104.00	33,571.20	100.00
5	Desinstalación y limpieza de tubería de 12"	ml	110.00	23.64	2,600.40	62.00	23.64	1,465.68	48.00	23.64	1,134.72	110.00	23.64	2,600.40	100.00
6	Conformado de zanja	ml	269.00	14.50	3,900.50	269.00	14.50	3,900.50	0.00	14.50	0.00	269.00	14.50	3,900.50	100.00
7	Cama de limo de 10 cm de espesor	m ³	16.14	260.00	4,196.40	16.14	260.00	4,196.40	0.00	260.00	0.00	16.14	260.00	4,196.40	100.00
8	Instalación de tubería de 10"	ml	269.00	14.50	3,900.50	269.00	14.50	3,900.50	0.00	14.50	0.00	269.00	14.50	3,900.50	100.00
9	Relleno de Limo, 10 cm sobre la corona del tubo	m ³	43.28	260.00	11,252.80	38.00	260.00	9,880.00	5.28	260.00	1,372.80	43.28	260.00	11,252.80	100.00
10	Relleno y compactado de zanja	m ³	250.17	156.00	39,026.52	215.17	156.00	33,566.52	35.00	156.00	5,460.00	250.17	156.00	39,026.52	100.00
11	Construcción de pozos	Unidad	4.00	3,900.00	15,600.00	4.00	3,900.00	15,600.00	0.00	3,900.00	0.00	4.00	3,900.00	15,600.00	100.00
12	Dirección del Proyecto	Global	1.00	30,000.00	30,000.00	0.85	30,000.00	25,500.00	0.15	30,000.00	4,500.00	1.00	30,000.00	30,000.00	100.00
13	Limpieza final	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	0.096704	5,000.00	483.52	0.903296	5,000.00	4,516.48	1.00	5,000.00	5,000.00	100.00
TOTAL					L 181,048.32		164,064.32			L 16,984.00		L 181,048.32		100.00	
RETENCION 5% POR CALIDAD DE OBRA					L 9,052.42		8,203.22			L 849.20		L 9,052.42			
TOTAL NETO (L.)					L 171,995.90		155,861.10			L 16,134.80		L 171,995.90			



Manuel Leopoldo Regalado
 Alcalde Municipal Trinidad, Santa Bárbara



Ing. Levi López Fernández
 C.I.C.H 7031

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA

PROP. LEVI LOPEZ FERNANDEZ

R. T. N. 16261972001266

TEL. 9694-1270

Bo. ABAJO, CALLE PRINCIPAL,
TRINIDAD SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: levi_alfa02@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000505

Por Lps: 16,134.80

CAI: 1B56BA-3F1FB2-C74589-DF972A-599E85-46

Recibí de: Municipalidad de Trinidad S.B.

RTN: 1626 999 54 43 317

La suma neta de: Dieciséis mil ciento treinta y cuatro lps con 80/100

Por concepto de: Pago de estimación N° 3 de avance de obra

10 de 03 del 2021

Levi Lopez Fernandez
firma


Total por Honorarios:

Total Neto Recibido: Lps 16,134.80

Original: Cliente
Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
278 000-001-04-00000501 - 000-001-04-00000600 - Fech. Recepción - 14/01/2021 - Limite. Emisión - 14/01/2022



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION FINAL

PROYECTO: RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO EL TEMPISQUE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, S.B.

Los abajo firmantes en representación de la MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B. Manuel Leopoldo Regalado Fernández y el Ingeniero. Levi López Fernández en su condición de CONTRATISTA, después de haber realizado la inspección final del proyecto "MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCION PARA LA RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO EL TEMPISQUE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, S.B." CERTIFICAN QUE:

Los trabajos realizados por el contratista Ingeniero Levi López Fernández según contrato N° 030-2020 celebrado el 08 de diciembre de 2020 fueron efectuados de acuerdo a lo pactado en el contrato antes mencionado.

En fe de lo cual firmamos la presente Acta de Recepción Final a los Veintiún días del mes de enero de 2021.



Manuel Leopoldo Regalado Fernández
Alcalde Municipal
Identidad: 1606-1979-00036



Levi López Fernández
Contratista
Identidad: 1626-1972-00126

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com

023604000020
 MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
 BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
 TEL: 687-16-89

CHEQUE No. 00013618

TRINIDAD 12 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

LEVI LOPEZ FERNANDEZ

L 16.134.80

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)

⑆01002142⑆00023604000020⑆00013618

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Tercera Estimación del Contrato No.030-2020 por valor de Lps.16,984.00 por La Prestación de Servicios por Mano de Obra y Equipo Dirección del Proyecto de Reconstrucción del Colector de Aguas Negras, en el barrio El Tempisque, T.S.. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA detallada de la siguiente forma: Valor de estimación Lps.16,984.00, retención del 5% de Garantía de Calidad Lps.849.20 TOTAL A PAGAR LPS.16,134.80

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23604000020	PAGO DE Tercera Estimación del Contrato No.030-2020 por valor de Lps.16,984.00 por La Prestación de Servicios por Mano de Obra, Equipo Dirección del Proyecto de Reconstrucción del Colector de Aguas Negras, en el barrio El Tempisque, T.S.. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA detallada de la siguiente forma: Valor de estimación Lps.16,984.00, retención del 5% de Garantía de Calidad Lps.849.20 TOTAL A PAGAR LPS.16,134.80	16,134.80	

CHEQUE No.

00013618



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RESIBI CONFIRMADO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, (CR-08-19) • 57409-36 • BZ011000030H

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021

Hora : 12:33 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2012

L.: 16,984.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1551

Fecha de Emision: 12/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEVI LOPEZ FERNANDEZ

Id/RTN: 1626197200126

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Tercera Estimación del Contrato No.030-2020 por valor de Lps.16,984.00 por La Prestación de Servicios por Mano de Obra, Equipo Dirección del Proyecto de Reconstrucción del Colector de Aguas Negras, en el barrio El Tempisque, T.S.. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA detallada de la siguiente forma: Valor de estimación Lps.16,984.00, retención del 5% de Garantía de Calidad Lps.849.20 TOTAL A PAGAR LPS.16,134.80

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 000 001 47210 11-001-01	RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCASIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA	16,984.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	849.20
Total de retenciones:		849.20

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,984.00
Monto Total:		16,984.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	16,984.00
- RETENCIONES	849.20
TOTAL	16,134.80

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1626197200126





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/07/2018

RTN: 16261972001266

LEVI LOPEZ FERNANDEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora


Ministra Directora


Comisario del Cuentapropio

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2976804

Transacción: EFEEBD

INFORME DE AVANCE DE OBRA N°3

Proyecto de Reconstrucción del Colector de Aguas Negras

**BARRIO EL TEMPISQUE, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.**

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA
Ing. Levi López Fernández



Trinidad, Santa Bárbara, 18 de enero de 2021

INFORME DE AVANCE DE OBRA N°3

I. DATOS GENERALES:


Proyecto:	Reconstrucción de Colector de Aguas Negras
Ubicación:	Barrio El Tempisque, Trinidad, Sta. Bárbara
Cliente:	Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara
Fecha:	18 de enero de 2021

II. ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1) Limpieza de tubería de Ø12"
- 2) Colocación de limo de 10 cm de espesor (cama y recubrimiento de tubería).
- 3) Instalación de tubería.
- 4) Reparación de red existente de aguas negras.
- 5) Construcción casquetes y tapaderas de 5 Pozos de inspección.
- 6) Relleno y compactado de zanjas.

III. REPORTE FOTOGRÁFICO DE DESARROLLO DEL PROYECTO



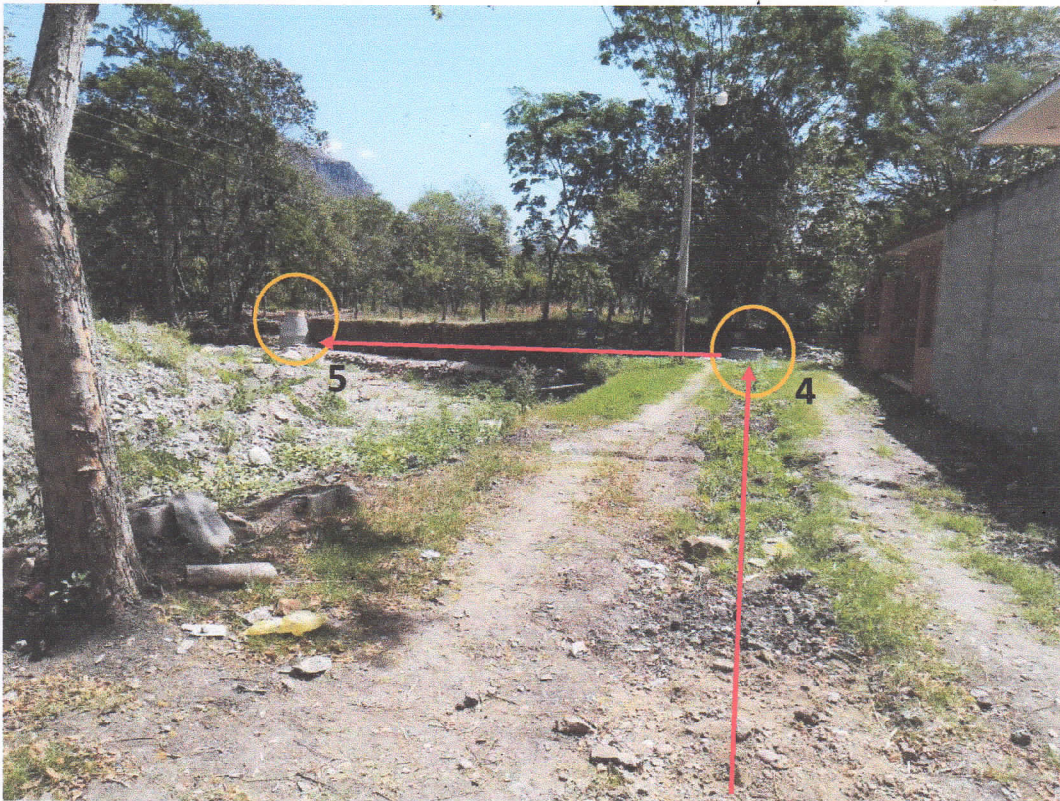

Reparación de Red de Aguas Negras existente





ANTES - DESPUÉS





ANTES - DESPUÉS





ANTES - DESPUÉS

