

# 2016

**Mejoramiento de la producción agrícola tradicional de la comunidad Lenca Llano Largo el Potrero por medio de un Sistema de Riego.**



**Grupo de Mujeres el  
CIPRES, Comunidad  
Llano Largo el Potrero**

10/02/2016

## RESUMEN EJECUTIVO

El área del proyecto se encuentra ubicado en la comunidad Llano Largo el Potrero, Municipio de Jesus de Otoro el proyecto comprenden el **“Mejoramiento de la producción agrícola tradicional de la comunidad Lenca Llano Largo el Potrero por medio de un Sistema de Riego”**, que los beneficiarios del proyecto puedan realizar un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos existentes en su comunidad y esta forma mejorar la producción y productividad agrícola tradicional, teniendo incidencia en la mejora de la calidad de vida de las familias beneficiarias del proyecto.

Los Beneficiarios directos del proyecto son los usuarios del sistema de riego de la comunidad de Llano Largo el Potrero, son 8 familias y de forma indirecta se beneficiaría a 26 familias. Los principales sistemas productivos bajo riego serán: frijoles maíz (rojo, amarillo, negro y blanco) y hortalizas (tomate, zanahoria, rábano, habichuela, patate, ayote, cilantro, chile dulce y yuca).

El fin del proyecto es el de contribuir al desarrollo sustentable del área de proyecto y a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la zona, a través de un mayor aprovechamiento del agua de riego y el incentivo de la comercialización de la producción agrícola tradicional.

Su propósito es mejorar la cantidad, calidad y oportunidad del agua para riego, fortalecer a los productoras/es agrícolas (organización de mujeres CIPRES), la mejora, diversificación de productos agrícolas tradicionales.

Es importante en este punto hacer mención a las instancias de participación de la comunidad involucrada especialmente del grupo de Mujeres el **CIPRES**. Se realizó un **“TALLER DE FORMULACION DE PROPUESTAS A FINANCIAR POR EL PC RUTA LENCA”**, taller que se realizó con metodología PPD al que se convocó a los beneficiarios del proyecto, para que a través de esta metodología se pudiese generar un diagnóstico de la situación actual, consensuado por los participantes del Taller. Además, en el Taller se estimuló a los convocados a identificar posibles soluciones a los problemas antes identificados. De esta instancia de participación se obtuvieron los problemas del área del proyecto, sus causas y consecuencias, así como posibles propuestas de solución, se formuló el perfil de proyecto a presentarse al PC Ruta Lenca.

El proyecto establece como ejes transversales la atención de las mujeres solteras, viudas y esposas de personas que presentan alguna discapacidad y de manera general promoverá capacitaciones sobre violencia domestica con enfoque de género. De igual manera establecerá actividades comunitarias para atender a los menos favorecidos dentro de las comunidades de intervención, por ejemplo alimentación de ancianas y ancianos abandonadas (os), familias en extrema pobreza.

## I. Datos Generales:

### 1. Nombre y dirección de la organización solicitante y ejecutora.



GRUPO DE MUJERES EL CIPRES, Barrio Agua Blanca.

### 2. Título del proyecto.

Mejoramiento de la producción agrícola tradicional de la comunidad Lenca Llano Largo el Potrero por medio de un Sistema de Riego.

### 3. Región y lugar de la ejecución del proyecto.

Proyecto se ejecutara en Comunidad de Llano Largo el Potrero, Municipio de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá.

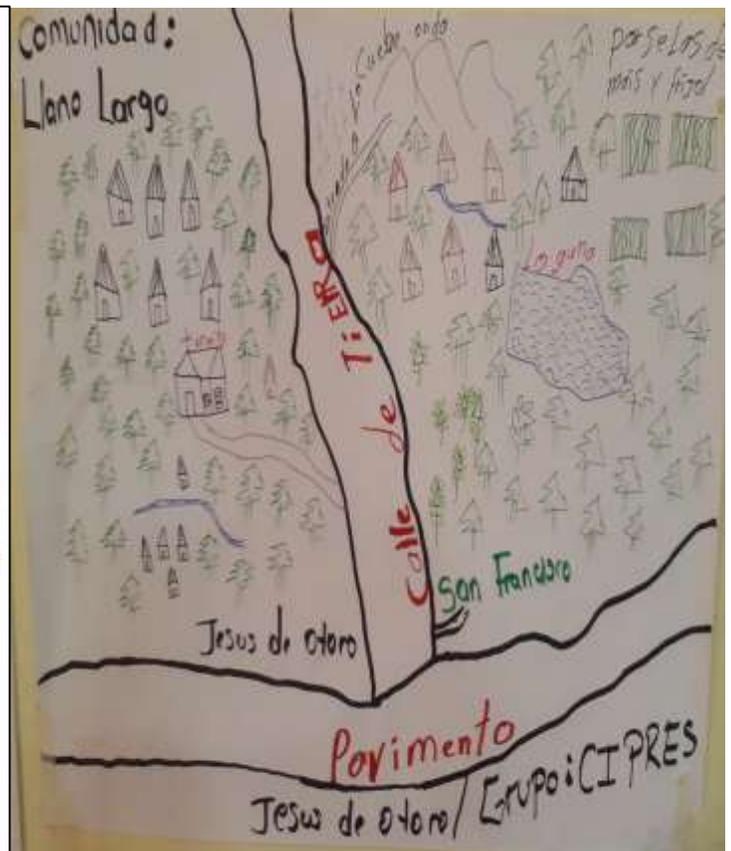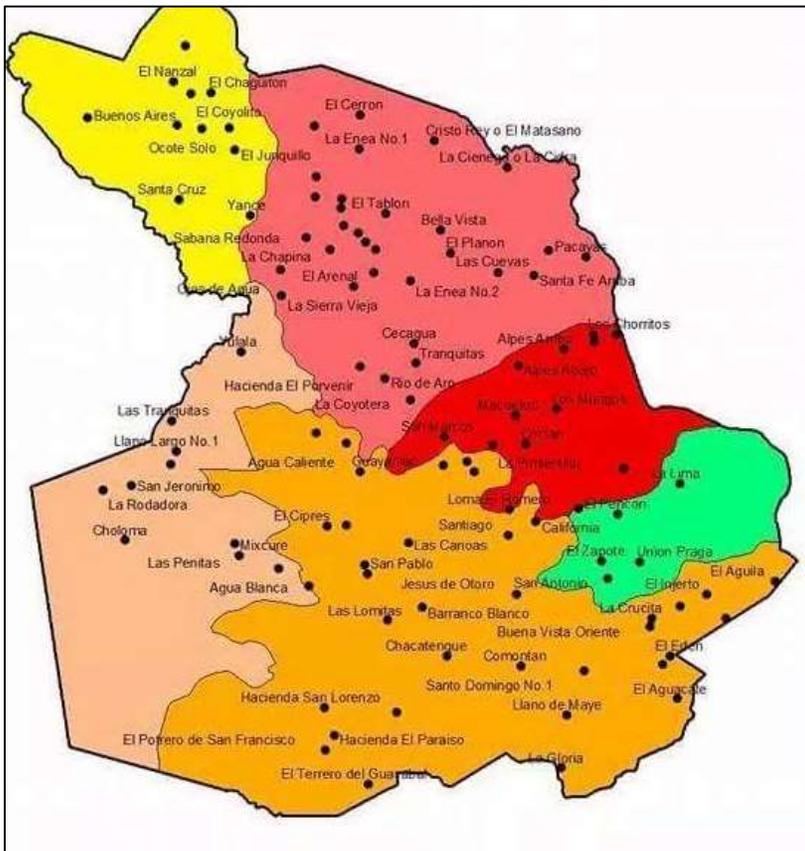

### 4. Aporte solicitado Al PPD periodo del proyecto

Se solicita al Programa de Pequeñas Donaciones, la cantidad de Lps. 800,000.00 (Ochocientos Mil Lempira exactos) equivalentes a \$. 36,500.00 (Treinta y seis mil quinientos dólares), el proyecto será ejecutado en un periodo de 12 meses.

## 5. Informaciones sobre la cuenta bancaria y las firmas

Actualmente el grupo de Mujeres del CIPRES no cuentan con cuentas bancarias en ningún banco.

## II. Informaciones sobre la organización solicitante:

### 1. Tipo de personería jurídica, según el registro. Especificar fecha de fundación y si es con o sin fines de lucro.

El Grupo de Mujeres el CIPRES, no cuenta con el documento de personería jurídica, tampoco cuenta con el reconocimiento de la municipalidad que es un grupo conformado por 8 mujeres que trabajan para mejorar las condiciones de la comunidad, en especial en lo que se refiere a la producción agrícola tradicional.

### 2. Origen y desarrollo histórico de la organización.

Breve historia del grupo de Mujeres del CIPRES, nace en el año 2010 con un proyecto de Agricultura financiado por la Alcaldía de Jesús de Otoro. Se conformó su junta directiva, siendo miembros 8 mujeres que conforman el grupo. Recientemente en enero del 2016 se llevó a cabo nuevamente su asamblea donde eligieron una nueva Junta Directiva quedando conformados por 5 miembros del grupo de mujeres del CIPRES.

Este grupo de personas será el encargado de gestionar proyecto con diferentes Organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales para lograr el objetivo de llevar ingresos económicos que beneficien a sus miembros.


Su miembros ha apoyado al Patronato en su actividades comunitarias, han apoyado en la gestión de un proyecto de agua potable misma que lograron que la alcaldía de Jesus de Otoro pueda financiar este proyecto que es una necesidad en la comunidad de Llano Largo el Potrero.

## MATRIZ HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN

AÑOS/FECHAS	Actividades	Como lo Hicieron (Estrategias)	Resultados
2010	Siembra y venta de frijol y maíz	Conformación de grupo de CIPRES Elección de junta directiva de CIPRES. Reuniones para definir parcelas de la siembra	Cosecha y venta de frijoles y maíz
2010-2016	Apoyo en las actividades del Patronato	Reuniones para la gestión de proyecto de agua potable para la comunidad de Llano Largo el Potrero.	Proyecto de Agua aprobado y financiado por la Alcaldía de Jesús de Otoro.
2010-2016	Apoyo en las actividades de patronato	Reuniones para la elaboración de merienda escolar.	Merienda escolar elaborada para los niños de la escuela de la comunidad.

### 3. Estructura de la organización:

- Organigrama

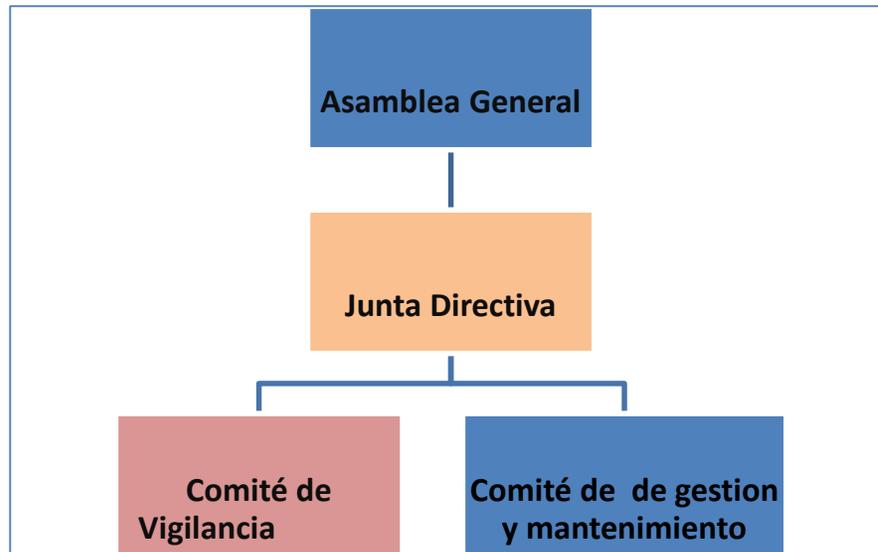

- Composición de los órganos directivos y de control (asamblea, consejo directivo, etc.): **indicar cantidad diferenciada de hombres y mujeres, e indicar a que sector (título personal, grupo destinatario, etc.) representa cada uno/a.**

Nombre Completo	Cargo	Comunidad	No. De Identidad
María Hilaria Méndez	Presidenta	Llano Largo el Potrero	1006-1970-00470
María Doris González	Secretaria	Llano Largo el Potrero	1007-1984-00595
Rosa González	Tesorera	Llano Largo el Potrero	1006-1992-00411
Martina Pineda	Fiscal	Llano Largo el Potrero	1006-1985-00578
María Mercedes Pineda	Vocal I	Llano Largo el Potrero	1006-1987-00863
Ana María García	Comité de Vigilancia	Llano Largo el Potrero	1016-1988-00257
María Justina Domínguez	Comité de Vigilancia	Llano Largo el Potrero	1006-1992-00845
María Ester Domínguez	Comité de Vigilancia	Llano Largo el Potrero	1006-1987-00147
María Mercedes Pineda	Comité de Gestión y mantenimiento	Llano Largo el Potrero	-----

- **Composición del equipo operativo y administrativo: cantidad diferenciada por mujeres y hombres, experiencia profesional y de trabajo en función del proyecto.**

La organización está formada por 8 mujeres, quienes trabajan de manera organizada en la producción agrícola tradicional de la comunidad.

Existe en la organización y a nivel de comunidad experiencia en el desarrollo de proyectos, los cuales han permitido desarrollar capacidades en los temas de:

- Gestión de proyectos (Agua Potable)
- Administración de recursos (Caja Rural)
- Planificación y ejecución de actividades (Educativas y comunales)
- Coordinación de grupos de trabajo. (actividades comunitarias)

- **Formas de participación del personal y de los miembros del grupo en los procesos de decisión.**

Asamblea: es la autoridad máxima y es la responsable de velar por el funcionamiento de la producción agrícola tradicional ya que todos son propietarios, las decisiones se toman de manera participativa, los acuerdos son tomados con la aprobación del 51% de la asamblea quienes en reuniones aprueban los acuerdos de cada reunión.

Junta directiva

Se encarga de la administración del Proyecto, divide sus funciones en comité de vigilancia y Comité de Gestión y Mantenimiento.

- **Anexar los estatutos y el manual de funcionamiento/reglamento interno en caso de proyectos nuevos y en caso de cambio de estos documentos.**

Existen en la organización algunos reglamentos que permiten la administración de la Producción Agrícola Tradicional tales como:

- Cada miembro aporta su propia semilla para el cultivo.
- Se distribuyen actividades en conjunto para la limpieza de la parcela, limpieza de maleza y otras actividades relacionadas a la siembra y cosecha de la producción agrícola tradicional.
- Se distribuyen grupos para el jalado de agua del pozo para el riego de las parcelas sembradas.

**4. Políticas y objetivos institucionales que encausan el quehacer de la organización: breve descripción (indicar, entre otros, si la organización dispone o existe apertura hacia una política institucional de equidad intergeneracional étnica y de género.**

- Apoyar al Patronato en la gestión de proyectos para beneficio de la comunidad Llano Largo el Potrero.
- El 100% de los miembros del Grupo CIPRES está conformado por mujeres en los cargos de dirección demostrando que estamos cumpliendo con la igualdad y equidad de oportunidades y responsabilidades.
- Apoyar a las instituciones educativas de la comunidad como un aporte al desarrollo educación en la comunidad de Llano Largo el Potrero.
- Rendición de cuentas a las miembras del Grupo CIPRES en caso que lo requieran.


**MATRIZ AGENDA DE LA ORGANIZACIÓN**

<b>OBJETIVOS</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>LIMITANTES</b>	<b>ESTRATEGIAS</b>
Desarrollo social y económico de las socias del CIPRES.	Aumentar los ingresos Económicos de los miembros del CIPRES.	No tenemos dinero Falta de infraestructura para guardar la cosecha y semillas. Falta de un sistema de riego para la producción agrícola tradicional	Alianza y gestión con el programa conjunto lenca. Solicitudes de proyectos a la alcaldía. Formulación y gestión de para el Proyecto de riego para la siembra de agricultura.
Empoderamiento y participación de la mujer	8 mujeres empoderadas y participando activamente en los proyectos y en la comunidad	Falta de capacitación a las mujeres. Falta de dinero Algunos miembros No saben leer y escribir.	Capacitar a las mujeres de CIPRES en temas de liderazgo, administración, organización, gestión y derechos. Gestionar proyectos educativos de alfabetización.

**5. Nombrar los ejes temáticos/programas y regiones geográficas del trabajo y los sectores de la población destinataria a nivel institucional o de la organización.**

- Fortalecer las capacidades de la Organización de mujeres CIPRES para contribuir al desarrollo de la comunidad Llano Largo el Potrero, buscando la mayor eficiencia y buena calidad de la producción agrícola tradicional.
- Crear una conciencia ecológica para la protección de la fuente hidrográfica que servirá para el riego de la siembra agrícola tradicional, disminuyendo el impacto negativo para el cambio climático.
- Crear un sistema de vigilancia para el sistema de riego que permita brindar un servicio de calidad y darle un mantenimiento adecuado al sistema de riego.
- Gestionar Proyectos que permitan aumentar la cobertura del sistema de riego hacia más hogares de la comunidad de Llano Largo el Potrero para mejorar sus ingresos y su calidad de vida.

## 6. Relaciones de cooperación financiera (nacionales e internacionales.)

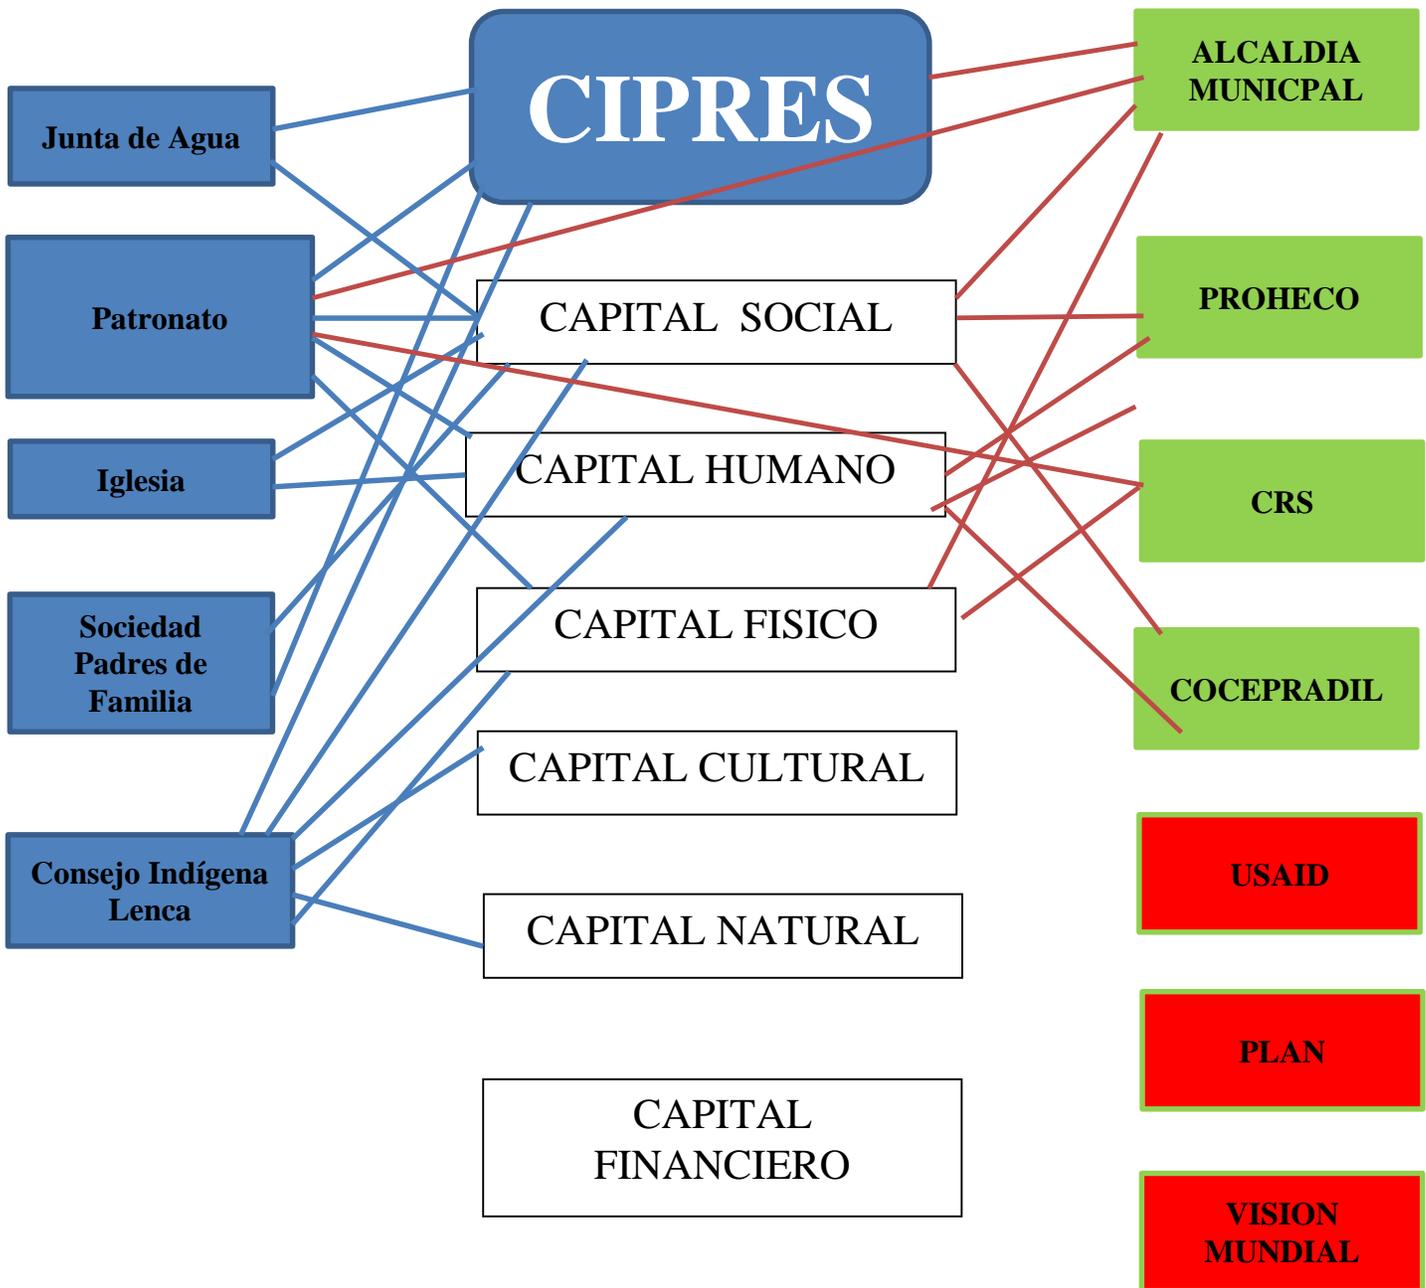

Los cuadros en rojo son los que tienen incidencia en el municipio de Jesus de Otoro que podrían ser aliados estratégicos para financiar proyectos en beneficio de la comunidad.

**MATRIZ ORGANIZACIONES NACIONALES**

Nombre de la Organización	Actividades que realiza	Quienes participan # de beneficiarios	Activo que fortalece
MUNICIPALIDAD	Proyecto de agua para la comunidad (con chamba vivís mejor)	147 personas (34 familias)	Capital Físico y financiero.
PROHECO	Educación para niños	62 niños	Capital social y humano
COCEPRADIL	Merienda escolar	62 niños	Capital social y capital humano
INA	Titulación de tierras a través de la gestión COPINH	Tierras comunales, beneficiarios totales 147 personas.	Capital financiero y social

**MATRIZ ORGANIZACIONES INTERNACIONALES**

Nombre de la Organización	Actividades que realiza	Quienes participan # de beneficiarios	Activo que fortalece
COCEPRADIL	Merienda escolar	62 niños	Capital social y capital humano
CRS	Potabilización de agua	147 personas	Capital físico y humano.

**7. Relaciones de coordinación y de redes (nacionales e internacionales.)**

**MATRIZ ORGANIZACIONES LOCALES**

Nombre de la Organización	Actividades que realiza	Quienes participan # de beneficiarios	Activo que fortalece
CAJA RURAL CIPRES	Siembra de frijoles y maíz	8 miembros del CIPRES. Mujeres y sus familias.	Financiero, social y humano
CAJA RURAL GUANACASTE	Todavía no ha iniciado a trabajar por falta de recursos financieros	9 miembros	
CAJA RURAL LAS ACACIAS	Préstamos a los socios y particulares en pequeñas cantidades.	12 miembros Toda la comunidad	Social y financiero
PATRONATO	Limpieza de la escuela, chapeado de las calles, limpia del cementerio, gestionar proyectos para la comunidad. Gestión para tener agua en la comunidad.	7 miembros de la junta directiva Toda la comunidad	Capital social, capital humano.
JUNTA DE AGUA	Gestión para tener agua en la comunidad.	24 miembros y toda la comunidad.	Capital humano y capital social
SOCIEDAD PADRE DE FAMILIA	Reuniones en la escuela para la acción educativa de sus hijos.	Padres de familia 62 niñ@s	Capital humano y capital social
CONSEJO INDIGENA LENCA	Defensa del territorio colectivo del pueblo lenca.	35 familias Toda la comunidad	Capital físico, capital humano, capital natural, capital cultural
AECO – ASOCIACION EDUCATIVA COMUNITARIA	Gestión de pago para el maestro.	5 miembros Toda la comunidad	Capital social, financiero y capital humano
TIF	Gestión para la salud de la comunidad.	14 miembros. Toda la comunidad.	Capital social y capital humano

### III. Información sobre el proyecto:

#### 1. Breve descripción de antecedentes (logros/dificultades) de la ejecución del proyecto anterior (o de los proyectos en caso que sean varios).

El grupo de mujeres del CIPRES desde su creación (2010) no ha contado con mucho apoyo financiero para la ejecución de su proyecto producción agrícola tradicional. En el año 2010 la alcaldía de Jesús de Otoro les otorgo un financiamiento de Lps 1,800.00 (Mil ochocientos lempiras exactos), sin embargo el proyecto no funciono porque no contaron con el apoyo financiero para poder instalar un Sistema de Riego que permitiera lograr con éxito la cosecha de su producción agrícola tradicional.

Siendo una comunidad con una riqueza de bosques, ríos, lagunas, cuevas el mayor problema que enfrenta es el acceso a su comunidad, la carretera desde la comunidad de Jesus de Otoro ha estado en malas condiciones sin que exista una preocupación por parte de los gobiernos locales de darle atención priorizada como un derecho a la comunicación que tiene la comunidad lenca y esto dificulta el acceso a diferentes entes nacionales e internacionales para la atención y apoyo a los comunitarios.

El requerimiento del presente proyecto, se originó en la comunidad Lenca Llano Largo el Potrero, esto debido a la apremiante necesidad que tienen los pobladores de estas comunidades desalentadas económicamente, de contar con agua para riego regulada por una presa para el riego de sus cultivos agrícolas tradicionales. Es importante señalar que este proyecto ha alentado la participación activa de todos sus beneficiarios.

Con el apoyo, gestión de los líderes de la comunidad de Llano Largo el Potrero y la gestión directa del **Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras - COPINH** se logró obtener un título comunal, que fue entregado por el INA en el año 2008; se logró una titulación comunal de unas 343 hectáreas de tierra las cuales son propiedad de todos los y las habitantes de la comunidad de Llano Largo el Potrero de Jesús de Otoro Intibucá. El grupo de mujeres CIPRES nunca ha recibido apoyo financiero de ningún ente gubernamental e internacional, cabe mencionar que como mujeres organizadas hemos apoyado a las demás organizaciones de la comunidad en la gestión de los diferentes proyectos que ha ido de beneficio para el desarrollo de la comunidad.

Como mujeres organizadas nuestro proyecto de producción agrícola tradicional hemos tomado la iniciativa que cada miembro compre sus semillas para la siembra, los materiales de siembra y cosecha (semillas frijoles, maíz, abono y otros) pero los trabajos de campo se realiza en conjunto (limpieza, riego, cuidado y cosecha). A pesar que no ha logrado conseguir apoyo financiero para invertir en su proyecto las inversiones mínimas que ha realizado ha logrado una ganancia de Lps 2,500.00 al año de algunas miembros. Las miembros que no han invertido mucho por falta de recursos han obtenido una ganancia de Lps 500.00 al año.

## **Antecedentes históricos de la comunidad**

Fecha de creación 20 de febrero del 2014 La comunidad de Llano Largo del Potrero inicio predicando la palabra de Dios en lo libre (en el campo) ya que los pobladores tenían la iniciativa de construir una ermita católica, ya que nosotros los pobladores pensábamos que el terreno era libre que no tenía dueño y podíamos construir viviendas. Luego el señor Don Rodolfo Panchame dijo que él era el dueño del terreno, pero que podían negociar, había una organización que les podía ayudar; los pobladores del lugar tomaron la decisión de reunirse y buscar asesoría donde la organización y así pudimos lograr el terreno a través de la organización de (COPINH) hoy tenemos un título comunitario y así fue todos construimos viviendas y la Ermita Católica. ¿Por qué lleva ese nombre? Lleva ese nombre porque pertenece a la aldea de San Francisco del Potrero, entonces decidieron que se llamara Llano Largo del Potrero.

Y se fundó con las siguientes personas:

- Barbará Domínguez
- Santos Pineda
- Feliciano Ramos
- Juan Domínguez

## **2. Breve descripción y análisis actual (ambiental, social, cultural, económico, político) de la región donde se desarrollará el proyecto.**

### **Situación Política**

La Comunidad Llano Largo el Potrero se encuentra ubicada en la parte alta de El Municipio de Jesús de Otoro, Al norte con Intibucá, al sur con San Francisco del Potrero, al este con lagunas y al oeste con Intibucá; teniendo como afluente principal el Río Quila, sé llega a ella a través de una carretera de tierra a 13 km (3 km de pavimento y 10 de tierra) desde Jesús de Otoro, esta comunidad cuánta con una población aproximada de 147 personas.

### **Situación Económica**

La economía de la zona depende en su mayoría la agricultura de granos básicos y cultivo del plátano en menor escala.

Alrededor de 25 cabeza de familia que trabajan como jornales fuera de la comunidad realizando trabajos de campo y otro de la comunidad se quedan atendiendo el trabajo familiar individual de u familia.

Las mujeres se dedican a trabajar en la siembra y cosecha agrícola tradicional y también se dedican a la economía informal como la venta de comida y venta de pan.

### **Situación Social.**

Cuenta con una población en su mayoría de religión Católica. Hasta el momento no cuentan con un sistema de agua potable está en proceso de gestión, en la iglesia católica funciona como escuela los días de semana y es atendida por una maestra del sistema PROHECO y la maestra del kínder es voluntaria.

Con una población estudiantil de 40 alumnos de los cuales 30 niñ@s están en diferente grado, un Jardín con 10 alumn@s, existe un 10% de analfabetismo principalmente en personas mayores de edad.

No se cuenta con un centro de salud, lo que obliga a la población a trasladarse a la comunidad de Jesus de Otoro, aunque la comunidad ha organizado a la TIF contando con 14 miembros quienes se encargan de gestionar medicamentos básicos para la salud y si hay algún grave en la comunidad ellos se encargan de trasladarlo al centro de salud de la comunidad de Jesús de Otoro. No existen problemas de inseguridad de robos, problemas de maras/pandillas y otros que signifique un riesgo para la comunidad.

### **Situación Ambiental**

En la parte ambiental existe presión sobre el bosque y las microcuencas, debido al problema que enfrenta el país con el Gorgojo descortersador, hasta el momento el ICF no se ha acercado a la comunidad a brindarle capacitación y asistencia técnica para enfrentar esta situación, que no solo afectara el bosque sino las fuentes hidrográficas que alimentan a la comunidad y que afecta directamente a la siembra agrícola tradicional. La comunidad tiene potencial para realizar proyectos de forestaría comunitaria sin embargo por el difícil acceso por el mal estado de la carretera no ha podido recibir capacitaciones y asistencia técnica para el manejo adecuado de sus recursos naturales.

Es de suma importancia proteger los recursos naturales, se ha demostrado que los pueblos indígenas milenariamente ha vivido en armonía con la naturaleza, la mayor parte de los asentamientos Lencas son áreas de vocación forestal, pero con tradición productiva básicamente agrícola. El pueblo Lenca a lo largo de los años viene sufriendo invasión de terceros en sus territorios lo que ha causado deforestación y degradación de los suelos.

Con todo y la presión que ha sufrido el bosque del pueblo lenca la comunidad de Llano Largo el Potrero, existen todavía área boscosa que permite la existencia de fuentes de agua, algunas actividades agroforestales como el cultivo de granos básicos (frijoles, maíz, plátano y hortalizas), hasta el momento la comunidad no sufre de áreas degradadas ni áreas deforestadas.

### Matriz de activos de la Comunidad de Llano Largo el Potrero

Capital Humano	Capital Social	Capital Físico	Capital Natural	Capital financiero	Capital Cultura
3 albañiles	1 Patronato	24 casas	5 pozos	7 familias cosechas grano básico	compostura de la tierra
1 fontanero	1 caja rural	10 de madera	1 cueva	25 familias que jornalean de diferentes formas por meses	la chicha de maíz
2 carpintero	1 sociedad de padres de familia	24 casas con agua	1 laguna		Atol agrio
14 viveristas de café	3 organizaciones de mujeres	1 iglesia católica	2 miradores		Atol chuco
20 panaderos	1 Consejo de Aldea (Consejo Indígena Lenca)	1 carretera irregular	hay animales, venados conejos, ardillas, tepezcunintle, mapaches, palomas, pericos		conserva de mango
2 capadores	1 equipo de futbol	158 habitantes	Zorsales, nances, guayaba.,bosque de pino y roble		compostura de trueno
5 destasadores	consejo indígena Lenca	1 vivienda de zacate	,		o palo rallado
		no hay letrinas			tamales, tecuco de frijoles
		No tienen escuela			tamales de maíz verdes y montuca,
		Carretera en mal estado.			ayote cosido con azúcar .
					chilate simple de maíz blanco

### 3. Identificación de los grupos destinatarios: criterios de selección y descripción detallada (cantidad diferenciada por hombres y mujeres, edades, etnias, estructura organizativa, etc.).

El Proyecto beneficiara a 08 familias (06 miembros por familia) que realizaran la producción agrícola tradicional, la comunidad podrán utilizar el sistema de riego para mejorar la producción agrícola y esto vendría a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad, se mejorara la economía local con comercialización de la producción agrícola (frijoles, maíz y sus derivados, hortalizas).

También se espera que las familias del resto de la comunidad puedan beneficiarse del sistema de riego y paguen un precio simbólico por el uso del riego esto serviría para el mantenimiento del sistema.

Concepto	Cantidad	Total
Mujeres	9	14
Hombres	5	
Niños	17	28
Niñas	11	
Gran Total de población		42

Identificación de los problemas y las necesidades estratégicas, diferenciadas por hombres y mujeres.

### MATRIZ DE PROBLEMA LOCAL

GENERO	PROBLEMAS	SOLUCIONES
Niños	Desnutrición Falta de colegio para continuar con su educación Enfermedades respiratorias y gastrointestinales Desintegración familiar	Crear fuentes de empleo Dinero para nuestros proyectos
Mujeres	Falta de empleo Madres solteras No tiene vivienda propia	Capacitaciones para la gestión de proyecto Crear fuentes de trabajo
Hombres	Falta de empleo Falta de dinero para los proyectos Falta de dinero para la agricultura de subsistencia	Crear fuente de trabajo Dinero para los proyectos Capacitaciones para la gestión de proyectos

#### 4. Justificación del proyecto

En el ámbito del proyecto existen recursos hídricos que no están siendo aprovechados eficientemente, el potencial agrícola de la zona no puede ser activado, debido principalmente a que no se dispone oportunamente de agua para riego, lo que se constituye en una limitante para que las familias de la comunidad lenca Llano Largo el Potrero puedan generar mayores ingresos económicos fruto de la actividad agrícola tradicional.

Con el proyecto se pretende asegurar e incrementar la oferta de agua para riego, mediante la construcción de una obra principal de almacenamiento, revestir la mayor cantidad posible de los canales para reducir las pérdidas por conducción y la construcción de obras de arte complementarias.

El desarrollo del presente proyecto beneficiará directamente a 8 familias de escasos recursos se incrementará 8 manzanas bajo riego óptimo permanente de producción (actualmente solo siembran 4 manzanas), diversificando la producción agrícola

velando también por el manejo racional y sostenible de los suelos, a través de una adecuada rotación de cultivos, incorporación de especies y variedades adaptadas a la zona, prácticas agronómicas ecológicas que permitan mantener la fertilidad del suelo (uso de abonos orgánicos). Los beneficiarios demuestran interés en el proyecto y han participado en la elaboración del presente estudio.

## **5. Descripción de Proyectos**

El Proyecto Mejoramiento de la producción agrícola tradicional de la comunidad Lenca Llano Largo el Potrero por medio de un Sistema de Riego, será ejecutado por organización de segundo nivel “Grupo de Mujeres EL CIPRES” y que aglutina a beneficiarios de la comunidad de Llano Largo el Potrero, con sede en la misma comunidad, Departamento de Intibucá, bajo la supervisión y monitoreo de la municipalidad de Jesús de Otoro y PC Ruta Lenca.

Con el sistema de riego se pretende potenciar la producción agrícola tradicional, con la siembra de frijoles, maíz (blanco, amarillo, rojo, negro) y hortalizas, comercialización de algunos productos de la producción como ser derivados del maíz, venta de frijoles y hortalizas. Se considera que los beneficiarios tendrán que mejorar la caseta que mantendrán abierta para promover, mercadear y ofertar sus productos de manera conjunta, para ello contarán con profesional en turismo cultural que la municipalidad será el responsable de esta oficina, será el encargado de hacer todas las gestiones y contactos con otras agencias operadoras de turismo o turismo de aventura a nivel nacional e internacional.

Con el enfoque del proyecto también se pretende mejorar la caseta donde brindaran comidas tradicionales con la producción agrícola tradicional, el equipamiento de mobiliario para acondicionar la caseta, mejorar las instalaciones con agua potable en los baños y cocina, para garantizar la comodidad de los turistas dentro de la caseta.

Para fortalecer los conocimientos de los beneficiarios en manejo de Sistema de Riego, servicios turísticos culturales (gastronomía) desde la cosmovisión indígena, se tomara en cuenta las experiencias de pueblos con experiencias exitosas, es por ello que se considera la gestión de un intercambio nacional con otros pueblos exitosos en el manejo del turismo cultural. Complementando este conocimiento con capacitaciones internas en preparación de alimentos tradicionales, atención turística cultural de la población en general y nivel de apoyo que garantice las organizaciones locales. Siendo que muchas experiencias exitosas siempre pasan por una buena administración, este será parte de las previsiones del proyecto con capacitación sobre manejo eficiente de la administración y la contabilidad de negocios. Pero también capacitaciones en los temas de derechos colectivos e individuales como pueblo indígena.

El proyecto establece como ejes transversales la atención de las mujeres solteras, viudas y esposas de personas que presentan alguna discapacidad y de manera general promoverá capacitaciones sobre violencia doméstica con enfoque de género. De igual manera establecerá actividades comunitarias para atender a los menos favorecidos dentro de las comunidades de intervención, por ejemplo alimentación de ancianas y ancianos abandonadas (os), familias en extrema pobreza. También se prevé apoyar al patronato en términos de limpieza general de comunidad y el encerramiento de animales domésticos para evitar la contaminación y la reducción de enfermedades, como parte del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.

El proyecto será ejecutado en tres componentes: Fortalecimiento de organizaciones del Grupo de Mujeres el CIPRES, promoción y mercadeo de productos agrícolas tradicionales y algunos de sus derivados, conservación y protección el ambiente.

## **6. El Objetivo general del proyecto**

***Mejorar la calidad de vida de 8 familias de la comunidad de Llano Largo, mediante el incremento de sus ingresos económicos provenientes de la producción agrícola tradicional, a través de la implementación de infraestructura de riego.***

## **7. Objetivos específicos y efectos esperados en el ámbito del proyecto y efectos esperados en relación con aspectos de equidad intergeneracional, étnica y de género) con sus respectivos indicadores para medir el futuro logro.**

1. Mejorar la producción y comercialización de la producción agrícola tradicional con un sistema de riego beneficiando a 8 familias Lenca del grupo de mujeres.

Se pretende disminuir la desnutrición en los niños de la comunidad mejorando su dieta alimenticia, también comercializar productos agrícolas tradicionales (derivados del maíz/gastronomía lenca) para que puedan obtener ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de las 8 familias beneficiarias directas del proyecto.

2. Instalar infraestructura para el sistema de riego de agua para la producción agrícola tradicional.

Se pretende construir un sistema de riego para la producción agrícola tradicional que beneficie a 8 familias de la comunidad Llano Largo el Potrero contribuyendo a la economía de las familias.

3. Fortalecer las capacidades del grupo de mujeres de CIPRES en: Derechos organización, formulación, gestión y ejecución de acciones para el desarrollo económico de su comunidad.

Se pretende capacitar a los miembros del comité y organizaciones de base de la comunidad, en temas de administración y organización a través de talleres para mejorar la eficiencia en el manejo de los fondos. También capacitaciones en el manejo adecuado del sistema de riego. Capacitaciones en los temas de derechos colectivos e individuales. Capacitaciones.

8. **Resultados y/o metas en función de los objetivos específicos con indicadores para medir el futuro logro.**

#### Resultado Esperado 1.

**8 manzanas sembradas, cosechadas y comercializadas los productos agrícolas tradicionales. Mejorada la infraestructura donde funcionara la comercialización de productos agrícolas y sus derivados. (Gastronomía lenca y venta de hortalizas y otros productos agrícolas)**

#### Resultado Esperado 2.

**Construido e instalado un (1) Sistema de Riego beneficiando a 8 familias para la producción de sus cultivos agrícolas tradicionales.**

#### Resultados Esperado 3.

**Grupo de mujeres el CIPRES fortalecidas y capacitadas ejecutando eficientemente su proyecto. (Realizado 6 talleres de capacitación)**

9. **Descripción de la metodología de trabajo.**

#### **Metodología General:**

- Al iniciar el proyecto se realizara una reunión comunitaria para socializar con los pobladores, en donde se expondrán las metas a lograr y los beneficios que recibirá la comunidad.
- Para la ejecución de las actividades ambientales se coordinara con el ICF-regional, alcaldía municipal, PC Ruta Lenca para que apoyen en el proceso de protección, manejo y conservación ambiental en este caso de las cuencas hidrográficas.
- Cada mes se realizara reunión de junta directiva y con los diferentes comités de trabajo, para evaluar el avance de las actividades, analizar y buscar soluciones a las dificultades o problemas que surjan.

- Durante todo el proceso la organización realizara reuniones para presentar informes económicos, dando a conocer la administración de los fondos.
- Para todas las compras se realizaran bajo procedimiento administrativo PPD y el sistema contable generalmente aceptado para el manejo de soportes necesarios para una administración transparente.
- Para la ejecución del proyecto se tendrá que contratar un asistente técnico y administrativo para el apoyo a la organización, quienes al momento de ser contrato tendrán que demostrar amplia experiencia en gestión y ejecución de proyectos dirigidos al pueblo lenca.

### **Metodología de Intervención de actividades:**

- La municipalidad de Jesús de Otoro y el PC Ruta Lenca serán las instancias de monitoreo del proyecto.
- Para la siembra de productos agrícolas tradicional se realizaran con técnicas ecológicas, las mujeres serán capacitadas previamente por los técnicos de la municipalidad.
- Para la venta de productos agrícolas tradicionales, gastronomía se buscara alianza con grupos en otras comunidades en coordinación con el Centro de información turística cultural y poder ofrecer productos de calidad a los visitantes nacionales y extranjeros, siendo una oportunidad para fortalecer la economía de las mujeres beneficiarias directas del proyecto.

### **10. Descripción del sistema y de los instrumentos de sistematización, monitoreo y evaluación, así como sobre el nivel de participación de los destinatarios y personal ejecutor del proyecto.**

La sistematización del proyecto y de todas sus actividades desarrolladas, se realizara de la forma siguiente:

- ✓ La Oficina de Turismo Cultural de la Alcaldía de Jesús de Otoro realizara tomas de fotografías para documentar y obtener imágenes del proceso en la ejecución de actividades.
- ✓ En cada reunión de trabajo, capacitaciones se recopilara el listado asistencia de los participantes, se elaborara la ayuda memoria de las reuniones, talleres y los diferentes temas tratados o desarrollados.
- ✓ Se levantarán actas como instrumento legal para registrar los temas y acuerdos discutidos en cada reunión.
- ✓ El acta será uno de los documentos legales muy utilizados en cada reunión, ya que permitirá dejar registrados los temas y acuerdos discutidos.
- ✓ Se realizara informes trimestrales de ejecución de actividades, informes económicos, serán los registros que permitirán sistematizar cada periodo de trabajo de acuerdo a cada desembolsos realizado por el PPD.

- ✓ Informe de monitorios, elaborado conjuntamente con el técnico asesor, Municipalidad y PC Ruta Lenca.
- ✓ Registro de reuniones en los libros de actas de la organización y de la municipalidad.

**11. Estimación del periodo de trabajo conjunto con los grupos de destinatarios y en la región.**

El periodo de ejecución del proyecto será de 12 meses a partir del primer desembolso.

**12. Estimación del riesgo o los riesgos para el desarrollo del proyecto: condiciones externas, condiciones internas, condiciones del grupo destinatario, etc.**

<b>Riesgos</b>	<b>Nivel (bajo, medio, alto)</b>	<b>Estrategias para superarlos</b>
Cambio climático	Alto	Medidas de mitigación (barreras vivas, reforestación, zanjas de laderas etc.)
Robo	Bajo	Vigilancia
Plagas en las parcelas	medio	Manejo adecuado
Alza y variación en los precios de los materiales	Alto	Destinar un 3% de imprevistos
Apatía por parte de la comunidad para respetar el reglamento interno de la administración del sistema	Bajo	Socialización del proyecto con la comunidad, reuniones de concientización.
Mal uso de fondo	Bajo	Revisiones periódicas de los gastos realizados, ver facturas y cuentas bancarias.
Retraso de fondo	Bajo	Se enviarán los informes de manera que no retrase su aprobación.
División de la organización	Bajo	Capacitación de motivación al trabajo organizativo. Elaboración de reglamentos internos de funcionamiento.

#### **IV. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL**

**1. Indicar cómo el proyecto contribuirá a la creación de conciencia pública sobre la protección del medio ambiente, que acciones hará para que la información llegue a escuelas, colegios, Unidades Municipales Ambientales y que circule en medios de prensa.**

El proyecto contribuirá a la creación de conciencia pública mediante los mecanismos siguientes:

- ✓ Charlas en la escuela de la comunidad.
- ✓ Publicación de los resultados y logros obtenidos en la protección del bosque y cuenca hidrográfica que se ocupara para el sistema de riego.
- ✓ En coordinación con la municipalidad y PC Ruta Lenca realizar una edición de un documento con información sobre las bondades Agricultura Tradicional (ecológica) como una forma de promover alimentos sanos sin contaminantes.

**2. Indicar cuál será la contribución del proyecto a la generación de medios de vida sostenible y reducción de la pobreza.**

Mediante el desarrollo de actividades productivas agrícola tradicionales, establecimiento de parcelas ecológicas para la producción agrícola tradicional y la transmisión de conocimientos tradicionales para la protección y conservación del bosque, cuidado de las cuencas hidrográficas, el proyecto aportara de forma significativa a través de la comercialización de la producción agrícola tradicional y los derivados del maíz (gastronomía lenca) para la generación de ingresos económicos para la reducción de la pobreza.

La población que no trabaje directamente se beneficiara con la elaboración y venta de productos agrícolas y alimentos para los visitantes, mano de obra en jornales para la mejora de la caseta, jornales para la construcción del sistema de riego, corte y acarreo de materiales de construcción.

Debido que los recursos económicos que se recaude producto de la venta productos agrícola y Gastronomía demandara en la población en general bienes y servicios adicionales, situación que dinamizara la economía local con mayores ingresos.

**3. Indicar cómo el proyecto contribuirá a la construcción de capacidades, fortalecimiento institucional y empoderamiento local.**

El proyecto contribuirá a la generación de capacidades, mediante el desarrollo de un plan de capacitaciones, transmisión de conocimiento, participación en foros y debate sobre el manejo de los recursos naturales, talleres de capacitaciones sobre derechos, acercamiento y coordinar actividades con instituciones locales y nacionales, establecimiento de convenios de apoyos con entidades estatales, así como también el desarrollo de las capacidades de incidencia en las tomas de decisiones a nivel comunal y municipal.

**4. Indicar cómo garantizará el proyecto la equidad de género, en especial la participación de las mujeres y otros grupos vulnerables adulto mayor.**

La participación de la mujer es clave en la ejecución del proyecto, ellas son las ejecutoras y beneficiarias directas, también participara en actividades de protección forestal ya que esto beneficiara a sus parcelas agrícolas tradicional (construcción de rondas, reproducción de plántulas y reforestación), el grupo de mujeres el CIPRES está conformada por 8 mujeres por lo tanto son las beneficiaras directas del proyecto. Los adultos mayores de la comunidad también participaran en desarrollar actividades puntuales, de acuerdo a sus capacidades y también son beneficiarios indirectos del proyecto.

**5. Explicar de cuales capacidades técnicas dispone la Organización para desarrollar el proyecto. Y, en caso de no disponer de ellas hasta el momento, de qué manera las gestionará y para qué temas.**

Actualmente la organización no dispone de capacidades técnicas, la municipalidad de Jesus de Otoro les brinda la asistencia técnica en las diferentes gestiones que realiza la comunidad. Es necesario fortalecerlas con diferentes capacitaciones.

Para algunos temas se gestionara ante el ICF, SAG, Municipalidad y PC Ruta Lenca; la asistencia técnica para el desarrollo del proyecto será ejercido por Municipalidad en conjunto con el grupo de Mujeres el CIPRES la que estará constante en el monitoreo y seguimiento de calidad, para asegurar el éxito del proyecto.

**V. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.**

**1. Explicar cómo van a permanecer en el tiempo los resultados una vez terminado el proyecto.**

El resultado de generación de ingreso mediante la comercialización de los productos agrícolas tradicionales y los derivados de algunos productos de la cosecha una vez terminada el proyecto reflejara incremento en los ingresos económicos, por sus diferentes convenios, promociones y publicidad que realicen a nivel del municipio a través del centro de información turismo cultural de la municipalidad, lo que repercutirá en la disponibilidad de recursos económicos para mantener los servicios gastronómicos que se brindaran en la caseta en la comunidad.

El nivel de apoyo técnico de la municipalidad se consolidara durante el proyecto y contara con un profesional que garantizara la asesoría administrativa en el manejo de los recursos económicos.

El resultado manejo y uso adecuado del sistema de riego asociado a la protección y conservación del bosque que poseen la comunidad beneficiaria a las parcelas de la producción agrícola tradicional.

**2. En caso de generar un producto para la venta, indicar a qué mercado está dirigido y cómo sabemos si existe demanda del mismo.**

El grupo beneficiario brindara servicios de gastronomía derivados del maíz, comercialización de granos básicos (frijol y maíz) y hortalizas dirigido a mercados municipales y nacionales, se ha identificado un buen mercado nacional en el caso de la comercialización de granos básicos y hortalizas la población demanda que lo productos sean orgánicos, para la gastronomía de platillos lenca tienen mucha demanda a nivel municipal y nacional; pero se espera que mediante una buena promoción y publicidad se pueda ir aumentando paulatinamente dicha demanda.

En un futuro a corto plazo la comunidad puede brindar servicios turísticos culturales ya que tenemos potenciales contamos: con una cueva, laguna y bosque para realizar actividades de caminatas por medio de senderos, visitas a nuestras parcelas agrícolas, visitas a las fincas de café.

**3. En caso de generar un producto, indicar cuál será la rentabilidad (precio de venta menos costos de producción y transacción).**

La organización brindara servicios de venta de granos básicos y hortalizas orgánicos al precio de mercado y se ha mostrado que es muy rentable y que la comunidad ha recibido ganancias.

El otro producto que genera ganancia es la venta de platillos de la gastronomía lenca hemos tenido visitas nacionales y carecemos de este servicio que solicitan los turistas y brindarle un servicio de gastronomía con los estándares de calidad de salud, consumo de alimentos generaría ganancias al grupo de mujeres del CIPRES.



<p>Compra de materiales para la siembra y cosecha de productos agrícolas tradicionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales de uso para la siembra y cosecha de productos agrícolas tradicionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Factura de gastos de viaje.</li> <li>• Acta de entrega de materiales.</li> </ul>													
<p>Cosecha de la producción agrícola tradicional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos de la cosecha (maíz, frijoles y hortalizas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listado de participantes de la cosecha de productos agrícolas.</li> <li>• Horario de turnos y responsables para la cosecha.</li> </ul>													
<p>Secado y tapiscado de frijoles y maíz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maíz, frijol secado y tapiscado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horario de turnos y los responsables firmada por el responsable y revisada por el comité de vigilancia</li> </ul>													
<p>Compra de materiales y equipos para las mejoras que se realizaran en la caseta donde se almacenara la producción agrícola tradicional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorada la caseta.</li> <li>• Productos almacenados y seguros.</li> <li>• Equipos instalados en las casetas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Factura de gastos de viaje.</li> <li>• Acta de entrega de materiales.</li> <li>• Contrato de mano de obra.</li> </ul>													
<p>Venta de productos y derivados del maíz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Venta de productos agrícolas tradicionales y derivados (Gastronomía Lenca)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recibos y facturas de ventas de productos.</li> <li>• Libro contable</li> <li>• Horario turnos y de responsables de la venta de productos y gastronomía lenca.</li> </ul>													





## VII. PRESUPUESTO

presupuesto de proyecto: Mejoramiento de la producción agrícola tradicional de la comunidad Lenca Llano Largo el Potrero por medio de un Sistema de Riego

Código	Concepto	Unidades	Cantidad	Costo Unitario/L.	Costo Total/L.	Aporte del PPD	Aporte local	Aporte efectivo
<b>Inversiones</b>								
<b>1</b>	<b>Infraestructura</b>				<b>150,500.00</b>	<b>150,500.00</b>		<b>-</b>
1.1.1	Construcción Obra Toma	global	1	20,500.00	20,500.00	20,500.00	-	-
1.1.2	Construcción del Tanque	global	1	86,500.00	86,500.00	86,500.00	-	-
1.1.3	Mejoramiento de Caseta para almacenamiento producción agrícola.	Caseta	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-
1.1.4	Mejoramiento de Caseta para venta comida tradicional. (Gastronomía Lenca)	Caseta	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-
1.1.5	Fogón Ecológico	c/u	1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-
<b>1.2</b>	<b>Equipo</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>-</b>
1.2.1	Armario de madera	c/u	3	500.00	1,500.00	1,500.00	-	-
1.2.2	Mesas para caseta y cocina	c/u	7	1,500.00	10,500.00	10,500.00	-	-
1.2.3	Cajón para almacenamiento de comida	c/u	3	1,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-
1.2.4	Sillas para caseta y cocina	c/u	21	400.00	8,400.00	8,400.00	-	-
<b>2</b>	<b>INSUMOS y HERRAMIENTAS</b>				<b>386,545.00</b>	<b>386,545.00</b>		
2.1	Machete	unidad	8	75.00	600.00	600.00	-	-

2.2	Azadon	unidad	8	90.00	720.00	720.00	-	-
2.3	Pala	unidad	8	150.00	1,200.00	1,200.00	-	-
2.4	Piocha	unidad	8	250.00	2,000.00	2,000.00	-	-
2.5	Barra	unidad	2	1,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-
2.6	Carreta	unidad	4	1,100.00	4,400.00	4,400.00	-	-
2.7	Cegueta	unidad	2	250.00	500.00	500.00	-	-
2.8	Bomba de Mochila	unidad	8	1,500.00	12,000.00	12,000.00	-	-
2.9	Clavos	libras	10	20.00	200.00	200.00	-	-
2.10	Tubos PVC	unidad	1288	190.00	244,720.00	244,720.00	-	-
2.11	Válvulas	unidad	4	370.00	1,480.00	1,480.00	-	-
2.12	Codos	unidad	5	35.00	175.00	175.00	-	-
2.13	Pegamento	lata	1	850.00	850.00	850.00	-	-
2.14	Arena	viaje	2	3,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-
2.15	Grava	viaje	2	3,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-
2.16	Cinta de Riego	rollo	9	3,000.00	27,000.00	27,000.00	-	-
2.17	Piedra	viaje	2	3,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-
2.18	Alambre de Pua	Rollo	5	1,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-
2.19	Comal	Unidades	8	100.00	800.00	800.00	-	-
2.20	Basureros	Unidades	6	250.00	1,500.00	1,500.00	-	-

2.21	Picheles	Unidades	6	200.00	1,200.00	1,200.00	-	-
2.22	Azafate	Unidades	6	250.00	1,500.00	1,500.00	-	-
2.23	Botas de hule	Unidades	8	150.00	1,200.00	1,200.00	-	-
2.24	Ollas Grades	Unidades	4	500.00	2,000.00	2,000.00	-	-
2.25	Cucharones	Unidades	4	150.00	600.00	600.00	-	-
2.26	Tazas barro rojo	Unidades	20	35.00	700.00	700.00	-	-
2.27	Platos de barro rojo	Unidades	20	40.00	800.00	800.00	-	-
2.28	Vasos barro rojo	Unidades	20	60.00	1,200.00	1,200.00	-	-
2.29	Cubiertos (cucharas, tenedores y cuchillos de mesa)	Juegos	10	150.00	1,500.00	1,500.00	-	-
2.30	Compra de Semillas de Frijoles	Sacos	4	1,500.00	6,000.00	6,000.00	-	-
2.31	Compra de Semillas de Maiz (diferentes semillas)	Sacos	4	800.00	3,200.00	3,200.00	-	-
2.32	Compra de semillas de Hortalizas (diferentes semillas)	Sobres	200	150.00	30,000.00	30,000.00	-	-
2.33	Compra de Sacos	Unidad	100	10.00	1,000.00	1,000.00	-	-
2.34	Compra de Lonas	Unidad	10	500.00	5,000.00	5,000.00	-	-
2.35	Materiales abono organico		1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-
<b>3</b>	<b>Fortalecimiento Organizacional</b>				<b>115,500.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1	Socialización del proyecto	Reuniones	1	5,000.00	5,000.00	4,000.00	-	-
3.2	Asamblea General de socios	Reuniones	3	2,500.00	7,500.00	10,000.00	-	-
3.3	Taller Administrativo de proyecto PPD	Jornada	1	5,000.00	5,000.00	4,000.00	-	-

3.4	Taller de preparación de alimento	Jornada	3	3,000.00	9,000.00	5,000.00	-	-
3.5	Taller de administración y contabilidad de negocios	Jornada	2	5,000.00	10,000.00	8,000.00	-	-
3.6	Taller atención al cliente para organizaciones locales.	Jornada	2	5,000.00	10,000.00	8,000.00	-	-
3.7	Taller de formulación de proyecto	jornada	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-
3.8	Taller proceso administrativo	jornada	2	10,000.00	20,000.00	8,000.00	-	-
3.9	Taller sobre Derechos Colectivos e individuales	jornada	3	8,000.00	24,000.00	5,000.00	-	-
3.10	Talleres capacitación Agricultura Ecológica. (Abono orgánico y otros)	jornada	4	5,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-
3.11	Taller Conservación y Protección Cuencas Hidrográficas (Reforestación y otras actividades)	jornada	3	5,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-
<b>4</b>	<b>JORNALES</b>				<b>143,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>-</b>
4.1	Excavación para Tubería	global	8	9,000.00	72,000.00	-	72,000.00	
4.2	Mano de Obra Calificada	global	1	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	
4.3	Mano de Obra No Calificada	global	8	4,500.00	36,000.00	-	36,000.00	
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6000.00</b>	<b>5280,000.00</b>	
5.1	Permiso para la obra	global	2	3,000.00	6,000.00	6,000.00	-	
5.2	Parcelas para la producción Agrícola Tradicional (1 manzana tiene 16 tareas)	manzanas	8	5120,000.00	5120,000.00	-	5120,000.00	
5.3	Terreno instalación de Sistema de Riego y Tanque.	tareas	4	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	
<b>6</b>	<b>TRANSPORTE</b>				<b>8,400.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>2,400.00</b>	
6.1	Transporte de Materiales	viaje	2	3,000.00	6,000.00	6,000.00	-	
6.2	Descarga de Materiales	global	16	150.00	2,400.00	-	2,400.00	

<b>7</b>	<b>Monitoreo y Evaluación</b>				<b>3,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>-</b>	
7.1	Monitoreo Municipalidad	Gira	2	1,500.00	3,000.00	6,000.00	-	-
<b>8</b>	<b>Gastos Operativos</b>							
<b>8.1</b>	<b>Gastos de viaje</b>				<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.1	Gastos de viajes (Llano-Jesús de Otoro-Intibuca)	viajes	3	10,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-
8.1.2	Fletes	Viajes	2	3,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-
<b>9</b>	<b>Gastos de oficina/materiales</b>				<b>11,861.00</b>	<b>11,861.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1	Papelería y materiales	Varios	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-
9.2	Teléfono e internet para gestión	Mes	12	300.00	3,600.00	3,600.00	-	-
9.3	Presentación de Informes	Docs.	3	1,087.00	3,261.00	3,261.00	-	-
<b>SUB TOTAL COSTOS OPERATIVOS</b>					<b>47,861.00</b>	<b>47,861.00</b>	<b>-</b>	
<b>SUB SUB TOTAL PROYECTO</b>					<b>875,806.00</b>	<b>729,906.00</b>	<b>5390,400.00</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Estimación de Riesgo (3%)</b>				26,274.18	21,897.18	-	-
<b>SUB TOTAL PROYECTO</b>						<b>751,803.18</b>	<b>5390,400.00</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Contratación de terceros</b>				<b>116,784.96</b>	<b>116,784.96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1	Acompañamiento Técnico (16%)	Contrato	1	116,784.96	116,784.96	116,784.96	-	-
<b>GRAN TOTAL PROYECTO HNL</b>					<b>1018,865.14</b>	<b>868,588.14</b>	<b>5390,400.00</b>	<b>-</b>
<b>Porcentajes</b>					<b>100%</b>	<b>85%</b>	<b>529%</b>	<b>0%</b>
<b>Gran total de valor del proyecto en USD</b>					<b>46,544.78</b>	<b>39,679.68</b>	<b>246,249.43</b>	<b>-</b>
