

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
PERFIL DE PROYECTOS
AGOSTO 2017

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CUNETAS EN COL.
BUENA VISTA, COL. LA HACIENDA Y BO. EL RASTRO
(RECONSTRUCCION).**




DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

Extensión Territorial: 39.34 km²

Población: 26,084 personas

Ubicación geográfica

El Municipio de Pimienta se encuentra ubicado en el departamento de Cortés, al noreste del país. Se desarrolla principalmente a lo largo de la carretera CA-5 Norte que conecta a esa zona con el centro del país.

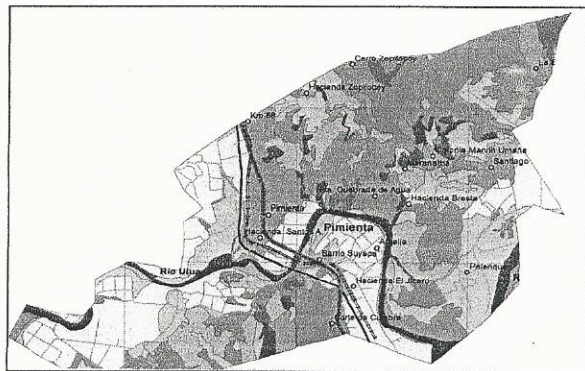

Ubicación: Geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas:

desde	87°	58'	hasta	87°	58'	Longitud
		06"		40"		Oeste
desde	15°	16'	hasta	15°	17'	Latitud Norte
		49"		08"		

Colindancias:


Norte: Municipios de San Manuel y Villanueva

Sur: Municipio de Potrerillos

Este: Municipio de El Progreso, Depto. de

Yoro

Oeste: Municipio de Villanueva



Altura: 60 msnm (promedio)


Relieve: La conformación de la superficie terrestre del municipio es plana ya que se encuentra, en su totalidad en un valle, con pendientes características que van de 0 a 5% de inclinación.

Acceso: El acceso al municipio se hace por la carretera CA-5 Norte, la cual cruza el municipio de norte a sur y conecta a las ciudades de Tegucigalpa con San Pedro Sula. Pimienta se ubica a escasos 26 km de San Pedro Sula.


Historia del municipio

El municipio de Pimienta se ubica en el Valle de Sula, en la parte sur del departamento de Cortés y es bañado por el caudaloso Río Ulúa.

A sólo 3 km río abajo se localiza la unidad maya de Cerro Palenque, habitada hace más de 200 años y que, como parte del Patrimonio Cultural Tangible, es un sitio arqueológico actualmente reconocido como Monumento Arqueológico. Históricamente una considerable colonia de ciudadanos árabes, palestinos y centroamericanos instalaron sus negocios y empresas en Pimienta, dedicándose en su mayoría a la distribución de mercadería para el occidente de Honduras por la vía fluvial, lo mismo que como intermediarios en la explotación de varios

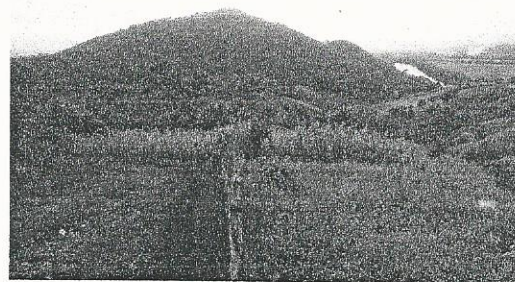

productos provenientes del occidente. La zona de explotación del ferrocarril nacional representa una parte muy importante del desarrollo de Pimienta, con una sección de línea, patios de acopio y fuentes de empleo para muchos ferrocarrileros.

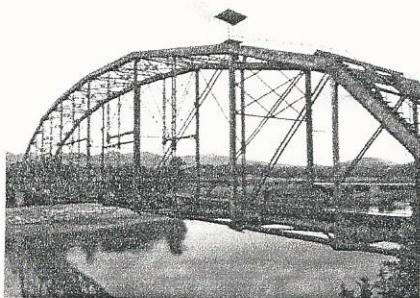

En 1914, con la inauguración del puente ferroviario, queda totalmente comunicada la zona de Potrerillos, ocupando Pimienta el lugar comercial de mayor crecimiento, pues las compañías bananeras instalaron allí la pagaduría de fruta de San Manuel, Villanueva y Potrerillos.

El 7 de junio de 1934, siendo alcalde municipal don Alfonso Pineda Torres, el río Ulúa en una enorme crecida arrasó con el poblado de Pimienta causando daños incalculables, por lo cual en 1936 la población es trasladada al nuevo sitio, conocido como Nueva Pimienta.

Aldeas	Aldea Santiago Aldea La Venta
	Total de Viviendas Urbano: 3,517 Rural: 2,703
Recursos Naturales	Cerro el Palenque Río Ulúa
Infraestructura Principal	<u>RED VIAL</u> Carretera Interoceánica Carretera Secundaria
	<u>CENTROS EDUCATIVOS</u> Pre-escolares: 9 Escuelas: 9 Centro Básico 1 Colegios: 4
	<u>CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA</u> Cesamo en Santiago Cesamo en Pimienta Filial Cruz Roja Hondureña Clínica de Odontología
	<u>PARQUES RECREATIVOS</u> Parque Central en Santiago Parque Central en Pimienta Parquecito en Bo. Suyapa
	<u>CENTROS SOCIALES</u> Centro Cívico Municipal
	<u>CENTROS DEPORTIVOS</u> Cancha Fútbol Col. Esquipulas con Graderías Estadio Municipal Santiagueño Rosendo Dubon

ALDEA SANTIAGO	
1	Bo. Las Flores
2	Bo. Los Almendros
3	Bo. La Escuela
4	Bo. El Palenque
5	Bo. La Zona
6	Bo. La Bomba
7	Bo. Las Guaras
8	Bo. Abajo
9	Col. Velásquez Cabrera
10	Col. Marvin Umaña N 2
11	Sector La Bomba
PIMIENTA	
1	Bo. Suyapa
2	Bo. El Playón
3	Bo. El Terraplén
4	Bo. El Rastro
5	Bo. El Platel
6	Bo. Las Acacias
7	Bo. El Bosque No. 1
8	Bo. El Bosque No. 2
9	Bo. El Tanque No. 1
10	Bo. El Tanque No. 2
11	Bo. El Centro
12	Col Esquipulas
13	Col. El Jordán
14	Col. Villas del Carmen
15	Col. San Ramón
16	Col. Alemania No. 1
17	Col. Alemania No. 2
18	Col. Episcopal
19	Col. Cruz Roja
20	Col. La Promesa
21	Col. KM 86
22	Col. Buena Vista
ALDEA LA VENTA	
1	Caratasca
2	Ulúa
3	San Antonio



CERTIFICACIÓN

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE TÉRMINO CERTIFICA QUE EN EL LIBRO DE ACTAS QUE LLEVA ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014-2018, SE ENCUENTRA EL ACTA CUYO PREAMBULO Y PUNTO CONDUCENTE LITERALMENTE DICE: ACTA No. 409, EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES A LOS 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 EN SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE PIMIENTA CORTES. - DR. RAUL ALFREDO UGARTE ALCALDE MUNICIPAL, LOS SEÑORES REGIDORES: HECTOR EDUARDO FUENTES, PROF. ALEJANDRO RAMOS MARMOL, JESSICA YAMILETH UMAÑA, NORBERTO LOPEZ GUILLEN, JUAN PABLO CUELLAR, JOSE HERNAN ORTIZ, CELSO PERDOMO AGUILAR, LUISA MADELY ANTUNEZ, ANTE LA SUSCRITA SECRETARIA QUE DA FE.1°.....2°.....3°.....4°.....5°.....6°
7°.-EL SR. HENRY RODAS EN CALIDAD DE JEFE DE PROYECTOS Y AUXILIADO DEL P.M. Y CONTADOR MUNICIPAL JESUS ALBERTO DUBON, PRESENTAN EL SIGUIENTE INFORME:

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2017 TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS DE PROYECTOS

Fecha de Aprobación 14 de Agosto del año 2017

Cuenta de Egresos a Disminuirse

Estructura del Ingreso	Descripción	Cantidad
15	INFRAESTRUCTURA	L. 186,500.00
15-00	Sub Programa	186,500.00
15-00-003-001-000-24200-11-001-01	Proyecto de Levantamiento y Estudios Topográficos de la Red Vial	114,864.16
15-00-005-000-001-47110-11-001-01	Proyecto de Adición de Oficinas del Palacio Municipal I Etapa, Bo. El Centro, Pimienta	71,635.84
TOTAL EGRESOS		L. 186,500.00

Cuenta de Egresos a Aumentarse

Estructura del Ingreso	Descripción	Cantidad
12	VIDA MEJOR	L. 30,000.00
12-01	Educación	30,000.00
12-01-012-000-001-47110-11-001-01	Proyecto de Mejoramiento de Kinder Vilma Malta de Aldea Santiago(Compra e Instalación de Ventiladores)	10,000.00
12-01-013-000-001-47110-11-001-01	Contraparte a Proyecto de Mejoramiento de Sanitarios, Canalización del Techado de Aulas e Iluminación de Pasillos del Auditorio en Esc. Hector Virgilio Barahona	20,000.00
15	INFRAESTRUCTURA	L. 156,500.00
15-02	Construcciones de Canales de Drenajes	156,500.00
15-02-012-000-001-47210-11-001-01	Proyecto de Mejoramiento de Cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro (Reconstrucción)	104,500.00
15-02-013-000-001-47210-11-001-01	Proyecto de Construcción de Canalización de Aguas Servidas y Pluviales en Bo. El Centro, Ref. Centro Cívico	52,000.00
TOTAL EGRESOS		L. 186,500.00

LOS SEÑORES CORPORATIVOS SE DIERON POR ENTERADOS A SATISFACCION Y APROBARON POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS DE PROYECTOS.

CERRÓ LA SESION A LAS 8: 00 P. M. SELLO Y FIRMA.- ALCALDE MUNICIPAL, LOS SEÑORES REGIDORES: HECTOR EDUARDO FUENTES, ALEJANDRO RAMOS MARMOL, JESSICA YAMILETH UMAÑA, NORBERTO LOPEZ GUILLEN, JUAN PABLO CUELLAR, JOSE HERNAN ORTIZ, CELSO PERDOMO AGUILAR, LUISA MADELY ANTUNEZ PINEDA, ANTE - ANTE LA COMISION DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, SELLO Y FIRMA.- SECRETARIA MUNICIPAL ES CONFORME A SU ORIGINAL.- SE EXTIENDE EN PIMIENTA, CORTES: A LOS 14 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

MARGARITA PONCE RUBIO
SECRETARIA MUNICIPAL



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONO: (504) 2650-2180



JUSTIFICACIÓN

Pimienta, Cortes. 17 de Agosto 2017

En las fuertes lluvias de los meses anteriores, se produjeron varios daños como ser inundaciones de viviendas, derrumbamiento de cercos perimetrales, en este caso derrumbamiento de las paredes y pisos de varias cunetas, en los sectores de: Col. Buenavista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro, donde las cunetas quedaron obstruyendo el paso del agua y saltaban a las calles, inmediatamente se procedió a levantar los materiales desechados quedando las cunetas sin las paredes en varios tramos, en las cuales se han erosionado con las lluvias, es por ello que se procederá a realizar la reconstrucción de las mismas para evitar se sigan dañando juntamente con las calles.



Henry Javier Rodas
Unidad de Proyectos

COTIZACION DE MANO DE OBRA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CUNETAS EN COL. BUENA VISTA , COL. LA HACIENDA Y BO. EL RASTRO (RECONSTRUCCION), PIMIENTA, CORTES

UBICACIÓN: COL.BUENA VISTA ,COL. LA HACIENDA Y BO.EL RASTRO, PIMIENTA, CORTES.

CONSTRUCTOR. MARIO AGUSTIN LOPEZ CARDENAS 0504-1982-00044

PARA: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

50	ML	FUNDICION DE PISO DE CUNETA	200.00	10,000.00
100	M ²	PEGADO DE BLOQUES	110.00	11,000.00
80	ML	FUNDICION DE SOLERA	150	12,000.00
20	ML	FUNDICION DE SOLERA SEPARADORA	110	2,200.00
20	ML	FUNDICION DE LOSA	120.00	2,400.00

TOTAL 37,600.00

Mario Agustín López

MARIO AGUSTIN LOPEZ CARDENAS
IDENTIDAD NO. 0504-1982-00044

COTIZACION DE MANO DE OBRA

PROYECTO: REPARACION DE CUNETAS EN COL. BUENA VISTA , COL. LA
HACIENDA Y BO. EL RASTRO

UBICACIÓN: COL. LA HACIENDA, BO.EL RASTRO,COL.BUENA VISTA , PIMIENTA, CORTES.


CONSTRUCTOR. JUAN CARLOS LOPEZ GUILLEN 0504-1979-00150

PARA: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

FECHA: 31 AGOSTO DEL AÑO 2017

20	ML	FUNDICION DE LOSA	130.00	2,600.00
100	M ²	PEGADO DE BLOQUES	120.00	12,000.00
20	ML	FUNDICION DE SOLERA SEPARADORA	121	2,420.00
80	ML	FUNDICION DE SOLERA	160	12,800.00
50	ML	FUNDICION DE PISO DE CUNETAS	205.00	10,250.00

TOTAL 40,070.00



JUAN CARLOS LOPEZ GUILLEN
IDENTIDAD NO. 0504-1979-00150

COTIZACION DE MANO DE OBRA

PROYECTO: REPARACION Y CONSTRUCCION DE TRAMO DE CUNETAS EN COL. BUENA VISTA , BO. EL RASTRO Y COL. LA HACIENDA

UBICACIÓN: BO.EL RASTRO ,COL.BUENA VISTA Y COL. LA HACIENDA , PIMIENTA, CORTES.


CONSTRUCTOR. JUAN MIGUEL MARTINEZ 0501-1958-01170

PARA: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

FECHA: 31 AGOSTO DEL AÑO 2017



80	ML	FUNDICION DE SOLERA	160	12,800.00
20	ML	FUNDICION DE SOLERA SEPARADORA	115	2,300.00
50	ML	FUNDICION DE PISO DE CUNETA	215	10,750.00
100	M ²	PEGADO DE BLOQUES	138	13,800.00
20	ML	FUNDICION DE LOSA	130	2,600.00

42,250.00



Juan Miguel Martinez

IDENTIDAD 0501-1958-01170



ACTA DE APERTURA DE INICIO DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro(Reconstrucción)

Dirección: Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro, Pimienta, Cortes

Procedencia de fondos: Municipalidad de Pimienta, Cortes.

Nosotros: Henry Javier Rodas Andino Identidad No. **0612-1982-00120** en carácter de Jefe de la Unidad de Proyectos de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el **Sr. Mario Agustín López Cardenas** Con Identidad 0504-1982-00044 quien actúa en su condición de contratista hemos acordado la ejecución del Proyecto: **Mejoramiento de Cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro, (Reconstrucción)** del Municipio de Pimienta, Cortes, el cual consiste en: 50 ML Fundición de Piso de Cuneta, 100 M² Pegado de Bloques, 80 ML Fundición de Solera, 20 ML Fundición de Solera Separadora, 20 ML Fundición de Losa.


El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida el 04 de Septiembre al 14 de Octubre del año 2017. Con un valor de mano de obra de L. 37,600.00 (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS). Por parte del Sr. Mario Agustín López Cardenas nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para dar inicio, procediéndose de la siguiente forma:


Primero: El contratista manifiesta que da inicio a la obra: El día Lunes 04 de Septiembre, para ejecución del proyecto: Mejoramiento de Cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro, (Reconstrucción) Pimienta, Cortes

Segundo: Se socializo con la comunidad beneficiaria, las diferentes actividades de trabajo acordando dar inicio al proyecto.


Tercero: Todas las partes aceptan lo antes expuesto para lo de lo cual firmamos la presente a los 04 días del mes de Septiembre de 2017.



Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad No. 0501-1960-01209
Contratante




Henry Javier Rodas Andino
Identidad No. 0612-1982-00120
Jefe de Proyectos




Representante de la comunidad
Nombre Arnoldo Reses
Identidad No. 1804-1989-01923


Sr. Mario Agustín López Cardenas
Identidad No. 0504-1982-00044
Contratista

PRESUPUESTO INICIAL

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CUNETAS EN COL. BUENA VISTA, COL. LA
HACIENDA Y BO. EL RASTRO (RECONSTRUCCION)

CANT.	DESCRIPCIÓN DE MATERIAL	PRECIO/UN.	TOTAL
1450	BLOQUES DE 6"	12.3	L. 17,835.00
105	BOLSAS DE CEMENTO	210	L. 22,050.00
115	VARILLAS LEGITIMA 3/8	115	L. 13,225.00
20	VARILLAS LEGITIMA 1/2	195	L. 3,900.00
40	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	20	L. 800.00
12	VARILLAS LISA 1/4	45	L. 540.00
5	VIAJES DE ARENA	1150	L. 5,750.00
6	LAMINAS DE ZINC 12	180	L. 1,080.00
10	TABLAS DE 1X6X12	162	L. 1,620.00
5	LIBRAS DE CLAVOS DE 3"	20	L. 100.00
TOTAL			L. 66,900.00

PAGO DE MANO DE OBRA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
50	ML	FUNDICIÓN DE PISO DE CUNETA	200	L. 10,000.00
100	M ²	PEGADO DE BLOQUES	110	L. 11,000.00
80	ML	FUNDICIÓN DE SOLERA	150	L. 12,000.00
20	ML	FUNDICIÓN DE SOLERA SEPARADORA	110	L. 2,200.00
20	ML	FUNDICIÓN DE LOSA	120	L. 2,400.00
*****Total Mano de Obra				L. 37,600.00

TOTAL GENERAL			L. 104,500.00
----------------------	--	--	----------------------

CONTRATO

**PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CUNETAS EN LA COL. BUENA VISTA, COL.
LA HACIENDA Y BO. EL RASTRO (RECONSTRUCCIÓN), PIMIENTA, CORTES.**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #05011960012095 declarado Alcalde por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 13 de Diciembre del 2013 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Sr. MARIO AGUSTIN LOPEZ CARDENAS quien se denomina EL CONTRATISTA mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Pimienta, Cortés, y con Identidad # 0504-1982-00044, R.T.N # 05041982000448 hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en: Fundición de 50 M.L de piso de cuneta, pegado de 100 m² de bloques, fundición de 80 M.L de solera, fundición de 20 M.L de solera reparadora y fundición de 20 M.L de losa.

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 04 de septiembre al 14 de octubre del año 2017.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor por mano de obra de LPS. 37,600.00 (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) los que se cancelaran en un solo desembolso una vez supervisados y entregados los trabajos. Se le hará la retención del 12.5% equivalente a Lps. 4,700.00 ya que el contratista no tiene constancia de pagos a cuenta.

CLAUSULA No... 4 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara una multa de Lps. 300.00 por día de retraso por incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del contratista.

CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá de dotar de sus herramientas necesarias para la ejecución de la obra.

CLAUSULA No... 6 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El contratista promete la calidad de su trabajo otorgando un periodo de 90 días de garantía a partir del día de la finalización del contrato, responsabilizándose hacer mejoras por desperfecto de mala calidad si sucediere durante su tiempo de garantía por fallas que sean únicamente por mala praxis de su oficio.

CLAUSULA No... 7 OBLIGACION DEL CONTRATISTA:

El contratista está obligado a cumplir con los requisitos establecidos en el plan de Arbitrios Vigente, previo a comenzar la obra.

CLAUSULA No.... 8 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Jefe de Proyectos, encargado de la supervisión y el departamento de Auditoria o cualquier institución contralor del estado podrá supervisar la obra durante su ejecución en cualquier momento.

CLAUSULA No.... 9 TRIBUNAL COMPETENTE:


Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la negociación directa entre el contratante y el contratista, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado Paz del Municipio de Pimienta, Cortés y/o Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

CLAUSULA No....10 RATIFICACIÓN:

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 02 de Septiembre del año 2017.


Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad. # 0501-1960-01209
Alcalde Municipal
Contratante


Henry Javier Rodas
Identidad # 0612-1982-00120
Supervisor de la Obra


Mario Agustín López Cárdenas
Identidad. # 0504-1982-000448
Contratista



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
08 de Septiembre 2017

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de mejoramiento de cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro (Reconstrucción).
UBICACION	Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro, Pimienta, Cortes
FINANCIAMIENTO	Fondos de transferencia #15-02-012-000-001-47210-11-001-01
CONTRATISTA	Sr. Mario Agustín López Cárdenas Identidad: 0504-1982-00044
CONTRATO	Valor. L. 37,600.00 Inicio: 04/09/2017 Finalización: 14/10/2017

Sr. José Moisés Pérez
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de mejoramiento de cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro (Reconstrucción)**, durante la fecha que comprende del día **lunes 04 al sábado 09 de Septiembre del año 2017**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- Se completo 10 m.L de fundición de piso de cuneta, equivalente al 20%.
- Se completo 30 m² de pegado de bloques, equivalente al 30%.
- Se completo 25 m.L de fundición de solera, equivalente al 31.25%.
- Se completo 10 m.L de fundición de solera separadora, equivalente al 50%.
- Se completo 20 m.L de fundición de losa, equivalente al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 33.38% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 12,550.00 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA**

Henry Javier Rodas Andino
Jefe de Proyectos





INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
14 de Septiembre 2017

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de mejoramiento de cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro (Reconstrucción).
UBICACION	Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro, Pimienta, Cortes
FINANCIAMIENTO	Fondos de transferencia #15-02-012-000-001-47210-11-001-01
CONTRATISTA	Sr. Mario Agustín López Cárdenas Identidad: 0504-1982-00044
CONTRATO	Valor. L. 37,600.00 Inicio: 04/09/2017 Finalización: 14/10/2017

Sr. José Moisés Pérez
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de mejoramiento de cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro (Reconstrucción)**, durante la fecha que comprende del día lunes 11 al sábado 16 de Septiembre del año 2017. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- Se completo 10 m.L de fundición de piso de cuneta, equivalente al 40%.
- Se completo 25 m² de pegado de bloques, equivalente al 55%.
- Se completo 20 m.L de fundición de solera, equivalente al 44.58%.
- Se completo 5 m.L de fundición de solera separadora, equivalente al 75%.

Hasta la fecha se han concluido a un 55.45% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 8,300.00 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA**



Henry Javier Rodas Andino
Jefe de Proyectos



INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
21 de Septiembre 2017

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de mejoramiento de cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro (Reconstrucción).
UBICACION	Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro, Pimienta, Cortes
FINANCIAMIENTO	Fondos de transferencia #15-02-012-000-001-47210-11-001-01
CONTRATISTA	Sr. Mario Agustín López Cárdenas Identidad: 0504-1982-00044
CONTRATO	Valor. L. 37,600.00 Inicio: 04/09/2017 Finalización: 14/10/2017

Sr. José Moisés Pérez
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de mejoramiento de cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro (Reconstrucción)**, durante la fecha que comprende del día **lunes 18 al sábado 23 de Septiembre del año 2017**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- Se completo 15 m.L de fundición de piso de cuneta, equivalente al 70%.
- Se completo 25 m² de pegado de bloques, equivalente al 80%.
- Se completo 15 m.L de fundición de solera, equivalente al 63.33%.

Hasta la fecha se han concluido a un 76.9% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 8,000.00 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA**



Henry Javier Rodas Andino
Jefe de Proyectos



INFORME DE SUPERVISION Y CANCELACION DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
28 de Septiembre 2017

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de mejoramiento de cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro (Reconstrucción).
UBICACION	Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro, Pimienta, Cortes
FINANCIAMIENTO	Fondos de transferencia #15-02-012-000-001-47210-11-001-01
CONTRATISTA	Sr. Mario Agustín López Cárdenas Identidad: 0504-1982-00044
CONTRATO	Valor. L. 37,600.00 Inicio: 04/09/2017 Finalización: 14/10/2017

Sr. José Moisés Pérez
Tesorero Municipal

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de mejoramiento de cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro (Reconstrucción)**, durante la fecha que comprende del día **lunes 25 al sábado 30 de Septiembre del año 2017**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- Se completo 15 m.L de fundición de piso de cuneta, equivalente al 100%.
- Se completo 20 m² de pegado de bloques, equivalente al 100%.
- Se completo 20 m.L de fundición de solera, equivalente al 100%.
- Se completo 5 m.L de fundición de solera separadora, equivalente al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 100% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 8,750.00 COMO CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA**

Henry Javier Rodas Andino
Jefe de Proyectos





Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro (Reconstrucción)

Dirección: Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro, Pimienta, Cortes

Procedencia de fondos: Municipalidad de Pimienta, Cortes.

Nosotros: Henry Javier Rodas Andino Identidad No. 0612-1982-00120 en carácter de Jefe de la Unidad de Proyectos de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el **Sr. Mario Agustín López Cárdenas** Con Identidad 0504-1982-00044 quien actúa en su condición de contratista hemos acordado la ejecución del Proyecto: **Mejoramiento de Cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro, (Reconstrucción)** del Municipio de Pimienta, Cortes, el cual consiste en: 50 ML Fundición de Piso de Cuneta, 100 M² Pegado de Bloques, 80 ML Fundición de Solera, 20 ML Fundición de Solera Separadora, 20 ML Fundición de Losa.


El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida el 04 de Septiembre al 14 de Octubre del año 2017. Con un valor de mano de obra de L. 37,600.00 (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS) Por parte del Sr. Mario Agustín López Cárdenas nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para efectuar la recepción final del mismo procediéndose de la siguiente forma:

Primero: El contratista manifiesta que ha finalizado la obra, el día Sábado 30 de Septiembre del año 2017, manifestando que finalizo la obra antes de lo que estipula el contrato, esto gracias a la ardua labor realizado por su personal y teniendo en cuenta la necesidad de finalizar esta obra en el menor tiempo posible.


Segundo: Los presentes procedieron a realizar un recorrido al proyecto, encontrando que este fue construido de acuerdo a las cláusulas plasmadas según contrato y especificaciones técnicas de mano de obra.

Tercero: Mediante este documento el contratista da por finalizada la obra: Mejoramiento de Cunetas en Col. Buena Vista, Col. La Hacienda y Bo. El Rastro, (Reconstrucción). Traspasando la misma al representante de la comunidad, quienes se comprometen a dar sostenibilidad a la obra terminada.


Cuarto: Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 30 días del mes Septiembre del año 2017.



Raúl Alfredo Ugarte Florentino
Identidad No. 0501-1960-01209
Alcalde Municipal




Henry Javier Rodas Andino
Identidad No. 0612-1982-00120
Jefe Proyectos




Representante de la Comunidad
Nombre: MARtha AD. TH Jensen
Identidad No. 0505 1966 00195


Sr. Mario Agustín López Cárdenas
Identidad No. 0504-1982-00044
Contratista

Mejoramiento de cunetas en la Col. Buena Vista, Col, La Hacienda y
Bo. El Rastro (Reconstrucción), Pimienta, Cortes.

