




SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

GERENCIA DE PROYECTOS

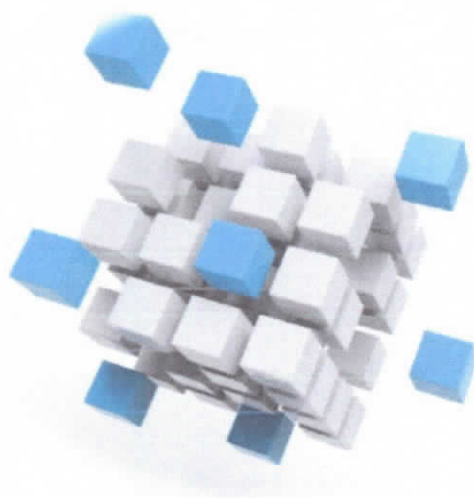

PROYECTOS:

**FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA EN
HONDURAS.**

**EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA/CHOLUTECA, CORTES/SAN
PEDRO SULA Y FRANCISCO MORAZÁN/ TEGUCIGALPA**

HONDURAS, C.A.

Febrero, 2020




SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

¡SALVAMOS VIDAS!

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO, (911).

IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS

- **Nombre de los proyectos:**
 1. Fortalecimiento del Centro de Operaciones de Tegucigalpa con la Construcción del Edificio Anexo Administrativo.
 2. Supervisión de la Construcción del Edificio Anexo Administrativo del SNE911, Tegucigalpa.
 3. Expansión y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), por medio de la creación de un centro de Coordinación y Operación en la ciudad de Choluteca, Choluteca.
 4. Contratación del Suministro de Mobiliario para el Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán.
- **Área que ejecuta los proyectos:** Gerencia de Proyectos del SNE911.
- **Periodo de reporte del proyecto:** Febrero, 2020
- **Tipo de proyecto:** Proyecto de Fortalecimiento de seguridad pública y Expansión Institucional.
- **Responsable de la ejecución de los proyectos:** Lic. Ronny Adalid García.
- **Cargo:** Gerente de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias 911.
- **Firma y Sello:** 





INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene información relacionada a los Proyectos para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras, el cual es realizado por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).

El proceso técnico, operativo y administrativo de estos proyectos son desarrollados por medio de Fondos de Inversiones y Asignaciones (FINA2). La Gerencia de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) es el responsable de supervisar y dar seguimiento a las actividades que se desarrollan durante el tiempo de duración de los proyectos.

Los proyectos se están desarrollando conforme al ciclo de vida de estos, desde la fase de inicio, seguido por la fase de planificación, implementación, control y seguimiento y culminación y/o cierre del mismo. Se dio inicio a la ejecución de las actividades y procesos operativos de estos proyectos seguido de la orden de inicio remitida por la Gerencia Administrativa.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Los proyectos para el “Fortalecimiento del sector de seguridad pública de Honduras”, busca brindar un aporte en la sociedad hondureña por medio de la mejora de las condiciones de seguridad pública de Honduras, específicamente en las ciudades de Choluteca, Choluteca, y Tegucigalpa, Francisco Morazán, que contará con un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de la sociedad hondureña y que logrará el fortalecimiento del estado de derecho, la protección de la integridad y seguridad de las personas, así como el disfrute de su libertad.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1. Propietario del Proyecto	Gobierno de la República de Honduras por medio del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).
2. Sector, sub sector	Seguridad
3. Nombres del Proyectos	▪ Construcción de Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán. ▪ Supervisión de la Construcción del Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la ciudad de Tegucigalpa. ▪ Construcción llave en mano del centro de coordinación y operación del sistema nacional de emergencias nueve, uno, uno (911) en la zona sur del país. ▪ Contratación del Suministro de Mobiliario para el Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán.
4. Ubicación de los Proyectos	Ciudades de Choluteca, Choluteca, y Tegucigalpa, Francisco Morazán.
5. Propósito	El incremento en los índices de delincuencia y la demanda por mayor seguridad por parte de la población hondureña ha generado que las autoridades del sector seguridad de este país busquen estrategias para disminuir estos altos índices que se registran en Honduras, es por esto que se ha decidido realizar varios proyectos durante el año 2019/2020, en la creación de un centro de operaciones 911 en la ciudad de Choluteca, Choluteca, que busca fortalecer el sector de Seguridad Pública de ese sector. Así como el fortalecimiento del SNE911 con la construcción del edificio administrativo en Tegucigalpa, Fco. Morazán, misma que va acompañada con una supervisión de la obra.

6. Descripción de los Proyectos	Una población que en forma constante se encuentra expuesta a condiciones de inseguridad en muy pocos casos logrará convertirse en un país, municipio y/o ciudad desarrollada. Uno de los principales desafíos del estado hondureño es adoptar y poner en práctica mecanismos que ayuden a mejorar las condiciones de seguridad pública y para ello las instituciones de seguridad deben esforzarse por trabajar de forma coordinada y sumar esfuerzos que logren fortalecer el sector de seguridad pública de Honduras.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance de los Proyectos (Principal Producto):	El proyecto se basa en la adquisición de hardware, software, diseño, implementación, construcción del centro de comando y despacho en la ciudad Choluteca, Choluteca., la instalación de ciento veinte (120) dispositivos aproximadamente (cámaras de seguridad fijas, PTZ y LPR) en la ciudad de Choluteca, Choluteca, así como la contratación de los servicios de transmisión de datos, seguros, comunicaciones, operaciones y fortalecimiento de las capacidades (capacitación) del personal operativo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), esto mediante un proceso de licitación como lo indica la ley de compras y contrataciones del Estado Licitación No. 001-2019 como un proyecto de llave en mano. El proyecto incluye las Ciudades de San Lorenzo 40 cámaras aprox. y Nacaome 40 cámaras aprox. en el Depto. Valle. Y la construcción del edificio anexo del Edificio Anexo Administrativo de Tegucigalpa. Así como la licitación de la contratación del suministro del mobiliario para el edificio administrativo anexo de la ciudad de Tegucigalpa.
2. Impacto en el desarrollo del programa	El principal impacto es buscar y brindar un soporte a la sociedad hondureña por medio de la mejora en las condiciones de seguridad pública de Honduras, específicamente en las ciudades de Tegucigalpa, Choluteca, con un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de la sociedad hondureña, logrará el fortalecimiento del estado de derecho, la protección de la

	integridad y seguridad de las personas, así como el disfrute de su libertad y la generación de fuentes de trabajo.
3. Detalles del Contacto	Gerencia de Proyectos, +504 2290-7800 Ext. 2102, Gerente de Proyectos Ronny Adalid García; correo electrónico: rgarcia@911.gob.hn
4. Fuente de Financiamiento	El presupuesto del proyecto es manejado por el Comité Técnico del Fideicomiso de FINA2
5. Fecha de Aprobación del Presupuesto de los Proyectos	03 de septiembre 2018
6 estado de los Proyectos (Actual, noviembre, 2019)	1. Actualmente (febrero, 2020) el proyecto de la construcción del Edificio Administrativo Anexo SNE911, Tegucigalpa se encuentra en su etapa de ejecución. 2. La supervisión trabaja de la mano con el cronograma de tiempo y presupuesto de la construcción del edificio anexo administrativo SNE911 de Tegucigalpa, cumpliendo con todo lo establecido en los Términos de Referencia. 3. El Proyecto Construcción llave en mano del centro de operaciones del SNE911 de la zona sur, al mes de febrero se encuentra en su fase de ejecución. Junto con la supervisión por parte del equipo técnico del SNE911 4. En el mes de febrero se recibió el mobiliario de la LPN para el Suministro de Mobiliario para el Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Y se está a la espera de la instalación por la empresa ganadora.
7. Costo de Finalización (proyectado):	Se estima que con el presupuesto total aprobado para el desarrollo de estos proyectos se cubrirá desde el inicio de operaciones hasta el periodo de cierre, así como el costo total de todas las actividades y procesos programados por el SNE911.

8. Fecha de Finalización (proyectada):	Con la programación de trabajo realizado se contempla que la fase de ejecución de los proyectos se finalice en el primer trimestre del año 2020 y solo se esté con el mantenimiento y seguimiento de los mismos
Ejecución del Proyecto	
	Los proyectos para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública, actualmente se encuentran en ejecución, hasta el mes de febrero del 2020, se han registrado importantes avances en cuanto a la ejecución de actividades de campo y procesos técnicos del proyecto, a continuación, los avances son los siguientes: 1. Actualmente se presenta información que la Construcción del Edificio Anexo Administrativo cuenta con un avance financiero de la obra del 81.82%, cumpliendo con el cronograma de trabajo. 2. La supervisión de la construcción del edificio administrativo anexo SNE911 de Tegucigalpa. a la fecha va cumpliendo en su totalidad con lo establecido en los Términos de Referencia recibiendo los productos a entera satisfacción. 3. El proyecto llave en mano del Centro de Operaciones del SNE911 en la zona sur del país, se encuentra en su fase de ejecución, y con un avance financiero del 68.00%, 4. En el mes de febrero se recibió el mobiliario de la LPN para el Suministro de Mobiliario para el Edificio Administrativo Anexo del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Y se está a la espera de la instalación por la empresa ganadora.
