



Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Informe del Estatus de la Cartera de Proyectos Ejecutados por la SAG

Mayo, 2023

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al **31** de mayo del año 2023.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2023, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Proyectos.


M.Sc. Edith Larjos
Asesora Ministerial
SAG-UPEG



Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor para contribuir a la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política, se basan en la promoción de un modelo económico alternativo orientado a fortalecer el rol del Estado en la economía, especialmente en las áreas estratégicas y servicios públicos, y formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas a fortalecer los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil/Privada y Social, como las cooperativas, cajas rurales, y los emprendimientos solidarios. En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- a) Ejercer acciones como coordinadora del sector público agroalimentario;
- b) Atender las funciones institucionales específicas; y,
- c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 4 proyectos que se detallan en el presente documento.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 4 proyectos:

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).


4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).

Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA, OFID y Exim Bank, de la India, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de Inversión cuentan con un presupuesto vigente de **L 1,484,663,310.00** representando un **22.54%** del presupuesto total de la institución, para el mes de mayo se refleja una ejecución de **L 3,880,419.28.**, Los Proyectos de Inversión reflejan una ejecución acumulada al 31 de mayo 2023 de **L 203,990,461.49.**

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras)

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Mayo	Ejecución acumulada al 31 de Mayo
Fuente 11: Fondos Nacionales	29,154,981.00	477,408.58	1,889,975.10
Fuente 21: Crédito Externo	1,455,508,329.00	3,403,010.70	202,100,486.39
BCIE	184,941,961.00	986,604.34	7,969,524.02
OFID	48,368,894.00	-	48,368,894.00
FIDA	183,618,607.00	2,416,406.36	145,762,068.37
BM	908,822,945.00	-	-
BID	129,755,922.00	-	-
	1,484,663,310.00	3,880,419.28	203,990,461.49

Fuente: SIAFI

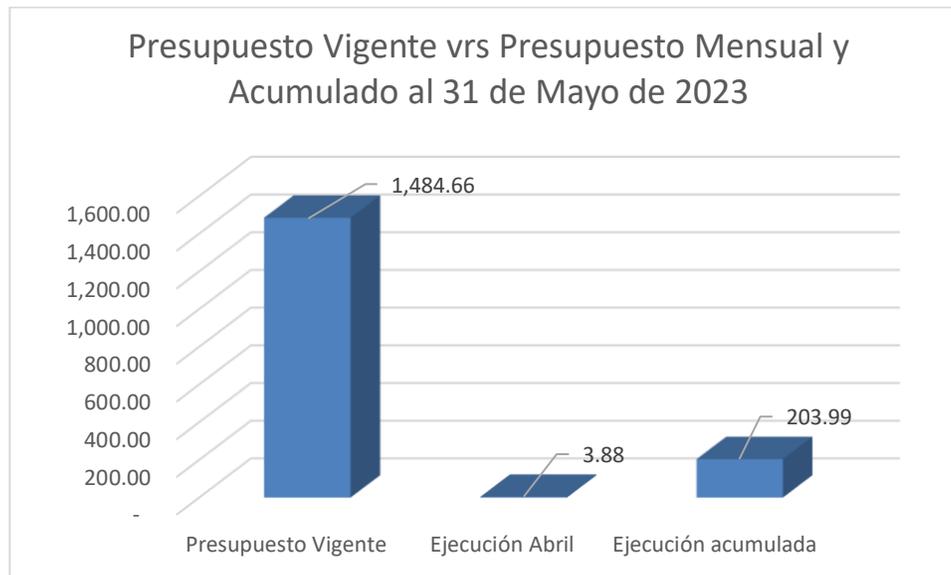

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: Contribuir a reducir pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Programa. De acuerdo a la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo a los valores que se encuentren en la línea de base. Por otra parte, se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. Por otra parte, el programa también contribuirá a reducir la tasa de desempleo abierto en el área rural según los hallazgos de la línea de base. Finalmente contribuirá a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo a las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base que se realice.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián.
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa.
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco.
4. Diseño y construcción de Pequeño Riego.

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019. Es relevante destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021), mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la República de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.

Es oportuno mencionar que nuevamente se ha dado una nueva ampliación a la ejecución del Proyecto mediante Resolución de Directorio No. DI-160/2021, del 18 de noviembre de 2021, el Directorio del BCIE autorizó ampliar hasta el 29 de noviembre del 2023 el plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo No. 2101, autorizado a la República de Honduras para financiar el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de mayo, 2023:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Mayo						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Mayo	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	17,216,651.00	17,216,651.00	121,729.75	0.71	395,005.25	2.29	15,224,770.75
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	184,941,961.00	184,941,961.00	986,604.34	0.53	7,969,524.02	4.31	176,122,436.98
Total	202,158,612.00	202,158,612.00	1,108,334.09	0.55	8,364,529.27	4.14	191,347,207.73

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Mayo			Ejecución Acumulada		
			Programado a Mayo	Ejecutado a Mayo	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Mayo	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego, en parcelas de los productores y productoras.	Hectárea	0	0	0	1,350	1300	96.3
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	0	0	0	38	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	272	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	0	0	0	38	0	0
	Constituidos los productores y productoras en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Documento	0	0	0	10	0	0
	Planes de producción aprobados y entregados a grupos empresariales de productores y productoras organizados.	Plan	0	0	0	5	0	0
	Planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de las subcuencas Tascalapa, Siguapa, Maralito, Olomán, Cuyamapa, Selguapa y Jupuara, socializado con las asociaciones de regantes, alcaldías municipales y actores claves de la gestión ambiental.	Plan de Manejo Ambiental	1	1	100	7	3	42.9
	Capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente impartidos a los usuarios en los canales de riego Selguapa y san Sebastián , aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitacion	2	0	0	12	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		14	Anual		20

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Mayo	Ejecución Acumulada
----------------	-------------------------	------------------	---------------------------	---------------------

			Programado a Mayo	Ejecutado a Mayo	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Mayo	%
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	0	0	0	14	0	0
Asistencia Técnica y Comercialización	Talleres de capacitación impartidos en diversificación agrícola (manejo de agua y fertigación), aplicando medidas de bioseguridad.	Tallere de Capacitacion	0	0	0	10	0	0
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	1	2	200	6	2	33
Organización y Desarrollo Local	Formulación de planes de producción.	Plan	0	0	0	5	0	0
	Organización de productores y productoras organizados en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	0	0	0	10	0	0
	Expedientes documentados a grupos empresariales organizados para la gestión de la personería jurídica.	Expediente	0	0	0	10	0	0
	Diagnóstico situacional de los grupos empresariales organizados	Diagnostico	0	0	0	10	0	0
Gestión Ambiental	Plan de trabajo para la socialización de los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales.	Plan de Trabajo	0	0	0	1	1	100
	Plan de capacitación elaborado.	Plan	0	0	0	2	2	100
Nivel de Ejecución			Mensual		22	Anual		26

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes de mayo:

- Se avanza con la socialización de los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales, con la socialización del plan de las Subcuencas Rio Tascalapa, Rio Siguapa y Rio Maralito. Este último, se socializó en el municipio de Marale, en la tribu Tolupán Paraíso. No se socializó con la corporación municipal, debido a la falta de apertura del Señor alcalde de Marale. Si la corporación municipal lo permite, en algún momento, el PDABR desarrollará el taller de socialización sin ningún problema.
- Durante el mes mayo se avanzó en el proceso de aprobación del plan de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de la subcuenca Rio Cuyamapa (municipios Victoria, Yoro y Morazán, Departamento de Yoro), en el ICF, el cual está listo para firma del ministro del ICF. Este proceso corresponde a la consultoría de la **Elaboración de (7) Planes de Ordenamiento y Manejo de los Recursos Naturales de las Subcuencas del PDABR**, que desarrolla la empresa consultora SERTYCO. En contraste, el proceso de aprobación de los planes de las subcuencas Rio Selguapa y Rio Jupuara, siguen atrasados en las regiones forestales de ICF-Comayagua e ICF-Francisco Morazán, situación que ha generado mucha preocupación para el consultor SERTYCO y para el PDABR; se trabaja en la aceleración de dichos procesos.
- Se firmó el convenio de regularización del uso del agua en el rio Jupuara, donde participan las asociaciones de regantes de Lamaní y San Sebastián, Exportadora del Atlántico y otros usuarios independientes. La firma de este convenio dio lugar a reiniciar las actividades de construcción del proyecto San Sebastián y Joya de Ramos y a la gestión de servidumbre para la instalación de tubería de conducción correspondiente.
- Se continúa aforando el rio Jupuara, con registro de volumen de 187 litros/segundo en Pitafina y 170 en el punto de presa San Sebastián y Joya de Ramos en el más reciente aforo. En este proceso de medición de caudal, se ha contado con el apoyo de la alcaldía municipal de Lamaní y la AR Lamaní.
- Se ha generado información ambiental para el equipo ambiental del BCIE, para lo cual se sostuvo reunión de seguimiento al cumplimiento del plan SIEMAS del PDABR. Se compartieron los medios de verificación de las actividades de cierre del proyecto Sulaco, la aprobación de los planes de manejo aprobados y se le da seguimiento a las actividades ambientales y sociales de Selguapa, Lamaní y San Sebastián.

Problemática que afectó la Ejecución en el mes y acciones realizadas:

- La actividad de capacitación que estaba planificada para estos meses de abril y mayo, misma que consiste que es el desarrollo de talleres de Educación Ambiental, se está posponiendo para los meses siguientes, debido a que aún no se cuenta con los insumos para los talleres (meriendas para los participantes). Se espera que la administración del PDABR, pueda resolver esta falta de insumos lo más pronto posible para realizar las capacitaciones respectivas en los meses venideros.

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación. El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609,235,000.00.

El Proyecto inició 01/12/2016 y su fecha de finalización es 28/08/2022.

Localización: La zona de intervención del Proyecto es el departamento de El Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de mayo:

Ejecución Financiera del Mes de evaluación:

Presupuesto Programado en el Mes	Presupuesto Ejecutado en el Mes	% de Ejecución
0.00	0.00	0%

Análisis de la Ejecución Financiera

- No se programó ejecución financiera para el mes de mayo.
- Actualmente no se cuenta con presupuesto asignado, se espera solicitar próximamente una vez sea evaluado el proyecto.

Análisis de la Ejecución Física

- No se cuenta con planificación física para el mes de mayo, de igual manera se cuenta con un equipo integrado por especialistas para el análisis y evaluación del proyecto con el objetivo de una posible reestructuración.
- Una auditoria del Tribunal superior de cuentas, a espera del informe.
- Proyecto en campo sin avance, por lo que se ha detenido los pagos pendientes.
- Revisión documental para la toma de decisiones.

Principales actividades realizadas en el mes de mayo:

- No se cuenta con ninguna actividad relevante para este mes de mayo.

Problemática que afectó la Ejecución en el mes y acciones realizadas:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	En espera el informe del Tribunal Superior de Cuentas	Reuniones sostenidas con el TSC para definir tema de auditoría. Nombramiento de una comisión para realizar una evaluación de medio término del proyecto.
Financiera	El desembolso no ha sido procesado por temas legales en proceso.	Reestructuración del proyecto mediante evaluación de campo. Se sostuvieron reuniones con el área legal.

3. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA)

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) microempresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33,000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total de L.574, 086,00. El Proyecto inició 15/04/2016 y su fecha de finalización es 30/09/2022.

Localización: La zona de intervención del proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira. Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de mayo:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al 31 de Mayo						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Mayo	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	52,935,274.00	52,935,274.00	2,416,406.36	4.56	16,864,590.66	31.86	36,070,683.34
Total	52,935,274.00	52,935,274.00	2,416,406.36	4.56	16,864,590.66	31.86	36,070,683.34

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROOCCIDENTE**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Mayo			Ejecución Acumulada		
			Programado a Mayo	Ejecutado a Mayo	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Mayo	%
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PRO-LENCA	Planes de Fortalecimiento organizacional implementados a organizaciones	Plan	0	0	0	60	63	105
	Capacitaciones en inclusión social y genero brindadas a organizaciones	Capacitacion	0	0	0	50	50	100
	Asistencia técnica en temas administrativos y financieras brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.	Asistencia Tecnica	0	0	0	100	127	127
	Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego rehabilitadas a productores y productoras contribuyendo a la seguridad alimentaria..	Hectarea	0	0	0	5	0	0
	Documento final de cierre del proyecto dirigido a socios estratégicos, autoridades, beneficiarios y ente financiador.	Documento	0	0	0	1	0	0

Nivel de Ejecución			Mensual			Anual		
			0			66		
Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Mayo			Ejecución Acumulada		
			Programado a Mayo	Ejecutado a Mayo	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Mayo	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	0	0	0	60	63	105
	Evaluación de resultados del proyecto.	Informe	0	0	0	1	0	0
	Consultoría aprobada para el fortalecimiento de Organizaciones.	Consultoría	0	0	0	1	1	100
Desarrollo Productivo y de Negocios	Selección de cajas rurales de ahorro y crédito.	Caja Rural	0	0	0	100	127	127
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas.	Kilómetro	0	0	0	1	1	100
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas FIDA II.	Kilómetro	0	0	0	1	1	100
Nivel de Ejecución			Mensual			Anual		
			0			89		

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de mayo:

- Capacitaciones en inclusión social y género brindadas a organizaciones en este mes de mayo, meta cumplida en el mes de mayo se ejecutaron las 50 jornadas de capacitación, en temas de Seguridad Alimentaria con Enfoque de Género y en Sensibilización en Violencia contra las Mujeres.
- Asistencia técnica en temas administrativos y financieras brindadas a familias productoras Agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. (FIDA II)
Meta cumplida y reportada en el sistema logrando llegar a 3119 familias beneficiarias en 130 cajas de ahorro y crédito.
- Se dio orden de inicio para la consultoría para la elaboración del informe de terminación del proyecto, como parte de este proceso se dio por recibido y revisado el primer producto que comprende al cronograma y plan de trabajo a desarrollar durante el mes de junio.
Metodología de trabajo del ITP .

- El ITP se realizará mediante un enfoque participativo, representará una síntesis de hechos, opiniones y puntos de vista recopilados por la consultora e identificará sus hallazgos a través de la triangulación de la información obtenida de las diferentes fuentes de información, que también representarán los medios de verificación. El abordaje participativo será necesario para asegurar un alto nivel de cooperación entre la evaluadora y los actores del proyecto y que sea un ejercicio evaluativo de utilidad para la toma de decisiones en siguientes proyectos, así se podrá tener mayor probabilidad de que los hallazgos, y específicamente las recomendaciones, sean utilizadas por la SAG, el FIDA y sus socios. Por esta razón, se prevé entrevistar a las personas pertenecientes a la mayor parte de los actores institucionales involucrados en la implementación del proyecto, así como a beneficiarios y beneficiarias. Así también, el ITP prevé una matriz de calificaciones del proyecto, el cual estará integrado dentro del informe.

Muestreo y herramientas de investigación

Dentro del diseño para desarrollar el ITP, se hará uso de un "muestreo intencional para identificar a las partes interesadas que se consultarán y consecuentemente recopilar datos primarios. Con referencia a la exploración de datos secundarios, se realizará una revisión exhaustiva de los documentos, informes, estudios, materiales de comunicación y otros reportes, así como otros documentos relevantes, para constituir la referencia base del ejercicio evaluativo que evidenciará un primer nivel de hallazgos, que posteriormente, serán contrastados/verificados/validados a través la triangulación entre datos primarios y secundarios.

El diseño de investigación del ejercicio hará uso de las siguientes herramientas de investigación:

Revisión documental: Una revisión exhaustiva de la documentación disponible producida por el proyecto será revisado. Esto incluye, entre otros: Convenio del proyecto, informe de realineamiento, marco de resultados, presupuestos, planes operativos anuales, informes de progreso, evaluación intermedia, materiales de comunicación, base de datos del sistema de monitoreo, entre otros.

Entrevistas individuales: En línea general, las entrevistas individuales serán llevadas a cabo con aquellos actores que puedan expresar el punto de vista oficial de la institución de pertenencia y con técnicos que puedan explicar, en detalle, aspectos puntuales del proyecto. Se podrán desarrollar entrevistas en persona o por medios electrónicos o combinando ambas herramientas.

Grupos Focales (FGD): Los FGD se llevarán a cabo, con una amplia variedad de grupos de

partes interesadas. para facilitar la discusión y alentar que todos participen, los grupos focales estarán compuestos por aproximadamente 8-12 personas, que permitirá la recopilación de datos sobre cuestiones relacionadas con la relevancia y eficacia del proyecto, ya que se identificará con los participantes, los resultados que se han logrado y sobre los factores que han posibilitado o dificultado el logro de dichos resultados.

Observaciones directas: Las observaciones directas, representan la identificación en terreno de los hallazgos principales del proceso evaluativo, los cuales permitirán a la evaluadora validar información e identificar el grado de la participación e involucramiento de las beneficiarias y beneficiarios directos.

La matriz de evaluación, en anexo 1, muestra como la evaluadora responderá a los criterios definidos en los TdR. En la matriz, se aclaran los indicadores adoptados, la fuente de los datos, los métodos, procedimiento de recopilación y análisis de datos. Para la conducción de entrevistas, se harán cuestionarios con la batería de preguntas para cada grupo de actores durante el ejercicio de evaluación.

Problemática que afectó la Ejecución en el mes de mayo y acciones realizadas:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Técnica	Proceso de firma de finiquitos de organizaciones.	Se le expuso a la ministra la importancia de la firma de los mismos, y se propuso el nombramiento de una comisión para auditoria de campo y constatar las inversiones, para posterior firma de los mismos. Subsanación de aspectos técnicos para iniciar con la auditoria en campo.

4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)

Objetivo: Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizadas y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de

procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

La población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conformaran 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colón.

El Proyecto tiene una inversión total de L. 1, 026,645,518.00.

El Proyecto inició 03/01/2022 y su fecha de finalización es al 31/12/2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en:

- **Departamento de Atlántida:** Jutiapa.
- **Departamento de Yoro:** Olanchito, Jacón y Arenal.
- **Departamento de Colón:** Balfate, Tocoa, Sonaguera, Trujillo; Sabá, Limón, Bonito Oriental, Santa Rosa de Agúan y Santa Fé.
- **Departamento de Olancho:** Guata, Gualaco, Yocón, Jano, Esquipulas del Norte, Mangulile, El Rosario, San Esteban y La Unión.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de mayo:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Mayo						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Mayo	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,938,330.00	11,938,330.00	355,678.83	2.98	1,494,969.85	12.52	10,338,621.11
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	130,683,333.00	130,683,333.00		0.00	1,785,855.29	1.37	128,897,477.71
Fuente 21: Crédito Externo OFID	123,740,000.00	48,368,894.00		0.00	-	0.00	48,368,894.00
Fuente 22: Donaciones Externas				#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	
Total	266,361,663.00	190,990,557.00	355,678.83	0.19	3,280,825.14	1.72	187,604,992.82

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROINORTE**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Mayo			Ejecución Acumulada		
			Programado a Mayo	Ejecutado a Mayo	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Mayo	%
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Plan de fortalecimiento elaborado a organizaciones de productores y productoras.	Plan	0	0	0	1	0	0
	Planes de Negocios Implementados a grupos de productores y productoras(resilientes e inclusivas).	Plan de Negocio	0	0	0	1	0	0
	Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kit	0	0	0	5	0	0
	Desembolsos realizados a instituciones u organizaciones seleccionadas.	Cantidad	0	0	0	1	0	0
	Campañas de concientización nutricional y articulación a espacios Seguridad Alimentaria Nutricional SAN con jóvenes especialmente mujeres adolescentes implementadas.	Campaña	0	0	0	1	0	0
	Planes de inversión en servicios ecosistémicos y dinamización territorial implementados con grupo de productores y productoras.	Plan de Inversion	0	0	0	2	0	0
	Red de gestores de innovación Implementado en los municipios de influencia del proyecto.	Red de Innovacion	0	0	0	5	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Mayo			Ejecución Acumulada		
			Programado a Mayo	Ejecutado a Mayo	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Mayo	%

Alianzas Comerciales, Fortalecimiento Organizacional e Innovación.	Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto.	Diagnostico	0	0	0	20	0	0	
	Selección de la institución u organización a fortalecer que brindara los servicios de investigación.	Cantidad	0	0	0	1	0	0	
	Estudios complementarios en temas ambientales al proceso de diagnostico territorial.	Estudio	0	0	0	2	0	0	
	Diseño de campañas de concientización nutricional.	Campaña	0	0	0	1	0	0	
	Fondo concursable de innovación estratégica creado.	Concurso	0	0	0	1	0	0	
	Identificación de la red de gestores.	Informe	0	0	0	1	0	0	
Desarrollo Productivo y Resiliencia	Planes de Negocios Formulados.	Plan de Negocio	0	0	0	10	0	0	
	Formulación de planes de inversión en servicios ecosistémicos.	Plan de Inversion	0	0	0	2	0	0	
	Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) realizados.	Estudio	0	0	0	1	0	0	
	Kit de herramientas adquiridos.	Kits	0	0	0	5	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de mayo:

- No se cuenta con ninguna actividad relevante para este mes de mayo.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de mayo:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	No se ha podido realizar ninguna acción administrativa directa del proyecto por falta de finalización de condiciones previas para desembolso.	La empresa CADERH ha presentado los candidatos a ser contratados y estos están en revisión por parte de la ministra.
Técnica	No se ha podido realizar ejecución técnica.	En constante seguimiento para el cumplimiento de las condiciones previas

Conclusiones

- El presupuesto ejecutado en el mes de mayo es de **L 3,880,419.28** de la cartera de proyectos vigente correspondiente a **L1,484,663,310.00**, Es importante mencionar que la ejecución financiera acumulada al mes de mayo es **L 203,990,461.49**. La cual corresponde a un **13.73%** del presupuesto vigente.

Fecha de Elaboración: 13 de junio de 2023.

Elaborado por: El equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

