



Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Informe del Estatus de la Cartera de Proyectos Ejecutados por la SAG

Junio, 2023

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al 30 de junio del año 2023.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2023, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Proyectos.


MSc. Edith Larios
Asesora Ministerial
SAG-UPEG



Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA).

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor para contribuir a la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política, se basan en la promoción de un modelo económico alternativo orientado a fortalecer el rol del Estado en la economía, especialmente en las áreas estratégicas y servicios públicos, y formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas a fortalecer los diferentes tipos de empresas y de propiedad: Estatal, Mercantil/Privada y Social, como las cooperativas, cajas rurales, y los emprendimientos solidarios. En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- a) Ejercer acciones como coordinadora del sector público agroalimentario;
- b) Atender las funciones institucionales específicas; y,
- c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 4 proyectos que se detallan en el presente documento.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 10 proyectos:

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).


4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).
5. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente).
6. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)
7. Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
8. Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana
9. Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)

Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, OFID, FIDA, BM, BID, y Exim Bank, de la India, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de Inversión cuentan con un presupuesto vigente de **L 1,484,663,310.00** representando un **22.54%** del presupuesto total de la institución, para el mes de junio se refleja una ejecución de **L 19,840,430.84.**, Los Proyectos de Inversión reflejan una ejecución acumulada al 30 de junio 2023 de **L 61,505,829.44.**

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos
(En Lempiras)**

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	Ejecución acumulada al 30 de Junio
Fuente 11: Fondos Nacionales	29,154,981.00	1,329,732.54	3,219,707.64
Fuente 21: Crédito Externo	1,455,508,329.00	17,162,388.62	56,937,812.12
BCIE	184,941,961.00	660,766.04	8,630,290.06
OFID	48,368,894.00	-	-
FIDA	183,618,607.00	2,136,229.50	20,786,675.45
BM	908,822,945.00	12,545,911.57	23,234,016.06
BID	129,755,922.00	1,819,481.51	4,286,830.55
Fuente 22: Donaciones Externas	-	1,348,309.68	1,348,309.68
	1,484,663,310.00	19,840,430.84	61,505,829.44

Fuente: SIAFI

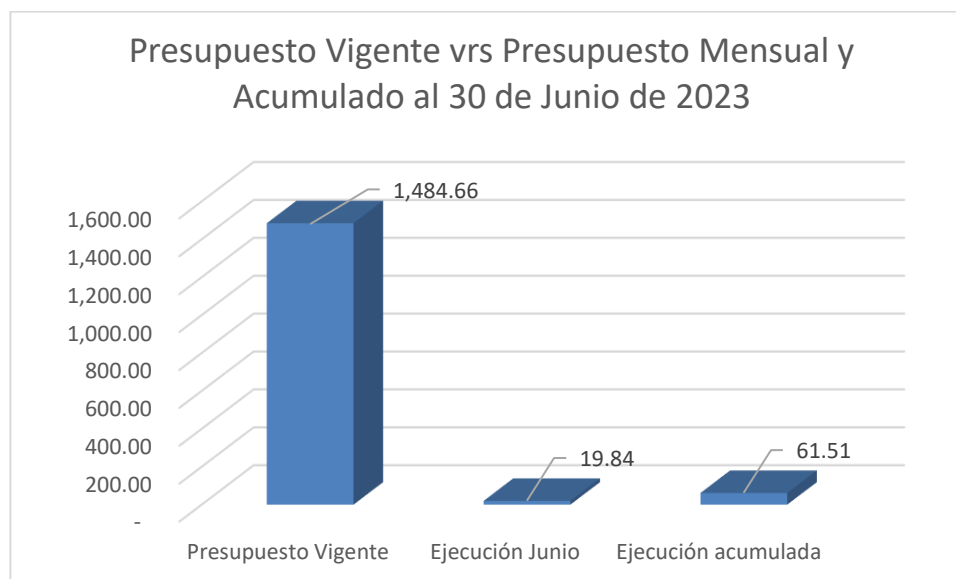

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: Contribuir a reducir pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Programa. De acuerdo a la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo a los valores que se encuentren en la línea de base. Por otra parte, se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. Por otra parte, el programa también contribuirá a reducir la tasa de desempleo abierto en el área rural según los hallazgos de la línea de base. Finalmente contribuirá a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo a las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base que se realice.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián.
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa.
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco.
4. Diseño y construcción de Pequeño Riego.

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019. Es relevante destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021), mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.

Es oportuno mencionar que nuevamente se ha dado una nueva ampliación a la ejecución del Proyecto mediante Resolución de Directorio No. DI-160/2021, del 18 de noviembre de 2021, el Directorio del BCIE autorizó ampliar hasta el 29 de noviembre del 2023 el plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo No. 2101, autorizado a la República de Honduras para financiar el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de junio, 2023:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	17,216,651.00	17,216,651.00	900,495.64	5.23	1,295,500.89	7.52	15,921,150.11
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	184,941,961.00	184,941,961.00	660,766.04	0.36	8,630,290.06	4.67	176,091,871.73
Total	202,158,612.00	202,158,612.00	1,561,261.68	0.77	9,925,790.95	4.91	192,013,021.84

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícola con acceso a riego, en parcelas de los productores y productoras.	Hectárea	0	0	0	1,350	1300	96.3
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	0	0	0	38	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	272	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	0	0	0	38	0	0
	Constituidos los productores y productoras en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Documento	0	0	0	10	0	0
	Planes de producción aprobados y entregados a grupos empresariales de productores y productoras organizados.	Plan	0	0	0	5	0	0
	Planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de las subcuencas Tascalapa, Siguapa, Maralito, Olomán, Cuyamapa, Selguapa y Jupuara, socializado con las asociaciones de regantes, alcaldías municipales y actores claves de la gestión ambiental.	Plan de Manejo Ambiental	1	1	100	7	4	57.1
	Capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente impartidos a los usuarios en los canales de riego Selguapa y san Sebastián , aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	2	1	50	12	1	8.33
Nivel de Ejecución			Mensual		21	Anual		23

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%

Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	Líneas de tubería instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	0	0	0	14	0	0
Asistencia Técnica y Comercialización	Talleres de capacitación impartidos en diversificación agrícola (manejo de agua y fertigración), aplicando medidas de bioseguridad.	Talleres de Capacitación	0	0	0	10	0	0
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	1	1	100	6	3	50
Organización y Desarrollo Local	Formulación de planes de producción.	Plan	0	0	0	5	0	0
	Organización de productores y productoras organizados en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	0	0	0	10	0	0
	Expedientes documentados a grupos empresariales organizados para la gestión de la personería jurídica.	Expediente	0	0	0	10	0	0
	Diagnóstico situacional de los grupos empresariales organizados	Diagnostico	0	0	0	10	0	0
Gestión Ambiental	Plan de trabajo para la socialización de los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales.	Plan de Trabajo	0	0	0	1	1	100
	Plan de capacitación elaborado.	Plan	0	0	0	2	2	100
Nivel de Ejecución			Mensual		11	Anual		28

Fuente: SIAFI

Principales actividades realizadas en el mes de junio:

- Siguiendo con el compromiso de PDABR de acompañar a los beneficiarios del Proyecto Sulaco en la identificación de fuentes de financiamiento y mercados para la producción, se gestionó la visita de funcionarios de FUNDER y SEMPRENDE a una reunión con la junta directiva de la Asociación de Regantes de Sulaco, para que puedan informarles en que consiste los productos que ofrecen y cuáles son sus condiciones.

A esta reunión se hicieron presentes los Ingenieros Rony Flores por SEMPRENDE y Cesar Madariaga por FUNDER quienes brindaron una exposición de condiciones, requisitos etc., resaltando lo siguiente:

Tasa de Interés: 8.7% anual con una comisión del 2% + seguro de deuda

Montos y garantías:

20,000-100,000 solidaria/aval

100,001- 1,000,000 Prendaria/hipotecaria

1,000,001-2,000,000 hipotecaria

Forma de pago: de acuerdo al ciclo del cultivo

Requisitos:

DNT

RTN

Plan de inversión

Flujo de efectivo

Estados financieros últimos 3 años

Constancia de la A.R.S

Contrato de compra venta

Autorización para el buró de crédito

Carta irrevocable de retención

Croquis de la parcela

Garantías

Costo de seguro

Comisión por desembolso

Se acordó sostener otra reunión con el grupo de productores interesados en iniciar a producir, comunicándose para pactar fecha para este evento.

- Reactivación de Grupos de Beneficiarios de Pequeños Proyectos de Riego (PPR):
 - ❖ Durante este trimestre, realice visita a 4 grupos de Pequeños Proyectos de Riego (PPR) preseleccionados en su área de influencia Márcala, Departamento de la Paz, coordinando con cada uno de ellos una reunión con la participación de los principales líderes del grupo o con los socios que estén disponibles, tratando los siguientes temas entre otros.
 - ❖ Informarles que los pequeños proyectos de riego se han reactivado
 - ❖ Brindar una explicación de lo que sucedió para que se haya declarado fallido el proceso de licitación realizado.
 - ❖ Identificar si continúan con el interés del proyecto
 - ❖ Si el interés continuo, se explica el proceso que se está siguiendo para una nueva licitación y explicándoles los tiempos probables que lleve hasta la construcción
- En el primer semestre, se aprobaron 4 planes de manejo, cumpliendo el indicador 1 en un 57%. Se elaboraron los planes de Educación Ambiental en Selguapa y San Sebastián y el plan de socialización de los 7 planes de manejo. Se concluyó el proyecto de riego Sulaco y se gestionaron el informe final de quejas y reclamos, los planes de cierre de los planteles de presas y el ICMA bianual y de cierre del Proyecto. Se está aforando el caudal del río Jupuara, para conocer la oferta hídrica. También se logró la aprobación de los planes de las subcuencas Río Olomán, Río Siguapa, Río Tascalapa, Río Maralito, con lo que, el Indicador 1 “Se elaboran al menos siete (7) Planes de Manejo y Gestión de Microcuencas abastecedoras de agua para los sistemas de riego del programa aprobados por la autoridad”, se cumple en un 57%. Así mismo,

se avanza con el proceso de aprobación de los planes de Rio Cuyamapa. Rio Selguapa y Rio Jupuara.

Problemática que afectó la Ejecución en el mes y acciones realizadas:

- Acompañe a los ingenieros de riegos Fernando Escobar y Antonio Mejía, a una gira por diferentes sitios del proyecto Selguapa, con el propósito de verificar su funcionamiento e identificar si existen problemas constructivos. Nos contactamos con el canalero encargado del tramo I, quien nos llevó a un sitio donde existe una fuga en una Unidad de Riego, constatándose en el sitio, tal como se muestra en la siguiente toma.
- Así mismo se verifico otro problema en uno de los hidrantes de una Unidad de Riego, donde la presión de agua es muy baja aun estando abierto solo un hidrante.

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación. El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609,235,000.00.

El Proyecto inició 01/12/2016 y su fecha de finalización es 28/08/2022.

Localización: La zona de intervención del Proyecto es el departamento de El Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de junio:

Ejecución Financiera del Mes de evaluación:

Presupuesto Programado en el Mes	Presupuesto Ejecutado en el Mes	% de Ejecución
0.00	0.00	0%

Análisis de la Ejecución Financiera

- Proyecto en proceso de desobligación.
- No se programó ejecución financiera para el mes de junio.
- Actualmente no se cuenta con presupuesto asignado.

Análisis de la Ejecución Física

El proyecto presenta dificultades para su ejecución, por ejemplo:

- Una auditoría del Tribunal superior de cuentas, a espera del informe.
- Proyecto en campo sin avance, por lo que se ha detenido los pagos pendientes.
- Revisión documental para la toma de decisiones.

Principales actividades realizadas en el mes de mayo:

- No se cuenta con planificación física para el mes de junio, de igual manera se cuenta con un equipo integrado por especialistas para el análisis y evaluación del proyecto con el objetivo de una posible reestructuración.

Problemática que afectó la Ejecución en el mes y acciones realizadas:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	En espera el informe del Tribunal Superior de Cuencas.	Nombramiento de una comisión para realizar una evaluación de medio término del proyecto.
Financiera	El desembolso no ha sido procesado por temas legales en proceso.	Reestructuración del proyecto mediante evaluación de campo.

3. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA)

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) microempresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33,000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total de L.574, 086,00. El Proyecto inició 15/04/2016 y su fecha de finalización es 30/09/2022.

Localización: La zona de intervención del proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira. Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de junio:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	52,935,274.00	59,435,274.00	1,712,322.97	2.88	18,576,913.63	31.26	40,858,360.37
Total	52,935,274.00	59,435,274.00	1,712,322.97	2.88	18,576,913.63	31.26	40,858,360.37

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROLENCA**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PRO-LENCA	Planes de Fortalecimiento organizacional implementados a organizaciones	Plan	0	0	0	60	63	105
	Capacitaciones en inclusión social y genero brindadas a organizaciones	Capacitación	0	0	0	50	50	100
	Asistencia técnica en temas administrativos y financieras brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.	Asistencia Técnica	0	0	0	100	127	127
	Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego rehabilitadas a productores y productoras contribuyendo a la seguridad alimentaria.	Hectárea	0	0	0	5	0	0

	Documento final de cierre del proyecto dirigido a socios estratégicos, autoridades, beneficiarios y ente financiador.	Documento	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		66

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	0	0	0	60	63	105
	Evaluación de resultados del proyecto.	Informe	0	0	0	1	0	0
	Consultoría aprobada para el fortalecimiento de Organizaciones.	Consultoría	0	0	0	1	1	100
Desarrollo Productivo y de Negocios	Selección de cajas rurales de ahorro y crédito.	Caja Rural	0	0	0	100	127	127
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas.	Kilómetro	0	0	0	1	1	100
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II	Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas FIDA II.	Kilómetro	0	0	0	1	1	100
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		89

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de junio:

- **Elaboración e implementación de Planes de Fortalecimiento Organizacional, con enfoque de equidad de género.**

Esta meta fue cumplida en su totalidad los 63 planes de fortalecimiento organizacional y reportada en tiempo y forma.

- **Asistencia técnica en temas administrativos y financieras brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. (FIDA II)**

- Meta cumplida y reportada en el sistema logrando llegar a 3119 familias beneficiarias en 130 cajas de ahorro y crédito.

- **Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego rehabilitadas contribuyendo a la seguridad alimentaria (FIDA II)**

Meta cumplida y reportada con medios de verificación en el sistema SIAFI.

- **Seguimiento a la elaboración de finiquitos de las organizaciones, tanto a nivel de elaboración de campo como a nivel de firma por el Despacho de la Secretaría.**
- **Seguimiento al cierre de convenios y consultorías**

Problemática que afectó la Ejecución en el mes de junio y acciones realizadas:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Técnica	Proceso de firma de finiquitos de organizaciones.	Se le expuso a la ministra la importancia de la firma de estos, a la fecha no se ha firmado ningún finiquito.

4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)

Objetivo: Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizadas y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático.

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

La población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conformaran 15,000 familias rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho y Colón.

El Proyecto tiene una inversión total de L. 1, 026,645,518.00.

El Proyecto inició 03/01/2022 y su fecha de finalización es al 31/12/2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en:

- **Departamento de Atlántida:** Jutiapa.
- **Departamento de Yoro:** Olanchito, Jacón y Arenal.
- **Departamento de Colón:** Balfate, Tocoa, Sonaguera, Trujillo; Sabá, Limón, Bonito Oriental, Santa Rosa de Agúan y Santa Fé.
- **Departamento de Olancho:** Guata, Gualaco, Yocón, Jano, Esquipulas del Norte, Mangulile, El Rosario, San Esteban y La Unión.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de junio:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,938,330.00	11,938,330.00	429,236.90	3.60	1,924,206.75	16.12	9,416,123.25
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	130,683,333.00	124,183,333.00	423,906.53	0.34	2,209,761.82	1.78	121,973,571.18
Fuente 21: Crédito Externo OFID	123,740,000.00	48,368,894.00		0.00	-	0.00	48,368,894.00
Fuente 22: Donaciones Externas					-		
Total	266,361,663.00	184,490,557.00	853,143.43	0.46	4,133,968.57	2.24	179,758,588.43

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROINORTE**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada			
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%	
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Plan de fortalecimiento elaborado a organizaciones de productores y productoras.	Plan	0	0	0	1	0	0	
	Planes de Negocios Implementados a grupos de productores y productoras(resilientes e inclusivas).	Plan de Negocio	0	0	0	1	0	0	
	Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kit	0	0	0	5	0	0	
	Desembolsos realizados a instituciones u organizaciones seleccionadas.	Cantidad	0	0	0	1	0	0	
	Campañas de concientización nutricional y articulación a espacios Seguridad Alimentaria Nutricional SAN con jóvenes especialmente mujeres adolescentes implementadas.	Campaña	0	0	0	1	0	0	
	Planes de inversión en servicios ecosistémicos y dinamización territorial implementados con grupo de productores y productoras.	Plan de Inversion	0	0	0	2	0	0	
	Red de gestores de innovación Implementado en los municipios de influencia del proyecto.	Red de Innovacion	0	0	0	5	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento Organizacional e Innovacion.	Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto.	Diagnostico	0	0	0	20	0	0

	Selección de la institución u organización a fortalecer que brindara los servicios de investigación.	Cantidad	0	0	0	1	0	0	
	Estudios complementarios en temas ambientales al proceso de diagnostico territorial.	Estudio	0	0	0	2	0	0	
	Diseño de campañas de concientización nutricional.	Campaña	0	0	0	1	0	0	
	Fondo concursable de innovación estratégica creado.	Concurso	0	0	0	1	0	0	
	Identificación de la red de gestores.	Informe	0	0	0	1	0	0	
Desarrollo Productivo y Resiliencia	Planes de Negocios Formulados.	Plan de Negocio	0	0	0	10	0	0	
	Formulación de planes de inversión en servicios ecosistémicos.	Plan de Inversion	0	0	0	2	0	0	
	Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) realizados.	Estudio	0	0	0	1	0	0	
	Kit de herramientas adquiridos.	Kits	0	0	0	5	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de junio:

- No se cuenta con ninguna actividad relevante para este mes de junio.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de junio:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	- No se ha podido concluir con la contratación del director ejecutivo y de los 2 coordinadores de los componentes. - No se ha logrado cumplir todas las condiciones previas para el primer desembolso con recursos del FIDA	- Se envió solicitud de No Objeción a FIDA del candidato para director ejecutivo, se está a la espera de respuesta, ya se cuenta con no objeción de los 2 coordinadores de los componentes, se espera que en el mes de julio se realicen todos los contratos que restan para completar el equipo de la UGP. - En el mes de julio se cumplirán todas las condiciones previas para solicitar el primer desembolso.
Técnica	No se ha podido realizar ejecución técnica.	Al tener al equipo técnico completo del proyecto se procederá con el cumplimiento de las condiciones previas.

5. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente).

Objetivo: Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el CSH.

El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Descripción del Proyecto: PROOCIDENTE opera a partir del convenio financiero de préstamo BIS-4936H y BID-4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M con el objetivo de incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras y mejorar el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

El Proyecto tiene una inversión total de **USD 86.6 Millones**

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en:

- **Departamento de Santa Barbara:** 88 Municipios
- **Departamento de Copan**
- **Departamento de Ocotepeque**

- Departamento de Lempira
- Departamento de Intibucá
- Departamento de La Paz

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de junio:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROOCCIDENTE
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BID		129,755,922.00	1,819,481.51	1.40	4,286,830.55	3.30	124,261,653.36
Fuente 22: Donaciones Externas					-		
Total	-	129,755,922.00	1,819,481.51	1.40	4,286,830.55	3.30	124,261,653.36

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROOCCIDENTE**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad	Planes de inversión con la adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados a productores y productoras organizadas (o).	Plan de Inversión	0	0	0	20	0	0
	Planes de manejo de microcuencas implementados.	Plan de Manejos de Microcuencas	0	0	0	5	0	0
	Créditos otorgados a productores rurales.	Crédito	0	0	0	55	0	0

Nivel de Ejecución	Mensual	0	Anual	0
---------------------------	----------------	----------	--------------	----------

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada			
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%	
Fortalecimiento del Desarrollo Productivo	Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto	Plan de Inversión	0	0	0	20	0	0	
	Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición	Asistencia Técnica	0	0	0	20	0	0	
	Planes de manejo de microcuenca aprobados por el Instituto Conservación Forestal ICF.	Plan de Manejos de Microcuencas	0	0	0	5	0	0	
Acceso a Financiamiento	Monto de créditos y garantías aprobados	Lempira	0	0	0	5000000	127	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de junio:

- Se brindó asistencia técnica a 97 productoras y productores para la elaboración de planes con adopción de tecnologías CI, en los 6 departamentos cobertura del proyecto, 10 municipios y 22 aldeas. Se identificó a 18 MIPYMEs de los que 07 son lideradas por mujeres y 2 como iniciativas de jóvenes productores.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de junio:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	<p>Completar la Unidad Ejecutora del Proyecto (4 puestos claves)</p> <p>Solicitud de espacio fiscal, para la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi)(WEF) donación de \$1.4 MM. que serán incorporados al proyecto.</p> <p>Solicitud de notificación de firmas para desembolso de los fondos FONPRODE. Apalancamiento de 35.MM /Fase II</p>	<p>Se enviaron los TdR para no objeción del BID, En proceso de recibir visto bueno para publicación, evaluación de candidatos y selección de profesionales.</p> <p>Cumplimiento del marco legal del proyecto y nota de prioridad; gestiones internas en SEFIN. Seguimiento de acciones.</p> <p>Pendiente de notificación de firma para solicitud del primer desembolso de fondos FONPRODE. gestiones internas en SEFIN</p>
Financiera	Reprogramar actividades financieras en base a la implementación de los componentes 1 y 2	Completar requerimientos para Inicio de implementación de los componentes 1 y 2
Técnica	<p>Finalizar proceso de negociación y firma de contrato con la empresa Sub-implementadora.</p> <p>Liquidación de fondos de fideicomiso/nueva figura administrativa del fondo y reintegro del 1er desembolso realizado en 2021.</p> <p>Definir el alcance institucional del sistema</p>	<p>Reprogramación de actividades para el cumplimiento de resultados y metas en el tiempo que resta al proyecto/Desembolso de anticipo consensuado una vez se llegue a acuerdos con la firma.</p> <p>Completar el proceso de reintegro de \$4.1MM del primer desembolso a la nueva figura administrativa. Actividad depende de BANHPROVI.</p> <p>Iniciar el proceso de evaluación y diagnóstico interno de la SAG, para determinar los requerimientos que se requerirá para el sistema.</p>

6. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)

Objetivo: El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas, en el marco del establecimiento de *alianzas público privadas* y el *fortalecimiento de temas agrologísticos* para el desarrollo del sector agroalimentario.

Descripción del Proyecto: ComRural II opera a partir del Convenio Financiero de préstamo IDA-6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020. El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

El Proyecto tiene una inversión total de **USD 100 Millones**

Localización:

Departamentos de:

- Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de junio:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos COMRURAL
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		476,495,835.00	9,240,953.03	1.94	15,635,798.13	3.28	455,061,073.15
Fuente 22: Donaciones Externas				#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	
Total	-	476,495,835.00	9,240,953.03	1.94	15,635,798.13	3.28	455,061,073.15

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
COMRURAL**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	Planes de Negocios implementados beneficiando Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Plan de Negocio	0	0	0	40	0	0
	Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	10	0	0	40	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Residencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales	Planes de Negocios aprobados por el Comité Directivo (CD) del proyecto.	Plan de Negocio	0	0	0	40	0	0
	Perfiles de negocios	Perfil	0	0	0	60	0	0
	Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs)	Asistencia Técnica	0	0	0	92	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0			0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de junio:

- Al I semestre la planificación estratégica y operativa para el proyecto ComRural II fue aprobada para uso y puesta en marcha, con los objetivos a los cuales se está dirigiendo la institución. El proceso de formulación del POA-Presupuesto fue iniciado a nivel de gobierno y giradas las instrucciones de parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), quienes compartieron las fechas clave y plazos para cada una de las etapas, dando inicio con la

determinación del presupuesto necesario para la ejecución del proyecto asignándose un monto de L 476.5 millones.

En simultaneo, se trabajaron los insumos para el POA institucional, elaborando la Matriz de planificación y seguimiento (Cadenas de Resultado 2023-2024) correspondientes según requerimientos de la Dirección de Gestión por Resultados. Siendo esta etapa culminada e implementándose para el año 2023 y en proceso de formulación para el año 2024.

- La ejecución del proyecto se enfocó técnica y operativamente en las siguientes acciones:
 - 1) apoyar actividades de pre-inversión para la identificación y formulación de los Planes de Negocios (PNs),
 - 2) la preparación del borrador de los TdR para la contratación de la firma sub-implementadora de la ventana 1,
 - 3) preparación de la convocatoria pública para la presentación de perfiles de negocios para la ventana 2,
 - 4) identificación de iniciativas de negocio para ser financiadas a través de la ventana 3,
 - 5) asesoría y seguimiento a la ejecución de 52 planes de negocios,
 - 6) la actualización de la base de datos de PSDEs, y
 - 7) actualización POA y PAC 2023.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de junio:

Área	Problemas	Soluciones (Acciones)	Responsable
Financiero-Administrativo	Realización de pagos de gasto operativo.	En proceso de pagos: Servicios públicos de las regionales que conforma el proyecto.	BM / UAP-SAG-ComRural
Técnico-Operativo	El proyecto tiene un desfase de ejecución desde de enero 2023, por lo que no se cuenta con avance físico.	El BM en fecha 10 de mayo 2023 otorgó la efectividad del proyecto. Actualmente se encuentra en revisión el POA/PAC 2023 por parte de BM y UCP; lo que permitirá la operatividad del proyecto incluyendo los pagos de salario y gasto operativo a partir del mes de Junio 2023.	BM / UAP-SAG-ComRural
	Designación de Firmas A y B interinas, para solicitud de Desembolsos.	Designación aprobada de firmas interinas A y B con el propósito de reactivar la ejecución del PNs en el marco del proyecto ComRural.	UAP-SAG-ComRural
	Comité de Evaluación interino	El Comité de Evaluación fue nombrado interinamente, con el propósito de avanzar en la revisión y aprobación de perfiles de negocios.	UAP-SAG-ComRural

7. Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras

Objetivo: El objetivo de desarrollo del Proyecto es mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en las áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras, a través de tres componentes:

Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gobernanza y gestión de los recursos hídricos

Componente 2: Ampliación de la infraestructura hidráulica resiliente para la seguridad hídrica en el Corredor Seco.

Componente 3: Gestión de Proyecto y Desarrollo de Capacidades.

financiero de préstamo IDA-6680-HN, suscrito el 8 de marzo de 2021 entre el Gobierno de Honduras y Banco Mundial por USD 70M y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021 mediante decreto legislativo N° 10-2021. El proyecto tiene como objetivo mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras.

El Proyecto tiene una inversión total de **USD 68.6 Millones**

Localización:

- **Departamento de Francisco Morazán:** Municipios de La Venta y curaren
- **Departamento de Intibucá:** Intibucá
- **Departamento de La Paz:** La Paz
- **Municipio de Nacaome:** 18 comunidades

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de junio:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Seguridad Hídrica (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		190,041,562.00	2,364,531.48	1.24	3,927,883.68	2.07	184,932,362.00
Fuente 22: Donaciones Externas				#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	
Total	-	190,041,562.00	2,364,531.48	1.24	3,927,883.68	2.07	184,932,362.00

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
SEGURIDAD HIDRICA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada			
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%	
Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras	Asistencia Técnica brindada para fortalecer la gobernanza en las municipalidades de los municipios de Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz.	Asistencia Técnica	0	0	0	1	0	0	
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Porcentaje	0	0	0	3	0	0	
	Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para las comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Porcentaje	0	0	0	3	0	0	
Nivel de Ejecución			Mensual			0	Anual		0

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos	Empresa Consultora Contratada para iniciar la Asistencia Técnica para fortalecer la gobernanza a nivel: (i) Etapa I: nivel local, Capacitación y Reforestación en Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Contrato	0	0	0	1	0	0

Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del Agua del Corredor Seco	Empresa Consultora Contratada para la Revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Contrato	0	0	0	1	0	0
	Empresa Consultora Contratada para la Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Contrato	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual		0	Anual		0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de junio:

- No se cuenta con ninguna actividad relevante para este mes de junio.

Problemática que afectó la Ejecución en el mes y acciones realizadas:

- A junio de 2023 se encuentran desfasados veintisiete (27) procesos de adquisiciones: una (1) auditoría financiera del Proyecto; tres (3) procesos para firmas consultoras; dieciocho (18) procesos correspondientes a la contratación del personal adicional que requiere la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) y cinco (5) procesos de adquisición de bienes.

8. Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana

Objetivo: El Proyecto tiene por objetivo de desarrollo mejorar la calidad y eficiencia de prestación de los servicios provistos por los Prestadores Urbanos de Servicios de Agua Potable (PUSAPs) y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19 en sus cabeceras municipales.

Descripción del Proyecto: Respecto a la implementación del Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana, con recursos del Crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial por un monto de USD 45.0 millones y contraparte municipal por USD 1.5 millones. Primero, se tiene un

plazo de ejecución Informe consolidado de proyectos del primer semestre de 2023 Página 11 de 27

El Proyecto tiene una inversión total de **USD 45.0 Millones**

Localización: La zona de intervención del proyecto se localiza en todos los departamentos a nivel nacional.

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de junio:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos AGUA URBANA
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		242,285,548.00	940,427.06	0.39	3,670,334.25	1.51	237,731,213.36
Fuente 22: Donaciones Externas				#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	
Total	-	242,285,548.00	940,427.06	0.39	3,670,334.25	1.51	237,731,213.36

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
AGUA URBANA**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable en proceso de ejecución beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Porcentaje	0	0	0	50	0	0
	Bienes e insumos COVID-19 entregados en municipios del Proyecto para su instalación escuelas y centros de salud urbanos.	Municipio	1	0	0	13	0	0
	Municipios que implementan un modelo de gestión desconcentrado para la prestación del servicio urbano de agua potable beneficiando a 6 cabeceras municipales	Municipio	0	0	0	6	0	0

Nivel de Ejecución			Mensual	0	Anual	0		
Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
Mejoramiento del Abastecimiento de Servicios de Suministro de Agua Potable en Zonas Urbanas	Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable licitados	Proyectos	0	0	0	13	0	0
	Certificación de no requerir licenciamiento ambiental para las obras de rehabilitación.	Certificación	0	1	0	13	1	8
	Licitación de bienes e insumos COVID-19	Licitación	1	0	0	13	0	0
	Evaluaciones de Impacto y Planes de Gestión Ambiental y Social (EIAS y PGAS).	Plan	0	0	0	13	0	0
	Planes de inversión de subproyectos de rehabilitación.	Plan de Inversión	0	0	0	13	0	0
	Formalización de Acuerdos de Asociación SAG-Municipalidad-Prestador	Acuerdo	0	0	0	13	0	0
Fortalecimiento Institucional de ERSAPS	Dictamen de aprobación del modelo por el ERSAPS	Dictamen	2	0	0	6	0	0
	Nombramiento de gerente del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	0	0	0	6	0	0
	Conformación de Junta Directiva del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	0	0	0	6	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual	0	Anual	1		

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de junio:

- No se cuenta con ninguna actividad relevante para este mes de junio.

Problemática que afectó la Ejecución en el mes y acciones realizadas:

- Los retrasos experimentados por el Proyecto a consecuencia de razones externas a su implementación, desde su aprobación por el Banco el 22 de junio de 2020 hasta el 4 de mayo de 2023, fecha de obtención de la efectividad por su reestructuración a causa del cambio de la Agencia Implementadora, totalizan 2.60 años que representan el 47% del plazo otorgado

para su completa implementación (5.5 años). Estos retrasos han incidido de forma bastante negativa en la ejecución presupuestaria de los recursos disponibles, al punto que al 55% de avance del plazo de implementación (30 jun 2023), apenas se ha desembolsado el 2.18% y ejecutado el 0.98% del Crédito otorgado.

9. Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)

Objetivo: Proyecto orientado a promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y fortalecimiento de centros comunales de salud y el fortalecimiento de grupos de productores, que pueden escalar a temas de competitividad y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo de corredor seco.

Descripción del Proyecto: El PROSASUR surge con el convenio financiero de donación TF 017904–HN, suscrito el 11 de noviembre de 2015 por USD 30M y el 19 de noviembre de 2021 se firmó un convenio de donación del fondo adicional TF–0B7211 por USD 5M, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y el fortalecimiento de centros comunales de salud y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

Localización: La zona de intervención del proyecto se localiza en todo el Corredor Seco del País.

El Proyecto tiene una inversión total de **USD 5.0 Millones**

A continuación, se detallan los avances financieros y físicos del mes de junio:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Junio	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donaciones Externas		67,392,925.00	1,348,309.68	2.00	1,348,309.68	2.00	65,577,580.50
Fuente 22: Donaciones Externas				#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	
Total	-	67,392,925.00	1,348,309.68	2.00	1,348,309.68	2.00	65,577,580.50

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROSASUR**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Planes comunitarios de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	0	0	0	100	0	0
	Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.	Plan	0	0	0	1	0	0
Nivel de Ejecución			Mensual			Anual		
			0			0		

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Junio			Ejecución Acumulada		
			Programado a Junio	Ejecutado a Junio	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Junio	%

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1	Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	0	0	0	1	0	0
	Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Cluster 2	Asistencia Técnica	0	0	0	1	0	0
	Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 1	Kit de Riego	0	0	0	1	0	0
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2	Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 2	Kit de Riego	0	0	0	750	0	0
	Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	0	0	0	1	0	0
EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1								

	Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 1	Cantidad	0	0	0	1	0	0
EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2	Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	0	0	0	1	0	0
	Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 2	Cantidad	0	0	0	1	0	0
	Nivel de Ejecución		Mensual	0			Anual	0

Fuente: SIAFI

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de junio:

- A la fecha, se han beneficiado directamente 12,202 hogares únicos (4,137 con una mujer como jefa de hogar) mediante la entrega de bienes y servicios de asistencia técnica llegando a un 102% de la meta global. En su fase adicional, se busca beneficiar 2000 hogares del corredor seco

A nivel de actividades se ha avanzado en lo siguiente:

- 1. La aprobación de la extensión de plazo para la donación original y financiamiento adicional al 31 de diciembre de 2024.
- 2. La obtención del presupuesto SIAFI 2023.
- 3. La revisión de los TDR para la contratación del implementador de la Donación.

- 4. La No Objeción para la contratación directa del implementador.
- 5. La aprobación de la excepción de presentación de informes de auditoría a junio del 2024.
- 6. Obtención de la NO Objeción del Manual de Operaciones (MO) y sus anexos en los que se incluye el Manual de Subproyectos (MP), documentos que rigen el accionar de la ACS PROSASUR.
- 7. Elaboración o aprobación de la cadena de valor del proyecto.

Problemática que afectó la Ejecución en el mes y acciones realizadas:

Área	Problemas	Acción Propuesta
Administrativa	- No se ha podido concluir con la contratación del director ejecutivo y de los 2 coordinadores de los componentes. - No se ha logrado cumplir todas las condiciones previas para el primer desembolso con recursos del FIDA	- Se envió solicitud de No Objeción a FIDA del candidato para director ejecutivo, se está a la espera de respuesta, ya se cuenta con no objeción de los 2 coordinadores de los componentes, se espera que en el mes de julio se realicen todos los contratos que restan para completar el equipo de la UGP. - En el mes de julio se cumplirán todas las condiciones previas para solicitar el primer desembolso.
Técnica	No se ha podido realizar ejecución técnica.	Al tener al equipo técnico completo del proyecto se procederá con el cumplimiento de las condiciones previas.

Conclusiones

- El presupuesto ejecutado en el mes de junio es de **L 19,840,430.84.** de la cartera de proyectos vigente correspondiente a **L1,484,663,310.00**, Es importante mencionar que la ejecución financiera acumulada al mes de junio es **L 61,505,829.44**. La cual corresponde a un **4.14%** del presupuesto vigente.
- Los Proyectos NO lograron la ejecución física y financiera esperada para este mes del presente año. Cabe resaltar que los proyectos en general presentan baja ejecución debido a la falta de personal técnico, ya que se están conformando las estructuras. No obstante, la ejecución financiera de algunos proyectos reflejada en el mes de junio 2023, corresponde a gastos administrativos de sueldos, salarios y pago de estimaciones.

Fecha de Elaboración: 14 de julio de 2023.

Elaborado por: El equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

