

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL III TRIMESTRE 2023.



Cultivo de AJAVI,
Pueblo Nuevo, Intibucá
Proyecto PROLENCA
Secretaría de Agricultura y Ganadería

Índice

1. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	4
1.1 Política Presupuestaria	7
1.1 Ejecución Financiera Institucional al Tercer Trimestre 2023	9
1.2 Ejecución Financiera todos los Fondos:	10
1.3 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:	10
1.4 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:	11
1.5 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:.....	11
1.6 Ejecución Financiera Fondos 22 Donación:.....	12
2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2023	13
2.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE FONDOS Y POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS.....	14
Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos	19
2.1.1 Programa 01: Actividades Centrales.....	19
2.1.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	20
2.1.3 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).....	22
2.1.4 Proyecto de Proyecto de inclusión Económica y Social de pequeños productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).	25
2.1.5 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC)	28
2.1.6 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	32
2.1.7 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	35
2.1.8 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA) 37	37
2.1.9 Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural)	39
2.1.10 Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad Pro-Occidente	41
2.1.11 Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras	44
2.1.12 Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana.....	46
2.1.13 Programa Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)	49
2.1.14 Proyecto Alianza para Corredor Seco (USAI-GAFSP PROSASUR).....	51
2.1.15 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.	53
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	54

Presentación

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en el contexto de las políticas y lineamientos del Plan de Gobierno 2018-2022 "Honduras avanza con paso firme" y en base a las funciones conferidas por ley en el Decreto Legislativo número 218-96 y en el marco de lo establecido en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, como institución responsable de normar y coordinar el Sector Agroalimentario Hondureño, en apego a la Ley para el establecimiento de una visión de país y la adopción de un Plan de Nación para Honduras, que establece en su Objetivo No.3: "Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental".


En el marco de lo antes referido y cumpliendo con las normas establecidas en el Artículo 08 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes, esta Secretaría de Estado tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual y Presupuesto, correspondiente al Tercer Trimestre del Año 2023.

El presente informe tiene como propósito proporcionar información que facilite la toma de decisiones de las máximas autoridades, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en relación con la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar la contribución de esta Secretaría de Estado, con la implementación de algunas políticas de su competencia en el área rural a través de los logros obtenidos por los programas, servicios y proyectos.

El informe consta de dos segmentos: el primero, que hace referencia a la gestión de la SAG y el segundo que refleja la ejecución financiera y física a nivel de cada Programa, Servicio y Proyecto adscrito a esta Secretaría de Estado, así como las transferencias realizadas a diferentes Instituciones del Sector público, privado y externo.

La fuente de información financiera para la elaboración del presente documento proviene del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI-GES); por otra parte, los avances en la ejecución física fueron proporcionados por cada una de las Unidades Ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos adscritos a la SAG.



Por: 
Orlando Lara Pineda
Director Ejecutivo UPEG

Antecedentes

1. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de diciembre de 1996, esto de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

Misión:

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos de la población.

Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

Objetivos Estratégicos:

1. Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios.
2. Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas.
3. Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.

Funciones de la SAG:

- a) La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:
- La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.
 - El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
 - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
 - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
 - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
 - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b) El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.

- c) La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d) La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.
- e) La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.
- f) El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
- g) La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
- h) La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
- i) La promoción del crédito agrícola.
- j) La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

Ámbito del accionar de la SAG:

A Nivel Regional: La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A Nivel Sectorial: La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.

A Nivel Institucional: A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.

1.1 Política Presupuestaria

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), como institución rectora del sistema SIAFI-GES, dicta los lineamientos que rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y Artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En ese contexto, se definió la política presupuestaria que rige el presupuesto del año 2019 y del presupuesto plurianual 2019-2022.

En la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto se toman en cuenta los lineamientos teóricos y prácticos de SEFIN, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las políticas, los planes de acción y desarrollo y la producción de bienes y servicios que competen a esta Secretaría de Estado, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con las fuentes de financiamiento.

Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de las máximas Autoridades, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, en relación a la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos y los logros obtenidos por los programas, servicios y proyectos. Este informe contiene el análisis de los avances físicos y financieros del Plan Operativo Anual y presupuesto, correspondientes al III Trimestre del año en curso.

El soberano Congreso Nacional, le aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2023, un presupuesto de **L 6,660,793,431.00** al cierre del III Trimestre el presupuesto vigente ascendió a **L 6,676,997,663.00** reflejando un incremento correspondiente a fondos incorporados a los programas: Actividades Centrales, PRONAGRO, PRONAGRI, DIGEPESCA, COMRURAL, UTSAN, Seguridad Alimentaria, Agua Urbana y Transferencias.

Este presupuesto está consignado en un **48.55% (L 3, 241, 372,157 00)** a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes **51.45% (L3, 435, 625,506.00)** a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta. El presupuesto de la SAG está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**72.9%**), Créditos Externos (**25.80%**), y Fondos Propios (**0.03%**), Donación (**1.00%**)

Al III Trimestre, refleja una ejecución de **L 4,190,067,807.6**, que representan el **62.75%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a los Fondos Nacionales un monto de **L 4,094,176,792.58** es decir un (**97.71%**) del total ejecutado en el período de evaluación, seguido a Fondos Externos (Créditos) con **L 89,241,642.26 (2.13%)**, y la diferencia corresponde a Fondos Propios con **L 4,556,801.38** es decir el (**0.11%**), seguido con Donación Externa **L 2,092,571.39 (0.05%)** del total de fondos ejecutados de la institución.

La distribución por Grupo del Gasto refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **74.11%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **10.87%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **10.97%**, Grupo 100 Servicios Personales con **2.44%** y Grupo 300 Materiales y Suministros con **1.61%**.

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 8 proyectos: Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental de Honduras (**PROLENCA**), Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (**PDABR**) , Proyecto de Inclusión


Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (**PROINORTE**), Proyecto Integrando la Innovación para la Competividad Rural en Honduras (**ComRural**), Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad **Pro-Occidente**, Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras, Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana, Proyecto Alianza para Corredor Seco (**USAI-GAFSP PROSASUR**).

Estos proyectos son financiados con fondos del BCIE, FIDA, BM, BID y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores y productoras, en su conjunto cuentan con un presupuesto de **L1,723,475,103.00** representando un **25.81%** del presupuesto total de la institución.

I. Análisis de la ejecución física y financiera de la SAG

1.1 Ejecución Financiera Institucional al Tercer Trimestre 2023

Al cierre del III Trimestre, el presupuesto vigente ascendió a **L6, 676, 997,663.00** reflejando un incremento del presupuesto aprobado por el Soberano Congreso de la Republica **48.5% (L3, 241, 372,157.00)** a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes **51.5% (L3, 435, 625,506.00)** a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta, tal cómo se puede observar en el siguiente gráfico:

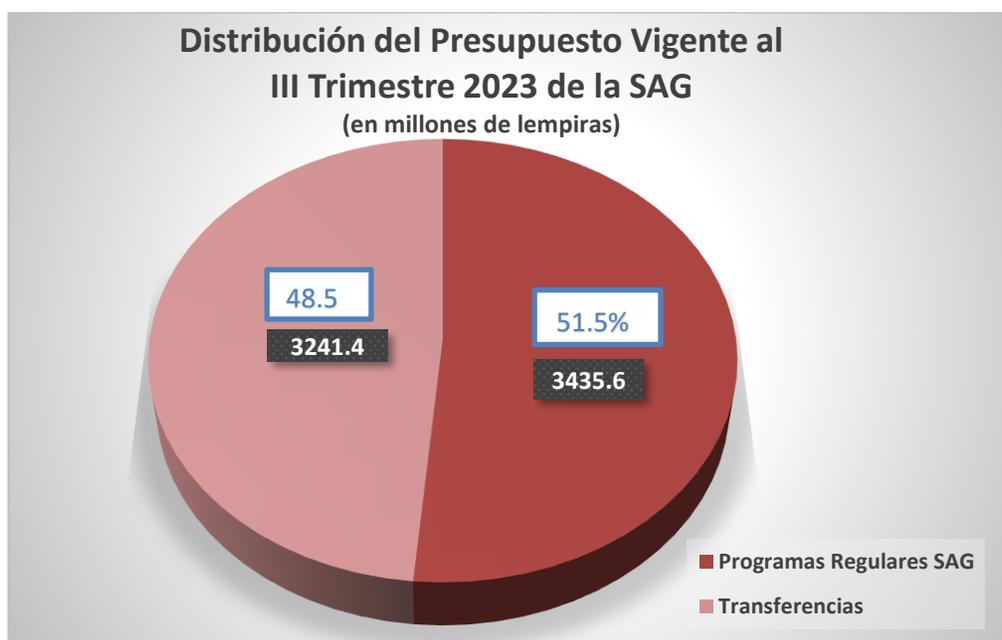

1.2 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto de la SAG Ejecutado está compuesto por tres fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales **(97.71%)**, **Créditos Externos (2.13%)**, y **Fondos Propios (0.11%)**, **Donación Externas (0.05%)**

Al III Trimestre, se refleja una ejecución de **L 4,190,067,807.61** que representan el **62.75%** del presupuesto global, de estos recursos corresponde a los Fondos Nacionales un monto de **L 4,094,176,792.58** es decir un **(97.71%)** del total ejecutado en el período de evaluación, seguido a Fondos Externos (Créditos) con **L 89,241,642.26 (2.13%)**, y corresponde a Fondos Propios con **L 4,556,801.38** es decir el **(0.11%)** , seguido con Donación Externas **L 2,092,571.39** es decir **(0.05%)** del total de fondos ejecutados de la institución.

A continuación, se detalla la programación y ejecución financiera de la SAG, al tercer trimestre de 2023:

Ejecución Financiera Todos los Fondos por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	3,443,603,687.00	3,435,625,506.00	1,384,491,124.61	40.30	1,975,985,942.22
Transferencias	3,217,189,744.00	3,241,372,157.00	2,805,576,683.00	86.56	435,795,474.00
Total	6,660,793,431.00	6,676,997,663.00	4,190,067,807.61	62.75	2,411,781,416.22

Fuente: SIAFI

Del monto ejecutado en este Trimestre, corresponden **L. 2,805,576,683.00** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo, alcanzando una ejecución equivalente a **86.56%** del presupuesto total ejecutado, mientras que los restantes **L.1,384,491,124.61**. fueron ejecutados por los programas, servicios y proyectos de la SAG, alcanzando una ejecución de **40.30%** de los fondos ejecutados.

1.3 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional:

Los recursos provenientes del Tesoro Nacional al III trimestre del año en curso, presentan un presupuesto ejecutado de **L 4,094,176,792.58** los cuales se ejecutó el **84.10%** del presupuesto total de la Institución de dichos fondos; las Transferencias muestran una ejecución de **L2,805,576,683.00** equivalentes a un **86.56%** del presupuesto total de la fuente 11, mientras que los programas regulares de la SAG,

alcanzaron una ejecución de **L 1,288,600,109.58**, es decir un **79.20%** del total de los fondos ejecutados por la institución.

**Ejecución Financiera Fondos 11 (Tesoro Nacional) por Institución
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	1,627,121,174.00	1,627,121,174.00	1,288,600,109.58	79.20	294,516,411.05
Transferencias	3,217,189,744.00	3,241,372,157.00	2,805,576,683.00	86.56	435,795,474.00
Total	4,844,310,918.00	4,868,493,331.00	4,094,176,792.58	84.10	730,311,885.05

Fuente: SIAFI

1.4 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios:

Durante el III Trimestre del año, los programas regulares de la SAG: Actividades Centrales, PRONAGRI y PRONAPAC, cerraron con un presupuesto vigente de **L 17,636,304.00** provenientes de los fondos generados por cobros en la prestación de servicios de diferente índole. Al cierre del período de evaluación, se refleja una ejecución de **L 4,556,801.38 (25.84%)** de esta fuente de financiamiento.

**Ejecución Financiera Fondos 12 (Recursos Propios) por Institución
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	208,900.00	208,900.00	46,583.61	22.30	162,316.39
PRONAGRI	219,769.00	219,769.00	-	-	219,769.00
DIGEPESCA	17,207,635.00	17,207,635.00	4,510,217.77	26.21	10,530,348.25
Total	17,636,304.00	17,636,304.00	4,556,801.38	25.84	10,912,433.64

Fuente: SIAFI

Cabe mencionar, que la generación de recursos de las Actividades Centrales es producto de la renta de alquileres de casetas y las casas de habitación en las Acacias, Juticalpa, Olancho y el cobro por canon y emisión de licencias de pesca artesanal e industrial del programa PRONAPAC.

1.5 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo:

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al III Trimestre del año reflejan un presupuesto vigente de **L. 1, 723, 475,103** representando un **25.81%** del presupuesto total de la Institución, estos recursos financian los proyectos de inversión pública que ejecuta la SAG.

**Ejecución Financiera Fondos 21 (Crédito Externo) por Institución
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Proyectos Regulares SAG	1,798,846,209.00	1,723,475,103.00	89,241,642.26	5.18	1,605,744,873.09
Total	1,798,846,209.00	1,723,475,103.00	89,241,642.26	5.18	1,605,744,873.09

Fuente: SIAFI

Los Organismos que financian los proyectos de inversión, están encabezados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y el Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Exim Bank de la India.


1.6 Ejecución Financiera Fondos 22 Donación:

Los recursos provenientes de Global Agriculture & Food Security Program (GAFSP) a través del Banco Mundial, de donación externa al III Trimestre del año reflejan un presupuesto vigente de **L. 67,392,925.00** representando un **1.01%** del presupuesto total de la Institución, ejecutándose un **3.11%** de los recursos de inversión pública que ejecuta la SAG.

**Ejecución Financiera Fondos 22 (Donaciones Externas) por Institución
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	-	67,392,925.00	2,092,571.39	3.11	64,812,224.44
Total	-	67,392,925.00	2,092,571.39	3.11	64,812,224.44

Fuente: SIAFI

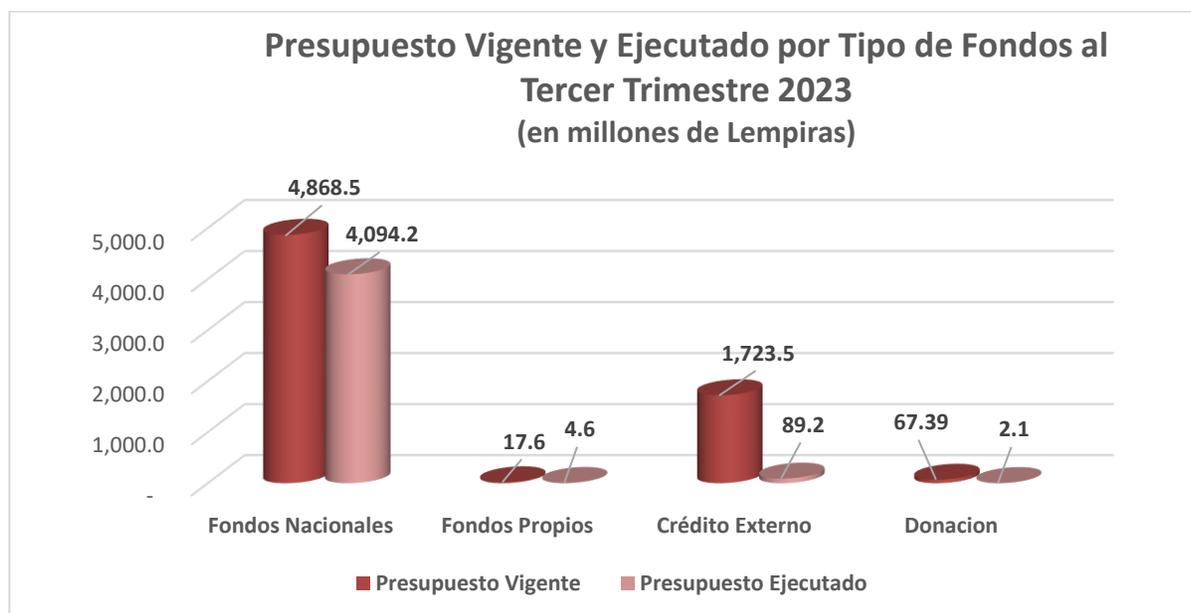


2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2023

La Secretaría de Agricultura y Ganadería ejecuta los siguientes Programas, Servicios y Proyectos:


1. Actividades Centrales;
2. Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) del que dependen los Proyectos:
 - Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR),
3. Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC);
4. Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO);
5. Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO);
6. Programa de Competitividad Rural conformado por los Proyectos:
 - Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).
 - Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).
 - Proyectos Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural)
 - Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad Pro-Occidente.
7. Programa Seguridad Alimentaria y Nutricional, conformado por los Proyectos
 - Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
 - Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana.
 - Proyecto Alianza para Corredor Seco (USAI-GAFSP PROSASUR).
8. Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

2.1 Ejecución Financiera por Tipo de Fondos y por Programas, Servicios y Proyectos.

La SAG al cierre del III Trimestre, refleja un presupuesto vigente de **L 6,676,997,663.00** cuales se destinan al financiamiento de 8 programas presupuestarios, de los cuales el programa 99 (Transferencias al Sector Público, Privado y Externo) abarca un **48.55%**, seguido del programa competitividad rural, integrado por los proyectos PROLENCA ,PROOCIDENTE,PROINORTE, COMRURAL que en su conjunto tienen una participación de **13.00%**, seguido por los programas PRONAGRO, PRONAPAC e INFOAGRO que en su conjunto tiene una participación de **20.30%**, el programa PRONAGRI, con una participación de **3.22%** y el programa Seguridad alimentaria y Nutricional integrado por los proyectos(Seguridad Hídrica, Agua Urbana, PROSASUR) en conjunto tiene una participación de **7.70%** y el resto Actividades Centrales de las SAG con un **7.24%** de participación.

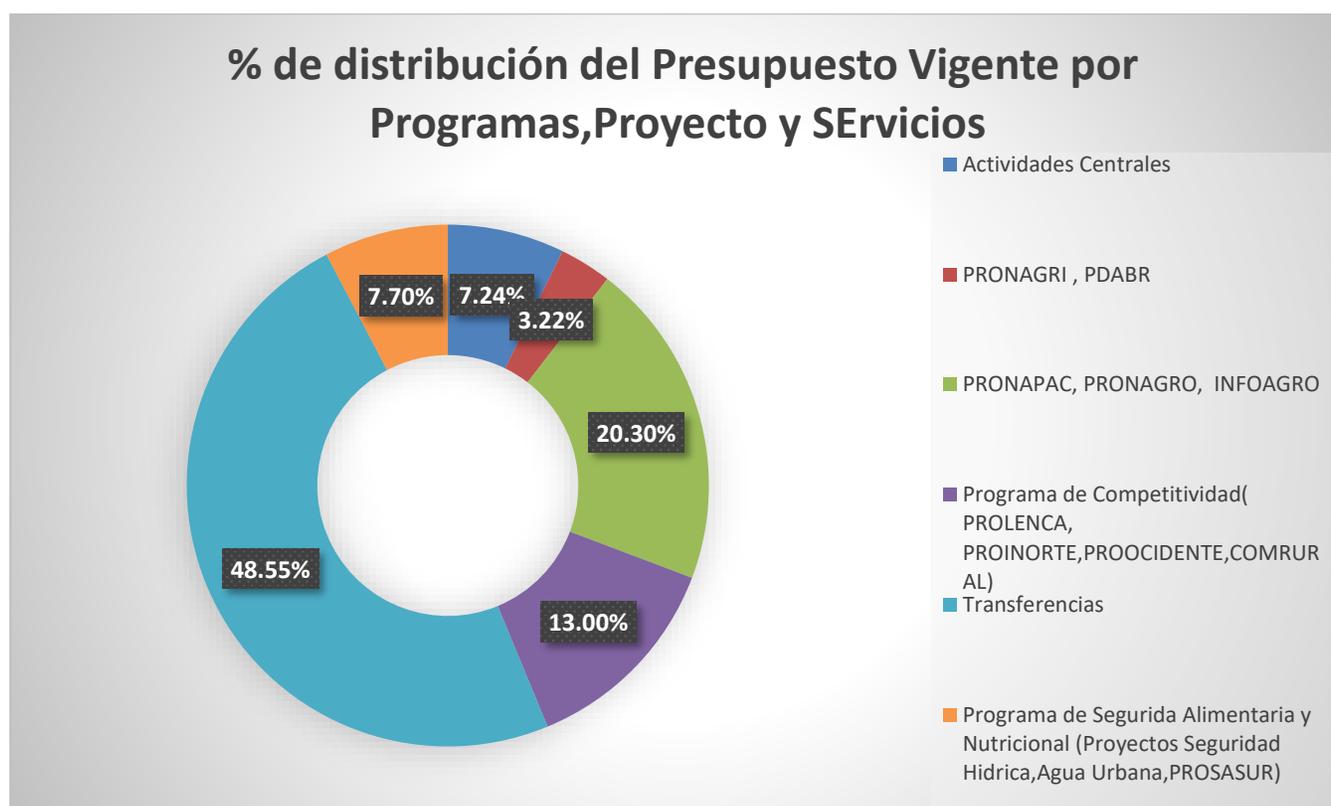

Al cierre del III Trimestre, se ejecutó el **62.75% (L 4,190,067,807.51)** del presupuesto vigente; de estos recursos, corresponde a los Fondos Nacionales un monto de **L 4,094,176,792.58** es decir un **(97.71%)** del total ejecutado en el período de evaluación, seguido de los Fondos Externos (Créditos) con **L 89,241,642.26 (2.13%)**, de los Fondos Propios se ejecutó **L 4,556,801.38** es decir el **(0.11%)** seguido de los fondos Donación **L 2,082,571.39** es decir **(0.05%)** del total de fondos ejecutados de la institución como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

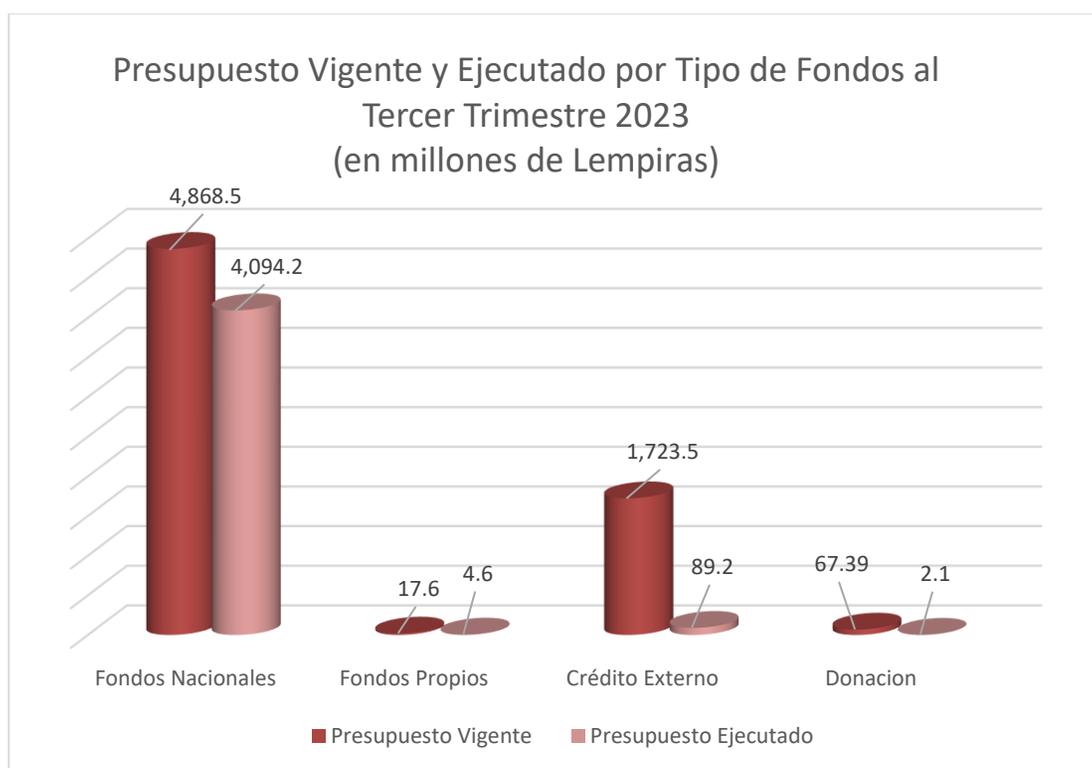

A continuación, se presenta cuadro con la ejecución financiera de todos los programas, servicios y proyectos que ejecuta la SAG:

Ejecución Financiera Todos los Fondos por Programas y Servicios
(En Lempiras)

DEPENDENCIAS	ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	1,534,904,232.00	483,558,918.00	101,783,805.34	21.05	343,335,270.91
PRONAGRI	29,780,328.00	30,430,782.00	10,346,004.45	34.00	17,364,515.88
DIGEPESCA	50,530,921.00	48,438,521.00	24,453,036.28	50.48	21,210,562.24
PRONAGRO	1,302,334,563.00	1,302,334,563.00	1,146,618,008.53	88.04	155,686,757.59
INFOAGRO	4,598,094.00	4,598,094.00	1,046,249.35	22.75	1,440,454.08
Proyecto PROLENCA	52,935,274.00	59,435,274.00	21,572,238.38	36.30	38,303,408.64
Proyecto PDABR	202,158,612.00	202,158,612.00	15,561,783.56	7.70	186,595,390.44
Proyecto PROINORTE	266,361,663.00	184,490,557.00	9,316,061.67	5.05	174,899,151.63
Proyecto PROOCCIDENTE		129,755,922.00	6,285,131.37		120,501,298.70
Proyecto COMRURAL		476,495,835.00	29,628,011.11		426,415,131.25

Proyecto SEGURIDAD HIDRICA		190,041,562.00	5,867,944.98		181,104,783.73
Proyecto AGUA URBANA		242,285,548.00	5,552,457.31		234,571,570.08
Programa UTSAN		14,208,393.00	4,367,820.89		9,745,422.61
Proyecto Alianza Corredor Seco		67,392,925.00	2,092,571.39		64,812,224.44
Transferencias	3,217,189,744.00	3,241,372,157.00	2,805,576,683.00	86.56	435,795,474.00
Total	6,660,793,431.00	6,676,997,663.00	4,190,067,807.61	62.75	2,411,781,416.22

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11).

Los Recursos del Tesoro Nacional (**L 4,868,493,331.00**), representan el **72.91%** del presupuesto vigente de la institución, de los cuales se han ejecutado **L 4,094,176,792.58** cabe mencionar que, de esta fuente, les corresponde a las transferencias realizadas al sector público, privado y externo, una ejecución de **L 2,805,576,683.00** es decir el **57.63%** del total de fondos ejecutados.

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	228,149,691.00	215,383,244.00	101,737,221.73	47.24	75,206,180.52
PRONAGRI	29,560,559.00	30,211,013.00	10,346,004.45	34.25	17,144,746.88
DIGEPESCA	33,323,286.00	31,230,886.00	19,942,818.51	63.86	10,680,213.99
PRONAGRO	1,302,334,563.00	1,302,334,563.00	1,146,618,008.53	88.04	155,686,757.59
INFOAGRO	4,598,094.00	4,598,094.00	1,046,249.35	22.75	1,440,454.08
Proyecto PDABR	17,216,651.00	17,216,651.00	1,522,747.56	8.84	15,693,543.94
Transferencias	3,217,189,744.00	3,241,372,157.00	2,805,576,683.00	86.56	435,795,474.00
PROINORTE	11,938,330.00	11,938,330.00	3,019,238.56	25.29	8,919,091.44
UTSAN		14,208,393.00	4,367,820.89	30.74	9,745,422.61
Total	4,844,310,918.00	4,868,493,331.00	4,094,176,792.58	84.10	730,311,885.05

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Recursos Propios (Fuente 12).

La SAG, con la prestación de servicios de distinta índole genera recursos propios a través de los programas: Actividades Centrales, PRONAGRI y PRONAPAC, mismos que en su conjunto reflejan un presupuesto vigente de **L 17, 636,304.00** los que representan un **25.84 %** del presupuesto total de la institución.

**Ejecución Financiera Recursos Propios Fuente 12
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	208,900.00	208,900.00	46,583.61	22.30	162,316.39
PRONAGRI	219,769.00	219,769.00		0.00	219,769.00
DIGEPESCA	17,207,635.00	17,207,635.00	4,510,217.77	26.21	10,530,348.25
Total	17,636,304.00	17,636,304.00	4,556,801.38	25.84	10,912,433.64

Fuente: SIAFI

Durante el período de evaluación, se refleja una ejecución de **0.11%** correspondientes a los servicios que prestó la institución.

Ejecución Financiera Crédito Externo (Fuente 21)

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamos), al III trimestre reflejan un presupuesto vigente de **L. 1, 723, 475,103.00** representando un **25.81%** del presupuesto total de la Institución, los cuales alcanzaron una ejecución **L. 89, 241,642.26** es decir un **5.18%** en relación con el presupuesto vigente para estos fondos.

**Ejecución Financiera Crédito Externo 21
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	1,306,545,641.00	267,966,774.00	-	0.00	267,966,774.00
PDABR	184,941,961.00	184,941,961.00	14,039,036.00	7.59	170,901,846.50
PROLENCA	52,935,274.00	59,435,274.00	21,572,238.38	36.30	38,303,408.64
PROINORTE	254,423,333.00	172,552,227.00	6,296,823.11	3.65	165,980,060.19
PROOCCIDENTE	-	129,755,922.00	6,285,131.37	4.84	120,501,298.70
COMRURAL		476,495,835.00	29,628,011.11	6.22	426,415,131.25
SEGURIDAD HIDRICA		190,041,562.00	5,867,944.98	3.09	181,104,783.73
AGUA URBANA		242,285,548.00	5,552,457.31	2.29	234,571,570.08
Total	1,798,846,209.00	1,723,475,103.00	89,241,642.26	5.18	1,605,744,873.09

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera Donación Externa (Fuente 22)

La fuente (Donaciones Externas), refleja un presupuesto vigente de fondos de Donación de Asociación Internacional de Fomento por L 67,392, 925.00 representa un (1.1%) del total del presupuesto vigente institucional, la ejecución asciende a un 3.11%.


Ejecución Financiera Fondos de Donaciones Externas SAG (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Alianza Corredor Seco	-	67,392,925.00	2,092,571.39	3.11	64,812,224.44
Donaciones	-	67,392,925.00	2,092,571.39	3.11	64,812,224.44
Total	-	67,392,925.00	2,092,571.39	3.11	64,812,224.44

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

La distribución por Grupo del Gasto refleja que el Grupo 500 de Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **74.11%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **10.88%**, Grupo 200 con Servicios No Personales con **10.98%**, Grupo 100 Servicios Personales con **2.46%** y Grupo 300 Materiales y Suministros con **1.57%**. Ver detalle de presupuesto vigente y ejecutado en cuadro y gráfico:

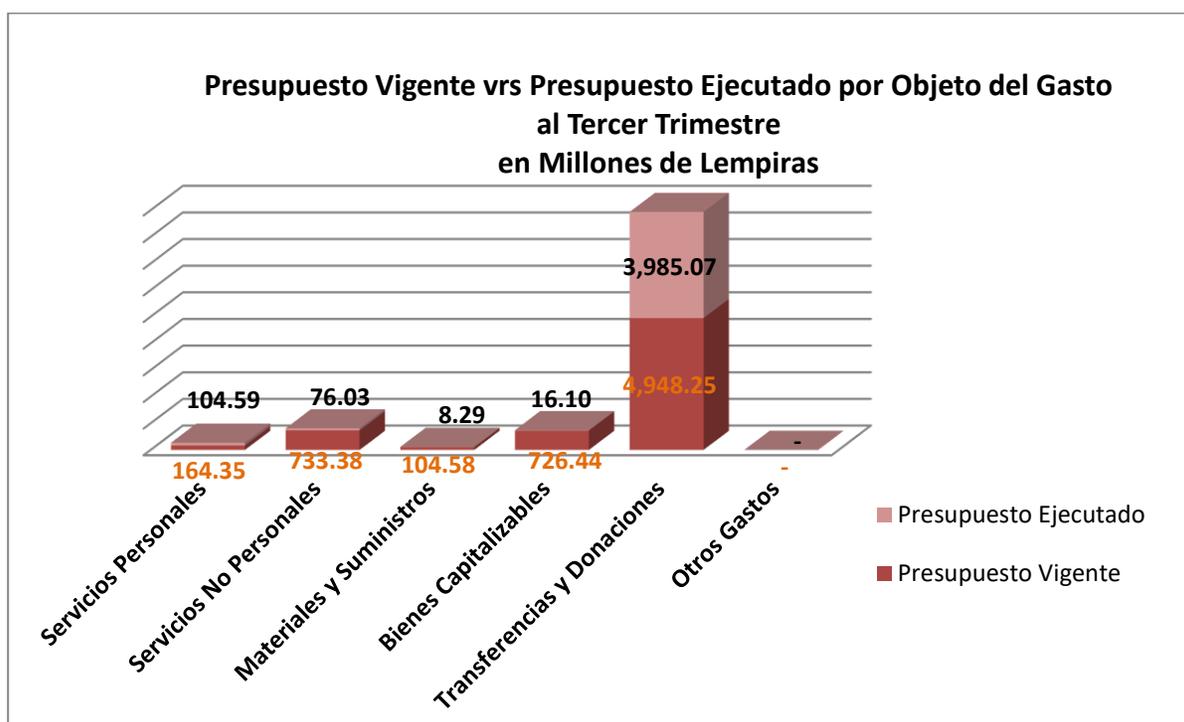

A continuación, se presenta el cuadro con la ejecución por cada Grupo del Gasto:

Ejecución Financiera por Grupo del Gasto SAG
(En Lempiras)

GRUPO DEL GASTO	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Servicios Personales	164,795,103.00	164,346,073.00	104,587,646.25	63.64	59,758,426.75
Servicios No Personales	483,121,545.00	733,383,148.00	76,025,136.81	10.37	641,592,767.58
Materiales y Suministros	130,670,464.00	104,581,116.00	8,288,988.69	7.93	94,147,777.38
Bienes Capitalizables	1,020,103,718.00	726,440,281.00	16,099,725.69	2.22	657,871,295.86
Transferencias y Donaciones	4,828,998,875.00	4,948,247,045.00	3,985,066,310.17	80.53	958,411,148.65
Activo Financieros	33,103,726.00				
Total	6,660,793,431.00	6,676,997,663.00	4,190,067,807.61	62.75	2,411,781,416.22

Fuente: SIAFI

Ejecución Física por Programas, Servicios y Proyectos

Los avances obtenidos por los programas, servicios y proyectos al III Trimestre reflejan la siguiente ejecución trimestral:

2.1.1 Programa 01: Actividades Centrales

Este programa comprende: 1) Dirección y Coordinación Superior, 2) Servicios Administrativos y Financieros, 3) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, 4) Unidad de Agro ambiente cambio climático, 5) Servicios de Secretaría General, 6) Auditoría Interna, 7) Coordinaciones Regionales, 8) Fomento a la Equidad de Género, 9) Apoyo al Sector Público y Privado y 10) Apoyo Financiero a Organismos del Exterior.

La Gerencia Administrativa, es la responsable de la administración presupuestaria, de los recursos humanos, materiales y servicios generales en apoyo a los programas, proyectos y demás servicios que presta la Secretaría, así como de los procesos de compra y suministros de bienes y servicios.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el cuadro siguiente:

**Ejecución Financiera Actividades Centrales
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	228,149,691.00	215,383,244.00	101,737,221.73	47.24	75,206,180.52
Fuente 12: Recursos Propios	208,900.00	208,900.00	46,583.61	22.30	162,316.39
Fuente 21: Credito Externo	1,306,545,641.00	267,966,774.00		0.00	267,966,774.00
Total	1,534,904,232.00	483,558,918.00	101,783,805.34	21.05	343,335,270.91

Fuente: SIAFI

En el cuadro anterior, el programa Actividades Centrales muestra una ejecución de 21.05%, como se puede observar los fondos 21 Crédito Externo no tienen ejecución debido a que son recursos que serán trasladados al programa Competitividad Rural y que serán ejecutados a través del Proyecto ComRural III, asimismo incluye los fondos asignados al proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle Jamastran,

2.1.2 Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)

Es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación.

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PRONAGRI**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI)	Hectáreas de tierras agrícolas irrigadas en las parcelas de los productores/as en los distritos de riego a nivel nacional.	Hectárea	2040	1,765	87	8159	4,493	55

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Análisis de Laboratorios de suelo, concreto, hidráulica, fisiología vegetal, brindados a personas naturales y jurídicas.	Análisis	-	-	-	33	-	-
Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en género (Género, sexo, identidad, roles entre otros) .	Capacitación	3	12	400	12	18	150
Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a micro riego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras.	Hectárea	17		-	97	10	10

Fuente: SIAFI

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Servicio de riego	Servicios de distribución de agua brindados.	Servicio	14,601	23,141	158	56,376	75,105	133
	Capacitación brindada en diversos temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión del riesgo, uso de suelo, pruebas en laboratorios entre otros, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	17	16	94	56	48	86
Investigación y Desarrollo de Tecnología de Riego	Pruebas de laboratorios realizadas.	Prueba de laboratorio	0	0	0	61	0	0
	Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lotes Demostrativos	2	1	50	10	6	60
Asistencia técnica en la identificación de áreas potenciales para Riego	Kit de riego (tuberías, accesorios, cinta de goteo y filtros) instalado en hectáreas de tierra.	Kit de Riego	25			140	10	7
	Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	25	20	80	100	40	40
	Diseño y presupuesto de sistemas de riego	Diseño	3	2	67	12	7	58
	Perfiles técnicos elaborados a productores agrícolas.	Perfil	9	9	100	51	43	84
	Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	22	29	132	144	124	86
Fomento de la equidad e igualdad de Género en las actividades de riego y drenaje	Plan de capacitación elaborado.	Plan	1	1	100	4	3	75

Fuente: SIAFI

Al III trimestre del 2023, no se han brindado servicios de laboratorios, ya que las instalaciones no cuentan con el servicio de energía eléctrica.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRI
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	29,560,559.00	30,211,013.00	10,346,004.45	34.25	17,144,746.88
Fuente 12: Recursos Propios	219,769.00	219,769.00	-	0.00	219,769.00
Total	29,780,328.00	30,430,782.00	10,346,004.45	34.00	17,364,515.88

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera. La ejecución financiera, refleja un avance de un **34%**, debido a que algunos procesos se encuentran en licitación, asimismo se solicitaron modificaciones al presupuesto, que están en proceso de aprobación.

Principales Logros:

- a) Se atendieron 760 productores (721 hombres y 168 mujeres) en los diferentes Distritos de Riego con el servicio de suministro de agua, se elaboraron 9 perfiles de riego en las regionales de Nacaome y Danlí beneficiando a 57 productores (42 hombres y 15 mujeres), se brindaron 29 asistencias técnicas y 16 capacitaciones en diversos temas de riego a 416 productores (276 hombres y 140 mujeres) además se impartieron 3 capacitaciones en el tema de sensibilización de género a 49 productores (37 hombres y 12 mujeres) Se estableció 1 lote nuevo lote demostrativo de cultivo de 1,500 mts² con goteo. Beneficiándose a un total de 1,282 productores y estudiantes (979 hombres y 303 mujeres) durante el III Trimestre.

2.1.3 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

El objetivo general del Proyecto es promover el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo mejorando los niveles de producción que eleve la contribución del PIB agrícola de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.

Ejecución Física. La ejecución física del proyecto se muestra a continuación

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023

PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	–		–	1,350	1300	96.3
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores y productoras.	Hectárea	–	–	–	38	–	–
	Planes de producción aprobados y entregados a grupos empresariales de productores y productoras organizados,	Plan	–	–	–	5	–	–
	Capacitación en uso y manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente impartidos a los usuarios en los canales de riego Selguapa y san Sebastián, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	6	7	117	12	8	67
	Constituidos los productores y productoras en grupos empresariales de acuerdo a la producción agrícola.	Documento	–	–	–	10	–	–
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores y productoras.	Hectárea	–	–	–	38	–	–
	Planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales de las subcuencas Tascalapa, Siguapa, Maralito, Oloman, Cuyamapa, Selguapa y Jupuara, socializado con las asociaciones de regantes, alcaldías municipales y actores claves de la gestión ambiental.	Plan de Manejo Ambiental	3	4	133	7	8	114

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas, en parcelas de los productores y productoras.	Hectárea	272	-	-	272	-	-
---	----------	-----	---	---	-----	---	---

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			0		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego	Líneas de tubería instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	14	-	-	14	-	-
Asistencia Técnica y Comercialización	Talleres de capacitación impartidos en diversificación agrícola (manejo de agua y fertigración), aplicando medidas de bioseguridad.	Taller de Capacitación	10	-	-	10	-	-
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	3	7	233	6	10	167
Organización y Desarrollo Local	Formulación de planes de producción.	Plan	-	-	-	5	-	-
	Expedientes documentados a grupos empresariales organizados para la gestión de la personería jurídica.	Expediente	-	-	-	10	-	-
	Organización de productores y productoras organizados en grupos empresariales, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	-	-	-	10	-	-
	Diagnóstico situacional de los grupos empresariales organizados	Diagnostico	5	-	-	10	-	-
Gestión Ambiental	Plan de trabajo para la socialización de los planes de ordenamiento y manejo de los recursos naturales.	Plan de Trabajo	-	-	-	1	1	100
	Plan de capacitación elaborado.	Plan	-	-	-	2	2	100

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	17,216,651.00	17,216,651.00	1,522,747.56	8.84	15,693,543.94
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	184,941,961.00	184,941,961.00	14,039,036.00	7.59	170,901,846.50
Total	202,158,612.00	202,158,612.00	5,561,783.56	7.70	186,595,390.44

Fuente: SIAFI

El Proyecto PDABR, refleja al III trimestre una baja ejecución de **7.70%**, debido a que se encuentra en proceso de aprobación la reestructuración y ampliación del proyecto PDABR, para iniciar la contratación de la empresa Consultora que ejecutaran las metas físicas del proyecto. Se solicito al BCIE la No Objeción.

Principales Logros:

- Suscritos convenios de compraventa con agroexportadoras como HONDUPRODUCE e INALMA, beneficiando a 8 productores y productoras con la diversificación de siembra de 11 hectáreas del cultivo de plátano y 0.7 has. de yuca.
- 34 productores y productoras han diversificado sus cultivos con la siembra de 29 hectáreas de cultivos como Okra, Bangaña, Papaya, Sandia, Guayaba, Yuca, etc.

2.1.4 Proyecto de Proyecto de inclusión Económica y Social de pequeños productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE).

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático. Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

Ejecución Física. La ejecución física del proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROINORTE**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE)	Plan de fortalecimiento elaborado a organizaciones de productores y productoras.	Plan	-	-	-	1	-	-
	Planes de Negocios Implementados a grupos de productores y productoras (resilientes e inclusivas).	Plan de Negocio	-	-	-	1	-	-
	Planes de inversión en servicios ecosistémicos y dinamización territorial implementados con grupo de productores y productoras.	Plan de Inversión	-	-	-	2	-	-
	Campañas de concientización nutricional y articulación a espacios Seguridad Alimentaria Nutricional SAN con jóvenes especialmente mujeres adolescentes implementadas.	Campaña	-	-	-	1	-	-
	Desembolsos realizados a instituciones u organizaciones seleccionadas.	Cantidad	-	-	-	1	-	-
	Kits de herramientas entregados a las Unidades Municipales Ambientales (UMA) entregados.	Kit	-	-	-	5	-	-
	Red de gestores de innovación Implementado en los municipios de influencia del proyecto.	Estación	-	-	-	5	-	-

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.	Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto.	Diagnostico	-	-	-	20	-	-
	Identificación de la red de gestores.	Informe	1	-	-	1	-	-
	Diseño de campañas de concientización nutricional.	Campaña	1	-	-	1	-	-
	Selección de la institución u organización a fortalecer que brindara los servicios de investigación.	Cantidad	1	-	-	1	-	-
	Estudios complementarios en temas ambientales al proceso de diagnóstico territorial.	Estudio	-	-	-	2	-	-
	Fondo concursable de innovación estratégica creado.	Concurso	-	-	-	1	-	-
Desarrollo Productivo y Resiliencia	Planes de Negocios Formulados.	Plan de Negocio	-	-	-	10	-	-
	Estudios de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo) realizados.	Estudio	-	-	-	1	-	-
	Kit de herramientas adquiridos.	Kit	-	-	-	5	-	-
	Formulación de planes de inversión en servicios ecosistémicos.	Pal de Inversión	-	-	-	2	-	-

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera: La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE

FUENTE	ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	11,938,330.00	11,938,330.00	3,019,238.56	25.29	8,919,091.44
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	130,683,333.00	124,183,333.00	6,296,823.11	5.07	117,611,166.19
Fuente 21: Crédito Externo OFID	123,740,000.00	48,368,894.00	-		48,368,894.00
Total	266,361,663.00	184,490,557.00	9,316,061.67	5.05	174,899,151.63

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera:

En proceso de contratación del personal técnico para la ejecución del proyecto, quienes realizaran el proceso de diagnóstico, y se encuentra en proceso de notificación oficial de la ONCAE para poder proceder a la compra conjunta de los insumos, materiales, equipo, materiales y suministros para la operatividad del proyecto.

Principales Logros:

- Actualizado el marco lógico y del COSTAB del proyecto.
- Apertura de dos oficinas en la sede de Tocoa, Colón y Olanchito, Yoro, quienes iniciaron operaciones presenciales a partir del 11 de septiembre del 2023.

2.1.5 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC)

El Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura (PRONAPAC), es el responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiológicas y la política pesquera nacional. Este programa, tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura.

Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
DIGEPESCA

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Pesca y Fomento a la Acuicultura	Licencias de pesca emitidas a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero,	Licencia	74	77	104	215	182	85
	Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales, acuícolas.	Capacitación	19	26	137	70	66	94
	Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros.	Licencia	4482	3953	88	10,504	9,309	89
	Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas.	Alevine	556000	539540	97	1,500,000	1,147,690	77
	Contrato de arrendamiento otorgado a acuicultores en el rubro de cultivo de camarón.	Contrato	–	–	–	1	–	–
	Tablas de alimentación, estimaciones de % de sobrevivencia y biometrías aplicadas para evaluar indicadores de rendimiento en el centro de investigación el CARAO, en beneficio de los productores y productoras acuícolas.	Informe de Investigación	1	–	–	4	–	–
	Censo de participación de las mujeres en las actividades pesqueras y acuícolas en las comunidades costeras del Golfo de Fonseca,	Porcentaje	25		–	100	25	25
	Diagnóstico participativo rural de las comunidades pesqueras y acuícolas,	Informe de Investigación	1	1	100	4	2	50

	Convenio establecido de alianza estratégica entre el programa pesca y fomento a la acuicultura y la institución manejadora de áreas marino costeras en beneficio de las comunidades pesqueras en el Golfo de Fonseca y/o la mosquitia.	Convenio	1	-	-	1	-	-
--	--	----------	---	---	---	---	---	---

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Investigación Pesquera y Acuicola	Recolección de datos socioeconómicos y de aprovechamiento hidrobiológicos en áreas de estudio predeterminadas.	Documento	-	-	-	2	1	50
	Elaboración de manual de métodos de siembra, cosecha y tablas de alimentación diaria.	Documento	-	-	-	1	-	-
Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuicola	Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas,	Reporte	671	671	100	2,573	2,163	84
	Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	246	246	100	900	653	73
Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuicola	Asistencia técnica a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	69	81	117	200	170	85
	Plan de capacitación elaborado	Plan	-	-	-	6	-	-
	Documento de proyecto aprobado para promover la extensión y desarrollo acuícola sustentable.	Documento	1	-	-	1	-	-
Fomento a la Acuicultura	Producción de alevines de tilapia.	Alevines	600000	550,000	92	1,550,000	1,180,000	76
	Inspecciones realizadas a fincas camaroneras previo a ser otorgado el contrato de arrendamiento.	Reporte	-	-	-	1	-	-

Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico.	Capacitación	3	-	8	2	25
--	--------------	---	---	---	---	----

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos DIGEPESCA

(En Lempiras)

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	33,323,286.00	31,230,886.00	19,942,818.51	63.86	10,680,213.99
Fuente 12: Recursos Propios	17,207,635.00	17,207,635.00	4,510,217.77	26.21	10,530,348.25
Total	50,530,921.00	48,438,521.00	24,453,036.28	50.48	21,210,562.24

Fuente: SIAFI

Análisis de la Ejecución Financiera:

Al III trimestre 2023 el programa tiene un presupuesto vigente de **L. 48,438,521.00** de los cuales se ejecutó a la fecha **L. 24,453,036.28** alcanzando un **50.48%**, debido a que hay procesos de pago pendientes los cuales de reflejaran en el mes siguiente.

En proceso de gestión la contratación de Recurso Humano (Técnicos) en algunas Regionales: El CARAO, Comayagua, Omoa, El Lago de Yojoa, San Pedro Sula, La Ceiba, que permita ampliar la cobertura de los servicios que brinda el programa a la población que realiza actividades pesqueras y acuícolas.

Principales logros:

- Realizadas 917 inspecciones y operativos de control y vigilancia en alta mar, aguas continentales y tierra, para controlar la pesca ilegal, regular la explotación racional de los recursos marino-costeros, y el registro de personas particulares dedicadas a las actividades pesqueras y acuícolas en los departamentos de Atlántida, Cortes, Colón, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía y Francisco Morazán.
- Generados 1,014 nuevos empleos (933 hombres y 81 mujeres entre los cuáles se encuentran 152 jóvenes), por medio de la emisión de licencias en los departamentos de Atlántida, Cortés, Colón, Choluteca, Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Francisco Morazán y Valle.

2.1.6 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad. Cabe mencionar que a través del programa se ejecuta el Bono Cafetalero, Bono Tecnológico Productivo y Bono Ganadero, como programas presidenciales en apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional de los pequeños productores y productoras a nivel nacional.

Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 PRONAGRO

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Informe	9	9	100	38	34	89
	Centro de Biotecnología Reproductiva equipado en beneficio de los productores y productoras de ganado.	Cantidad	–	–	–	1	–	–
	Planta procesadora de leche entregada a productores y productoras de ganado lechero.	Cantidad	–	–	–	1	–	–
	Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	1	1	100	3	2	67
	Asistencia técnica brindada a Pequeños y Medianos Productores y productoras de café.	Asistencia Técnica	2000	2000	100	9000	2000	22
	Bono de semilla de pasto entregado a pequeños productores y productoras de ganado.	Bono	2000	2000	100	7750	2000	26

Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	–	141760	–	300000	293229	98
Bono de fórmula cafetalera entregado a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Bono	25000	25000	100	75000	25000	33
Escuelas de campo formadas con pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	–	–	–	50	–	–
Instaladas cercas eléctricas en Fincas modelos de pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	–	–	–	250	–	–
Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes.	Informe	1	1	100	2	2	100
Comisión Interinstitucional de Agronegocios de Honduras reactivada en beneficio de los actores de las cadenas agroalimentaria.	Informe	1	–	–	4	–	–

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias	Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	3	2	67	10	10	100
	Reglamento interno de la Comisión Interinstitucional de Honduras aprobado.	Reglamento	–	–	–	1	–	–
	Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	6	4	67	20	15	75
	Plan estratégico de la Comisión Interinstitucional de Honduras aprobado.	Plan	–	–	–	1	–	–
Agronegocios	Talleres de capacitación impartido.	Taller de Capacitación	–	–	–	3	–	–
	Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnostico	–	–	–	3	–	–
	Plan de Negocio elaborado	Plan de Negocio	–	–	–	3	–	–

	Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	1	1	100	2	2	100
Bono cafetalero para la fertilización en apoyo a pequeños y medianos productores	Quintales de fertilizantes de fórmula cafetalera comprados.	Quintal	230000	284678	124	230,000	284678	124
	Diagnósticos a fincas productoras de café elaborado.	Diagnostico	-	-	-	2,000	-	-
Bono Tecnológico Productivo	Quintales de fertilizantes de fórmula comprados.	Quintal	-	348967	-	400,000	348967	87
	Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	-	-	-	88,000	37043	42
	Plántulas de frutales entregados.	Plántula	-	37000	-	60,000	37000	62
	Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	1800	1797	100	4,000	2898	72
	Kits fitosanitarios entregados	Kit	-	-	-	252,500	151000	60
Bono Ganadero	Paquetes de 4 kilos de semilla de pasto comprados.	Cantidad	7750	5750	74	7,750	5750	74
	Compra de equipo especializado para Centro de Biotecnología reproductiva.	Equipo	-	-	-	1	-	-
	Construcción de planta procesadora de leche.	Porcentaje	20	-	-	100	-	-
	Kit para cercas eléctricas adquiridas	Kit	250	330	132	250	330	132
	Asistencia técnica brindada a Productores y productoras de ganado.	Asistencia Técnica	1000	975	98	2,000	1975	99

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera. La ejecución del programa se muestra a continuación:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PRONAGRO
(En Lempiras)

FUENTE	ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	2,334,563.00	2,334,563.00	1,400,122.03	59.97	904,644.09
	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	
	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	845,217,886.50	84.52	154,782,113.50
	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	
Total	1,302,334,563.00	1,302,334,563.00	1,146,618,008.53	88.04	155,686,757.59

Fuente: SIAFI

Principales Logros:

- 293,200 productores y productoras acceden a los alimentos y generan ingresos de la producción de maíz y frijol, de los cuales 92,116 mujeres y 201,084 hombres, en 17 departamentos a nivel nacional.
- 92,555 pequeños productores y productoras de café, beneficiadas con el bono cafetalero, así como con asistencia técnica.
- 16,244 pequeños productores y productoras de ganado beneficiadas con bono de semilla de pasto.
- Realizado el censo de Fresa para elaborar la tabla de distribución de importación de material vegetativo de fresa y realizar calendarización de siembra con el objetivo de mantener los buenos precios en el mercado nacional.
- 2. Los productores y productoras implementan buenas prácticas agrícolas con el uso adecuado de los insumos que les permita una mejora en los rendimientos.
- Realizado Taller “Fortalecimiento en la Calidad del Cacao” en el cual se expusieron temas teóricos y prácticos como el beneficio de la postcosecha, cambios bioquímicos durante la fermentación, pruebas de sabores básicos y umbrales, y cata de diferentes muestras de licor de cacao, dicho evento se realizó en coordinación con el Comité Nacional de la Cadena de Cacao, SAG-PRONAGRO, FHIA, Chocolats Halba de Honduras, RIKOLTO y PROCACAO.
- Desarrollado diplomado de fertilidad de suelos a 90 técnicos de las asociaciones de productores de marañón, pitahaya y ajonjolí de la zona sur del país, se contó con el apoyo de representantes del INFOP y profesores de Institutos técnicos del sur.
- Fortalecidas las capacidades de 17 jóvenes fermentadores de 10 organizaciones cacaoteras, El evento fue coordinado por el Comité Nacional de la Cadena de Cacao, liderado por SAG-PRONAGRO, la FHIA y Chocolats Halba de Honduras, RIKOLTO y PROCACAO.
- Realizada la FERISAG, Juticalpa en la Plaza Francisco de Paula Flores, con la participación de más de 60 productores y emprendedores de la zona, con el fin de impulsar la seguridad alimentaria, así como acciones de comercialización.

2.1.7 Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país.

Ejecución Física. La ejecución física del Servicio se muestra a continuación

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
INFOAGRO**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Servicio de Información Agroalimentaria	Página WEG de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y de mercado, disponible a la población en general.	Reporte	3	3	100	12	11	92
	Documentos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de las cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible en la página web a la población en general.	Documento	54	107	198	216	238	110

Actividad/ Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Dirección en Tecnologías de la Información	Reportes elaborados con la información agrometeorológica seleccionada.	Reporte	3	6	200	12	17	142
	Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentaria seleccionados.	Documento	30	31	103	210	112	53

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos INFOTECNOLOGÍA
(En Lempiras)**

FUENTE	ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	4,598,094.00	4,598,094.00	1,046,249.35	22.75	1,440,454.08
Total	4,598,094.00	4,598,094.00	1,046,249.35	22.75	1,440,454.08

Fuente: SIAFI

Se encuentra en proceso de compra de equipo de informática y pago de licencias y software para mejora del servicio de la SAG a nivel central y regional.

Principales Logros:

- Actualizado el reporte Agro-Meteorológico, el cual tiene como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.

2.1.8 Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur-Occidental (PROLENCA)

Este Proyecto tiene como objetivo, mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza, vulnerabilidad al cambio climático y la pobreza extrema.

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
PROLENCA**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa de Competitividad Rural	Planes de Fortalecimiento organizacional implementados a organizaciones.	Plan	–		–	60	63	105

Capacitaciones en inclusión social y género brindadas a organizaciones	capacitación	-	-	-	50	50	100
Documento final de cierre del proyecto dirigido a socios estratégicos, autoridades, beneficiarios y ente financiador.	Documento	1	-	-	1	-	-
Asistencia técnica en temas administrativos y financieras brindadas a familias productoras agremiadas en Cajas Rurales de Ahorro y Crédito.	Asistencia Técnica	-	-	-	100	127	127
Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego rehabilitadas a productores y productoras contribuyendo a la seguridad alimentaria.	Hectárea	-	-	-	5	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	-	-	-	60	63	105
	Consultoría aprobada para el fortalecimiento de Organizaciones.	Consultoría	-	-	-	1	1	100
	Evaluación de resultados del proyecto.	Informe	1	1	100	1	1	100
Desarrollo Productivo y de Negocios	Selección de cajas rurales de ahorro y crédito.	Caja Rural	-	-	-	100	127	127
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social (FIDA II)	Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas FIDA II.	Kilómetro	-	-	-	100	1	1
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Líneas de tubería instaladas en parcelas agrícolas.	Kilómetro	-	-	-	1	1	100

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)**

FUENTE	ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	52,935,274.00	59,435,274.00	21,572,238.38	36.30	38,303,408.64
Total	52,935,274.00	59,435,274.00	21,572,238.38	36.30	38,303,408.64

Fuente: SIAFI

Principales Logro:

- **Informe de terminación del proyecto:**

Se encuentra en proceso de Revisión del Informe Final del proyecto

- **Evaluación de Resultados del proyecto:**

Iniciado el proceso de evaluación de resultados del proyecto, realizándose con un enfoque participativo, el que representará una síntesis de hechos, opiniones y puntos de vista recopilados por la consultora e identificará sus hallazgos a través de la triangulación de la información obtenida de las diferentes fuentes de información, que también representarán los medios de verificación. El abordaje participativo fue necesario para asegurar un alto nivel de cooperación entre el evaluador y los actores del proyecto y que sea un ejercicio evaluativo de utilidad para la toma de decisiones en siguientes proyectos, así se podrá tener mayor probabilidad de que los hallazgos, y específicamente las recomendaciones, sean utilizadas por la SAG, el FIDA y sus socios.

2.1.9 Proyecto Integrando la Innovación para la Competividad Rural en Honduras (ComRural)

Convenio Financiero de préstamo IDA- 6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020. El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto Integrado la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL)
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		476,495,835.00	29,628,011.11	6.22	426,415,131.25
Total	-	476,495,835.00	29,628,011.11	6.22	426,415,131.25

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 Proyecto Integrado la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL)

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	Planes de Negocios implementados beneficiando Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Plan de Negocio	20	1	5	40	1	3
	Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	-	-	-	40	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%

Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales	Planes de Negocios aprobados por el Comité Directivo (CD) del proyecto.	Plan de Negocio	20	18	90	40	18	45
	Perfiles de negocios	Perfil	20	20	100	60	20	33
	Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs)	Asistencia Técnica	10	–	–	92	–	–

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera

El proyecto solicitó la no objeción ante el organismo financiador (Banco Mundial) para la contratación del personal técnico de los componentes, debido a que la efectividad del proyecto se aprobó en el mes de junio del 2023.

Se encuentra en proceso de realizar a las organizaciones beneficiadas la transferencia no reembolsable, de los planes de negocio que fueron ratificados, afectando la ejecución financiera al III trimestre.

Principales Logros:

- Ratificación de 9 planes de negocios (PNs), por el Comité Directivo en fecha 24 de agosto, por el monto de L 80.3 millones que corresponde el 56% a transferencia no reembolsables, 33% a AFP y el 11% corresponde a OPRs, su inversión enfocada a la cadena de café especiales, hortalizas y granos básicos.

2.1.10 Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad Pro-Occidente

Con el objetivo general de incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco se han desarrollado las siguientes acciones por componentes

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación:

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad
PROCCIDENTE**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad	Planes de inversión con la adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados a productores y productoras organizadas (o).	Plan de Inversión	-	-	-	20	-	-
	Planes de manejo de microcuencas implementados.	Plan de Manejos de Microcuencas	-	-	-	5	-	-
	Créditos otorgados a productores rurales.	Credito	-	-	-	55	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Fortalecimiento del Desarrollo Productivo	Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto	Plan de Inversión	-	-	-	20	-	-
	Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición.	Asistencia Técnica	-	-	-	20	-	-
	Planes de manejo de microcuenca aprobados por el Instituto Conservación Forestal ICF.	Plan de Manejos de Microcuencas	-	-	-	5	-	-
Acceso a Financiamiento	Monto de créditos y garantías aprobados	Lempira	-	-	-	5000000	-	-

Fuente:SIAFI

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad Pro-Occidente (PROOCCIDENTE)
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BID		129,755,922.00	6,285,131.37	4.84	120,501,298.70
Total	-	129,755,922.00	6,285,131.37	4.84	120,501,298.70

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera

- El proyecto solicitó la no objeción ante el organismo financiador para la contratación del personal técnico de los componentes, debido a que la efectividad del proyecto se aprobó en el mes de junio del 2023.
- Solicitud de notificación de firmas para desembolso de los fondos FONPRODE. Apalancamiento de 35.MM /Fase II
- Completar el proceso de reintegro de \$4.1MM del primer desembolso a la nueva figura administrativa, misma que depende de la liquidación de fondos de fideicomiso/nueva figura administrativa del fondo y reintegro del 1er desembolso realizado en 2021

Principales logros:

- A nivel de avances para alcanzar las metas 2023 se han realizado las siguientes acciones:
- Distribuidos 11,600 entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- Firmado el contrato con la firma sub-implementadora del componente 1, 2 fortalecimiento productivo”. Durante el mes de octubre se dará seguimiento al proceso de planificación y coordinación previas al primer desembolso dando inicio a las actividades de campo en los 88 municipios cobertura del proyecto.
- Se continúa el proceso de negociación para la nueva figura administrativa del fondo para financiamiento rural con BANHPROVI y la liquidación/transferencia de los fondos desembolsados por el proyecto en 2021

- Se da seguimiento a la revisión del borrador del convenio de donación, IGR HO-G1261 por \$1.4MM, que serán financiados por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (WEF). El objetivo de los fondos será ampliar las actividades de los Subcomponentes 1.1 y 1.2 del Proyecto HO-L1201/HO-L1211 (Adopción de Tecnologías CI y Asistencia Técnica Integral, respectivamente), atendiendo exclusivamente a MiPyME vinculadas al sector agropecuario lideradas por mujeres.
- Se continuo con la asistencia técnica a grupos de productores con riego en las siguientes actividades de: aforos, mejora de obras toma, desarenadores, mantenimiento en la línea de conducción, operación y mantenimiento de estaciones de filtrado y tiempos de regado.
- Organización de Mujeres Indígenas con información actualizada sobre el Proyecto.

2.1.11 Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras

El Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras es un crédito externo aprobado el 12 de junio de 2020 por el Directorio del Banco Mundial, con Acuerdo de Financiamiento firmado por el Estado de Honduras el 8 de marzo de 2021, el cual fue publicado en La Gaceta No. 35,590 el 5 de mayo de 2021. Este período correspondió al primer año del Proyecto que coincidió con el inicio de la crisis sanitaria mundial, la pandemia COVID-19.

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 SEGURIDAD HIDRICA

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras	Asistencia Técnica brindada para fortalecer la gobernanza en las municipalidades de los municipios de Intibucá, La Venta, Curaren y La Paz	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
	Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Porcentaje	-	-	-	3	-	-

Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para las comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Porcentaje	-	-	-	3	-	-
--	------------	---	---	---	---	---	---

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos	Empresa Consultora Contratada para iniciar la Asistencia Técnica para fortalecer la gobernanza a nivel: (i) Etapa I: nivel local, Capacitación y Reforestación en Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz	Contrato	-	-	-	1	-	-
Ampliación de la Infraestructura Hidráulica Resiliente para la Seguridad del Agua del Corredor Seco	Empresa Consultora Contratada para la Revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz	Contrato	-	-	-	1	-	-
	Empresa Consultora Contratada para la Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Contrato	-	-	-	1	-	-

Fuente: SIAFI

Análisis de la Ejecución Física

Para 2023 el Proyecto tiene programada la firma de tres contratos para la ejecución de estudios y actualización de diseños y nuevos diseños. A la fecha los TdR se encuentran en revisión por el Banco Mundial.

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		190,041,562.00	5,867,944.98	3.09	81,104,783.73
Total	-	190,041,562.00	5,867,944.98	3.09	181,104,783.73

Fuente: SIAFI

Análisis de la Ejecución Financiera

La ejecución financiera fue de 3%, debido a que la efectividad del Proyecto se dio hasta el 22 de mayo de 2023, se reprogramaron de nuevo todas las actividades y se discutieron en detalle con la UAP-SAG y el Banco Mundial el 13 de junio de 2023, ajustándose el presupuesto para 2023 a L.55.1 millones correspondientes a fondos externos. En la misma fecha se recibió la No Objeción del Banco Mundial al POA y presupuesto 2023-2025.

El 31 de julio de 2023 el Banco Mundial aprobó el Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) del Proyecto. Con la aprobación del PAC en el sistema STEP se podrán reiniciar los procesos abiertos en el 2022 y comenzar los nuevos procesos reprogramados para 2023. En agosto se realizaron dos reuniones de revisión detallada del PAC con funcionarios del BM.

En septiembre 2023 se continuó en proceso la revisión de los términos de referencia de los estudios y diseños de los SIAS por parte del Banco Mundial. Se recibieron observaciones del BM a los TdR de la Asistencia Técnica Etapa1: Capacitación y Reforestación el 4 de septiembre de 2023, las que fueron incorporadas al borrador de TdR. Se revisaron los TdR durante la visita técnica realizada por el BM entre el 18 y el 20 de septiembre de 2023 y se recibieron comentarios adicionales los que serán incorporados al documento por el Proyecto.

2.1.12 Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

El Proyecto tiene por objetivo de desarrollo mejorar la calidad y eficiencia de prestación de los servicios provistos por los Prestadores Urbanos de Servicios de Agua Potable (PUSAPs) y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19 en sus cabeceras municipales.

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023
AGUA URBANA**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable en proceso de ejecución beneficiando a 13 cabeceras municipales.	Porcentaje	–	–	–	50	–	–
	Bienes e insumos COVID-19 entregados en municipios del Proyecto para su instalación escuelas y centros de salud urbanos.	Municipio	7	–	–	13	–	–
	Municipios que implementan un modelo de gestión desconcentrado para la prestación del servicio urbano de agua potable beneficiando a 6 cabeceras municipales	Municipio	2	5	250	6	5	83

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Mejoramiento del Abastecimiento de Servicios de Suministro de Agua Potable en Zonas Urbanas	Subproyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable licitados	Proyectos	5	–	–	13	–	–
	Certificación de no requerir licenciamiento ambiental para las obras de rehabilitación.	Certificación	2	–	0	13	1	8
	Licitación de bienes e insumos COVID-19	Licitación	7	–	–	13	–	–
	Evaluaciones de Impacto y Planes de Gestión Ambiental y Social (EIAS y PGAS).	Plan	2	–	–	13	–	–

	Planes de inversión de subproyectos de rehabilitación.	Plan de Inversión	5	-	-	13	-	-
	Formalización de Acuerdos de Asociación SAG-Municipalidad-Prestador	Acuerdo	8	-	-	13	-	-
Fortalecimiento Institucional de ERSAPS	Dictamen de aprobación del modelo por el ERSAPS	Dictamen	2	-	-	6	-	-
	Nombramiento de gerente del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	3	-	-	6	-	-
	Conformación de Junta Directiva del proveedor de servicios de agua potable.	Cantidad	5	-	-	6	-	-

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento del Agua Urbana
(En Lempiras)**

FUENTE	ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM		242,285,548.00	5,552,457.31	2.29	234,571,570.08
Total	-	242,285,548.00	5,552,457.31	2.29	234,571,570.08

Fuente: SIAFI

Ejecución financiera

- El proyecto está en proceso de revisión de Tdr para la contratación del personal técnico así como de las empresas ejecutoras y supervisoras, para someterlo a No Objeción ante el organismo financiador y continuar con los procesos de licitación de obras de infraestructura, compra de insumos en beneficio de los entes municipales beneficiados.

2.1.13 Programa Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 UTSAN

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Sistema Nacional Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) funcionando.	Acta	1	–	–	4	–	–
	Instituciones aplicando la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria.	Informe	–	–	–	3	–	–

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al II Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)	Seguimiento a la implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISAN.	Informe	2	–	–	6	–	–
	Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN Desarrollo Local.	Informe	–	–	–	2	1	50
	PCM de adecuación de las instancias del Sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional al nuevo marco institucional, aprobado y publicado en diario oficial la gaceta.	Documento	–	–	–	1	–	–
	Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional(SISESAN), operando	Informe	–	–	–	2	1	50

Mesas de seguridad alimentaria y nutricional regionales funcionando como instancias de diálogo y coordinación.	Informe	1	1	100	4	3	75
Proceso de actualización de la Política SAN y sus planes de acción	Porcentaje	50	50	100	100	75	75
Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras	Informe	-	-	-	1	1	100
Metodología del IX Censo de Talla en Escolares diseñada.	Porcentaje	50	50	100	100	100	100
Diplomados en SAN desarrollados.	Informe	-	-	-	2	-	-
Metodología de la incorporación de la SAN en la planificación estratégica y operativa aprobada	Porcentaje	25	-	-	100	25	25

Fuente: SIAFI

Ejecución Física. Participación de técnicos de UTSAN en la cumbre del sistema alimentario de las Naciones Unidas

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Programa Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales		14,208,393.00	4,367,820.89	30.74	9,745,422.61
Total	-	14,208,393.00	4,367,820.89	30.74	9,745,422.61

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera. Se ejecutó **L. 4, 367,820.89** equivalente al **30.74%** de lo programado, lo cual corresponde a sueldos del personal técnico, en vista que hasta el mes de junio se finalizó el proceso de traspaso a SAG.

2.1.14 Proyecto Alianza para Corredor Seco (USAI-GAFSP PROSASUR)

Proyecto orientado a promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y fortalecimiento de centros comunales de salud y el fortalecimiento de grupos de productores, que pueden escalar a temas de competitividad y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo de corredor seco.

Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2023 ALIANZA CORREDOR SECO

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Planes comunitarios de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	-	-	-	100	-	-
	Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.	Plan	-	-	-	1	-	-

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico del III Trimestre			Ejecución Acumulada		
			Programado al III Trimestre	Ejecutado al III Trimestre	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado al III Trimestre	%
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1	Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
	Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y GENERACIÓN DE INGRESOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2	Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 1	Kit de Riego	-	-	-	1	-	-
	Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 2	Kit	-	-	-	750	-	-
EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 1	Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
	Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 1	Cantidad	0	0	0	1	0	0
EDUCACIÓN NUTRICIONAL E HIGIENE DEL HOGAR, ASISTENCIA TÉCNICA, CLÚSTER 2	Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	-	-	-	1	-	-
	Infraestructura básica (Ecofiltro, ecofogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 2	Cantidad	-	-	-	1	-	-

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Alianza Corredor Seco
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecucion Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donación		67,392,925.00	2,092,571.39	3.11	64,812,224.44
Total	-	67,392,925.00	2,092,571.39	3.11	64,812,224.44

Fuente: SIAFI

En proceso de contratación del director ejecutivo y de los coordinadores de los componentes, así como la finalización del proceso de negociación para la firma de contrato con la empresa sub implementadora

2.1.15 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

Este programa comprende todas las transferencias que, a través de la SAG, se asigna a instituciones y organismos del sector público, privado y externo, de acuerdo a los convenios en vigencia. Estos fondos se destinan para el fortalecimiento institucional y para ejecutar programas y proyectos de las instituciones a las cuales se les realizan las transferencias

Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución Financiera por el Tipo de Fondo de las Transferencias
(En Lempiras)

Beneficiario	Transferencias	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
500	Instituto Nacional Agrario	519,558,208.00	519,558,208.00	318,980,232.00	61.39	200,577,976.00
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	143,035,531.00	167,217,944.00	110,248,302.00	65.93	56,969,642.00
703	Universidad Nacional de Agricultura	554,596,005.00	554,596,005.00	376,348,149.00	67.86	178,247,856.00
903	Bono Nacional de Desarrollo Agrícola	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00	-
4050	Programa Mundial de Alimentos	60,130.00	60,130.00	-	0.00	60,130.00
4107	Fondo Hondureño De Investigación Agrícola	33,330,711.00	33,330,711.00	4,365,352.00	13.10	28,965,359.00
4109	Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras	3,517,386.00	3,517,386.00	3,517,386.00	100.00	
4111	Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas	14,000.00	14,000.00	13,405.09	95.75	0.91
4112	Institución de Fomento a la Pesca	375,000.00	375,000.00	368,883.00	98.37	
4115	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura	2,400,000.00	2,400,000.00	2,265,872.01	94.41	0.99
4116	Centro Agronómico para la investigación y enseñanza	1,250,000.00	1,250,000.00	1,227,850.00	98.228	

4120	Consejo Agropecuario Centroamericano	1,125,000.00	1,125,000.00	1,105,065.00	98.23	
4360	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	447,500.00	447,500.00	442,026.00	98.78	
4362	Consejo Nacional Agrario	12,000,000.00	12,000,000.00	8,614,369.82	71.79	
5265	Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico	4,883,791.00	4,883,791.00	3,699,306.75	75.75	0.25
5268	Organización del Sector Pesquero y Acuicola del Istmo Centroamericano	625,000.00	625,000.00	613,925.00	98.23	
0009	Apoyo al Sector Público y Privado	48,848,097.00	48,848,097.00	16,497,107.82	33.77	28,965,359.00
0010	Apoyo Financiero a Organismos del Exterior	11,180,421.00	11,180,421.00	9,736,332.85	87.08	60,132.15
TOTALES		3,217,189,744.00	3,241,372,157.00	2,805,576,683.00	86.56	435,795,474.00

Fuente: SIAFI

Al III Trimestre el programa de Transferencias ejecutó el **86.56%** de su presupuesto vigente; cabe mencionar que se le transfirieron fondos a un total de 16 instituciones entre públicas, privadas y Organismos Internacionales; asimismo, es oportuno mencionar que está en proceso de creación de los beneficiarios correspondientes a detalle de Sin-TRF 0000,

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Este presupuesto está consignado en un **48.55%** (**L 3,241,372,157.00**) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo y los restantes **51.45%** (**L3,435,625,506.00**) a los programas, servicios y proyectos que la SAG ejecuta. El presupuesto de la SAG está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**72.9%**), Créditos Externos (**25.80%**), y Fondos Propios (**0.03%**), Donación (**1.00%**)

Recomendaciones:

- Llevar a cabo un seguimiento en conjunto con las Unidades Ejecutoras de los programas, servicios y proyectos a fin de identificar la problemática y las acciones que se requieren realizar en diversas instancias y así mejorar los niveles de ejecución.
- Se enviarán notas a las dependencias que muestran baja y sobre ejecución

Fecha de Elaboración: 20 de octubre de 2023.

Elaborado por: en conjunto con el Equipo técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnicos de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Revisado y Aprobado por:

Cargo: Director de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) de la SAG.
