




Agricultura y Ganadería

Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos SAG

Agosto, 2024

Unidad de Planeamiento y
Evaluación de la Gestión



ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN.....	3
II. RESUMEN EJECUTIVO	4
III. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	5
IV. EJECUCIÓN FINANCIERA	8
V. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	9
PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO (PRONAGRI) – 11.00.....	9
PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR) – 11.07	11
PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA -13.00.....	12
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO) – 15.00.....	14
SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA (INFOAGRO) – 17.00	20
PROYECTO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE) – 22.13.....	22
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PROOCCIDENTE) - 22.14.....	23
PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL II) – 22.15 .	24
PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III) – 22.16	25
UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 23.00	26
BONO CAFETALERO PARA FERTILIZACIÓN EN APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES- 23.00.000.003	28
BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO – 23.00-000-004	29
BONO GANADERO – 23.00-000-005.....	30
PROYECTO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS – 23.01	30
PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA – 23.02.....	31
ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03	32

I. Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas, Proyectos y Servicios adscritos a SAG, correspondiente al mes de agosto del año 2024.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2024, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia la Reducción de la Pobreza (ERP); disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la para planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Programas, Proyectos y Servicios.


Glenda Mendoza
Directora Interina UPEG

II. Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de la Máxima Autoridad, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, con relación a la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos y el avance físico del Plan Operativo Anual de los programas y proyectos durante el mes de agosto del año 2024.

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto de L.6,435,689,736.00, sin embargo, al 31 de agosto la SAG muestra un presupuesto vigente de L.6,456,189,736.00. Este presupuesto vigente está consignado en 42.46% (L. 2,741,454,769.00) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, seguido de los programas con 38.70% (L.2,498,794,247.00) y los proyectos de inversión con 18.83% (L.1,215,940,720.00)

La ejecución al 31 de agosto fue de L.2,912,464,064.28 de estos corresponde L.1,382,141,225.31 a las Transferencias que se realizan al Sector Público, L.1,247,827,948.59 a los programas regulares y L. 282,494,890.38 a los proyectos de inversión pública

La SAG ejecuta 8 programas los cuales están orientados a la entrega de bienes y servicios a la población; de estos, un programa de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público y 2 programas que incluyen los proyectos de inversión y una de las prioridades del Plan de Gobierno 2022-2026 como ser la Seguridad Alimentaria y Nutricional. A continuación, se describen:

Programa	Proyecto	Nombre del Proyecto
11	00	Programa Nacional de Agricultura Bajo Rego (PRONAGRI)
11	07	Programa Nacional de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
13	00	Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura
15	00	Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
17	00	Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)
22	00	Programa Competitividad Rural
22	13	Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)
22	14	Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PROOCCIDENTE)
22	15	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)
22	16	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III)
23	00	Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional
23	00-001	Dirección Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
23	00-002	Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a Productores/as
23	00-003	Bono Tecnológico Productivo
23	00-004	Bono Ganadero
23	01	Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
23	02	Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana
23	03	Proyecto Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)
99	00	Transferencias

III. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de enero de 1996, de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

Misión:

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos de la población.

Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

Objetivos Estratégicos:

1. Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios.
2. Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas.
3. Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.

Funciones de la SAG:

- a. La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la

producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.

- La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.
 - El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
 - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
 - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
 - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
 - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b. El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c. La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d. La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.
- e. La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.

- f. El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
 - g. La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
 - h. La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
 - i. La promoción del crédito agrícola.
- La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

Ámbito del Accionar de la SAG

A Nivel Regional: La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A Nivel Sectorial: La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.


A Nivel Institucional: A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.

IV. Ejecución Financiera

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto de L.6,435,689,736.00, sin embargo, al 31 de agosto del presente año la SAG muestra un presupuesto vigente de L.6,456,189,736.00. Este presupuesto vigente está consignado en 42.46% (L.2,741,454,769.00) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, seguido de los programas con 38.70% (L.2,498,794,247.00) y los proyectos de inversión con 18.83% (L.1,215,940,720.00)

El presupuesto de la SAG está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales **56.53%**, Créditos Externos **39.86%**, Donaciones externas **3.0%**, **Donaciones Internas 0.32%**, Fondos Propios **0.29%**. Este financiamiento proviene de los organismos financiadores: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) bajo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) / Banco Mundial (BM).

La SAG al 31 de agosto del año 2024 refleja una ejecución de L.2,912,464,064.28 (45%) del monto total ejecutado, corresponde L.1,382,141,225.31 a las Transferencias que se realizan al Sector Público, L.1,247,827,948.59 a los programas regulares y L. 282,494,890.38 a los proyectos de inversión pública

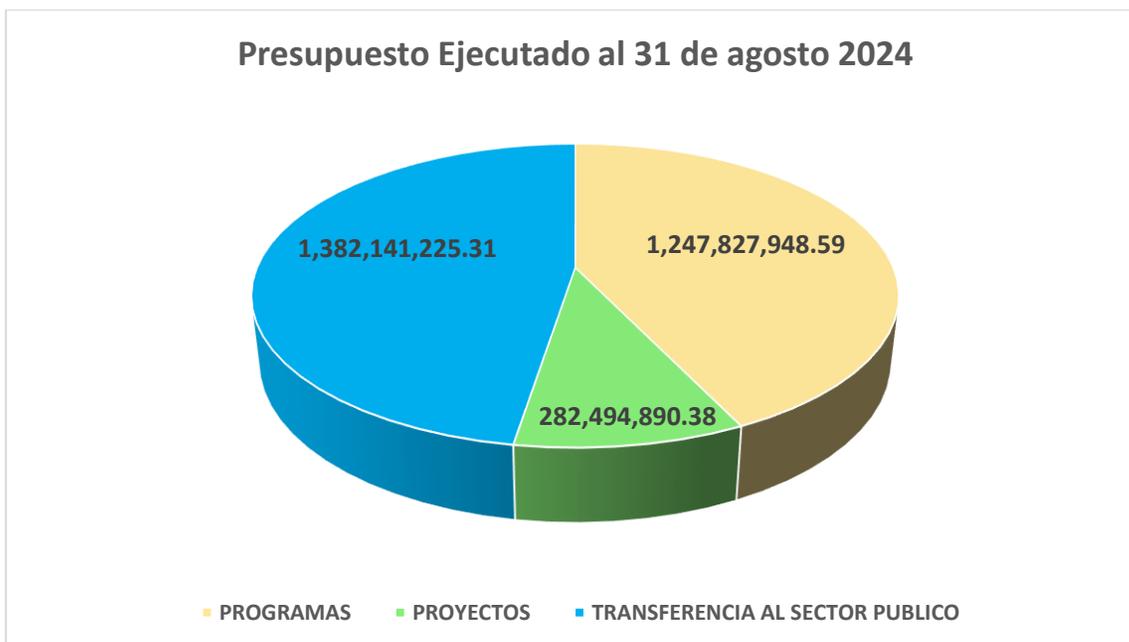

V. Ejecución Física de los Programas y Proyectos

Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) – 11.00

El PRONAGRI es responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

Avance Físico del Plan Operativo Agosto- SIAFI- 2024

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a microriego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras.	Hectárea	705	218	25%	
Estudios de prefactibilidad para construcción, modernización, Rehabilitación y ampliación de sistemas de riego para gestión de recursos financieros realizados, en beneficio de los pequeños y medianos productores(as).	Estudio de Prefactibilidad	2	1	50%	
Inventario de producción agrícola por rubros de las parcelas de los productores y productoras en los distritos de riego con acceso al mercado local y nacional	Reporte	4	2	50%	
Capacitación brindada en temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión de riesgo, uso de suelo, pruebas en los laboratorios entre otros, a estudiantes de la academia y productores(as)	Capacitación	63	41	65%	6
Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en el enfoque de género.	Capacitación	19	14	74%	2
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O- 02: Gestión de Distritos de Riego					
Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	100	25	25%	-
Recopilación de información de datos de volumen de producción por rubro en los distritos de riego.	Informe	4	2	50%	-
A/O-03: Capacitación y Asistencia Técnica en Agricultura Irrigada					
Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lote Demostrativo	12	8	67%	2
Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia Técnica	64	46	72%	4

A/O-04: Gestión de Áreas para Riego					
Kit de sistema de micro riego (tubería, accesorios, cinta de goteo, filtro) instalado en hectáreas de tierra agrícola	Kit de Riego	705	219	31%	
Áreas identificadas de riego para banco de proyectos.	Área	2	1	50%	
Diseño y presupuesto de sistema de riego elaborado.	Diseño	12	6	50%	
A/O-05: Fomento de la Equidad e Igualdad de Género en las Actividades de Riego y Drenaje					
Plan de capacitación Elaborado	Plan	4	2	50%	

Descripción de los logros:

Beneficiados 169 productores (98 hombres y 71 mujeres) mediante la entrega de bienes y servicios:

- Brindadas 4 asistencias técnicas a 28 productores (22 hombres y 6 mujeres) en temas de Aforamiento de fuentes de agua en el municipio de San Francisco de Coray, Valle, limpieza de sistema de riego de cosechadora en la comunidad del Tamarindo, Nacaome, Valle. Instalación de sistema de riego por aspersión en San Antonio de Oriente El Zamorano, Francisco Morazán, diseño e instalación de sistema de riego por goteo en Las Crucitas Potrerillos, el Paraíso.
- Impartidas 6 capacitaciones a 78 productores y estudiantes (50 hombres y 28 mujeres) en temas de: Infiltración densidad en el sitio, contenido de humedad del suelo y densidad aparente en los laboratorios del Departamento de Desarrollo de Tecnología de Riego y Drenaje DDTRD en Comayagua, diseño e instalación de sistema de riego por goteo a miembros de la Asociación de Ganaderos de Coray (AGACOR) en Langue, Valle. En proceso de identificación y contratación de empresas para la ejecución de Plan de Negocio Central de Abastos en San Juan de Flores Villa de San Francisco, Francisco Morazán
- Establecidos 2 nuevos lotes de cultivos de maíz, en El Destino y La Esmeralda, Guaimaca, Francisco Morazán, beneficiando a 2 productores.
- Impartidas 2 capacitaciones en temas de sensibilización del enfoque de género: diagnóstico y socialización del programa de empoderamiento a mujeres rurales Lencas en Guajiquiro, la Paz y fortalecimiento organizacional y socialización de convenio de cooperación, administración y mantenimiento de distritos de riego en La Cofaicita, El Tular, Nacaome, Valle, beneficiando a 61 productores (24 hombres y 37 mujeres).

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

Este programa tiene como objetivo contribuir a reducir pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Programa. De acuerdo con la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo con los valores que se encuentren en la línea de base. Se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. También tiene como objetivo contribuir a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo con las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base que se realice.

**Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)**

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Eventos de socialización de planes de ordenamiento de los Recursos Naturales en los municipios de: Comayagua, El Rosario, Siguatepeque, Jesús de Otoro, Santiago de Pringa, La Paz, Lauterique, Lamaní, San Sebastián, Lepaterique y la Villa de San Antonio desarrollados.	Evento	12	3	25%	-
Capacitación en manejo y uso del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente, protección de microcuencas impartidos a los usuarios de los sistemas de riego de san Sebastián, Lamaní, Comayagua, Lauterique, Lejamani, La Paz, Marcala, San Jose, Chinacla, Cantarranas.	Capacitación	8	5	63%	5

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O-04: Gestión Ambiental					
Planes de ordenamiento de los Recursos Naturales aprobados.	Plan	2	1	50%	-
Plan de capacitación en temas ambientales elaborado.	Documento	1	1	100%	1

Avances:

- Impartidas 5 capacitaciones a 141 estudiantes de la carrera de Bachillerato en Agricultura, Ambiental y Desarrollo Socioambiental (70 hombres y 71 mujeres, destacando la participación de 136 jóvenes), en temas de: educación ambiental, cambio climático, riego de cultivos del agua del canal, enfatizando en la necesidad de bajar los niveles de contaminación de las aguas para irrigación por desechos (basura), derivados carburantes (aceites, combustibles) y exceso de agroquímicos, en los municipios de Comayagua, Ajuterique, La Paz y Lamani.

Limitantes de la ejecución física y financiera

Debido a la determinación acordada entre El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), se ha procedido a iniciar la etapa de cierre del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

En lo que compete al proyecto San Sebastián continua con acta de suspensión, se está a la espera por parte del BCIE la no objeción a la cuarta adenda de la supervisión y contratista de obra de este proyecto.

Estas acciones han limitado el cumplimiento de la planificación 2024 del proyecto, sin embargo, se continua con la preparación de la segunda etapa del PDABR conforme lo solicitado, esta propuesta está a la espera de la aprobación de BCIE, SEFIN y SAG, y para lo cual se estableció un listado de posibles proyectos a desarrollar durante el periodo de tres años.

Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura -13.00

El programa tiene el objetivo de fortalecer el ejercicio de responsabilidad del estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura, en sus diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la investigación multidisciplinaria con el propósito de conocer la real disponibilidad de los recursos para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los mejores beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que ofrecen los recursos y las condiciones económicas y sociales del país.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Licencias de pesca emitidos a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	242	178	73%	32
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros	Licencia	11,272	7,503	67%	658

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre			Ejecución Agosto	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada		% de Ejecución
Evaluaciones de la estructura poblacional de las especies marinas Pepino de Mar (Holothuria mexicana), camarones y peces teleosteo en aguas nacionales para establecimiento de cuotas de captura en beneficio de pescadores industriales y artesanales.	Informe	6	2	33%	
Asistencia técnica brindada a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	723	488	67%	93
Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas	Alevines	1,500,000	654,050	42%	30,200

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre			Ejecución Agosto	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada		% de Ejecución
A/O-02: Investigación Pesquera y Acuícola					
Recolección de datos biológicos en campo.	Informe	6	2	33%	-
A/O-03: Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola					
Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas,	Reporte	3,659	1,948	53%	282
Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	1,173	801	68%	74
A/O-04: Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola					
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas en temas (cultivos de tilapia, artes de pesca, importancia de estar documentado, diferentes tipos de veda entre otras	Capacitación	103	61	59%	10
Validación del Plan de Manejo Pesquero con equipo técnico multidisciplinario del Programa	Reunión	5	2	40%	-
A/O-05: Fomento a la Acuicultura					
Producción de alevines de tilapia.	Alevines	1,600,000	959,100	60%	88,000

Descripción de los logros

- Producidos 88,000 alevines de tilapia, en el Centro Nacional de Investigación Piscícola El Carao, y distribuidos 30,200 alevines beneficiando a 2 productores del departamento de Comayagua.
- 282 inspecciones realizadas a plantas procesadoras, restaurantes, supermercados, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras y comercializadores en los

departamentos de Atlántida, Cortes, Colon, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Francisco Morazán.

- 74 inspecciones realizadas a embarcaciones artesanales e industriales en los departamentos de Atlántida e Islas de la Bahía para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
- Emitidas 658 licencias de operación y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción, beneficiando a 594 hombres y 64 mujeres productores/as, comercializadores y personas particulares.
- Capacitados 260 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales (199 hombres y 61 mujeres) en temas de cultivo de tilapia, veda en el sistema lagunar, normativa pesquera y recursos naturales, cultivo de tilapia, diferentes tipos de veda, como asistencias técnicas en los departamentos de Atlántida, Colon, Choluteca, valle y Francisco Morazán. Mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de estos.
- Capacitadas 18 mujeres que se dedican a las actividades pesqueras y acuícolas (Marisqueras) en la comunidad costera del Golfo de Fonseca (Playa el Burro, Amapala, Valle), en el tema de liderazgo y empoderamiento económico de la mujer en la Pesca. Asimismo, se inició la encuesta de participación de las mujeres, cuyo objetivo es crear una base de datos e identificar los grupos de mujeres organizados.
- Generados L.864,532.64 ingresos por diferentes conceptos como ser: Canon, compra venta mayorista, pesca industrial (buzos), pesca deportiva, comercialización, entre otros.
- Generados 399 nuevos empleos, beneficiando a 358 hombres y 41 mujeres entre ellos 277 jóvenes por medio de la emisión de licencias en los departamentos de Colon, Atlántida, Cortes, Islas de la Bahía, Valle, Francisco Morazán, Gracias a Dios y Choluteca.

Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) – 15.00

El programa tiene el objetivo de desarrollar capacidades de los actores del subsector agroalimentario en materia de producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad, generación y transferencia de tecnología agropecuaria, para impulsar la creación de agronegocios competitivos que satisfagan la demanda nacional e internacional, y promuevan la creación de empleos.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 PRONAGRO

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Comité	12	8	66%	2
Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes de los productos agroalimentarios.	Evento	3	1	33%	-
Ferias agropecuarias nacionales, municipales realizadas, en apoyo a la comercialización de la producción de los pequeños y medianos productores(as).	Feria	12	7	58%	1
Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	10	6	60%	1
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias					
Análisis situacional de las cadenas agroalimentarias.	Análisis	8	8	100%	-
Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad	Capacitación	20	12	60%	2
Mapeo de los actores de las cadenas agroalimentarias.	Informe	8	8	100%	-
Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	35	23	65%	4
Reuniones de cadenas agroalimentarias con los actores de los diferentes eslabones.	Reunión	50	34	68%	7
Agronegocios					
Plan de trabajo de las ferias elaborados.	Plan de Trabajo	12	9	75%	2
Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	3	3	100%	-
Plan de Negocio elaborado.	Plan de Negocio	8	1	12%	1
Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnóstico	5	3	60%	1
Talleres de capacitación impartido.	Taller de Capacitación	6	3	50%	1

Descripción de los logros

Comité de Cadenas Agroalimentarias:

Cacao

- El Comité Nacional de la Cadena de Cacao (CNCC), en reunión desarrollada en San Pedro Sula se comprometió a revisar las tablas de legalidad que le competen a esta cadena en el marco del cumplimiento del reglamento de la Unión Europea 1115/2023 Libre de Deforestación (UEDR). Asistieron 43 participantes (Hombres: 29, Mujeres 14, Jóvenes 4), de la Federación Nacional de Productores de Cacao de Honduras (FENAPROCAHAO), Chocolats Halba (CHH), Asociación Nacional de Familias Chocolateras y Cacaoteras de Honduras (ANFACCH), Rikolto, FUNDER, LWR, ComRural, Heifer y PRONAGRO/SAG.
- La consultora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) acordó socializar el enlace para el registro e identificación de negocios interesados en participar en la Ruta Gastronómica y Turística de Cacao y Chocolate.
- Se conformó la Comisión responsable del VI Concurso Nacional de Cacao de Calidad en el marco del CoEx 2025.

Cacao Región Olancho

- Realizar mesas temáticas y generación de compromisos en 3 jardines clonales de la región de Catacamas o Culmí. Coordinar la gira con actores de la localidad, así como la identificación de posibles mercados para la venta de varetas.
- Sostener reunión con CERTICEM/SENASA para coordinar el tema de la certificación de viveros y jardines clonales de cacao. Asistieron 27 participantes (20 hombres, 7 mujeres, 1 joven),

Reunión de Cadenas Agroalimentarias:

Cadena de Papa

Con la participación de 61 actores (Hombres: 56, Mujeres: 5; Jóvenes: 4) en reunión de cadena se desarrollada en La Esperanza, Intibucá se logró lo siguiente:

- Realizada la asignación mensual de 81 contenedores de importación de semilla de papa con la aprobación del pleno de la reunión de cadena de papa, con el objetivo de disminuir el desabastecimiento en el mercado nacional para la temporada 2024-2025.
- Aprobada la distribución mensual de la cuota de contenedores para la importación de semilla para la temporada 2024-2025

Cadena de Pimienta Gorda

Con la participación de 3 productores de la comunidad de Chivana, Omoa; y Agua Caliente, Puerto Cortés, Cortés:

- Registrados 16 nuevos productores y 4 compradores de pimienta gorda en el directorio de esta cadena y se acordó que los exportadores y operadores utilizarán los sistemas que ya poseen y usan en cuanto a la detección de la deforestación y la trazabilidad de la materia prima y sus derivados.

Cadena de Cacao

- Con la participación de 16 actores (Hombres: 13, Mujeres: 3) se socializó y revisó con los actores del CNCC las tablas de legalidad descritas anteriormente.
- Se acordó que el sector cacaotero elabore y envíe una nota al director ejecutivo de ICF para que se revisen aspectos y trámites diversos como el licenciamiento ambiental, entre otros que requieren se traten más expeditamente.

Cadena de Frijol

Con la participación de 15 productores (Hombres: 12, Mujeres: 3) se realizó reunión en Yorito, Yoro, acordando lo siguiente:

- Conformar la organización y proceder a la elección de la junta directiva correspondiente.
- Gestionar para que a través de la Red de Productores Agrícolas de Semillas de Honduras (RED PASH) se imparta un taller inductivo referente a la producción de semilla de frijol y el proceso de comercialización.

Cadena Apícola

Desarrollada reunión en la regional de Danlí, El Paraíso con la asistencia de 14 productores (Hombres: 10; Mujeres: 4) en el marco de la Mesa Sectorial Apícola, se logró lo siguiente.

- Formulación y consenso del Plan de Acción, en el que se describen las estrategias, actividades y cronogramas destinados a fortalecer y desarrollar el sector apícola a nivel nacional. Este plan es producto de un proceso colaborativo entre productores, representantes gubernamentales, actores claves de la cadena productiva, con el objetivo de mejorar la producción, comercialización, calidad, y sostenibilidad del sector.
- Realizar encuentro regional de productores apícolas para fortalecer la organización regional y elaborar el censo de productores.
- Gestionar un convenio de compra y venta entre productores apícolas región El Paraíso y los comercializadores nacionales.

Cadena de Aguacate

En reunión desarrollada con la participación de 23 actores (Hombres: 19; Mujeres: 4), se acordó lo siguiente:

- Conformar el comité técnico para la elaboración y revisión del Acuerdo Marco de Competitividad del rubro de Aguacate.

- La Asociación de Productores de Aguacate de Honduras (ASPAH) deberá presentar informe de liquidación de los fondos entregados.
- Presentar informe de recaudación de la producción nacional.

Cadena de Fresa

En reunión realizada participaron 49 actores de la cadena de fresa (Hombres: 35; Mujeres: 14):

- 4 asociaciones de productores se articularán con el proyecto ProOccidente para recibir apoyo financiero y asistencia técnica para poner en marcha proyectos de inversión. Cabe mencionar que el proyecto ProOccidente se incorporara como actor de la cadena para brindar mejor apoyo.
- Actualizado el plan de inversión para el cultivo de fresa, el cual será entregado a BANADESA de manera oficial a través de la SAG.

Capacitaciones:

Realizadas 2 capacitaciones a 35 productores y técnicos (18 hombres y 17 mujeres, de estos 11 jóvenes) en los temas siguientes:

- Nutrición de Aguacate y Técnicas de Poda, Los productores podran identificar plantas con problemas radiculares y de nutrición, identificar diferentes variedades de aguacate y a conocer las deficiencias en las raíces para realizar aireación de suelos lo que les ayudará a obtener mejores resultados en cosecha y evitar oerdidas en el cultivo. La misma se desarrolló en La Sabana de San Pedro, Yorito, Yoro a 13 productores y técnicos (Hombres: 11; Mujeres: 2).
- Con el objetivo de formalizar y legalizar a Organizaciones del Sector Social de la Economía, se beneficio a la Caja Rural de Ahorro y Crédito Las Flores Los Anises en Santa Barbara con la participación de 22 productores (Hombres: 7, Mujeres: 15):
 - Se emitió la Resolución de Personería Jurídica
 - Aprobado el informe de denominación por el órgano competente.
 - Recopilada documentación Personería Jurídica, Carta Poder, Certificación de Acta de Constitución, Certificación de Estatutos, Declaración Jurada y Listado de Asistencia de Socios a Asamblea Constitutiva para dicho proceso.

Asistencia Técnica brindada en temas de:

Realizadas 4 asistencias técnicas beneficiando a 15 productores en los siguientes temas:

- Definir el volumen de frijol para comercializar con el IHMA para los ciclos de primera y postrera 2024. Asimismo, se realizaron visitas a parcelas cultivadas de frijol para evaluar la etapa fenológica y cálculos de cosecha para etapa de primera, en El Altiplano, Danlí, El Paraíso beneficiando 10 productores (Hombres: 5; Mujeres: 5; Jóvenes: 1).
- En el rubro de aguacate se asistio en manejo adecuado, selección de plantas, identificar metodos de siembra y plantas con deficiencias para ser reemplazadas con el proposito de evitar perdidas. Beneficiando a 2 productores Ojojona, Francisco Morazán.
- 2 productores de la aldea de Guamiles, Silca, Olancho asistidos en el manejo adecuado de cultivo de tilapia en tanques, bajar los índices de mortalidad por Saprolegnia(hongos), Amonio (NH3), y

bajas de oxígeno utilizando de manera eficiente la calidad del agua de los estanques. Asimismo, se indicó adquirir alevines de alta calidad genética, inoos y libres de enfermedades en los Centros de producción de tilapia Certificados por El SENASA y La DIGEPESCA.

- Asistido 1 productor de tilapia de la Hacienda La China, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán en el manejo adecuado de cultivo de tilapia en estanques de geomembrana, mejora de calidad de agua y la producción en las diferentes Fases del Engorde para reducir la mortalidad de los peces juveniles de tilapia por Saprolegnia (hongos), Streptococcus ; así como el utilizar la aireación mecánica utilizando aireador tipo Splash de 2 HP para tener un mejor movimiento de la lámina de agua en la superficie de los estanques aumentando el Oxígeno disuelto

Talleres de Capacitación

Beneficiados 19 productores (Hombres: 5, Mujeres: 14), de la Asociación de Regantes y organizaciones de productores de frijol de Sulaco, Yoro

- Fortalecidas las capacidades de Caja Rurales de Ahorro y Crédito CRAC, Comité de Investigación Agrícola Local (CIALES), y Asociaciones para la presentación de ideas de negocios a ser presentados al proyecto ComRural III.
- Aplicación y dosificación de Nico Insect 6L (Insecticida botánico a base de nicotina) como alternativa para control de Megaleurothrips usitatus y otras plagas.

Unidad de Agronegocios

FERISAG desarrolladas

- Realizada la FeriSAG en Sonaguera, Colon con la participación de 73 personas, (Hombres: 28, Mujeres: 45) de estos 14 jóvenes, en la misma se tiene un espacio para exponer y comercializar sus productos, así como crear una relación comercial con compradores potenciales.

Plan de Trabajo de Ferias Elaboradas

- 2 planes de trabajo elaborados para desarrollar 2 FeriSAG, 1 en Cantarranas, Francisco Morazán y 1 en El Progreso, Yoro.

Fortalecimiento Agroempresarial

- La “EMPRESA TIERRA INDIA, de Teupasenti, El Paraíso, integrada por 24 personas (1 Hombre. 23 Mujeres, 8 jóvenes, se acordó:
 - Gestionar nuevos mercados potenciales para vender el producto.
 - Reunión con BANADESA para identificar acceso a financiamiento.

Diagnóstico situacional

- Elaborado el diagnostico situacional de la empresa trabajando juntos dedicada a la producción de Cítricos Criollos en el municipio de Orocuina, Choluteca, quien tiene establecido 20 hectáreas

de limón criollo y persa. a través de la Unidad de Agronegocios en la identificación de nuevos mercados, y en la gestión de cumplir con los requerimientos que estos soliciten.

Plan de Negocio

- Elaborado el Plan de Negocio del cultivo de Malanga, a productores y productoras del municipio de Patuca, Olancho, beneficiando a 25 productores (12 hombres y 13 mujeres; 10 jóvenes). Se espera sembrar 50 MZ de malanga de la variedad coco/badu y la construcción de planta de procesamiento y comercialización internacional de 1,500,000 libras de tubérculo fresco durante 48 meses de producción.

Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO) – 17.00

Brindar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los elementos informáticos necesarios para la realización de los trabajos, lo que implica el mantenimiento, supervisión, actualización, control y seguridad de los equipos, sistemas e información gestionada dentro de la institución.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 INFOAGRO

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y pronóstico diario, disponible a la población en general.	Actualización	12	8	67%	1
Recursos bibliográficos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de las cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible a la población en general en la biblioteca digital/ página web	Documento	400	216	54%	31
Módulo de desempeño de Recursos humanos creado, que facilite la automatización de los servicios a los usuarios de SAG	Cantidad	1	1	100%	
Publicación de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas de los rubros maíz, frijol y sorgo difundida en la página web de la SAG, en beneficio de los productores/as.	Publicación	2	2	100%	

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre			Ejecución Agosto	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada		% de Ejecución
Dirección en Tecnologías de la Información					
Información agrometeorológica seleccionada	Reporte	32	13	41%	1
Actualización de la plataforma del pronóstico diario del tiempo (días laborables) en la página web	Actualización	196	131	67%	18
Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados	Documento	220	124	56%	20
Eventos desarrollados en la socialización de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas.	Evento de Capacitación	5	4	80%	1

Avance:

- Actualizado el reporte Agrometeorológico, con el objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.
- Actualizada la página web de la SAG, con información agrometeorológica, suelos e información del sector agroalimentario en los enlaces <https://infoagro.sag.gob.hn/agrometereologia/>, <https://sag.gob.hn/soilfer/>, <https://sag.gob.hn/suelos-de-honduras/> alcanzando en agosto 2024 un total de visitas de 11,825 usuarios.
- Recopilación de recursos bibliográficos en temas de frutales, agrometeorología, porcicultura, leyes agropecuarias, café, riego y drenaje, vegetales orientales. Las visitas por los usuarios a estos recursos fueron de 11,167 vistas, los temas de mayor interés los siguientes:
 - Introducción a la agronomía (Borja Vivero, Juan) 51 visitas.
 - Manual como Organizar Cajas de Ahorro y Crédito Rural 41 visitas.
 - Manual técnico del cultivo del aguacate Hass (Persea americana L.) (Alfonso Bartoli, José Angel) 38 visitas.
 - Manual de Administración y Contabilidad en Las Cajas De Ahorro y Crédito Rural 33 visitas.
 - Cosecha de Agua: Para producir y enfrentar las sequías 32 visitas.
 - Listado de plaguicidas y sustancias a fines registrados en Honduras, 32 visitas.
 - Organización y Funcionamiento de la Caja Rural (FAO et al) 31 visitas.
 - Acuerdo N° 018-93 Reglamento general de la Ley de Municipalidades (Republica de Honduras) 30 visitas.
 - Manual de producción de cebolla (Arias, Salvador et al) 29 visitas.
 - Manual de Normas Básicas de Bioseguridad de una Granja Avícola (Federico, Francisco J.) 29 visitas.

Proyecto Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático. Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia, Tocoa, Olanchito Yoro.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROINORTE

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Campañas de difusión con información Agroclimática articulada y difundida a los productores /as.	Cantidad	2	2	100%	–

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROINORTE

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e innovación.					
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados	Plan	50	50	100%	
Desarrollo Productivo y Resiliencia					
Mesas Agroclimáticas regionales Conformadas (mancomunidades, productores)	Cantidad	3	3	100%	1

Avance del proyecto:

- En proceso de conformación de 2 plataformas sectoriales atendidas: 1 comité regional de la cadena de frijol en el departamento de Olancho y 2 comité de cadena de cacao de la zona atlántica; con ambas organizaciones se están discutiendo los temas de coordinación con PROINORTE.
- Conformada 1 Mesa Agroclimática regional (mancomunidades, productores) en el departamento de Salamá, Olancho.
- En seguimiento a las 84 organizaciones de productores(as) que presentaron solicitud al proyecto, se encuentra en proceso de aprobación para fortalecer las capacidades y seleccionar a cuáles se les formulara un Plan de Negocio.
- En procesos de revisión los términos de referencia para la contratación de la consultoría para la ejecución del desarrollo de fondo concursable de innovación estratégica.

- Identificadas las necesidades de talento para algunas de las organizaciones atendidas por el proyecto y con candidatos para optar a las becas.
- Firmado memorándum de entendimiento con las 22 municipalidades de intervención del proyecto como paso previo a la adquisición y dotación del kit de herramientas tecnológicas para las UMAs, asimismo se han realizado reuniones con el ICF y SERNA para la provisión de servicios de capacitación técnicas, ambiental y climática.

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14

Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

El PROOCIDENTE opera a partir de los convenios financieros de préstamo BID-4936HN y BID-4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M USD; un fondo de préstamo de 35 M USD del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID del Gobierno de España; y un fondo de donación WE-FI de 1.4 M USD. Estas operaciones obtuvieron una ampliación de 23 meses por parte de SEFIN, por lo cual, serán concluidas el 21 de abril del 2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto son los 88 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La PAZ.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROOCIDENTE

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Fortalecimiento del Desarrollo Productivo					
Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto	Plan de Inversión	50	25	50%	-
Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición.	Asistencia Técnica	100	30	30%	-

Principales avances:

- Presentado el Informe de levantamiento de la línea base que contiene; producción, demográfica, territorial, social y económica, para la medición de los indicadores en los 6 departamentos del área de cobertura del proyecto; se realizaron más de 800 encuestas en el área de intervención del proyecto. Este informe será revisado por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y remitido para subsanación a la firma sub implementadora en caso de que existan observaciones, previo a la aprobación final.

- Se continua en la revisión de 29 planes de inversión de la fase 2 presentado por ACIDI VOCA, se espera beneficiar a 807 familias productoras, conformadas por 580 hombres, 134 mujeres, 20 mujeres jóvenes y 73 hombres jóvenes. Incluye 411.84 Has con tecnologías climáticamente inteligente.
- En seguimiento a la priorización de las cinco (5) microcuencas que serán intervenidas por la firma sub implementadora de los Planes de Manejo de Microcuencas, se encuentra a nivel de borrador el formato de convenio de cooperación, con las mancomunidades COLOSUCA y CAFEG en el departamento de Lempira, incluyendo la identificación de las formas de fortalecimiento y dotación de equipo para cada Mancomunidad.
- Elaborado el borrador de enmienda No. 3 para revisión y aprobación por parte de SEFIN, con el objetivo de incrementar el valor del contrato debido a la generación de utilidades que generó el fondo de fideicomiso administrado por BANHPROVI.
- Recibido el borrador de contrato SAG-BANHPROVI con observaciones por parte del BID y AECID, el mismo será remitido a BANHPROVI para ajustes y posterior firma entre ambas instituciones.

Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (ComRural II) – 22.15

Mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados/as para incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras. El ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA- 6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020. El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

Localización: Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 COMRURAL II

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	112	8	7%	
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales					
Planes de negocios orientados a la Agricultura en transición aprobados por Comité Directivo	Plan de Negocio	20	8	40%	
Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Asistencia Técnica	60	20	33%	

Avances:

- Socialización de procesos de formulación, Implementación e Instrumentos de Monitoreo y Seguimiento de los Planes de Negocios con proveedores de Servicios de Desarrollo Empresariales.
- Seguimiento a las Transferencias de los 8 Planes de Negocios Ratificados en el Comité Directivo N° 9.

Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (ComRural III) – 22.16

El proyecto contribuye al acceso a mercados, la adopción a prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, la creación de empleos para apoyar a beneficiarios del proyecto en cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas; y en caso de una crisis o emergencia elegible responder efectivamente a ello. El ComRural III apoya a las iniciativas agroindustriales competitivas, innovadoras, con resiliencia climática y nutricionalmente inteligentes (subproyectos o planes de negocios) en cadenas de valor agroalimentarias prioritarias bajo un modelo de alianzas productivas.

Inversión del Proyecto: El proyecto tiene una inversión total de US\$ 108.5 millones.

Localización: El Proyecto ComRural III se focaliza en 17 Departamentos de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Valle y Yoro cubriendo casi la totalidad del territorio nacional. y el Financiamiento Adicional se enfoca exclusivamente en el Departamento de Gracias a Dios.

Avances:

- Se ha avanzado en la preparación del borrador de los Términos de Referencia (TDRs) para la selección de la firma implementadora que operará en la región de la Moskitia. Este documento es crucial para definir los requisitos técnicos y operativos que garantizarán la correcta implementación de las actividades proyectadas en esta región.
- En proceso de conformación de equipos técnicos regional de Olancho, incluye especialistas en el área social, ambiental y técnica. Asimismo, la contratación de personal de la Moskitia, Yoro y Valle

Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional 23.00

Realizar la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante la coordinación de intervenciones con el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, impulsando estrategias, procesos metodológicos y la articulación entre los diversos sectores, para optimizar los esfuerzos y recursos que conllevan a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 UTSAN

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)					
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) funcionando para acciones estratégicas de vigilancia y promoción de la SAN a nivel nacional.	Informe	2	1	50%	-
Instituciones gubernamentales incorporando acciones de la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional (SAN)	Informe	2	1	50%	-
Seguimiento a la implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISAN	Informe	4	1	25%	-
Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de dialogo y coordinación (Golfo de Fonseca, Valles de Olancho, Comayagua, Región Lempa) y reactivadas (Valle de Sula, Región Valle de Aguan, Región 11 el Paraíso, Región 03 Santa Rosa de Copan)	Informe	11	4	36%	-
Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISESAN), operando.	Informe	2	1	50%	-
Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN, Desarrollo Local.	Informe	2	1	50%	-

Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras	Informe	1	1	100%	-
---	---------	---	---	------	---

Avances:

- Finalizado el informe del EUROSAN Del para liberación del IV tramo variable, a espera de la subsanación de parte de Secretaría de Salud (SESAL) para ser remitido a la autoridad superior y posteriormente a la delegación de la Unión Europea.
- Realizada reunión con FAO, AMHON, y Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización para el seguimiento a los lineamientos de inversión en seguridad alimentaria y nutricional.
- Realizados talleres de seguimiento a las Guías Alimentarias de Honduras, donde se revisaron los temas:
 - Revisar y sistematizar las recomendaciones internacionales vigentes, y recopilar los avances recientes de evidencias científica sobre alimentación y nutrición, tomando en consideración sus implicaciones con el sistema alimentario.
 - Establecer líneas de recomendaciones técnicas, tomando en consideración la situación alimentaria, nutricional y de salud, del sistema alimentario y los aspectos culturales, para promover una alimentación saludable y sostenible.
 - Establecer consenso en torno a la alimentación y nutrición saludable y sostenible, para el desarrollo de políticas educativas alimentarias, producción y comercialización de alimentos.
 - Documentar el proceso de elaboración de las guías alimentarias, en un documento técnico, que sirva de referencia al documento final de las guías alimentarias.
- Participación en la presentación al comité de Seguridad Alimentaria de los resultados del análisis CIF y la actualización del Plan SAN CELAC.
- En coordinación con el observatorio de Seguridad Alimentaria (OBSAN) de la UNAH, mancomunidad MANCEPPAZ y Rikolto se realizó el levantamiento de 125 encuestas en los municipios de Santiago de Puringla, Santa María, San Pedro de Tutule, Marcala, Chinacla y San José para la elaboración del diagnóstico alimentario y plan de capacitación en nutrición.
- Participación en el taller de resultados preliminares de Diagnóstico Alimentario en seis (6) municipios de MANCEPAZ organizado por RIKOLTO, UNAH; CONADEH.
- Participación en taller Facilitadores de la política y estrategia de seguridad alimentaria y nutricional PYENSAN 2018-2030 en conjunto con el proyecto FEED THE FUTURE de USAID.

**Bono Cafetalero para Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores-
23.00.000.003**

El Programa Bono Cafetalero, con el objetivo de mejorar los ingresos de las familias cafetaleras pequeñas y medianas, mediante el mantenimiento de la productividad del área cultivada de café, mediante el apoyo a la fertilización de las fincas y el acompañamiento con asistencia técnica y capacitación.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Cafetalero

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Bono Cafetalero					
Bono Cafetalero entregado a pequeños y medianos productores y productoras de café	Bono	90,000	2,667	3%	2,667
Capacitación brindada a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Evento de Capacitación	500	500	100%	
Kit para estructura de vivero de café entregado a Alcaldías y organizaciones de productores (malla, alambre, bolsa).	Kit	100	185	185%	
Kit de podas para café entregado a grupos de productores y productoras (motosierra, bomba motorizada, corta seto, chapeadora).	Kit	1,000	973	97%	
Kit para secadora solar de café entregado a productores y productoras. (tubería, plástico UV, tornillos, zaran, varilla).	Kit	300	300	100%	
Diagnósticos productivos en fincas de Pequeños y Medianos Productores y productoras de café.	Finca	2,500	265	11%	265

- Entregados 2,667 bonos de café, beneficiando a 1,067 productoras y productores.
- Realizados 265 diagnósticos productivos en fincas de pequeños y medianos productores y productoras de café.

Bono Tecnológico Productivo – 23.00-000-004

El Bono Tecnológico Productivo (BTP) es un incentivo económico dirigido al pequeño productor de granos básicos, que beneficia particularmente aquellos pequeños productores de subsistencia que no tienen acceso al financiamiento bancario, ni a la asistencia técnica.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Tecnológico Productivo

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Bono Tecnológico Productivo					
Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	350,000	215,035	61%	55,422
Quintales de fertilizantes de formula comprados.	Quintal	400,000	310,000	78%	
Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	4,000	988	25%	
Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	88,000	50,800	58%	
Kits fitosanitarios entregados (fungicida, insecticida, foliar)	Kit	252,500	176,000	70%	
Plántulas de frutales entregados.	Plántula	80,000	18,360	23%	

Descripción de logros

- Entregados 55,422 bonos tecnológicos productivos, beneficiando a igual número de productores y productoras, (28,265 mujeres y 27,157 hombres), a nivel nacional excepto los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía.

Bono Ganadero – 23.00-000-005

El Programa Bono Ganadero, está dirigido a mejorar los ingresos de pequeños ganaderos por medio del mejoramiento de la alimentación del ganado, así como apoyo al proceso de construcción y equipamiento de plantas de procesamiento de leche; y fortalecimiento al centro de reproducción pecuaria.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Ganadero

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Bono Ganadero					
Bono de semilla de pasto entregado a pequeños productores y productoras de ganado.	Bono	9,000	4,190	47%	4,190
Asistencia técnica brindada a Productores y productoras de ganado.	Asistencia Técnica	500	500	100%	500

Descripción de los logros:

Beneficiados 4,690 productores y productoras mediante la entrega de insumos y asistencia técnica a través del Programa Bono Ganadero.

- Entregados 4,190 bonos de semilla de pasto logrando beneficiar a igual número de productores y productoras a nivel nacional.
- Brindadas 500 asistencias técnicas a productores y productoras de ganado.
- Mediante la estrategia de mejoramiento genético a través de la inseminación a vaquillas en beneficio de pequeños productores y productoras de ganado, se identificaron 1,820 productores de ganado, se realiza el diagnóstico a las fincas que pueden ser elegibles para esta actividad.

Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras, como ser los municipios de La Venta y Curaren, departamento de Francisco Morazán; Intibucá, departamento de Intibucá; La Paz, departamento de La Paz; Nacaome, departamento de Valle.

Avances:

- Publicados los TDR para la Asistencia Técnica Etapa I del proyecto; asimismo para la contratación de consultor para el diseño de viveros agroforestales municipales y comunitarios.

- En lo que se refiere al proceso de actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) se solicitó a las empresas ofertantes, la presentación de propuestas técnicas y financieras.
- Para la revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS), En el mes de agosto se publicaron los TdR, y se espera que en el mes de septiembre se reciban expresiones de interés por parte de las empresas ofertantes.

Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

El proyecto tiene el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de los prestadores urbanos de servicios de agua potable y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19, cuenta con recursos del crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial por un monto de USD 45.0 millones y una contraparte municipal por USD 1.5 millones. La SEFIN aprobó una ampliación de 15 meses finalizando 30/03/2027 la cual está pendiente de la aprobación final del Banco Mundial.

El Proyecto tiene una inversión total de USD 45.0 Millones. Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todos los departamentos a nivel nacional

Avances:

- Se publicó nuevamente licitación del subproyecto de Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de la ciudad de La Paz con un presupuesto base de US\$ 2,500,000.00, se recibirán ofertas hasta el 2 de septiembre del 2024.
- Se finalizó la formulación de los subproyectos de rehabilitación para las ciudades de Choloma y Siguatepeque.
- Los subproyectos de rehabilitación para las ciudades de Comayagua, La Esperanza, Intibucá, San Marcos de Colon y Santa Rosa de Copan se encuentran en proceso de formulación técnica, ambiental y social
- Se publicó la Licitación Pública Nacional del proceso de compra de “Adquisición de Radars de Penetración de Suelo y Servicios de Capacitación” el 22 de agosto del 2024, se espera recibir ofertas el 23 de septiembre del 2024.
- En proceso de formulación técnica y ambiental del Subproyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Comayagua, La Esperanza, Intibucá, San Marcos de Colón y Santa Rosa de Copán.
- En lo referente al Plan de Asistencia Técnica (PAT) a prestadores de servicios de agua potable del Proyecto aprobado, se recibió la información solicitada por la Comisión Evaluadora sobre las

firmas que enviaron sus expresiones en idiomas diferentes al español; el informe fue concluido y enviado a No Objeción por el Banco el 27 de agosto, posteriormente se realizara la integración de las Lista Corta de firmas que serán invitadas a presentar propuestas técnico-económica para llevar a cabo la consultoría.

- Se firmó el convenio para Fortalecimiento de Agua Urbana con el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) para beneficiar a más de 125,000 familias.

Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03

Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables en áreas seleccionadas del Corredor Seco, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y el fortalecimiento de centros comunales de salud y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco. La zona de intervención del proyecto se localiza en todo el Corredor Seco del País, con una inversión total de USD 35.0 Millones.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROSASUR

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				Ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Alianza para el corredor seco (USAID-GAFSP)					
Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), Planes de Negocios Agrícolas (PNA) y Planes de Negocio No Agrícolas(PNNA) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	339	278	82%	278
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al III Trimestre				ejecución Agosto
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Producción de alimentos y generación de ingresos, sub-proyectos, cluster 1.					
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FA, Cluster 1	Kit	500	278	56%	278
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Cluster 2	Asistencia técnica	2,500	2,500	100%	1,875
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Clúster 1	Asistencia técnica	2,500	840	34%	208

Avance.

- Se inició la negociación de la propuesta técnica y económica presentada por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, International Food Policy Research Institute) para la consultoría Evaluación de Impacto del Proyecto de Seguridad Alimentaria Nutricional del Corredor Seco de Honduras PROSASUR (ACS-GAFSP).

Elaborado por: El equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.
