



# INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO IV TRIMESTRE



## Contenido

<b>I. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería .....</b>	<b>5</b>
<b>II. Análisis de la ejecución física y financiera de la SAG .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Ejecución Financiera Institucional al IV Trimestre 2024 .....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Ejecución Financiera todos los Fondos: .....	8
2.1.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional .....	9
2.1.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios .....	9
2.1.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo .....	9
2.1.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas .....	10
2.1.6 Ejecución Financiera Fondos 14 Donaciones Internas .....	10
2.1.7 Ejecución Financiera por Grupo del Gasto .....	11
<b>2.2 Ejecución Física y Financiera por Programa y Proyecto al IV trimestre 2024 .....</b>	<b>12</b>
<b>2.3 Ejecución Financiera todos los Fondos, por Programas y Proyectos .....</b>	<b>13</b>
2.3.1 Ejecución Financiera por Fuente 11 Tesoro Nacional, Programa y Proyecto .....	15
2.3.2 Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios, por Programa: .....	15
2.3.3 Ejecución Financiera Fuente 21 Crédito Externo, Programa y Proyecto: .....	16
2.3.4 Ejecución Financiera Fuente 22 Donaciones Externas, Programa y Proyecto: .....	16
<b>2.4 Ejecución física por Programa y Proyecto. ....</b>	<b>17</b>
2.4.1 Programa 01: Actividades Centrales .....	17
2.4.2 Programa 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI) .....	17
2.4.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07 .....	20
2.4.3 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura .....	23
2.4.4 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) .....	27
2.4.5 Programa 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO) .....	33
2.4.6 Programa 22 – Competitividad Rural .....	35
2.4.6.1 Proyecto de inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13 .....	35
2.4.6.2 Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad Pro-Occidente 22.14 .....	38
2.4.6.3 Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) 22.15 41	41
2.4.6.4 Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III) 22.16 43	43
2.4.7 Programa de Seguridad Alimentaria – 23.00 .....	46
2.4.7.1 Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional – 23 – A/O 02 .....	46
2.4.7.2 Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores – 23.00-002 48	48
2.4.7.3 Bono Tecnológico Productivo .....	49
2.4.7.4 Bono Ganadero .....	51
2.4.7.5 Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01 .....	52
2.4.7.6 Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02 .....	54
2.4.7.7 Proyecto Alianza para Corredor Seco (GAFSP PROSASUR) – 23.03 .....	57
2.4.8 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo. ....	60
<b>3 Conclusiones: .....</b>	<b>61</b>

## Presentación

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), es la institución responsable de normar y coordinar el Sector Agroalimentario Hondureño en el contexto de las políticas y lineamientos del Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026; y en base a las funciones conferidas por ley en el Decreto Legislativo número 218-96 y la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector agrícola.

En el marco de lo antes referido y cumpliendo con las normas establecidas en el Artículo 253 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes, esta secretaria de Estado tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual y Presupuesto correspondiente al IV Trimestre del Año 2024.

El presente informe muestra el avance físico y financiero alcanzado por las Unidades Ejecutoras de los programas y proyectos de la SAG, además de presentar la rendición de cuentas con transparencia de las acciones realizadas a través de los recursos asignados, tanto nacionales como externos y la contribución de esta Secretaría de Estado a la implementación del Plan de Gobierno 2022-2026, en contribución de la Seguridad Alimentaria, promoviendo el desarrollo del sector Agroalimentario.

El informe consta de dos segmentos: el primero, que hace referencia al marco legal y normativo de la SAG y el segundo que refleja la ejecución financiera y física a nivel de cada Programa y Proyecto adscrito a esta Secretaría de Estado, así como las transferencias realizadas a diferentes Instituciones del Sector Público, Privado y Externo del Sector Agroalimentario.

La fuente de información financiera para la elaboración del presente documento proviene del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI-GES); por otra parte, los avances en la ejecución física fueron proporcionados por cada una de las Unidades Ejecutoras: Programas y Proyectos adscritos a la SAG.



**Glenda Mendoza**  
Directora Interina UPEG

## Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de la Máxima Autoridad, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, con relación a la ejecución de los fondos nacionales como externos y los logros obtenidos por los programas y proyectos. Este informe contiene el avance físico y financiero del Plan Operativo Anual y presupuesto, correspondientes al IV Trimestre del año 2024.

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto de **L6,435,689,736.00**: el cual al cierre del IV Trimestre 2024 tiene un presupuesto vigente de **L.6,423,760,336.00** este presupuesto está consignado en **42.66% (L 2,740,099,467.00)** a las transferencias que la SAG realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, el **38.83% (L.2,471,647,753.00)** a los programas regulares y el **18.87% (L.1,212,013,116.00)** a los proyectos de inversión. Asimismo, está compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**56.25%**), Fondos Propios (**0.33%**), Crédito Externo (**40.06%**), Donaciones Externas (**3.04%**) y Donaciones Internas (**0.32%**).

Al cuarto trimestre del año 2024 el presupuesto vigente fue de **L. 6,423,760,336.00** de los cuales se ejecutaron **L.4,945,709,825.63** lo que representa el **76.99%** del presupuesto total. Por Grupo del Gasto la ejecución refleja que el Grupo 500 Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con **89.57%**, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con **5.90%**. Grupo 300 Materiales y Suministros con **0.55%**, Grupo 200 Servicios No Personales con **5.90%** y Grupo 400 Bienes Capitalizables con **0.72%**

Al desglosar la ejecución por tipo de fondo, se observa que los Fondos Nacionales alcanzaron un **100%** de ejecución, con una participación del **73.06%** del presupuesto ejecutado. Por otro lado, los Fondos Propios representan el **73.38%** de la ejecución, con un **0.32%** de participación en el presupuesto ejecutado. En cuanto al Crédito Externo, se ejecutó un **45.84%**, contribuyendo con el **23.85%** del presupuesto total ejecutado, las Donaciones externas registraron una ejecución del **59.73%**, contribuyendo con el **2.36%** del presupuesto ejecutado. Finalmente, las Donaciones internas ejecutaron el **100%** del presupuesto vigente con una participación de **0.41%**.

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 8 proyectos que se detallan a continuación:

- El Programa Nacional de Agricultura bajo Riego: Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (**PDABR**)
- Programa de Competitividad Rural con los proyectos: Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (**PROINORTE**), Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (**Pro-Occidente**) y los proyectos Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (**ComRural II** y **ComRural III**).
- El Programa de Seguridad Alimentaria: incluye el Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras (**Seguridad Hídrica**); Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana (**Agua Urbana**) y Alianza para el Corredor Seco (**PROSASUR**).

Estos proyectos son financiados con fondos de los organismos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de España a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID. Las acciones de estos proyectos están focalizadas en distintos departamentos del país para atender pequeños productores y productoras, organizaciones, cajas rurales entre otras; y en su conjunto cuentan con un presupuesto de crédito y donaciones externas de **L 1,204,995,413.00** que representa un **18.75%** del presupuesto vigente total de la institución.

## I. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de diciembre de 1996, de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

### Misión:

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos de la población.

### Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

### Objetivos Estratégicos:

1. Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios.
2. Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas.
3. Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.

### Funciones de la SAG:

- a) La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:
  - La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
  - La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.

- El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
  - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
  - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
  - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
  - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
  - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b) El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c) La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d) La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.
- e) La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.
- f) El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
- g) La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
- h) La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
- i) La promoción del crédito agrícola.
- j) La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

### **Ámbito del accionar de la SAG:**

**A Nivel Regional:** La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

**A Nivel Sectorial:** La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.

**A Nivel Institucional:** A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.

### **Política Presupuestaria**


La Secretaría de Finanzas (SEFIN), como institución rectora del sistema SIAFI-GES, dicta los lineamientos que rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y Artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En ese contexto, se definió la política presupuestaria que rige el presupuesto del año 2024 de acuerdo con el Decreto 62-2023 del Presupuesto y sus disposiciones generales para el ejercicio fiscal 2024.

## II. Análisis de la ejecución física y financiera de la SAG

### 2.1 Ejecución Financiera Institucional al IV Trimestre 2024

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2024, un presupuesto de **L.6,435,689,736.00**, el cual al IV trimestre 2024 tiene un presupuesto vigente de **L.6,423,760,336.00**

Este presupuesto está distribuido en un **42.66%** (**L.2,740,099,467.00**) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, el **38.48%** (**L.2,471,647,753**) a los programas regulares y el **18.87%** (**L.1,212,013,116.00**) a los proyectos de inversión.

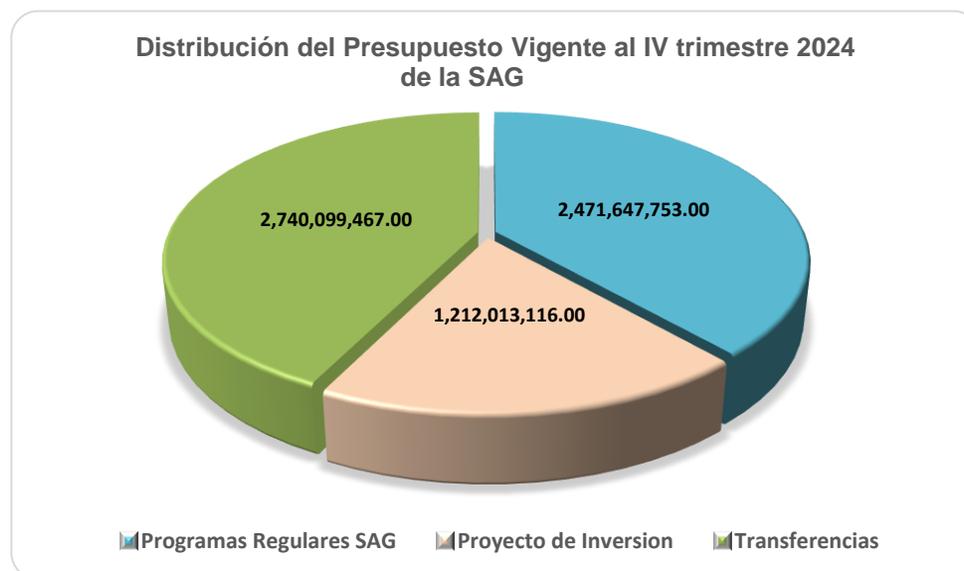

#### 2.1.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto de la SAG está compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales **56.25%**, Crédito Externo (**40.06%**), Donaciones Externas (**3.04%**), Fondos Propios (**0.33%**), y Donaciones Internas (**0.32%**).

Del monto total ejecutado en el IV Trimestre, corresponden **L. 2,740,099,466.42** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo ejecutando el **100%** de su presupuesto, **L.1,595,554,083.14 (64.55%)** a los programas regulares, y **L. 610,056,276.07 (50.33%)** a los proyectos de inversión. En el siguiente cuadro, se detalla el presupuesto vigente y la ejecución financiera de la SAG, al IV trimestre de 2024:

**Ejecución Financiera Todos los Fondos por Institución  
(En Lempiras)**

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución
Programas Regulares SAG	2,498,794,247.00	2,471,647,753.00	1,595,554,083.14	64.55
Proyecto de Inversión	1,215,940,720.00	1,212,013,116.00	610,056,276.07	50.33
Transferencias	2,720,954,769.00	2,740,099,467.00	2,740,099,466.42	100.00
<b>Total</b>	<b>6,435,689,736.00</b>	<b>6,423,760,336.00</b>	<b>4,945,709,825.63</b>	<b>76.99</b>

Fuente: SIAFI

## 2.1.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional

El presupuesto vigente del Tesoro Nacional al IV trimestre, se muestra en **L. 3,613,200,863.00** los cuales representan el **56.25%** del presupuesto total de la Institución, de estos fondos se ejecutaron **L.3,613,200,734.32** que representa el **100%** del presupuesto vigente de dichos fondos; de los cuales las Transferencias al sector público ejecutaron **L. 2,026,256,966.42**, los programas regulares y proyectos de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L1,586,943,767.90**.

### Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional por Institución (En Lempiras)

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	1,609,827,341.00	1,579,926,193.00	1,579,926,073.82	100.00	119.18
Proyectos de Inversión	12,059,271.00	7,017,703.00	7,017,694.08	100.00	8.92
Transferencias	2,027,612,269.00	2,026,256,967.00	2,026,256,966.42	100.00	0.58
<b>Total</b>	<b>3,649,498,881.00</b>	<b>3,613,200,863.00</b>	<b>3,613,200,734.32</b>	<b>100.00</b>	<b>128.68</b>

Fuente: SIAFI

## 2.1.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios

La SAG a través de los programas regulares: Actividades Centrales, PRONAGRI, Pesca y Fomento a la Acuicultura, genera ingresos por cobros en la prestación de servicios de diferente índole: Arrendamiento de tierras para cultivo de camarón "Canon", licencias para ejercer actividades pesqueras y acuícolas. Al IV trimestre cerró con un presupuesto vigente de **L. 21,298,682.00** de estos fondos se ejecutaron **L.15,628,009.32** equivalente a un **73.38%** del presupuesto vigente de los recursos propios.

### Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios (En Lempiras)

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	18,544,028.00	21,298,682.00	15,628,009.32	73.38	5,670,672.68
<b>Total</b>	<b>18,544,028.00</b>	<b>21,298,682.00</b>	<b>15,628,009.32</b>	<b>73.38</b>	<b>5,670,672.68</b>

Fuente: SIAFI

## 2.1.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo

El presupuesto vigente proveniente de crédito externo (préstamo) al IV trimestre del año se refleja en **L.2,573,242,098.00**, que representa un **40.06%** del presupuesto total de la Institución, estos recursos financian los programas que incluyen los proyectos de inversión pública y los programas de apoyo como las Actividades Centrales y Transferencias; dichos fondos alcanzaron una ejecución de **L.1,179,599,106.89** es decir un **45.84%** en relación con el presupuesto vigente de los mismos.

Los Organismos financiadores son: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) bajo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) / Banco Mundial (BM).

**Ejecución Financiera Fondos 21 – Crédito Externo  
(En Lempiras)**

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares	870,422,878.00	870,422,878.00	-	0.00	870,422,878.00
Proyectos de Inversión	1,062,601,720.00	1,009,476,720.00	486,256,606.89	48.17	523,203,474.06
Transferencias	693,342,500.00	693,342,500.00	693,342,500.00	100.00	-
<b>Total</b>	<b>2,626,367,098.00</b>	<b>2,573,242,098.00</b>	<b>1,179,599,106.89</b>	<b>45.84</b>	<b>1,393,626,352.06</b>

Fuente: SIAFI

### 2.1.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas

Las Donaciones Externas (Fuente 22) refleja un presupuesto vigente de **L.195,518,693.00** correspondientes a los proyectos de inversión SAG, recursos que provienen de los siguientes organismos la Asociación Internacional de Fomento (AIF)/Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al IV trimestre se alcanzó una ejecución de un **59.73%** del presupuesto vigente para estos fondos.

**Ejecución Financiera Fuente 22, Donaciones Externas por Organismo Financiero**

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Proyectos de Inversión	141,279,729.00	195,518,693.00	116,781,975.10	59.73	78,736,717.90
<b>Proyectos de Inversión SAG</b>	<b>141,279,729.00</b>	<b>195,518,693.00</b>	<b>116,781,975.10</b>	<b>59.73</b>	<b>78,736,717.90</b>

Fuente: SIAFI

### 2.1.6 Ejecución Financiera Fondos 14 Donaciones Internas

Las Donaciones Internas (Fuente 22) refleja un presupuesto vigente de **L.20,500,000.00** correspondientes a las Transferencias de Capital a Universidades, recursos que provienen Banco Central de Honduras (BCH) Al IV trimestre se alcanzó una ejecución de un **100.00%** del presupuesto vigente de estos fondos

**Ejecución Financiera Fuente 14 Donaciones Internas (En Lempiras)**

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Transferencias	-	20,500,000.00	20,500,000.00	100.00	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>20,500,000.00</b>	<b>20,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

Fuente: SIAFI

### 2.1.7 Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

En lo que respecta al presupuesto vigente por grupo del Gasto, el mayor porcentaje de participación corresponde al Grupo 500 Transferencias y Donaciones con **71.62%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **16.84%**, Grupo 200 Servicios No Personales **8.32%**, Grupo 100 Servicios Personales con **2.53%** y Grupo 300 Materiales y Suministros un **0.69%**. En el siguiente cuadro, se presenta el presupuesto vigente y ejecutado por Grupo del Gasto:


**Ejecución Financiera por Grupo del Gasto SAG**  
**(En Lempiras)**

Grupo Del Gasto	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
100-Servicios Personales	228,873,994.00	162,693,879.00	161,170,702.66	99.06	1,523,176.34
200-Servicios No Personales	493,185,717.00	534,464,397.00	291,862,612.28	54.61	242,585,145.67
300-Materiales y Suministros	61,521,893.00	44,353,609.00	27,180,205.83	61.28	17,173,403.17
400-Bienes Capitalizables	1,139,793,569.00	1,081,576,905.00	35,465,637.6	3.28	1,046,111,267.37
500-Transferencias y Donaciones	4,512,314,563.00	4,600,671,546.00	4,430,030,667.2	96.29	170,640,878.77
<b>Total</b>	<b>6,435,689,736.00</b>	<b>6,423,760,336.00</b>	<b>4,945,709,825.63</b>	<b>76.99</b>	<b>1,478,033,871.32</b>

Fuente: SIAFI

## 2.2 Ejecución Física y Financiera por Programa y Proyecto al IV trimestre 2024


La Secretaría de Agricultura y Ganadería ejecuta 8 programas los cuales están orientados a la entrega de bienes y servicios a la población, un programa de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público en la institución, además 2 que incluyen los proyectos de inversión y una de las prioridades del Plan de Gobierno 2022-2026 como ser la Seguridad Alimentaria y Nutricional, a continuación, se muestra la estructura de los programas:

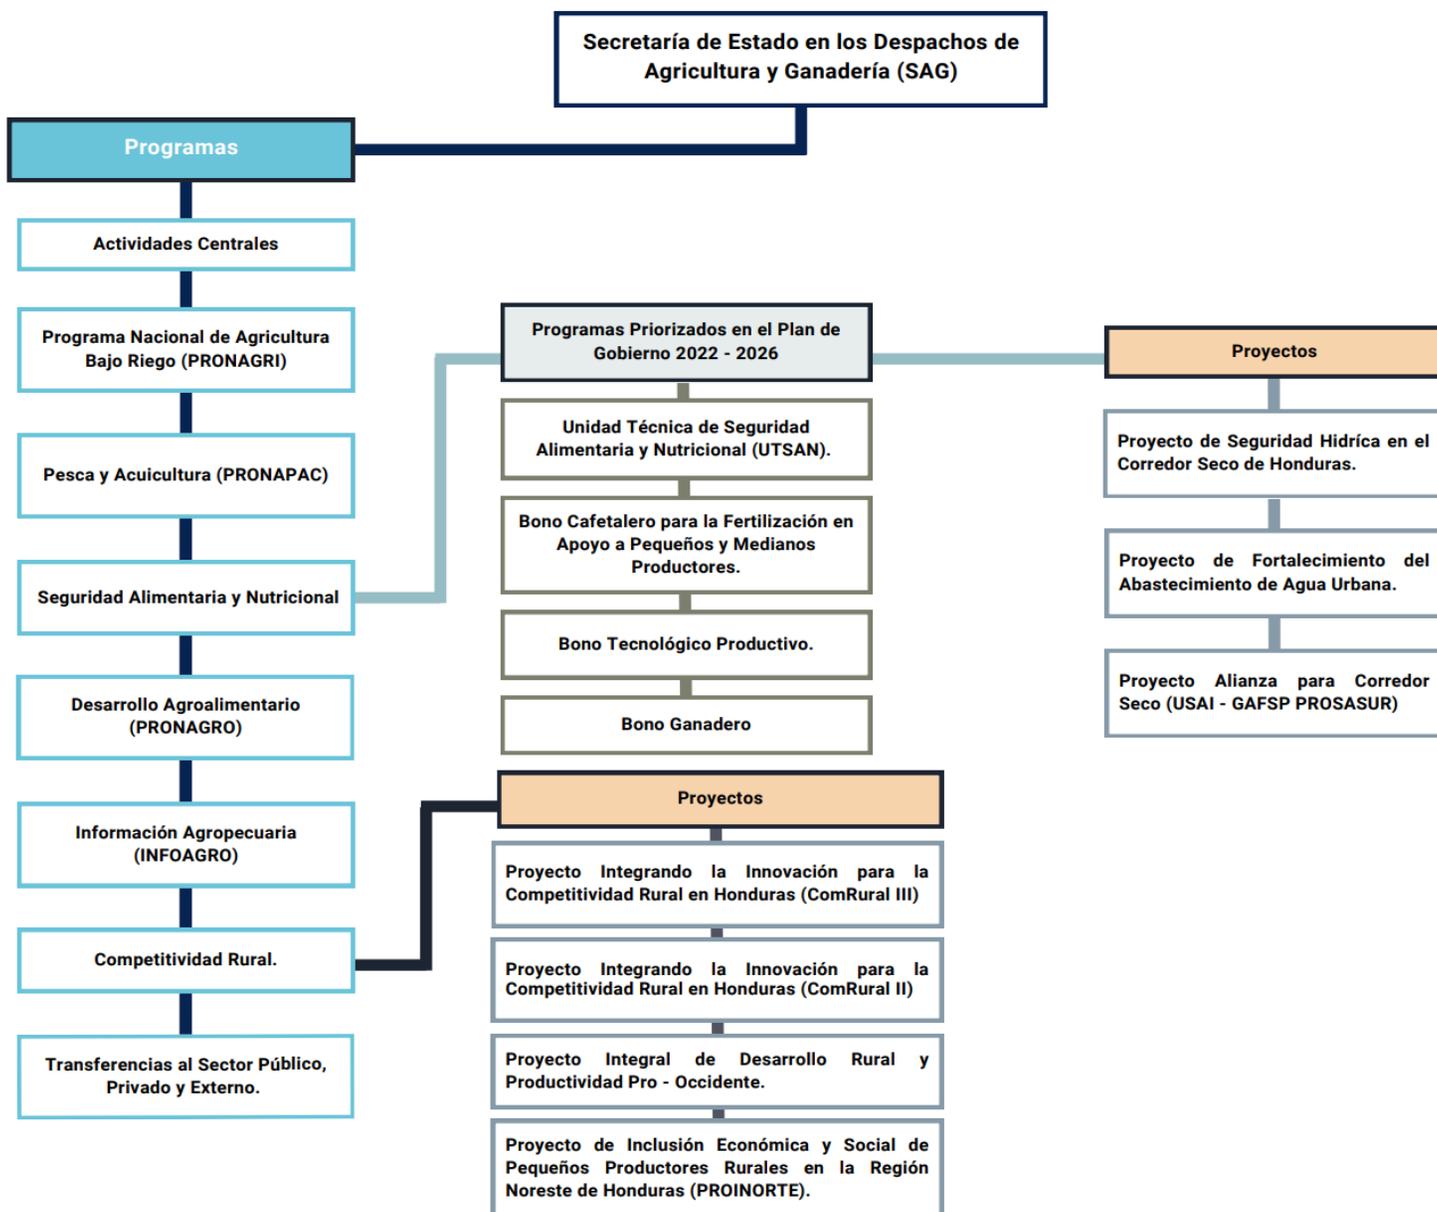


## 2.3 Ejecución Financiera todos los Fondos, por Programas y Proyectos

La SAG al cierre del IV trimestre 2024, refleja un presupuesto vigente de **L.6,423,760,336.00** los cuales se destinan al financiamiento de los 8 programas presupuestarios; de estos el mayor porcentaje le corresponde al programa 99 Transferencias al Sector Público, Privado y Externo un 42.66%, seguido del programa Seguridad Alimentaria y Nutricional con 25.91% que incluye los proyectos: Seguridad Hídrica, Agua Urbana, PROSASUR , además UTSAN y los bonos Cafetalero, Tecnológico Productivo y Ganadero, el programa Actividades Centrales con 16.01%, el programa de Competitividad Rural con 12.20%, incluye los proyectos (PROINORTE, ProOccidente, ComRural II y ComRural III), el PRONAGRI que incluye el proyecto PBADR 1.50% y el resto de los programas (Pesca y Fomento a la Acuicultura, PRONAGRO, INFOAGRO) con un porcentaje menor al 1.72%.

**Porcentaje de Distribución del Presupuesto Vigente por Programa Presupuestario**

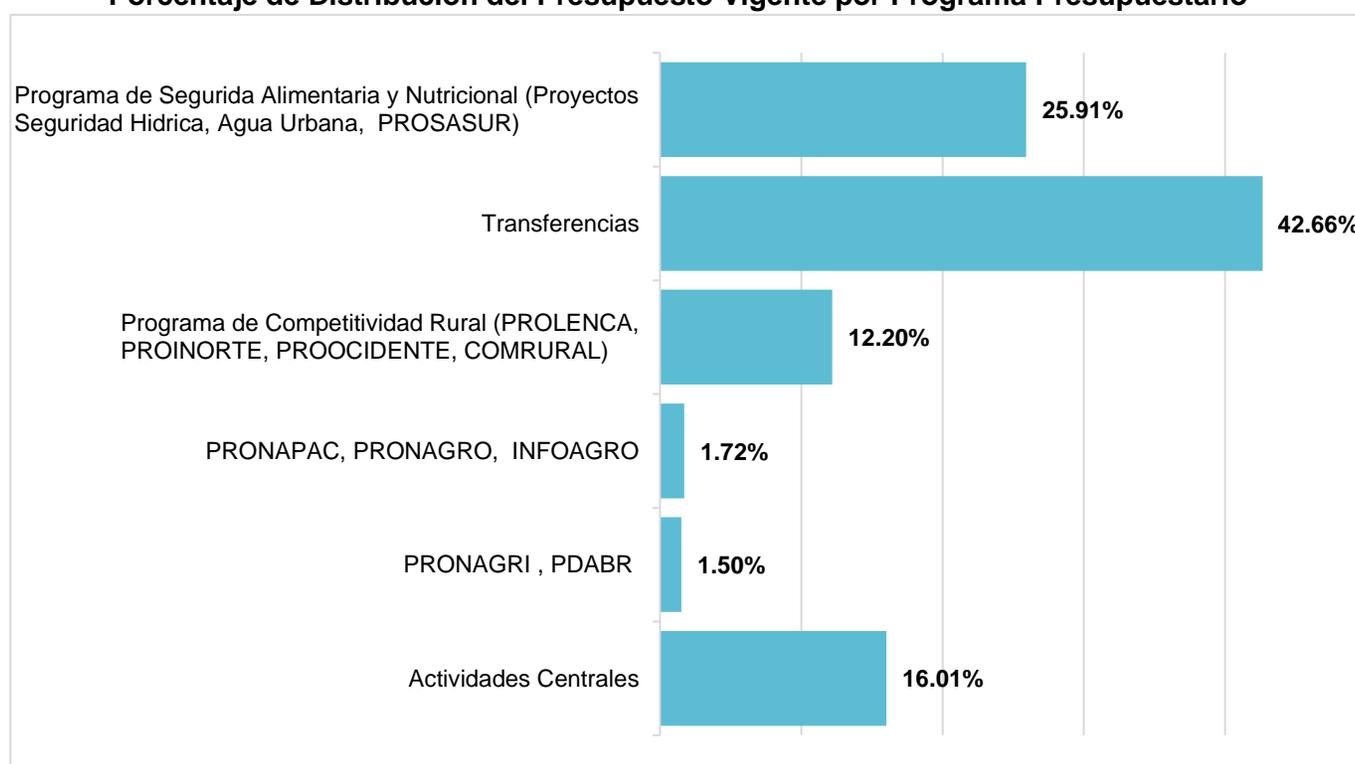

El presupuesto de la SAG está compuesto por cinco fuentes de financiamiento, del presupuesto total ejecutado **L. 4,945,709,825.6** corresponde a la fuente 11 Tesoro Nacional **L. 3,613,200,734.3**, seguido de Fondos Externos (Crédito) con **L. 1,179,599,106.9**, corresponde a la fuente 22 Donaciones Externas **L116,781,975.1**, la fuente 12 Recursos Propios con **L. 15,628,009,3** y Donaciones Internas con **L20,500,000.00**. En el gráfico se puede observar el presupuesto vigente y ejecutado por tipo de Fondo.

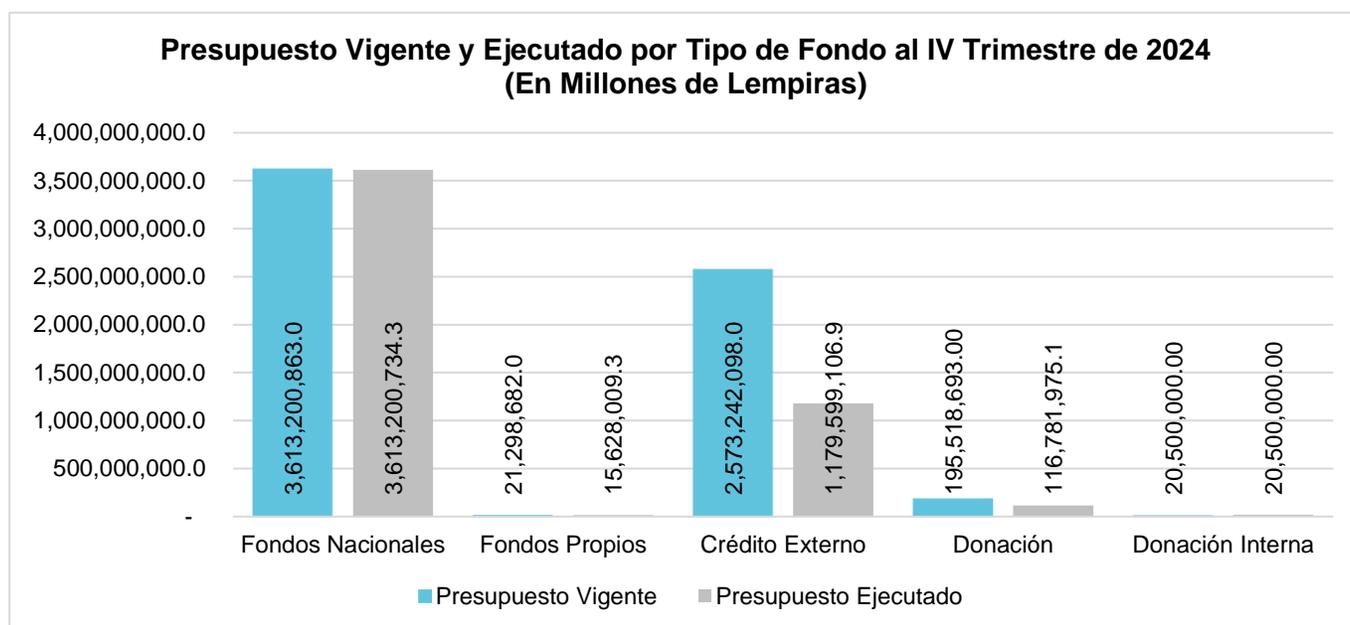

Al IV trimestre 2024 la ejecución financiera fue de **L.4,945,709,825.6** que representan el 76.99% del presupuesto total vigente de **L.6,423,760,336.0** En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución financiera por programas y proyectos de la SAG.

**Ejecución Financiera Todos los Fondos por Programas y Servicios (En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	1,010,325,854.00	1,028,739,557.00	157,802,483.17	15.34	870,937,073.83
PRONAGRI	43,957,934.00	21,932,092.00	21,932,053.38	100.00	38.62
PDABR		74,613,131.00	7,047,249.49	9.45	67,565,881.51
DIGEPESCA	55,561,571.00	47,746,383.00	42,589,852.66	89.20	5,156,530.34
PRONAGRO	52,649,038.00	47,691,325.00	47,691,315.92	100.00	9.08
INFOAGRO	20,431,650.00	15,331,611.00	15,331,601.84	100.00	9.16
Proyecto PROINORTE	123,788,094.00	115,195,242.00	61,091,860.48	53.03	54,086,742.47
Proyecto PROOCCIDENTE	220,801,170.00	316,781,634.00	235,104,633.60	74.22	81,677,000.40
Proyecto COMRURAL II	147,358,209.00	220,978,549.00	142,003,992.61	64.26	78,974,556.39
Proyecto COMRURAL III	248,744,582.00	130,499,242.00	2,027,694.70	1.55	128,471,547.30
UTSAN	15,868,200.00	10,206,785.00	10,206,776.17	100.00	8.83
Programa BONO CAFETALERO	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-
Programa BONO TECNOLÓGICO	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
Programa BONO GANADERO	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
Proyecto SEGURIDAD HIDRICA	220,718,928.00	128,718,928.00	15,314,833.09	11.90	113,404,094.91
Proyecto AGUA URBANA	117,500,008.00	38,207,697.00	30,684,037.00	80.31	7,523,660.00
PROSASUR	137,029,729.00	187,018,693.00	116,781,975.10	62.44	70,236,717.90
Transferencias	2,720,954,769.00	2,740,099,467.00	2,740,099,466.42	100.00	0.58
<b>Total</b>	<b>6,435,689,736.00</b>	<b>6,423,760,336.00</b>	<b>4,945,709,825.63</b>	<b>76.99</b>	<b>1,478,033,871.32</b>

### 2.3.1 Ejecución Financiera por Fuente 11 Tesoro Nacional, Programa y Proyecto

La ejecución de los fondos 11 tesoro nacional muestra un presupuesto vigente de **L 3,613,200,863.00**, de los cuales se ejecutó el **100% (L. 3,613,200,734.32)**, en el siguiente cuadro se detalla la ejecución por cada uno de los programas y proyectos que son financiados por estos fondos:

**Ejecución Financiera Fuente 11 Tesoro Nacional de la Institución por Programas y Proyecto (En Lempiras)**

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
<b>Programas Regulares SAG</b>	<b>1,621,886,612.00</b>	<b>1,586,943,896.00</b>	<b>1,586,943,767.90</b>	100.00	<b>128.10</b>
Actividades Centrales	139,692,577.00	157,142,545.00	157,142,500.60	100.00	44.40
PRONAGRI	43,726,234.00	21,700,392.00	21,700,370.50	100.00	21.50
DIGEPESCA	37,459,642.00	27,853,535.00	27,853,508.79	100.00	26.21
PRONAGRO	52,649,038.00	47,691,325.00	47,691,315.92	100.00	9.08
INFOAGRO	20,431,650.00	15,331,611.00	15,331,601.84	100.00	9.16
UTSAN	15,868,200.00	10,206,785.00	10,206,776.17	100.00	8.83
Bono Cafetalero	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-
Bono Tecnológico	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
Bono Ganadero	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
<b>Proyecto de Inversión</b>	<b>12,059,271.00</b>	<b>7,017,703.00</b>	<b>7,017,694.08</b>	<b>100.00</b>	<b>8.92</b>
PROINORTE	12,059,271.00	7,017,703.00	7,017,694.08	100.00	8.92
<b>Transferencias al Sector Público</b>	<b>2,027,612,269.00</b>	<b>2,026,256,967.00</b>	<b>2,026,256,966.42</b>	<b>100.00</b>	<b>0.58</b>
Transferencias	2,027,612,269.00	2,026,256,967.00	2,026,256,966.42	100.00	0.58
<b>Total</b>	<b>3,649,498,881.00</b>	<b>3,613,200,863.00</b>	<b>3,613,200,734.32</b>	<b>100.00</b>	<b>128.68</b>

### 2.3.2 Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios, por Programa:

El presupuesto vigente de estos recursos fue de **L 21,298,682.00** que corresponden a los programas: Actividades Centrales, PRONAGRI, y Pesca y Fomento a la Acuicultura, estos recursos son generados por cobros en la prestación de servicios como arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), pesca industrial (Buzos), pesca deportiva, compra venta mayorista, pesca artesanal, embarcación artesanal básica, venta de productos, renta de alquileres de casetas y las casas de habitación en las Acacias, Juticalpa, Olancho entre otros.

En el siguiente cuadro se puede observar que la ejecución al IV Trimestre fue de **L 15,528,009.32** que representa un **73.38%** del presupuesto vigente, como se puede observar no se alcanzó el 100% de ejecución debido a que los recursos corresponden a los sueldos y salarios del personal que laboraba como contrato y que se trasladaría a personal permanente (acuerdo), en base al artículo 85 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024 y a la Circular No. DGP-002-2024, sin embargo, no se concluyó el proceso de nombramiento del personal ante la Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC). Así mismo, algunos de estos ingresos se incorporaron a finales del mes de noviembre, con los cuales se había programado realizar compras que requerían procesos de licitación, pero no se disponía del tiempo para realizar el proceso.

**Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios (En Lempiras)**

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	210,399.00	1,174,134.00	659,982.57	56.21	514,151.43
PRONAGRI	231,700.00	231,700.00	231,682.88	99.99	17.12
DIGEPESCA	18,101,929.00	19,892,848.00	14,736,343.87	74.08	5,156,504.13
<b>Total</b>	<b>18,544,028.00</b>	<b>21,298,682.00</b>	<b>15,628,009.32</b>	<b>73.38</b>	<b>5,670,672.68</b>

Fuente: SIAFI

### 2.3.3 Ejecución Financiera Fuente 21 Crédito Externo, Programa y Proyecto:

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamo) reflejan un presupuesto vigente de **L.2,573,242,098.00** y una ejecución de **45.84%** que equivale a **L. 1,179,599,106.89**. En cuanto al presupuesto asignado por la SEFIN al programa Actividades Centrales, fondos del organismo AIF/BM destinados como recursos adicionales para los proyectos de inversión, no fueron ejecutados debido a que los proyectos no requirieron de presupuesto adicional. Los recursos asignados a los proyectos de inversión, no se cumplió ya que están en proceso trámites administrativos, procesos de licitación, contratación de empresas consultoras e implementadoras, entre otros.

#### Ejecución Financiera Fuente 21 Crédito Externo de la Institución y por Programa y Proyecto (En Lempiras)

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	870,422,878.00	870,422,878.00	-	0.00	870,422,878.00
PROINORTE	111,728,823.00	108,177,539.00	54,074,166.40	49.99	54,086,733.55
PDABR	-	74,613,131.00	7,047,249.49	9.45	67,565,881.51
PROOCCIDENTE	216,551,170.00	316,781,634.00	235,104,633.60	74.22	81,677,000.40
COMRURAL II	147,358,209.00	220,978,549.00	142,003,992.61	64.26	78,974,556.39
COMRURAL III	248,744,582.00	121,999,242.00	2,027,694.70	1.66	119,971,547.30
Seguridad Hídrica	220,718,928.00	128,718,928.00	15,314,833.09	11.90	113,404,094.91
Agua Urbana	117,500,008.00	38,207,697.00	30,684,037.00	80.31	7,523,660.00
Transferencias	693,342,500.00	693,342,500.00	693,342,500.00	100.00	-
<b>Proyectos Regulares SAG</b>	<b>2,626,367,098.00</b>	<b>2,573,242,098.00</b>	<b>1,179,599,106.89</b>	<b>45.84</b>	<b>1,393,626,352.06</b>

Fuente: SIAFI

### 2.3.4 Ejecución Financiera Fuente 22 Donaciones Externas, Programa y Proyecto:

Las donaciones externas reflejan un presupuesto vigente de **L.195,518,693.00**, de los cuales se han ejecutado al IV trimestre **L. 116,781,975.10 (59.73%)** en apoyo a los proyectos de inversión ComRural III el cual aún no se encuentra en implementación y el proyecto PROSASUR, que tiene pagos pendientes de productos que se han reprogramado para el 2025, en vista que se autorizó una ampliación de tiempo al contrato del consultor implementador. A continuación, el detalle:

#### Ejecución Financiera Fuente 22, Donaciones Externas por Organismo Financiero

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
POOCCIDENTE	4,250,000.00	-	-	-	-
COMRURAL III	-	8,500,000.00	-	0.00	8,500,000.00
PROSASUR	137,029,729.00	187,018,693.00	116,781,975.10	62.44	70,236,717.90
<b>Programas Regulares SAG</b>	<b>141,279,729.00</b>	<b>195,518,693.00</b>	<b>116,781,975.10</b>	<b>59.73</b>	<b>78,736,717.90</b>

Fuente: SIAFI

## 2.4 Ejecución física por Programa y Proyecto.

Al IV trimestre del presente año, los programas y proyectos alcanzaron los siguientes avances:

### 2.4.1 Programa 01: Actividades Centrales

Este programa sirve de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público en la institución a través de las siguientes actividades: 1) Dirección y Coordinación Superior, 2) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, 3) Servicios Administrativos y Financieros, 4) Servicios de Secretaría General, 5) Auditoría Interna, 6) Coordinaciones Regionales, 7) Fomento a la Equidad de Género, 8) Unidad de Agro Ambiente y Cambio Climático.

La ejecución financiera del al IV trimestre 2024 alcanzo un 15.34% (**L.157,802,483.17**), debido a que no se ejecutaron los recursos de crédito externo del organismo AIF/BM, asignado por la SEFIN al programa, destinados como recursos adicionales para los proyectos de inversión, los mismos no se transfirieron a los proyectos ya que no requirieron de presupuesto adicional.

**Ejecución Financiera Actividades Centrales (En Lempiras)**

Fuente	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
<b>Fuente 11: Fondos Nacionales</b>	139,692,577.00	157,142,545.00	157,142,500.60	100.00	44.40
<b>Fuente 12: Recursos Propios</b>	210,399.00	1,174,134.00	659,982.57	56.21	514,151.43
<b>Fuente 21: Crédito Externo AIF</b>	870,422,878.00	870,422,878.00	-	0.00	870,422,878.00
<b>Total</b>	<b>1,010,325,854.00</b>	<b>1,028,739,557.00</b>	<b>157,802,483.17</b>	<b>15.34</b>	<b>870,937,073.83</b>

Fuente: SIAFI

### 2.4.2 Programa 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)

Es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

**Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (PRONAGRI)**

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre 2024					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a microriego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras.	Hectárea	705	225	213	95%	656	93%
Inventario de producción agrícola por rubros de las parcelas de los productores y productoras en los distritos de riego con acceso al mercado local y nacional.	Reporte	4	1	1	100%	4	100%

<b>Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (PRONAGRI)</b>							
Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre 2024					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Capacitación brindada en temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión de riesgo, uso de suelo, pruebas en los laboratorios entre otros, a estudiantes de la academia y productores(as).	Capacitación	50	6	5	83%	49	98%
Estudios de prefactibilidad para construcción, modernización, Rehabilitación y ampliación de sistemas de riego para gestión de recursos financieros realizados, en beneficio de los pequeños y medianos productores(as).	Estudio de Prefactibilidad	2	.	.	-	2	100%
Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en el enfoque de género.	Capacitación	19	3	2	67%	17	89%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>A/O- 02: Gestión de Distritos de Riego</b>							
Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	50	-	-	-	25	50%
Recopilación de información de datos de volumen de producción por rubro en los distritos de riego.	Informe	4	1	1	100%	4	100%
<b>A/O-03: Capacitación y Asistencia Técnica en Agricultura Irrigada</b>							
Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lote Demostrativo	12	4	3	75%	11	92%
Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia Técnica	64	12	12	100%	62	97%
<b>A/O-04: Gestión de Áreas para Riego</b>							
Kit de sistema de micro riego (tubería, accesorios, cinta de goteo, filtro) instalado en hectáreas de tierra agrícola.	Kit de Riego	302	-	-	-	266	88%
Diseño y presupuesto de sistema de riego elaborado.	Diseño	12	3	2	67%	11	92%
Áreas identificadas de riego para banco de proyectos.	Área	2	-	-	-	2	100%
<b>A/O-05: Fomento de la Equidad e Igualdad de Género en las Actividades de Riego y Drenaje</b>							
Plan de capacitación Elaborado	Plan	4	1	1	100%	4	100%

Fuente SIAFI

## Descripción de los logros:

Beneficiados 890 productores y estudiantes (675 hombres y 215 mujeres) durante el IV Trimestre a raves de los siguientes servicios:

- Beneficiados 696 productores y productoras (163 mujeres y 533 hombres) a través de 212.65 nuevas hectáreas con acceso a microriego intrafinca.
- Se brindaron un total de **12 asistencias técnicas a 76 productores y productoras** (61 hombres y 15 mujeres) en diferentes municipios, abordando temas como el manejo y limpieza de tuberías de riego por goteo, uso y manejo de sistemas de riego por goteo y aspersión, empaque y comercialización del cultivo de plátano Curare Enano, entre otras. Estas actividades se llevaron a cabo en Nacaome, Langue, El Tular y Cofaisita (Valle), Jobos, San Antonio de Oriente, Jiriguare y Guaimaca (Francisco Morazán), y Yuscarán Ojo de Agua (El Paraíso), incluyendo visitas técnicas a la escuela agrícola Luis Landa y la evaluación de daños en redes de riego.
- Se impartieron un total de **5 capacitaciones a 98 productores y productoras** (71 hombres y 27 mujeres), incluyendo productores y estudiantes, en diversas temáticas clave para fortalecer sus capacidades productivas. Las capacitaciones abordaron el uso y manejo de sistemas de riego por aspersión y goteo en cultivos de pastos y forrajes, pruebas realizadas en el laboratorio de suelos en Comayagua, manejo del sistema de riego del distrito de Ganso en Comayagua, fertilización del cultivo de plátano en el distrito de riego de Oropolí (El Paraíso), y fortalecimiento de capacidades productivas y acceso al agua en el distrito de riego de Flores, Villa de San Antonio (Comayagua). Estas actividades se llevaron a cabo en el DDTRD, las regionales de Nacaome y Comayagua, e incluyeron la participación de productores asociados y estudiantes del SCITA y la Universidad Nacional de Agricultura, promoviendo un uso eficiente de recursos y mejores prácticas agrícolas.
- Brindadas **2 capacitaciones a 15 productores y productoras** (5 hombres y 10 mujeres) en temas relacionados a la inclusión de género, tales como formulación de la política de género en la SAG.
- Establecidos 3 nuevos lotes de cultivo de maíz en las comunidades de la Esmeralda, Guaimaca (Francisco Morazán) y Ojo de Agua (El Paraíso), beneficiando a 3 productores hombres.
- Elaborados 2 diseños de sistemas de riego por microaspersión para producción de cultivo de cítricos en Sonaguera, Colón a 2 productores independientes (hombres).

## Limitantes de la ejecución física

La ejecución física se vio afectada debido al recorte presupuestario realizado por la SEFIN, en cumplimiento del artículo 6 del PCM-35-2024, publicado el 15 de noviembre de 2024. Dicho artículo instruye que, debido a las afectaciones ocasionadas por la tormenta Tropical SARA, “se gestionen, reorienten y asignen los recursos identificados entre las distintas instituciones del Gobierno”, afectando los grupos 200 y 300 que son los necesarios para la operatividad del programa.

## Ejecución Financiera

La ejecución financiera acumulada fue de L 21,932,053.38 equivalente a 100%

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego PRONAGRI (En Lempiras)

Fuente	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	43,726,234.00	21,700,392.00	21,700,370.50	100.00	21.50
Fuente 12: Recursos Propios	231,700.00	231,700.00	231,682.88	99.99	17.12
<b>Total</b>	<b>43,957,934.00</b>	<b>21,932,092.00</b>	<b>21,932,053.38</b>	<b>100.00</b>	<b>38.62</b>

Fuente: SIAFI

### 2.4.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

Este programa tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.

### Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (PDABR)

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Contratos firmados con empresas constructoras y supervisoras de sistemas de riego Lamaní, Proyecto de pequeño riego (PPR), Proyecto Intrafinca, obras menores en proyecto Selguapa, Sistema de Filtrado y Protección Proyecto Sulaco y Elaboración de Estudio para obras complementarias en Proyecto Selguapa, en beneficio de los productores y productoras del área de influencia del proyecto.	Contrato	6	5	-	-	-	0%
Rehabilitación de sistemas de riego San Sebastián y Lamaní, en beneficio de los productores y productoras.	Porcentaje	35	15	-	-	-	0%
Propuestas de negocios aprobadas en beneficio de los grupos empresariales de productores (as) de San Sebastián, Ajuterique y Sulaco.	Propuesta Técnica	10	10	-	-	-	0%
Capacitaciones en riego presurizado, manejo de agua y fertirriego impartida a los productores (as) organizados en los grupos empresariales.	Capacitación	6	6	-	-	-	0%

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**  
**Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)**

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Juntas directivas de asociaciones de regantes y grupos empresariales elegidas por productores (as) en asambleas de 12 municipios beneficiados.	Cantidad	27	18	-	-	-	0%
Documentos aprobados de estatutos y reglamentos de las asociaciones de regantes de los proyectos y grupos empresariales organizados.	Documento	28	22	-	-	-	0%
Planes estratégicos aprobados a los productores (as) que integran a las asociaciones de regantes y a grupos empresariales organizados.	Plan Estratégico	7	7	-	-	-	0%
Capacitación en manejo y uso del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente, protección de microcuencas impartidos a los usuarios de los sistemas de riego de san Sebastián, Lamaní, Comayagua, Lauterique, Lejamani, La Paz, Marcala, San Jose, Chinacla, Cantarranas.	Capacitación	8	3	3	100%	8	100%
Talleres impartidos sobre medidas de control ambiental y social a los productores y productoras organizados, usuarios de los sistemas de riego de los municipios de Yoro, Victoria, Distrito Central, Jacaleapa, Azacualpa y Marita.	Taller	6	6	1	17%	1	17%
Eventos de socialización de planes de ordenamiento de los Recursos Naturales en los municipios de: Comayagua, El Rosario, Siguatepeque, Jesús de Otoro, Santiago de Pringa, La Paz, Lauterique, Lamaní, San Sebastián, Lepaterique y la Villa de San Antonio.	Evento	12	6	-	-	3	25%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>A/O- 01: Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego</b>							
Oficio de adjudicación a empresas constructoras y supervisoras de proyectos de sistemas de riego	Documento	6	5	-	-	-	0%
Desembolsos realizados a empresas constructoras y supervisoras.	Lempira	55,719,360	23,879,726	-	-	-	0%
<b>A/O-02: Asistencia Técnica y Comercialización</b>							
talleres para la formulación de propuestas de negocios realizados.	Taller	10	10	-	-	-	0%
Planes de capacitaciones elaborados.	Plan	1	1	-	-	-	0%

A/O-03: Organización y Desarrollo Local							
Talleres en temas organizativos de las asociaciones de regantes y grupos empresariales desarrollados.	Taller	27	18	-	-	-	0%
Talleres para la formulación de estatutos y reglamentos para las asociaciones de regantes y grupos empresariales desarrollados.	Taller	28	22	-	-	-	0%
Asambleas desarrolladas para la aprobación de los estatutos y reglamentos de las asociaciones de regantes.	Asamblea	3	3	-	-	-	0%
Talleres desarrollados para la formulación de planes estratégicos.	Taller	7	7	-	-	-	0%
A/O-04: Gestión Ambiental							
Plan de capacitación en temas ambientales.	Documento	1	-	-	-	1	100%
Plan de desarrollo del taller de medidas ambiental y social elaborado.	Plan}	1	-	-	-	1	100%
Planes de ordenamiento de los Recursos Naturales aprobados.	Plan	2	-	1	-	2	100%

Fuente: SIAFI

### Avances:

- Desarrolladas 3 capacitaciones en temas relacionados con educación ambiental, cambio climático y conservación de microcuencas en el municipio de San Sebastián, en el cual participaron 98 personas, 38 hombres, 60 mujeres, entre ellos 94 jóvenes estudiantes y 4 docentes de varios centros educativos. Se enfatizó en los conceptos básicos de educación ambiental, cambio climático, resiliencia, calentamiento global, precipitación y déficit hídrico, conservación de la biodiversidad y manejo de desechos sólidos en áreas de los sistemas de riego.
- Realizado un (1) taller con la participaron de 7 beneficiarios, productores agropecuarios, que fueron capacitados directamente en sus predios, en el tema de cumplimiento de medidas ambientales y sociales, de diferentes comunidades del municipio de Olanchito, Yoro.
- Aprobado el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Recursos Naturales de la Subcuenca Rio Selguapa, a través de este plan, el PDABR ha contribuido a poner bajo manejo 180,475.0211 hectáreas de bosque que protegen las microcuencas abastecedoras de agua de los proyectos de riego Selguapa, Sulaco, San Sebastián, Lamaní y otras potenciales áreas aptas para riego en el valle de Olomán, Yoro.

La ejecución financiera se presenta a continuación:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto PDABR**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BCIE	-	74,613,131.00	7,047,249.49	9.45	67,565,881.51
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>74,613,131.00</b>	<b>7,047,249.49</b>	<b>9.45</b>	<b>67,565,881.51</b>

Fuente: SIAFI

**Limitantes:**

La ejecución física y financiera no se cumplió debido a la no aprobación de reestructuración del proyecto por parte del BCIE en vista que los tiempos programados para la ejecución de nuevas obras se ejecutaban más allá de la fecha de cierre del Proyecto, en ese contexto conjuntamente la SAG, BCIE y SEFIN en reunión sostenida se tomó la decisión de continuar únicamente con la ejecución del Proyecto san Sebastián y el Proyecto Lamaní. A la fecha no se ha recibido por parte del BCIE el otorgamiento de la “No Objeción” para las adendas No. 4 de la constructora y supervisora de los proyectos. Las bases de licitación están a espera de revisión en el banco.

**2.4.3 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura**

El Programa es el responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiológicas y la política pesquera nacional. Este programa, tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura. La ejecución física del programa se muestra en el siguiente cuadro:

**Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (DIGEPESCA)**

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros.	Licencia	11,272	1,355	967	71%	9,021	80%
Licencias de pesca emitidos a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	242	42	42	100%	244	101%
Contratos de arrendamiento otorgados a las y los acuicultores en el rubro del cultivo de camarón.	Contrato	3	3	3	100%	3	100%

**Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (DIGEPESCA)**

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Evaluaciones de la estructura poblacional de las especies marinas Pepino de Mar (Holothuria mexicana), camarones y peces teleósteo en aguas nacionales para establecimiento de cuotas de captura en beneficio de pescadores industriales y artesanales.	Informe	6	2	2	100%	6	100%
Encuesta de participación de las mujeres en las actividades pesqueras y acuícolas en las comunidades costeras del golfo de Fonseca.	Porcentaje	100	50	100	200%	100%	100%
Asistencia técnica brindada a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	723	116	160	138%	723	100%
Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas.	Alevines	1,500,000	355,000	703,160	198%	1,431,110	95%
Plan de manejo pesquero entregado al comité de gobernanza de la laguna de Caratasca en Gracias a Dios.	Plan	1	1	1	100%	1	100%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>A/O-02: Investigación Pesquera y Acuícola</b>							
Recolección de datos biológicos en campo.	Informe	6	2	2	100%	6	100%
<b>A/O-03: Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola</b>							
Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Reporte	2896	627	627	100%	2,896	100%
Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	1,173	307	307	100%	1,173	100%
<b>A/O-04: Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola</b>							
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas en temas (cultivos de tilapia, artes de pesca, importancia de estar documentado, diferentes tipos de veda entre otras.	Capacitación	96	19	30	158%	96	100%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Validación del Plan de Manejo Pesquero con equipo técnico multidisciplinario del Programa.	Reunión	5		1	100%	5	100%
<b>A/O-05: Fomento a la Acuicultura</b>							
Producción de alevines de tilapia.	Alevín	3,331,461	1,027,999	1,027,999	100%	3,458,461	104%
<b>A/O-06: Fomento de la equidad e igualdad de género en el sector pesquero y Acuícola</b>							
Inspecciones realizadas a fincas camaroneras previo a ser otorgado el contrato de arrendamiento.	Reporte	3	3	3	100%	3	100%
Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico en las comunidades de Marcovia, Choluteca y Amapala, Valle.	Capacitación	6	2	2	100%	4	67%

Fuente: SIAFI

### Descripción de los logros

- Producidos 1,027,999 alevines de tilapia, en el Centro Nacional de Investigación Piscícola El Carao, ubicado en la comunidad de Playitas, departamento de Comayagua, de los cuales se distribuyeron 703,160 alevines, beneficiando directamente a 28 productores en los Comayagua, El Paraíso, La Paz, Copan, Olancho, Yoro, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca e indirectamente a 72 beneficiarios.
- Realizadas 627 vigilancias a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas en plantas procesadoras, restaurantes, supermercados, pescaderías, puestos de venta, comunidades pesqueras y comercializadores en los departamentos de Atlántida, Cortés, Colón, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Francisco Morazán.
- Inspecciones realizadas a 307 embarcaciones artesanales e industriales en los departamentos de Atlántida e Islas de la Bahía. con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
- Emitidas 967 licencias de operación beneficiando a 854 hombres y 113 mujeres naturales y jurídicas, que intervienen en la actividad pesquera (Pescadores artesanales, empresas procesadoras, comercializadores de productos pesqueros, etc.) en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Choluteca y Francisco Morazán.
- Capacitados y asistidos 641 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales (450 hombres y 191 mujeres) en temas tales como: técnicas pesqueras, cultivo de tilapia en Geomembrana, normativas pesqueras, importancia de las vedas, cultivo de tilapia, en los departamentos de Atlántida, Colon, Cortes, Comayagua, La Paz, Valle y Choluteca.
- Generados L. 2,559,913.29 millones en ingresos por diferentes conceptos como ser: arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), Pesca industrial (Buzos), licencias y permisos para ejercer actividades pesqueras y acuícolas, pesca industrial, venta de alevines, y otros).

- Generados 442 nuevos empleos beneficiando a 369 hombres y 73 mujeres, por medio de la emisión de carnets en los departamentos de Atlántida, Colon, Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Valle.
- Capacitados 14 técnicos del programa para fortalecer sus capacidades en temas como tráfico ilegal de madera, vida silvestre, pesca ilegal, ética profesional, actuación de campo, y verificación de infracciones ambientales en áreas protegidas de Tela y La Ceiba, Atlantida. Las actividades incluyeron capacitaciones sobre dispositivos excluidores de tortugas (TEDs), gobernanza, normativa de monitoreo satelital para control y vigilancia, protección de océanos para alcanzar la meta 30x30, conservación y uso sostenible de recursos marinos en el Pacífico de Honduras, y el combate de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Además, participaron en el 1er Encuentro de Socios del Programa Global Alianzas Climáticas con representantes de México, Guatemala y Honduras, organizado por GLOBAL y el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF).
- Remodelada la oficina regional de Omoa, con una inversión de 973,330.95 lempiras de los cuales se estará dando atención a unos 1,100 pescadores en la zona, a través de capacitación, asistencia técnica y emisión de licencias.
- Realizado Muestreo Biológico de camarón en el caribe, previo a la apertura de la temporada de pesca. El cual tiene como propósito determinar si el recurso pesquero (camarón) cumple con los requisitos establecidos.
- Con el apoyo del Gobierno de Turkia y la organización de OSPESCA, se desarrolló el Taller de Aporte nutricionales de Harina de Pescado en Honduras, en la dieta de las personas y las diversas formas de preparación en la que puede ser incluida para enriquecer el alimento. Se presentó el desafío de hacia donde el país puede avanzar en la gestión de la producción de harina de pescado y de inclusión dentro de las meriendas escolares.
- Presentación de resultados de la investigación de protocolo de pepino de mar temporada 2023-2024, con pescadores artesanales e industriales del caribe hondureño, con el principal objetivo de posicionar una pesca responsable, enmarcado en la nueva Política de Estado del Sector Agroalimentario de Honduras (PESAH 2023-2043).
- Se brindó asistencia técnica a las cooperativas Cooperativa de Pescadores y Curiles Mixta del Mar Limitada (CURIMAR) y Cooperativa de Pescadores Buenos Aires Limitada (COOPBAL) en el CIAP En: Muestreo o crecimiento de los camarones, mantenimiento de las instalaciones y equipos (Ciclo III), en Choluteca.
- Construcción de un Plan de Apoyo para los pescadores artesanales de la Isla del Tigre en el Municipio de Amapala, con el objetivo principal de mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la pesca artesanal con vista a contribuir al desarrollo económico de las comunidades pesqueras de la Isla del Tigre.

### **Limitantes de la ejecución física**

La ejecución física se vio afectada debido al recorte presupuestario realizado por la SEFIN, en cumplimiento del artículo 6 del PCM-35-2024, publicado el 15 de noviembre de 2024. Dicho artículo instruye que, debido a las afectaciones ocasionadas por la tormenta SARA, “se gestionen, reorienten y asignen los recursos identificados entre las distintas instituciones del Gobierno”, afectando los grupos 200

y 300 que son los necesarios para la operatividad del programa, además, algunas actividades se vieron afectadas para su realización como ser carnetización y capacitaciones.

### Ejecución Financiera

La ejecución financiera fue de L 42,589,852.66 equivalente a 89.20% debido a que a la fecha quedaron remanentes que corresponden a los sueldos y salarios del personal que laboraba como contrato y que se trasladaría a personal permanente (acuerdo), en base al artículo 85 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024 y a la Circular No. DGP-002-2024, sin embargo, no se concluyó el proceso de nombramiento del personal ante la Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC). Así mismo, algunos de estos ingresos se incorporaron a finales del mes de noviembre, con los cuales se había programado realizar compras que requerían procesos de licitación, pero no se disponía del tiempo para realizar los procesos.

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos DIGEPESCA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	37,459,642.00	27,853,535.00	27,853,508.79	100.00	26.21
Fuente 12: Recursos Propios	18,101,929.00	19,892,848.00	14,736,343.87	74.08	5,156,504.13
<b>Total</b>	<b>55,561,571.00</b>	<b>47,746,383.00</b>	<b>42,589,852.66</b>	<b>89.20</b>	<b>5,156,530.34</b>

Fuente: SIAFI

#### 2.4.4 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad. La ejecución física del programa se muestra a continuación:

#### Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 PRONAGRO

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Comité	12	3	3	100%	12	100%
Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes de los productos agroalimentarios.	Evento	3	1	-	0	2	67%
Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	9	2	2	100%	9	100%
Ferias agropecuarias nacionales, municipales realizadas, en apoyo a la comercialización de la producción de los pequeños y medianos productores(as).	Feria	13	4	4	100%	13	100%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>Enfoque de Cadenas Agroalimentarias</b>							
Análisis situacional de las cadenas agroalimentarias.	Análisis	8	-	-	-	8	100%
Mapeo de los actores de las cadenas agroalimentarias.	Informe	8	-	-	-	8	100%
Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	16	2	2	100%	16	100%
Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	29	2	2	100%	29	100%
Reuniones de cadenas agroalimentarias con los actores de los diferentes eslabones.	Reunión	45	6	6	100%	45	100%
Foros de cadenas agroalimentarias.	Cantidad	1	1	-	-	-	-
<b>Agronegocios</b>							
Plan de trabajo de las ferias elaborados.	Plan de Trabajo	13	3	3	100%	13	100%
Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnostico	5	2	2	100%	5	100%
Talleres de capacitación impartido.	Talleres de Capacitación	5	1	1	100%	5	100%
Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	3	-	-	-	3	100%
Plan de Negocios elaborado.	Plan de Negocio	5	2	2	100%	5	100%

Fuente: SIAFI

### **Logros alcanzados/ Enfoque de Cadenas agroalimentarias:**

- Realizados 3 Comités de Cadenas Agroalimentarias siendo estos los siguientes:

#### ***Cadena de Aguacate***

Mediante reunión realizada con 19 productores (16 hombres y 3 mujeres) de Aguacate en Tegucigalpa, Francisco Morazán, se realizaron las siguientes acciones:

- Se logró un acuerdo para establecer un precio justo entre los productores e importadores de aguacate, quienes aceptaron comprar la libra de aguacate fresco a un precio de L 20.00.
- Se acordó elaborar un plan fitosanitario que será presentado a los productores de aguacate con el objetivo de mejorar la calidad de la fruta para el año 2025.
- Se creará una mesa entre productores e importadores para reducir las importaciones en los meses de producción.

### **Cadena de Cacao**

A través de una reunión realizada en la regional de la SAG en San Pedro Sula, con la participación de 31 productores de cacao (21 hombres, 10 mujeres y 5 jóvenes), se presentó el resumen consolidado de la Rendición de Cuentas de 14 organizaciones de productores de cacao. Durante esta presentación se destacaron los siguientes logros relevantes:

- Generación de 131 empleos, con 96 en edad adulta donde 51 fueron permanentes (Hombres: 40 y Mujeres: 11), 45 empleos temporales (Hombres: 19 y Mujeres: 26) y 35 empleos a jóvenes donde 17 son permanentes (Hombres:12 y Mujeres 5) y 18 empleos temporales (Hombres: 10 y Temporales: 8).
- Mediante la Cadena de cacao de PRONAGRO se lograron atender 275 comunidades productoras de cacao.
- Establecidas 13 organizaciones de productores de cacao.
- A través de PRONAGRO, se brindó apoyo a 12 organizaciones de productores para obtener la certificación orgánica por parte de la empresa Mayacert (Maya Certificaciones).
- Se están logrando avances en el VI Concurso Nacional de Cacao de Excelencia, Edición 2024-2025. Las muestras ganadoras serán enviadas en enero de 2025 para participar en los Premios Cacao de Excelencia 2025, en Roma, Italia.

### **Cadena de Frijol**

Realizada reunión con productores de la cadena de Frijol, en la cual se acordó lo siguiente:

- Iniciar en la producción de semillas como multiplicadores de material genético, para su comercialización a través de DICTA, lo que contribuirá a incrementar los ingresos de los productores.
- Se brindará apoyo logístico a la directiva del comité para diversificar la producción, incorporando cultivos como ajonjolí y cardamomo, a través de dos organizaciones de Francisco Morazán.
- Se determinará el número de familias que se beneficiarán con la mejora de su dieta e ingresos, a través de la entrega de especies frutales y aves de traspatio a los productores de frijol.

### **Reunión de Cadenas Agroalimentarias**

Realizadas 6 reuniones de Cadenas Agroalimentarias en las que se lograron los siguientes acuerdos:

#### **Pitahaya**

Realizada reunión en Regional SAG-Cholulteca, Cholulteca, sostenida con 11 productores (9 hombres y 2 mujeres; 3 jóvenes) en la cual:

- Se identificaron productores, comercializadores y empresas de servicios para la implementación de un acuerdo marco orientado a fomentar la competitividad.
- Se establecieron vínculos entre diversas instituciones con el objetivo de crear un acuerdo marco que impulse el crecimiento de la cadena agroalimentaria de pitahaya, como el caso de Pitahaya y Más y Michoacanas. Además, se conocieron otras empresas, como Agroindustria Nase (AGRONASE) e Inversiones del Trópico Seco (INTROS), así como instituciones de apoyo como: Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), Cooperativa de Productores de Pitahaya del Sur (COOPISUR) y Sur en Acción.
- Se promoverá la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) de fincas, para lo cual se llevará a cabo una capacitación en colaboración con SENASA.

## **Guayaba**

Mediante reunión con 65 productores (54 hombres y 11 mujer; 11 jóvenes) de la cadena de Guayaba se acordó:

- Se convocará a una reunión entre la junta directiva de la Asociación de Productores de Guayaba de Comayagua (APGC) y la Asociación de Agricultores y Agrónomos de Ajuterique (ASAGRAJ) con el fin de alcanzar acuerdos sobre la comercialización.
- Se completará la caracterización de los productores interesados en acceder al financiamiento de COMRURAL, y se llevará a cabo una reunión para definir los posibles proyectos que podrían ser perfilados, ya sea como asociación ASAGRAJ o en colaboración con los productores de la APGC.

## **Frijol**

Realizada reunión con 11 productores (Hombres: 8, Mujeres: 3) de la cadena de Frijol, en la cual se acordó lo siguiente:

- Se impulsará la producción de semillas como material genético para comercializarlas a través de DICTA, incrementando los ingresos de los productores, así mismo, se beneficiará a las familias productoras de frijol mediante la entrega de especies frutales y aves de traspatio para mejorar su dieta e ingresos.

## **Rambután**

Reunión con 39 productores (Hombres: 36, Mujeres: 3) de la cadena de Rambután:

- Se logró, por primera vez, el acercamiento de los comercializadores regionales y locales con la cadena de valor del rambután.
- Se logró la creación de una comisión compuesta por dos representantes de cada organización de productores (un representante de los comercializadores y uno de Rainforest Alliance), con el objetivo de realizar visitas a las municipalidades y promover la creación de centros de acopio.
- Se incorporó a la cadena de valor del rambután a la Cooperativa Agroforestal Las Camelias (COACAL).
- Se proporcionó información sobre PRONAGRO-SAG, la Cadena de Valor del Rambután y el Proyecto de Sistemas Agroforestales Productivos de USAID.
- Se obtuvo la aprobación de los participantes para constituir una organización de productores de rambután.

## **Capacitaciones**

Impartidas 2 capacitaciones a 41 productores y productoras (28 hombres y 13 mujeres) con el objetivo de fortalecerlos en temas tales como:

- Manejo adecuado y mejoramiento de la producción de aguacate en el departamento de Santa Bárbara, brindando capacitaciones en temas de Nutrición de Aguacate y Técnicas de Poda, técnicas para mejorar el cuidado de sus árboles y prevenir la caída prematura de frutas, época adecuada de cosecha y el proceso necesario para garantizar una recolección de calidad, aceptada por el mercado.
- Buenas Prácticas Agrícolas (BPAS), proceso de exportación y cumplimiento de las normas establecidas en el sector de la pitahaya a productores y productoras de Choluteca.

## Asistencia Técnica

Se brindó asistencia técnica a 10 productores y productoras (1 mujer y 9 hombres) para brindar conocimientos teóricos y prácticos en las Cadenas Agroalimentarias de Cacao y Tilapia:

- Asistencia técnica brindada a productores y productoras de cacao en las parcelas establecidas en la estación experimental La Omonita, en la cual se abordaron temas tales como: control de malezas en las parcelas y sus alrededores, poda del cacao, Fertilización del cacao, Deschuponado del cacao, Corte de brotones de madreado, Cosecha de cacao.
- Asistencia técnica brindada en la Aldea El Sifón, Municipio de Ajuterique, Comayagua, en cultivo de tilapia en 3 estanques rústicos. Los temas brindados fueron manejo eficiente de recambios de fondos de los estanques, Aumento de capacidad producida, Limpieza, lavado y desinfección de estanques para un mejor manejo, Conocimiento y buen uso de aplicación de los fertilizantes orgánicos.

## Fortalecimiento agroempresarial A PYMES

Se fortaleció a 2 MYPES del sector Agroempresarial a través de Agronegocios del rubro de Lácteos beneficiando a 2 productores (hombres).

- Con el objetivo de fortalecer la Empresa Lácteos Rio Grande, en aspectos de comercialización, se realizó una reunión en Marcala La Paz, en la que participaron 2 productores hombres, en dicha reunión se tocaron temas relacionados con explorar nuevos mercados nacionales e internacionales, mediante la implementación de diversas herramientas.
- Logrado acuerdo con la Procesadora de Lácteos Castellanos en Cururuji, Danlí el Paraíso con la finalidad de brindarles fortalecimiento en temas de comercialización para buscar nuevos mercados Nacionales, mediante la implementación de nuevas estrategias.

## Diagnostico Situacional de las PYMES

- Constituida una sociedad en la Empresa Inversiones Dos Marías (CAFÉ DOS MARÍAS) conformada por 5 productores, hombres y mujeres. A través de la Unidad de Agronegocios-SAGPRONAGRO, se apoyará a la empresa en la búsqueda de nuevos mercados y en la gestión para cumplir con los requisitos que estos exijan e invitará a la empresa a participar en ferias, ruedas de negocios y foros de inversiones organizados, con el objetivo de que puedan dar a conocer su producto y establecer vínculos con compradores potenciales.

## Talleres de Capacitación Impartido

- Beneficiados 12 productores (hombres) de Argelia Jamastrán, Danlí (El Paraíso) dedicados a la Agricultura y Ganadería en el uso de herramientas tecnológicas (Drone) con el fin de volver más eficiente sus procesos productivos y que generen mayor rentabilidad.

## Plan de Negocio

- Elaborado el Plan de Negocio: "Asociación de Mujeres Avícola la Guadalupe (AMAGU)" en San Esteban, Olancho. participaron 7 personas (Mujeres 7, Jóvenes 3), La empresa avícola cuenta con un equipo de trabajo conformado por 7 personas que se han constituido en una junta directiva; cada uno se han distribuido las actividades en tres áreas; producción, procesos y de comercialización. Se espera mejorar el nivel de vida de 7 mujeres cabeza de familia mediante el engorde de 200 pollos en el periodo

de 60 días y su comercialización local entero fresco durante 4 ciclos de cultivo en el municipio de San Esteban departamento de Olancho durante un año de ejecución del proyecto.

- Elaborado el Plan de Negocio “Asociación de Mujeres Productoras de Ayote (APRAYOTE)” en el Municipio de Yoro (Yoro) con la siembra escalonada de 25 manzanas de calabaza (cucúrbita mochata) con una producción promedio de 18,000 libras de fruto fresco por ciclo de cría de 90 días (4) ciclos por año obteniendo una producción total de 1,800.000 libras. Para la ejecución de todas las fases del proyecto, se gestionará recursos financieros de la banca estatal nacional, aporte de las socias y del fondo del programa nacional agroalimentario. Beneficiando a un total de 25 participantes del Plan de Negocio (25 mujeres).

## FeriSAG

Realizadas 4 Ferias con la participación de 230 expositores entre jóvenes productores, emprendedores y alumnos de Institutos, Escuelas Agrícolas y Universidades:

- **FeriSAG Ojojona** se desarrolló en el Parque Central de Ojojona, Francisco Morazán, con la participación de 54 personas, 25 mujeres y 29 hombres; conformado por 9 jóvenes.
- **FeriSAG Valle de Ángeles** conto con la participación de 30 expositores: entre productores, procesadores y emprendedores del municipio, en donde han logrado comercializar sus productos y crear una relación comercial con compradores potenciales.
- **FeriSAG Choluteca**, con una participación de 85 expositores (32 hombres y 53 mujeres) se desarrolló en la calle frente a la Plaza de la Concha Acústica, Choluteca, Choluteca.
- **FeriSAG Nacional** se desarrolló en el Estacionamiento SAG, Tegucigalpa, M.D.C. contando con la participación de 61 expositores: entre productores, procesadores y emprendedores (22 hombres y 39 mujeres).

## Ejecución financiera:

La ejecución financiera al IV Trimestre fue de 100% del presupuesto vigente, que equivale a L.47,691,315.92. La ejecución física se vio afectada debido al recorte presupuestario realizado por SEFIN, en cumplimiento del artículo 6 del PCM-35-2024, publicado el 15 de noviembre de 2024. Dicho artículo instruye que, debido a las afectaciones ocasionadas por la tormenta SARA, “se gestionen, reorienten y asignen los recursos identificados entre las distintas instituciones del Gobierno”. Asimismo, el comité organizador SAG-PRONAGRO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y RiKolto Internacional tomo la decisión de cancelar el evento programado para el sábado 23 de noviembre del presente año en la ciudad de Comayagua.

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	52,649,038.00	47,691,325.00	47,691,315.92	100.00	9.08
<b>Total</b>	<b>52,649,038.00</b>	<b>47,691,325.00</b>	<b>47,691,315.92</b>	<b>100.00</b>	<b>9.08</b>

Fuente: SIAFI

### 2.4.5 Programa 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país. La ejecución física se muestra a continuación:

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 INFOAGRO

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y pronóstico diario, disponible a la población en general.	Actualización	12	3	3	100%	12	100%
Recursos bibliográficos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de las cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible a la población en general en la biblioteca digital/ página web.	Documento	400	95	95	100%	340	85%
Publicación de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas de los rubros maíz, frijol y sorgo difundida en la página web de la SAG, en beneficio de los productores/as.	Publicación	2	-	-	-	3	150%
Módulo de desempeño de Recursos humanos creado, que facilite la automatización de los servicios a los usuarios de SAG	Cantidad	1	-	-	-	1	100%
Talleres de capacitación de las herramientas ofimáticas impartidas.	Talleres de Capacitación	1	-	-	-	-	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>Dirección en Tecnologías de la Información</b>							
Información agrometeorológica seleccionada.	Reporte	32	7	7	100%	27	84%
Actualizada la plataforma del pronóstico diario del tiempo (días laborables) en la página web.	Actualización	196	44	44	100%	200	102%
Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados	Documento	220	50	50	100%	192	87%
Eventos desarrollados en la socialización de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas.	Evento de Capacitación	5	1	1	100%	5	100%
Flujos automatizados desarrollados	Cantidad	1	-	-	-	-	-
Plan de capacitación elaborado.	Plan	1	-	-	-	-	-

## Descripción de los logros

- Actualizado el reporte Agrometeorológico, el cual tiene como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.
- Actualizada la página web de la SAG, con información agrometeorológica, suelos e información del sector agroalimentario en los enlaces <https://sag.gob.hn/secciones/cpep-sag/cpep-2024/>, <https://infoagro.sag.gob.hn/agrometereologia/>, <https://aguaurbana.sag.gob.hn/category/publicaciones/>, <https://sag.gob.hn/publicaciones/centro-de-documentos-sag/2024/resumen-vi-concurso-nacional-de-cacao-de-calidad-2024/>, <https://proinorte.sag.gob.hn/>, <https://sag.gob.hn/publicaciones/centro-de-documentos-sag/2024/boletines-agroclimaticos-participativos-ciclo-de-postrera-2024/>, alcanzando en octubre 2024 un total de visitas de 14,198 usuarios.
- Recopilación de recursos bibliográficos en temas de cambio climático, boletines de alerta temprana y pronóstico diario.
- Realizado el evento informando al sector sobre la perspectiva para los meses de noviembre 2024 a marzo 2025 que publicó el CENAOS/COPECO y las recomendaciones técnicas para el ciclo de postrera, en el cual se contó con la participación de 127 personas (98 hombres y 32 mujeres), de mayor origen participativo de los municipios de Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca, Danli, Comayagua, Santa Rosa Copan, Juticalpa, Santa Barbara, Intibucá.

## Limitantes de la ejecución física

La ejecución física de las actividades programadas no se logró debido a varios factores. En primer lugar, el personal asignado estuvo involucrado en jornadas de capacitaciones no planificadas, lo que impactó el cumplimiento de las tareas asignadas. Además, la elaboración de los reportes de información agrometeorológica dependía de datos proporcionados por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de COPECO, los cuales únicamente estuvieron disponibles durante el primer semestre del año.

En cuanto al resto de los productos programados, estos no se ejecutaron debido a un recorte presupuestario efectuado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) en cumplimiento del artículo 6 del PCM-35-2024, publicado el 15 de noviembre de 2024. Este artículo establece que, como consecuencia de las afectaciones ocasionadas por la tormenta SARA, “se gestionen, reorienten y asignen los recursos identificados entre las distintas instituciones del Gobierno”.

## Ejecución Financiera

La ejecución financiera fue de 100% (L 15,331,601.84) como se muestra en el cuadro siguiente:

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	20,431,650.00	15,331,611.00	15,331,601.84	100.00	9.16
<b>Total</b>	<b>20,431,650.00</b>	<b>15,331,611.00</b>	<b>15,331,601.84</b>	<b>100.00</b>	<b>9.16</b>

## 2.4.6 Programa 22 – Competitividad Rural

### 2.4.6.1 Proyecto de inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático. La ejecución física se muestra a continuación:

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROINORTE

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Campañas de difusión con información Agroclimática articulada y difundida a los productores y productoras.	Cantidad	2	-	-	-	2	100%
Servicios ecosistémicos brindados actores locales (UMAS), comunidades del área de influencia al proyecto	Servicios	2	2	-	-	-	-
Plataformas regionales de cadenas de valor, establecidas con cadenas de productores y productoras rurales.	Plataforma	10	10	2	20%	2	20%
Becas para el desarrollo de innovación a otros jóvenes.	Beca	15	7	-	-	-	-
Fortalecimientos con servicios especializados (producción agrícola, valor agregado, mercadeo, contabilidad y finanzas) a empresas locales con la participación de jóvenes y mujeres.	Servicios	4	4	-	-	-	-
Planes de negocios con enfoque de cadenas implementados con las organizaciones de productores y productoras rurales.	Estudio	29	29	20	69%	20	69%

**Secretaría de Agricultura y Ganadería**  
**Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)**

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.</b>							
Diagnóstico territorial elaborado a municipios beneficiados por el proyecto.	Diagnóstico	22	22	-	-	-	-
Intercambio de experiencia entre organizaciones de éxito y los usuarios de la plataforma regionales de las cadenas de valor, atendidas por el proyecto.	Evento	1	1	1	100%	1	100%
Fondo concursable de innovación estratégica (innovatesh, ventana de innovación de jóvenes/ remesas) desembolso.	Lempiras	2,000,000	1,800,000	-	-	-	-
Estudio de resiliencia del cambio climático finalizado.	Estudio	1	1	-	-	-	-
Estudio de riesgo climático actualizado.	Estudio	1	1	-	-	-	-
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	72	22	22	100%	72	100%
Asistencia empresarial brindada a organizaciones de productores/as y jóvenes (contable, procesos, marketing, organizacional).	Asistencia Técnica	6	6	-	-	-	-
Planes de inversión formulado (caja rural, empresas locales productivas).	Plan	6	-	-	-	-	-
Caja de ahorro y créditos beneficiadas	Caja Rural	22	11	-	-	-	-
Estudio de análisis de competitividad integral y estrategia sectorial por cadena.	Estudio	1	1	-	-	-	-
Plataforma de cadenas de valor a nivel sectorial multi actores atendidas.	Cantidad	10	10	-	-	-	-
<b>Desarrollo Productivo y Resiliencia</b>							
Caminos rurales rehabilitados	Kilometro	40	40	-	-	-	-
Planes de negocios aprobados por el comité de aprobación de inversiones (CAI).	Plan de Negocio	30	30	27	90%	27	90%
Capacitación técnica, ambiental y climática brindada actores locales.	Capacitaciones	1	-	-	-	-	-
Kit de herramientas adquiridos.	Kit	22	22	21	95%	21	95%
Asistencia técnicas y servicios de apoyo de los Planes de Inversión brindada a organizaciones de productores y productoras.	Asistencia Técnica	30	30	-	-	-	-
Planes de Inversión en Servicios Ecosistémicos formulados.	Plan	3	3	-	-	-	-
Estudio de microcuencas (alta vulnerabilidad y riesgo).	Estudios de Servicios Complementarios	1	-	-	-	-	-
Mesas Agroclimáticas regionales Conformadas (mancomunidades, productores).	Cantidad	3	-	-	100%	3	100%

Fuente: SIAFI

## Descripción de los logros

- Implementados 20 planes de negocios con enfoque de cadenas, beneficiando directamente a un total de 1,147 jefes de hogar de los cuales 708 son hombres y 439 son mujeres.
- Beneficiados 1,184 productores y productoras (698 hombres y 486 mujeres) mediante la aprobación de 22 planes de Fortalecimiento organizacional (PFO), haciendo un total de 72 PFO que han beneficiado a 3,927 productores y productoras (2,356 hombres y 1,571 mujeres) en los departamentos de Atlántida, Colón, Olancho y Yoro, con una inversión total de L 2,580,114.21
- Mediante la firma de memorándum de entendimiento con las 21 municipalidades de intervención del proyecto, se entregaron 21 Kits de herramientas (Azadones, rastrillos, carretas, computadoras, GPS, Dron, entre otros) para el fortalecimiento de las UMAs.
- Identificada y priorizada una microcuenca para el estudio de microcuencas en una comunidad PECH en Santa María del Carbón, municipio de San Esteban, Olancho, los TdR están elaborados y está pendiente de iniciar el proceso de contratación.
- En revisión de FIDA los TdR para la contratación de la empresa encargada para la aceleración de 2 innovaciones tecnológicas por parte del Fondo Concursable de Innovación Estratégica (InnovaTech).
- En relación a las becas se ha determinado la necesidad de talentos a nivel de las organizaciones después de varias discusiones con el FIDA y UAP/SAG, se ha definido el mecanismo de implementación, los cuales se han integrado al Manual Operativo MOP y al Reglamento de Becas
- 27 planes de Negocio PN aprobados por el Comité Técnico del Proyectos CTP y por el Comité de Aprobación de Inversiones CAI, de los cuales 20 se les realizó desembolso.

## Ejecución Financiera

La ejecución financiera del Proyecto fue de 53.03% equivalente a L 61,091,860.48 el cual corresponde a desembolsos realizados a las organizaciones para la implementación de los planes de negocios y gastos operativos del proyecto.

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	12,059,271.00	7,017,703.00	7,017,694.08	100.00	8.92
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	59,975,307.00	56,424,023.00	42,012,853.53	74.46	14,394,530.42
Fuente 21: Crédito Externo OFID	51,753,516.00	51,753,516.00	12,061,312.87	23.31	39,692,203.13
<b>Total</b>	<b>123,788,094.00</b>	<b>115,195,242.00</b>	<b>61,091,860.48</b>	<b>53.03</b>	<b>54,086,742.47</b>

Fuente: SIAFI

La meta financiera y física no se logró debido a que hay procesos iniciados como:

- Contratación de la empresa consultora que formularan los planes de negocio de esto depende la identificación de los caminos rurales a rehabilitar, con la implementación de los planes de negocios.
- En espera de la No Objeción por parte del ente financiador (FIDA) para la contratación de la empresa que realizara los diagnósticos territoriales y la asistencia.

- Se realizaron los ajustes conforme a las sugerencias emitidas durante la misión de supervisión de FIDA con el objetivo de alcanzar una versión más afinada de los TdR “Estudio de Análisis de Competitividad Integral y Estrategia Sectorial por Cadena”.
- Se publicó el proceso de la contratación de un consultor para el fortalecimiento de la mesa agroclimática y la difusión de la información.
- En proceso de aprobación el plan de trabajo presentado por CIAT para realizar el estudio de análisis de competitividad
- En proceso de elaboración los TdR para el Estudio de Resiliencia Climática con el apoyo del especialista ambiental de FIDA.
- En la aprobación del plan de aceleración algunas metas físicas se realizarán en el año 2025.

#### 2.4.6.2 Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad Pro-Occidente 22.14

El proyecto objetivo de incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria. La zona de intervención del Proyecto son los 88 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz.

#### Ejecución Física

##### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROOCCIDENTE

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Planes de inversión con adopción de tecnologías CI (Climáticamente inteligentes) implementados, en beneficio de productores (as) organizados.	Plan de inversión	50	25	13	26%	13	26%
Planes de manejo de microcuencas implementados en la zona de intervención, Lempira (San Marcos de Caiquin, Erandique, Gualcinse) La Paz (Guajiquiro, Marcala, Opatoro) Intibucá (Intibucá, Yamaranguila	Plan de Manejo de Microcuencas	5	5	-	-	-	-
Desembolso para créditos y garantías otorgados a productores/as rurales a través de BANHPROVI.	Lempira	50,000,000	10,000,000	-	-	-	-
Sistema de Monitoreo y Evaluación con el registro de las actividades productivas de los productores(as), implementado en el corredor seco.	Sistema de Información	1	1	-	-	-	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>Fortalecimiento del Desarrollo Productivo</b>							
Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto.	Plan de Inversión	77	27	52	193%	77	100%
Planes de manejo de microcuencas aprobados por el Instituto Conservación Forestal ICF.	Plan de Manejos de Microcuencas	5	5	-	-	-	-
Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición.	Asistencia Técnica	361	291	331	114%	361	100%

Acceso a Financiamiento							
Monto de créditos y garantías transferido a BANHPROVI.	Lempira	100,000,000	60,000,000	100,000,000	167%	100,000,000	100%
Sistema de Monitoreo y Evaluación, versión BETA (La primera Versión completa) evaluado.	Sistema de Información	1	1	-	-	-	-

### Descripción de los logros:

- Beneficiados 398 productores y productoras (286 hombres y 112 mujeres), mediante la implementación de 13 planes de inversión con adopción de Tecnologías Climáticamente Inteligentes (TCI) en el área de influencia del proyecto (Santa Bárbara, Ocotepeque, La Paz, Lempira, Intibucá, Copán), con una inversión de L20,784,055.44.
- Aprobados 52 planes de inversión por parte del equipo técnico del proyecto, se espera beneficiar a 1,281 productores y productoras (806 hombres y 475 mujeres), el beneficio incluye la adopción de Tecnologías Climáticamente Inteligentes (TCI) en diversas cadenas productivas, como café, hortalizas, granos básicos, ganadería, frutales (plátano y papaya), apicultura y agro transformación. Las inversiones se implementarán en 52 grupos productivos ubicados en 26 municipios dentro del área de influencia del proyecto. Identificados a nivel de propuesta para aprobación de plan
- Atendidos 1,771 productores y productoras (1,317 hombres y 454 mujeres) a través de asistencia técnica en producción, mercadeo, finanzas, educación financiera, requisitos y condiciones para obtención de crédito, en las cadenas de café, granos básicos, hortalizas, frutales, ganadería, especies menores, apicultura y agro transformación.
- Evaluadas y priorizadas 5 mancomunidades para firma de convenios y el fortalecimiento de mancomunidades, manejo y protección de microcuencas, siendo estas las siguientes:
  - Mancomunidad de la Cuenca del Río San Juan, MANCURISJ (Intibucá)
  - Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz MAMSURPAZ (La Paz)
  - Mancomunidad de Municipios Lencas de la Sierra de La Paz MAMLESIP (La Paz)
  - Mancomunidad COLOSUCA (Lempira)
  - Mancomunidad CAFEG (Lempira)
- Identificadas tres mancomunidades para la dotación de equipos y provisión de asistencia técnica con presencia local, siendo las siguientes:
  - Mancomunidad de la Cuenca del Río San Juan, MANCURISJ (Intibucá)
  - Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz MAMSURPAZ (La Paz)
  - Mancomunidad de CAFEG (Lempira)
- Seis microcuencas priorizadas con 10,557.29 hectáreas bajo planes de manejo a ser implementados con apoyo del proyecto, de las cuales 3 cuentan con planes de manejo elaborado y presentado al Instituto de Conservación Forestal (ICF), para su aprobación.
- Transferidos L100,230,464.00 de fondos a la nueva cuenta de administración de fondos de BANHPROVI para iniciar la implementación de colocación de fondos.
- Se han identificado 8 intermediarias financieras con acción en el área de influencia del proyecto, con quienes se estará trabajando para intermediar los fondos SAG BANHPROVI, entre ellas están: Cooperativa Chorotega, Central de Cajas UNICEMOCH, Caja Rural CAMACUL, BANCOMSA, Cooperativa COMLESUL, Cooperativa CAFESMO, Banco LAFISE y Banco de Occidente.

- Se han realizado reuniones de socialización con la AHIBA, Proyecto Aldea Global, PAG en seguimiento a alianzas estratégicas para colocación de los productos financieros.
- Seguimiento al proceso de diseño y desarrollo de la tarjeta agrícola con Banco Atlántida, donde se ha identificado un potencial de 2,700 productores, que pueden hacer uso de este producto.
- En cuanto al Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E-SAG) Se realizó una reunión virtual con especialistas del BID para analizar los TdR del sistema, revisar los términos propuestos y establecer una ruta de trabajo conjunta con los especialistas del BID previo al lanzamiento del proceso.

#### Avance en los contratos

- Contratación de las etapas IB y II. En la etapa IB se han elaborado TdR para implementar la etapa; de conformidad con la nueva estrategia de implementación esta será realizada por la misma firma sub implementadora de la etapa IA mediante contratación directa. Los mismos TdR sirven de base para el lanzamiento, contratación y adjudicación de la etapa II.
- Contratación de fondos de donación para el proyecto: Adopción de Tecnologías Climáticamente Inteligentes en MIPYMES Agrícolas Lideradas por Mujeres, por un monto de \$1.4 MM.
- Se encuentra en proceso de contratación la auditoría financiera 2024

#### Ejecución Financiera

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos**  
**Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PROOCCIDENTE) (En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo ICO	29,598,300.00	41,048,300.00	-	0.00	41,048,300.00
Fuente 21: Crédito Externo BID	186,952,870.00	275,733,334.00	235,104,633.60	85.27	40,628,700.40
<b>Total</b>	<b>216,551,170.00</b>	<b>316,781,634.00</b>	<b>235,104,633.60</b>	<b>74.22</b>	<b>81,677,000.40</b>

Fuente: SIAFI

#### Limitantes

- Los Planes de Adopción de Tecnologías CI y los Planes de Manejo de Microcuencas no se cumplió debido a que se está en proceso previo de aprobación por el ICF. Se validaron 6 microcuencas que estarán siendo intervenidas en 2025 y se tienen los seis planes de manejo en proceso de aprobación en el ICF. Se espera la firma de un convenio entre la SAG e ICF lo que permitirá inversiones tempranas en microcuencas.
- Hasta el mes de diciembre 2024 pudieron ser transferidos los fondos para iniciar implementación del componente No 2, durante el año se mantuvieron reuniones para definir el proceso de devolución, enmiendas, autorizaciones etc.
- Completar la Unidad Ejecutora del Proyecto, la cual se encuentra en proceso de evaluación.
- La comisión completo el proceso de elaboración de TdR del Sistema de Monitoreo y Evaluación hasta en el IV trimestre 2024, así mismo, está en proceso de revisión por los especialistas del Banco financiador.

### 2.4.6.3 Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) 22.15

Con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados/as para incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras. El área de influencia será en los departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

El ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA- 6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020. La ejecución física se muestra en el siguiente cuadro:

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 COMRURAL II

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Planes de Negocios implementados beneficiando Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Plan de Negocio	112	30	7	23%	17	15%
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	112	40	9	23%	17	15%
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales							
Planes de Negocios orientados a la Agricultura de Subsistencia aprobados en acuerdos de subvención.	Plan de Negocio	90	30	-	-	-	-
Planes de negocios orientados a la Agricultura en transición aprobados por Comité Directivo.	Plan de Negocio	20	-	7	-	15	75%
Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Asistencia Técnica	102	52	82	158%	102	100%
Planes negocios orientados a la Agricultura Comercial aprobados en acuerdos de subvención.	Plan de Negocio	2	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

#### Avances

- A través de la Ventana 1 “Agricultura de subsistencia” se está a la espera de la finalización del proceso de contratación de la Firma Consultora Implementadora (FCI) de la subregión Sur para iniciar implementación en enero-febrero de 2025; así mismo se continua con el proceso de solicitud de propuesta a otra FCI para la subregión Occidente en vista que la empresa seleccionada no cumplió con uno de los requisitos para su contratación.

A través de esta ventana se espera beneficiar a 7,700, de los cuales 3,350 corresponden a la Sub-Región Sur, 3350 Sub Región Occidente y 1,000 personas, a la Sub Región Atlántica. Se cuenta con una base de datos de 297 Grupos de Productores identificadas.

- Realizados 4 procesos de adquisiciones en el marco de los Componentes I y III del proyecto, de los cuales 8 fueron adjudicados exitosamente, (estos incluyen 4 consultorías individuales, 2 procesos de adquisición de servicios de No consultoría, 2 proceso de bienes).
- A través de la Ventana 2 Agricultura en Transición se recibieron un total de 244 perfiles de negocios (PNs), resultado de 11 convocatorias públicas. Del total de PNs aprobados, a la fecha se cuenta con 83 Planes de negocios (PNs) ratificados, que beneficiaran a 8,068 beneficiarios.
- La Ventana 3 Agricultura Comercial: recibieron 13 Notas conceptuales de negocios que representan un TNR estimado de L.256.25 MM (USD 10.26 MM) y 3,008 familias. De las cuales 5 PNs están en proceso de evaluación y que representan un estimado de TNR de L. 103.52 MM (USD 4.15 MM) y 1,404 beneficiarios (40% arriba de la meta). Se tenía previsto la ratificación de 3 PNs que representan un estimado de TNR de L. 67.86 MM (USD2.7 MM) y 1,088 beneficiarios en el Comité de Dirección del 05 de diciembre 2024, sin embargo, fueron pospuestos para un CD posterior.
- Implementado el plan de aceleración del proyecto en seguimiento a las actividades pendientes por componente actualizado y sistematizado en Power BI.
- Restructurado el Marco de Resultados del Proyecto, logrando contar con fichas por cada uno de los indicadores del proyecto.
- Revisadas y aprobadas solicitudes de desembolsos de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs) en el marco del contrato tripartito con Proveedores de Desarrollo Empresarial (PSDEs).
- Realizado Taller del Plan Operativo Anual (POA) 2025 en la Regional Centro Sur Oriente y la Regional de Santa Rosa de Copán.
- Se realizó Comité Directivo (CD) 10 en el mes de octubre y CD 11 en diciembre 2024, ratificando 7 Planes de Negocios (PNs) que representan un estimado de Transferencias no Rembolsables (TNR) de L. 59.2 MM y que beneficiaran alrededor de 676 familias.

## Ejecución Financiera

Como se puede observar en el cuadro siguiente la ejecución financiera al IV trimestre fue de 64.26% equivalente a L 142,003,992.61.

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto Integrado la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL II) (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM	147,358,209.00	220,978,549.00	142,003,992.61	64.26	78,974,556.39
<b>Total</b>	<b>147,358,209.00</b>	<b>220,978,549.00</b>	<b>142,003,992.61</b>	<b>64.26</b>	<b>78,974,556.39</b>

Fuente: SIAFI

## Limitantes

La ejecución física y financiera no se logró en vista a que no se ha contratado la Firma Consultora Implementadora (FCI), para ventana 1 Agricultura en Subsistencia para la formulación e implementación de los PNs y la Ventana 3 Agricultura comercial aún no se encuentran en implementación.

### 2.4.6.4 Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III) 22.16

El proyecto contribuirá el acceso a mercados, la adopción a prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, la creación de empleos para apoyar a beneficiarios del proyecto en cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas; y en caso de una crisis o emergencia elegible responder efectivamente a ello. El ComRural III apoya a las iniciativas agroindustriales competitivas, innovadoras, con resiliencia climática y nutricionalmente inteligentes (subproyectos o planes de negocios) en cadenas de valor agroalimentarias prioritarias bajo un modelo de alianzas productivas. Este proyecto se focaliza en 17 Departamentos de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Valle y Yoro cubriendo casi la totalidad del territorio nacional. Y el Financiamiento Adicional se enfoca exclusivamente en el Departamento de Gracias a Dios.

## Ejecución Física

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 COMRURAL III

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	20	20	-	-	-	-
Asistencias Técnicas brindadas a grupos / Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs) y comunidades locales.	Asistencias Técnicas	10	-	-	-	-	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>Agricultura de subsistencia: Financiar vínculos productivos a través de grupos informales de productores.</b>							
Planes negocios en Agricultura de Subsistencia aprobados.	Plan de Negocio	1	1	-	-	-	-
Planes negocios en Agricultura en transición aprobados.	Plan de Negocio	20	10	-	-	-	-
Planes negocios en Apoyo a la Agricultura Comercial aprobados.	Asistencia Técnica	1	1	-	-	-	-
Planes negocios Agro-logísticos y agropecuarios aprobados.	Plan de Negocio	1	1	-	-	-	-
Convenio firmado con la Firma Consultora Implementadora (FCI) para la ejecución de los subproyectos agrocosteros y Planes de Nutrición e Higiene en la zona de la Moskitia, Costa Atlántica.	Convenio	1	1	-	-	-	-
Convenio firmado entre el programa mundial de alimentos (PMA) y la SAG, en la prestación de los servicios de asistencias técnicas.	Convenio	1	1	-	-	-	-

## Avances

A través del componente 1. Mejoramiento de la Competitividad y la Resiliencia en las Cadenas de Valor Priorizadas se realizan las acciones siguientes

- **Ventana 1: Agricultura de subsistencia:** *Financiar vínculos productivos a través de grupos informales de productores;* a la fecha de la misión, la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) se encuentra en proceso de elaboración de los Términos de Referencia (TdRs) para las cuatro firmas implementadoras de la Región Occidental y Centro Occidental (6 departamentos, Región Noroccidental y Nororiental (5 departamentos), Región Centro Oriental (2 departamentos) y Región Centro Sur (3 departamentos).
- **Ventana 2: Agricultura en Transición:** Se lanzó una convocatoria pública abierta para presentar perfiles de negocio para OPRs ubicadas en los departamentos de Olancho, Yoro y Valle. Se recibieron 34 perfiles de negocio con 2009 beneficiarios potenciales en las cadenas de valor de ganadería (39%), granos básicos (24%), cafés especiales (18%), especies menores (8%), cacao fino (7%) y sal (4%), así mismo, se lanzó una nueva convocatoria pública con cobertura a nivel nacional para cubrir 16 departamentos del país. La apertura de esta fue el pasado 28 de noviembre de 2024 y cierra el 10 de enero de 2025
- **Ventana 3: Agricultura Comercial.** Esta ventana tiene un monto total de \$ 15,000,000 (aproximadamente L. 375,000,000), y se espera beneficiar a 5,000 productores directos y 16,500 productores indirectos, está dirigida a empresas formales de mediano tamaño, denominadas Empresas Ancla, que operen en sectores agropecuarios, agroindustriales o de comercialización agroindustrial que estén activamente involucrados en la cadena productiva agroalimentaria. Se lanzó una nueva convocatoria pública con cobertura a nivel nacional para cubrir 16 departamentos del país. La apertura de esta fue el pasado 28 de noviembre de 2024 y cierra el 10 de enero de 2025.
- **En cuanto a la Ventana 4.** Financiar servicios Agro-logísticos y agropecuarios complementarios a pequeña escala, se encuentran en proceso de revisión en conjunto con el BM sobre la definición del concepto que orientara al fortalecimiento de las cadenas locales de suministro de alimentos, promoviendo la seguridad alimentaria y la inclusión de las comunidades en las zonas de intervención;

En el componente II Fortalecimiento Institucional para Mejorar el Entorno de los Agronegocios:

- Se ha continuado en reuniones mensuales en Comité Habilitador de Ambiente de Agronegocios (CHAA) y en misión de implementación el avance que se ha tenido por las instituciones de las cuales presentaron sus propuestas de inversión de la siguiente manera:
  - AMHON: Propone una inversión de US\$ 500,000 para servicios de extensión a Grupos de Productores en 60 municipios a través de mancomunidades. Las inversiones incluyen equipo de cómputo y motocicletas para fortalecer la unidad de desarrollo económico a nivel territorial.
  - Instituto de la Propiedad (IP): Propone una inversión de US\$ 400,000 para aumentar la cobertura de los servicios catastrales, que actualmente cubren Tegucigalpa (Centro-Sur), San Pedro Sula (Noroccidente) y Comayagua. Las inversiones incluyen equipos de geolocalización, vehículos y recursos humanos.
  - ARSA: Propone una inversión de US\$ 1.7 millones enfocada a la construcción del Laboratorio de Calidad de Producto.

- SERNA: Propone una inversión de US\$ 1.0 millones para la digitalización de expedientes del Sistema de Licencias Ambientales.
- SENASA: Propone una inversión de US\$ 1.5 millones para el fortalecimiento del Laboratorio LANAR, incluyendo obras y equipamiento logístico.
- SENPRENDE: Propone una inversión de US\$ 900,000 para equipamiento de dos centros comunitarios de innovación, tentativamente ubicados en Comayagua, Valle y Ocotepeque.

### El componente III. Apoyo a la Gestión del Proyecto

- En proceso de actualización del MOP del proyecto, se está incorporando ajustes realizados a ComRural III.
- Seguimiento a licencias ambientales para los Planes de negocios de ComRural III.
- En proceso de actualización de POA y PAC 2025 para su aprobación, Contratación de Consultor para la Evaluación de Impacto.
- Instrumentos Ambientales Actualizados para el Proyecto, en Proceso de restructuración de Marco de Resultados, en proceso de Elaboración de Fichas Indicadores de ComRural III.

### Componente V. Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Inclusión Productiva en la Moskitia y Costa Atlántica de Honduras.

- Reuniones realizadas en seguimiento a la discusión de los estándares ambientales y sociales aplicados a las actividades que implementara el Programa Mundial de Alimentos (PMA), para proceder a la firma del Convenio.
- En Proceso de Contratación de la Firma Implementadora en la región de la Moskitia, asegurando que los requisitos técnicos y operativos sean claros y alineados con los objetivos del proyecto.
- Fortalecimiento de Alianzas Estratégicas: Colaboración con entidades locales para optimizar la implementación de las actividades del proyecto y maximizar el impacto en las comunidades beneficiarias.

### Ejecución Financiera

La ejecución financiera fue de 1.55% equivalente a L2,027,694.70, no se logró el 100% debido a que aún no se encuentran en implementación las Ventanas 1 - 4, ya que aún no se ha contratado la Firma Consultora Implementadora (FCI), se encuentran en revisión las propuestas de perfiles y notas conceptuales de Planes de negocio y la Firma de convenio con PMA y SEDESOL.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos COMRURAL III (En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM	195,619,582.00	121,999,242.00	2,027,694.70	1.66	119,971,547.30
Fuente 22: Donación Externas AIF	53,125,000.00	8,500,000.00	-	0.00	8,500,000.00
<b>Total</b>	<b>248,744,582.00</b>	<b>130,499,242.00</b>	<b>2,027,694.70</b>	<b>1.55</b>	<b>128,471,547.30</b>

Fuente: SIAFI

## 2.4.7 Programa de Seguridad Alimentaria – 23.00

### 2.4.7.1 Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional – 23 – A/O 02

Garantizar la implementación de acciones de la Política y Estrategia Nacional de Seguridad alimentaria y Nutricional para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de la población.

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)</b>							
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) funcionando para acciones estratégicas de vigilancia y promoción de la SAN a nivel nacional.	Informe	2	1	-	-	1	50%
Instituciones gubernamentales incorporando acciones de la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional (SAN).	Informe	2	1	1	100%	2	100%
Diplomados en SAN desarrollados.	Informe	1	1	1	100%	1	100%
Seguimiento al diseño y/o ejecución de Censo Nacional Agropecuario y Encuesta Nacional de Demografía y Salud.	Informe	1	1	1	100%	1	100%
Seguimiento a la Implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISAN.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
Informe del gasto público e inversión en SAN o Nutrición elaborado	Informe	1	-	-	-	-	-
Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de dialogo y coordinación (Golfo de Fonseca, Valles de Olancho, Comayagua, Región Lempa) y reactivadas (Valle de Sula, Región Valle de Aguan, Región 11 el Paraíso, Región 03 Santa Rosa de Copan).	Informe	11	3	3	100%	9	82%
Metodología de la incorporación de la SAN en la planificación estratégica y operativa aplicada en las instituciones.	Informe	1	1	1	100%	1	100%
Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISESAN), operando.	Informe	2	1	1	100%	2	100%
Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN Desarrollo Local.	Informe	2	1	1	100%	2	100%
Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras.	Informe	1	-	-	-	1	100%
Coordinación de la Ejecución del IX Censo de Talla en Escolares.	Informe	1	-	-	-	-	-
Proceso de actualización de la Política SAN y sus planes de acción	Informe	2	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

### **Descripción de logros:**

- Iniciado el levantamiento de indicadores de seguridad alimentaria en todo el país con el apoyo de la unidad de soporte global de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) Unidad de Soporte Global de la CIF (USG), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organizaciones no Gubernamentales ONG que trabajan el tema Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), Mancomunidades gobiernos locales.
- Organizado y desarrollado el taller de actualización de la Política Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su plan de acción PAR-POLSAN, el cual fue financiado por el Sistema de Integración de Centroamérica (SICA) y organizado por UTSAN.
- Finalizado el proceso de actualización de las guías alimentarias de Honduras la cual está en proceso de revisión final por el Instituto de nutrición de Centroamérica y Panamá INCAP.
- Aprobado el segundo diplomado de lactancia materna por parte de la UNAH, el cual comenzará en el primer trimestre del 2025.
- Aprobado por la Delegación de la Unión Europea (DUE) el Informe del tramo Variable de EUROSAN Del mediante el cual se autorizaron los desembolsos por casi tres millones de euros a las instituciones ejecutoras.
- Finalizado y clausurado el diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional realizado en conjunto con la Mancomunidad Trinacional Rio Lempa, Fundación Estatal, Estancia y Bienestar Social (CSAI) y la Secretaría de Salud.
- Finalizada la guía de gestión territorial para la planificación territorial municipal en SAN la cual está en proceso de aprobación por la secretaria de gobernación justicia y descentralización, proceso construido con el apoyo del programa first de FAO y Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).
- Participación junto a Rikolto y El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) en Taller / Conversatorio de derechos humanos y sistemas alimentarios perspectivas desde las comunidades en seguimiento intervención en SAN solicitada por la autoridad superior en el departamento de la Paz.

### **Limitantes de la ejecución física**

La ejecución física no se cumplió en vista que aún se está a la espera del decreto PCM para la reactivación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria (SINASAN), el cual fue remitido a la Secretaría de la Presidencia SDP, así como el PCM para la elaboración del Censo de Talla en Escolares en el cual se instruye a todas las instituciones responsables a realizar dicho censo.

## Ejecución Financiera

La ejecución financiera fue de 100% (L.10,206,776.17) del presupuesto vigente, como se puede observar en el siguiente cuadro:

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	15,868,200.00	10,206,785.00	10,206,776.17	100.00	8.83
<b>Total</b>	<b>15,868,200.00</b>	<b>10,206,785.00</b>	<b>10,206,776.17</b>	<b>100.00</b>	<b>8.83</b>

Fuente: SIAFI

### 2.4.7.2 Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores – 23.00-002

El Programa Bono Cafetalero, con el objetivo de mejorar los ingresos de las familias cafetaleras pequeñas y medianas, mediante el mantenimiento de la productividad del área cultivada de café, mediante el apoyo a la fertilización de las fincas y el acompañamiento con asistencia técnica y capacitación.

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Café

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Bono Cafetalero entregado a pequeños y medianos productores y productoras de café	Bono	90,000	84,000	84,000	100%	90,000	100%
Kit bono cafetalero comprados.	Kit	90,000	-	-	-	97,549	108%
Capacitación brindada a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Evento de Capacitación	500	200	-	-	500	100%
Diagnósticos productivos en fincas de Pequeños y Medianos Productores y productoras de café.	Finca	2,500	2,000	2,000	100%	2,500	100%
Kit para estructura de vivero de café entregado a Alcaldías y organizaciones de productores (malla, alambre, bolsa).	Kit	100	-	-	-	185	185%
Kit de podas para café entregado a grupos de productores y productoras (motosierra, bomba motorizada, corta seto, chapeadora).	Kit	1000	-	27	-	1,000	100%
Kit para secadora solar de café entregado a productores y productoras. (tubería, plástico UV, tornillos, zaran, varilla).	Kit	300	-	-	-	300	100%

Fuente: SIAFI

### Descripción de los logros:

- Entregados 84,000 bonos cafetaleros a pequeños productores y productoras, beneficiando a 12,530 mujeres, 54,889 hombres y 16,581 que no se identificaron en los listados de beneficiarios (No Definidos, en los 15 departamentos productores de café, logrado impactar a una amplia comunidad de agricultores, mejorando sus condiciones de producción y sostenibilidad.
- Construido y equipado viveros con la entrega de 200 quintales de semillas y 185 kits de semilleros, garantizando así el acceso a recursos esenciales para la producción agrícola.
- Más de 10,000 beneficiarios han participado en la renovación de alrededor de 7,000 manzanas de cultivo de café, mejorando la calidad y sostenibilidad de la producción cafetalera “Renovando sin dejar de producir”.
- Se beneficiaron 572 microempresarios mediante la facilitación de su formalización, asesoría legal para registros de marca y vinculación en ferias nacionales e internacionales, lo que ha fortalecido su presencia en el mercado.
- Se ha establecido una red de 85 técnicos agrícolas que garantizan la entrega efectiva de beneficios a los productores de café, así como su formación en las mejores prácticas agrícolas.

### Ejecución Financiera

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Bono Cafetalero (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-
<b>Total</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

Fuente: SIAFI

#### 2.4.7.3 Bono Tecnológico Productivo

El BTP brinda un incentivo económico al pequeño productor(a) de granos básicos, que beneficia particularmente aquellos pequeños productores de subsistencia que no tienen acceso al financiamiento bancario, ni a la asistencia técnica. Para este IV Trimestre se presentan la siguiente ejecución física y financiera.

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Tecnológico Productivo (BTP)

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	536,971	411,971	279,361	68%	536,971	100%
Quintales de fertilizantes de formula comprados.	Quintal	790,000	550,000	550,000	100%	790,000	100%

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores.	Asistencia Técnica	4,000	1,200	1,249	104%	4,030	101%
Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	188,000	143,000	137,200	96%	188,000	100%
Kits fitosanitarios entregados (fungicida, insecticida, foliar).	Kit	407,067	274,567	274,567	84%	450,567	111%
Plántulas de frutales entregados.	Plántula	80,000	30,000	-	-	52,530	66%

Fuente: SIAFI

### Descripción de los logros

- Entregados 279,361 Bonos Tecnológicos Productivos, los cuales beneficiaron a 145,268 mujeres y 134,093 hombres, brindando insumos agrícolas como semilla de frijol, maíz, sorgo, fertilizantes, entre otros elementos necesarios para mejorar la productividad del sector agrícola. Cabe recalcar que mediante la entrega del BTP, para el IV Trimestre del 2024 se beneficiaron 49,131 productores (as) pertenecientes a grupos étnicos.
- Apoyados los pequeños productores (as) de granos básicos con la implementación en sus parcelas de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) mediante las 1,249 asistencias técnicas brindadas por los extensionistas del BTP, beneficiando a 637 mujeres y 612 hombres.

### Ejecución Financiera

Para el IV Trimestre la ejecución financiera fue de 100% del presupuesto vigente.

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Bono Tecnológico Productivo (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
<b>Total</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

Fuente: SIAFI

### 2.4.7.4 Bono Ganadero

Con el fin de optimizar los hatos ganaderos mediante el mejoramiento genético de alta calidad y alimentación del ganado de carne y leche, para el incremento de la producción y productividad y generar valor agregado a las unidades de producción de leche de pequeños productores organizados para el acceso a nuevos mercados y generación de ingresos.

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Ganadero

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Bono de semilla de pasto entregado a pequeños productores y productoras de ganado.	Bono	15,000	10,000	10,000	100%	15,000	100%
Aves ponedoras para distribución compradas	Cantidad	50,000	30,000	50,000	167%	50,000	100%
Bono de aves ponedoras a pequeños productores y productoras avícolas	Bono	2,000	1,200	2,000	167%	2,000	100%
Escuelas de Campo Formadas con Pequeños Productores y Productoras de Ganado.	Cantidad	221	171	171	100%	221	100%
Equipo para la industrialización (descremadoras, pasteurizadoras, pilas de cuajo etc.) adquirido.	Cantidad	12	-	-	-	-	-
Material genético (Pajillas) para inseminación adquirido.	Cantidad	1,000	800	1,000	125%	1,000	100%
Vaquillas inseminadas de pequeños productores y productoras de ganado	Cabeza de Ganado	1,000	800	1,000	125%	1,000	100%
Pie de cría adquirido para distribución Comprados	Cantidad	400	200	-	-	-	-
Equipamiento a Plantas procesadoras de lácteos (descremadoras, pasteurizadoras, pilas de cuajo etc.) entregadas a organizaciones de productores y productoras	Cantidad	12	12	-	-	-	-
Paquetes de 4 kilos de semilla de pasto comprados.	Paquete	15,000	10,000	10,000	100%	15,000	100%
Asistencia técnica brindada a Productores y productoras de ganado.	Asistencia Técnica	1,000	500	500	100%	1,000	100%
Bono de pie de cría (cerdo) a pequeños productores y productoras de cerdos.	Bono	400	200	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

#### Descripción de los logros

- Entregados 10,000 bonos de Semilla de Pasto, beneficiando la misma cantidad de pequeños productores y productoras, brindando insumos agrícolas como semilla de frijol, maíz, sorgo, fertilizantes, entre otros elementos necesarios para mejorar la productividad del sector agrícola.
- Entregados 2,000 bonos de aves ponedoras, beneficiados a familias en diferentes zonas rurales, esta acción se vinculó a las mujeres amas de casa y pequeños productores avícolas a nivel nacional.

- Brindadas 500 asistencias técnicas, beneficiando a pequeños productores y productoras de ganado.
- Formadas 171 escuelas de campo beneficiando a pequeños productores y productoras de ganado en los Departamentos de: Comayagua, Colon, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá y La Paz, formando en total 221 ECA.
- En implementación el primer programa de mejoramiento genético con Inseminación artificial. Donde se han importado 15,000 dosis de semen con alto valor genético de 5 razas (Brahman, Gyr, Braunvieh, Pardo Suizo y Simmenthal) promoviendo la producción doble propósito Carne (Ternero macho al destete) Leche (Razas de alta producción lechera), logrando inseminar 1,000 Vaquillas de pequeños productores y productoras de ganado

### Ejecución Financiera

Al IV Trimestre la ejecución financiera fue de 100% del presupuesto vigente, el cual equivale a L.50,000,000.00.

#### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Bono Ganadero (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
<b>Total</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

Fuente: SIAFI

#### 2.4.7.5 Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

El proyecto se ejecuta con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras, como ser los municipios de La Venta y Curaren, departamento de Francisco Morazán; Intibucá, departamento de Intibucá; La Paz, departamento de La Paz; Nacaome, departamento de Valle.

### Ejecución Física

#### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Seguridad Hídrica

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para las comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, La Paz y Curarén.	Porcentaje	80	48	-	-	-	-
Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizado para comunidades priorizadas en los municipios de Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz.	Porcentaje	80	48	-	-	-	-

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Seguridad Hídrica

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Capacitaciones en Gestión Integral Recursos Hídricos (GIRH) (Asistencia Técnica implementada Etapa 1) brindada en los municipios de Intibucá, La Paz, La Venta, y Curarén.	Capacitaciones	4	4	4	100%	4	100%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la Gobernanza y Gestión de los Recursos Hídricos</b>							
Plan de capacitación elaborado	Plan	1	1	1	100%	1	100%
Diseño de viveros comunitarios y municipales elaborados	Diseño	1	1	-	-	-	-
Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizados: Manazapa y Las Mercedes, La Venta, La Paz y Curarén, con No Objeción del Banco Mundial.	Diseño	2	2	-	-	-	-
Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS): Intibucá, La Venta, Curarén y La Paz actualizados con la no objeción del Banco Mundial.	Estudio	2	2	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

#### Principales Logros:

- Brindadas 4 capacitaciones en temas relacionados con la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), beneficiando a 108 productores (75 Hombres; 33 Mujeres y 10 jóvenes), en el Departamento de Francisco Morazán, Municipios de La Venta y Curaren.
- Convenios Institucionales suscritos:
  - El convenio con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), firmado por la Ministra SAG, ha sido enviado a la SERNA y actualmente está a la espera de la firma por parte del Ministro. Este convenio tiene como objetivo principal asegurar una eficiente coordinación y colaboración entre ambas instituciones para alcanzar, de manera efectiva y oportuna, los objetivos, resultados e indicadores del Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
  - Convenio tripartito entre SAG-COPECO-SERNA, firmado por la Máxima Autoridad de SAG y COPECO, y remitido a SERNA para firma del Ministro, dicho convenio tiene como propósito asegurar una eficiente coordinación y colaboración entre la SAG, COPECO y SERNA para el logro efectivo y oportuno de los objetivo, resultados e indicadores del Proyecto de Seguridad

Hídrica en el Corredor Seco de Honduras, a través de las acciones y actividades a desarrollarse colaborativamente.

- Obtenida la No Objeción del Manual Operativo del Proyecto (MOP) por parte del Banco Mundial.

El Proyecto ha programado la contratación de empresas consultoras para lo siguiente:

- Asistencia Técnica Etapa 1. se encuentra en proceso de negociación con las personas adjudicadas para la contratación de las consultorías.
- Revisión y actualización de la Estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS). se completó la revisión de las evaluaciones de expresión de interés; el informe de evaluación y lista corta se encuentra en firma de la comisión evaluadora.
- Actualización de Diseños de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS), se realizó la apertura de las Propuesta Financiera de las empresas.

### Ejecución Financiera

Al IV Trimestre del 2024 la ejecución financiera fue de 11.90%, que corresponde a gastos operativos. La baja ejecución física y financiera se debe a la reestructuración del proyecto que fue aprobada por el BM en el mes de julio del 2024, esto provoco cambios en alcance y procesos tardíos de contratación. Cabe mencionar que durante el proceso de selección para la contratación de la empresa que desarrollara los diseños fue declarado desierto, iniciando un nuevo proceso en julio de 2024, durante el proceso de selección, una de las empresas participantes solicito aclaraciones sobre aspectos técnicos y legales sobre el proceso de selección, ocasionando atrasos. A la fecha el nuevo Proceso ya tiene Evaluada las expresiones de interés; el Informe de Evaluación y Lista Corta se encuentra en firma de la Comisión Evaluadora, mientras continúa el proceso de Evaluación de la Propuesta Financiera.

La baja ejecución

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras**  
**(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM	220,718,928.00	128,718,928.00	15,314,833.09	11.90	113,404,094.91
<b>Total</b>	<b>220,718,928.00</b>	<b>128,718,928.00</b>	<b>15,314,833.09</b>	<b>11.90</b>	<b>113,404,094.91</b>

Fuente: SIAFI

#### 2.4.7.6 Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

El Proyecto tiene por objetivo de desarrollo mejorar la calidad y eficiencia de prestación de los servicios provistos por los Prestadores Urbanos de Servicios de Agua Potable (PUSAPs) y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19 en sus cabeceras municipales.

## Ejecución Física

### Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Agua Urbana

Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Proyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable en proceso de ejecución beneficiando a 8 cabeceras municipales.	Porcentaje	8	6	-	-	-	-
Nuevos prestadores de servicios de agua potable implementados en 6 cabeceras municipales.	préstamo	6	6	-	-	-	-
Plan de Asistencia Técnica (PAT) a prestadores de servicios de agua potable del Proyecto aprobado.	Plan	1	1	-	-	-	-

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>Mejoramiento del abastecimiento de servicio de suministros de agua potable en zonas urbanas.</b>							
Proyectos de rehabilitación de sistemas urbanos de agua potable con contrato firmado por empresa ejecutora.	Contrato	8	4	-	-	-	-
Diagnósticos con línea base del nivel operativo de los prestadores de servicios urbanos aprobado	Diagnóstico	1	1	-	-	-	-
Nuevos prestadores de servicios de agua potable con personal y oficinas funcionando	Cantidad	6	2	-	-	-	-
Planes de rehabilitación elaborados a Nuevos prestadores de servicios de agua potable	Plan	6	6	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

### Avance de procesos:

- Recibida la No Objeción por parte del Banco documento de Solicitud de Propuestas (SDP) y realizada la invitación a las firmas consultoras Consorcio Concremat Engenharia e Tecnologia S.A./Técnica de Ingeniería S.A. (TECNISA) y PINI Group S.A. a presentar su propuesta técnico-económica para brindar los servicios de supervisión de los Subproyectos.
- Firmado el acuerdo de Asociación con 19 de las 22 municipalidades beneficiarias con recursos de inversión del Proyecto, en los que se convienen los compromisos que estas deben asumir para la ejecución de los recursos asignados, entre ellos la aportación de la contraparte, instalación de micromedidores, revisión y ajuste de tarifas de los servicios, cumplimiento del Marco de Resultados del Proyecto, entre otros.

- Entregados insumos y bienes para la rehabilitación de Instalaciones Hidrosanitarias en Apoyo a la Respuesta Municipal por emergencia COVID-19, para el municipio de Trujillo (Colón) y Puerto Lempira (Gracias a Dios).
- En Cuanto al Plan de Asistencia Técnica (PAT) a prestadores de servicios de agua potable del Proyecto aprobado, 5 empresas consultoras presentaron su interés en presentar propuestas, sin embargo, el tiempo de entrega de propuestas técnicas-financieras ha sido ampliado debido a que estas mismas firmas han solicitado muchas solicitudes de aclaración de dudas.
- Realizada reunión en Siguatepeque con los prestadores de servicios que participan en el Proyecto, el ERSAPS y el Equipo Técnico de la Unidad Administradora de Proyectos UAP-SAG para presentar la Estrategia de Monitoreo y Evaluación del Marco de Resultados de Proyecto de Agua Urbana – SAG – Banco Mundial.
- Se finalizó el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de Siguatepeque y se está trabajando en el de San Marcos de Colón.
- Se elaboró y gestiono la Estrategia de socialización para Micromedición, socializada en la Municipalidad de Choloma.
- Finalizada la evaluación del subproyecto de rehabilitación del sistema de agua potable de la ciudad de Puerto Cortés, en proceso de adjudicación.
- En evaluación el Subproyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de la Ciudad de La Paz, La Paz.
- En proceso de adjudicación la supervisión del Subproyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de La Paz y Danlí.
- Adjudicado el proceso adquisición de Radares de Penetración de Suelo y Servicios de Capacitación.

### **Limitantes**

- El mercado local para la ejecución de proyectos de la envergadura de La Paz, Danlí y Puerto Cortés (Entre USD 4.5-6.0 millones), no cuenta con la capacidad financiera requerida por el Banco para participar en los procesos de licitación de las obras, por lo tanto, se realizaron diversas reuniones con la Chico de Tegucigalpa y San Pedro Sula, a fin de lograr mayor participación de oferentes.
- Por otra parte, se identificaron problemas en la Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de las Ciudades de La Esperanza e Intibucá debido a problemas de Tenencia de tierra incompleta y no cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- Tenencia de Tierra incompleta a favor de la Municipalidad de San Marcos de Colón.

### **Ejecución Financiera**

Como se puede observar el presupuesto aprobado inicialmente para el Proyecto fue de L 117,500,008.00, sin embargo, se realizó una disminución presupuestaria de 67.5%; quedando el presupuesto vigente por L.38, 207,697.00, debido a que no se realizarían los procesos siguientes:

- La adjudicación de la Asistencia Técnica es un proceso internacional.
- El pago de camiones cisterna, no se pudo realizar debido a que el contrato indica que es contra entrega y la misma está planificada para marzo del 2025.

La ejecución financiera corresponde a los pagos que se realizaron en insumos y bienes en atención de emergencias post Pandemia COVID19 y gastos operativos como: pagos en primas y seguros de vehículos, pasajes, viáticos y diésel.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento del Agua Urbana  
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM	117,500,008.00	38,207,697.00	30,684,037.00	80.31	7,523,660.00
<b>Total</b>	<b>117,500,008.00</b>	<b>38,207,697.00</b>	<b>30,684,037.00</b>	<b>80.31</b>	<b>7,523,660.00</b>

Fuente: SIAFI

### 2.4.7.7 Proyecto Alianza para Corredor Seco (GAFSP PROSASUR) – 23.03

Proyecto orientado a promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y fortalecimiento de centros comunales de salud y el fortalecimiento de grupos de productores, que pueden escalar a temas de competitividad y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo de corredor seco.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) PROSASUR							
Descripción Producto Final	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), Planes de Negocios Agrícolas (PNA) y Planes de Negocio No Agrícolas(PNNA) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	1,000	500	722	144%	1,000	100%
Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.	Plan	11	1	11	1,100%	11	100%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
<b>Producción de alimentos y generación de ingresos, sub-proyectos, clúster 1.</b>							
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FO, Clúster 1	Kit	1	-	-	-	-	-
<b>Producción de alimentos y generación de ingresos, sub-proyectos, clúster 2.</b>							
Kit de bienes productivos (Bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PSAN. FO Clúster 2	Kit	313	-	-	-	276	88%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PNNA. FO Clúster 2	Kit	16	-	-	-	2	13%
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PNA. FO Clúster 2.	Kit	500	250	194	78%	444	89%
<b>Educación nutricional e higiene del hogar, asistencia técnica, clúster 1</b>							
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	1	1	-	-	-	-
<b>Educación nutricional e higiene del hogar, asistencia técnica, clúster 2.</b>							
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	1	1	1	100%	1	100%
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Clúster 2	Asistencia Técnica	2,500	625	625	100%	2,500	100%
<b>Producción de alimentos y generación de ingresos asistencia técnicas clúster 1.</b>							
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FA, Cluster 1	Asistencia Técnica	1,000	500	500	100%	1,000	100%
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 1	Asistencia Técnica	1	-	-	-	-	-
<b>Educación nutricional e higiene del hogar, sub-proyectos, clúster 1.</b>							
Infraestructura básica (Eco filtro, eco fogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FA, Clúster 1	Cantidad	2,400	1,200	717	60%	717	30%
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	1	1	-	-	-	-
Infraestructura básica (Eco filtro, eco fogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 1	Cantidad	1	1	-	-	-	-
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Clúster 1	Asistencia Técnica	2,500	625	625	100%	2,500	100%
<b>Producción de alimentos y generación de ingresos, asistencias técnicas, clúster 2</b>							
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FA, Cluster 2	Asistencia Técnica	1,000	500	500	100%	1,000	100%
<b>Educación nutricional e higiene del hogar, subproyectos clúster 2.</b>							
Infraestructura básica (Eco filtro, eco fogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FA, Clúster 2	Cantidad	2,400	1,200	731	61%	731	30%
Establecimientos de Salud y educación dotados con Infraestructura y equipo médico básico a través del PNC del corredor seco. FA clúster 1	Cantidad	49	-	-	-	-	-

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Establecimientos de Salud y educación dotados con Infraestructura y equipo médico básico a través del PNC del corredor seco. FA clúster 2	Cantidad	45	-	-	-	-	-
Infraestructura básica (Eco filtro, eco fogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar) entregada a Hogares del corredor seco. FO, Clúster 2	Cantidad	1	1	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

### Descripción de los logros

- Entregados 512 Kits con Bomba de Mochila, Cal Dolomita, Fertilizante Foliar granular 20-20-20, Fertilizante Granulado 12-24-12, Fertilizante Granulado 18-46-00, Fungicida, Insecticida y Semilla de Mejorada maíz
- Brindadas 2,251 asistencias técnicas para mejorar la producción y productividad agropecuaria y en nutrición e higiene en el hogar.
- Implementados 722 Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), Planes de Negocios Agrícolas (PNA) y Planes de Negocio No Agrícolas (PNNA) en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.
- Implementados 11 Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.
- Entregados en el Corredor Seco 1,448 infraestructuras básicas como Eco filtro, eco fogones, letrinas, piso de cocina o en el sitio elegido por el hogar.
- Autorizada por el Banco Mundial la ampliación de la vigencia del convenio de donación Fondo Adicional, extendiendo la fecha de cierre del 31 de diciembre de 2024 al 30 de junio de 2025.
- Se finalizó la instalación de los sistemas de riego incorporando 54 hectáreas de riego por goteo.

### Ejecución Financiera

La ejecución financiera al IV trimestre fue de 62.44% del Presupuesto Vigente, equivalente a L.116,781,975.10 sin embargo, la misma se vio afectada debido a que algunas propuestas no cumplieron con los criterios del Manual de Subproyectos. Asimismo, el implementador CARE, no finalizó la entrega de los sistemas de riego; la finalización de las 5,079 obras, y la implementación de los planes de nutrición comunitaria en 94 centros de salud. Se ha autorizado una ampliación de tiempo al contrato del consultor implementador, por el cual se realizará el pago en el año 2025.

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Alianza Corredor Seco (En Lempiras)

Fuente	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donación GASFP/BM	137,029,729.00	187,018,693.00	116,781,975.10	62.44	70,236,717.90
<b>Total</b>	<b>137,029,729.00</b>	<b>187,018,693.00</b>	<b>116,781,975.10</b>	<b>62.44</b>	<b>70,236,717.90</b>

Fuente: SIAFI

#### 2.4.8 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

Este programa realiza las transferencias que, a través de la SAG, se asigna a instituciones y organismos del sector público, de acuerdo con los convenios en vigencia. Estos fondos se destinan para el fortalecimiento institucional y para ejecutar programas y proyectos de las instituciones a las cuales se les realizan las transferencias. La ejecución financiera se alcanzó en un **100%** de su presupuesto vigente.

#### Ejecución Financiera por el Tipo de Fondo de las Transferencias (En Lempiras)

Beneficiario	Transferencias	Ejecución Presupuestaria al IV Trimestre				
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al IV Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
500	Instituto Nacional Agrario	515,387,802.00	515,387,802.00	515,387,801.89	100.00	0.11
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	186,599,482.00	186,599,482.00	186,599,482.00	100.00	-
703	Universidad Nacional de Agricultura	594,096,025.00	594,096,025.00	594,096,025.00	100.00	-
901	Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	6,776,513.00	5,421,211.00	5,421,210.53	100.00	0.47
903	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	724,752,447.00	724,752,447.00	724,752,447.00	100.00	-
<b>Totales</b>		<b>2,027,612,269.00</b>	<b>2,026,256,967.00</b>	<b>2,026,256,966.42</b>	<b>100.00</b>	<b>0.58</b>

### 3 Conclusiones:

- El presupuesto vigente al IV trimestre fue de **L.6,423,760,336.00** de los cuales se ejecutaron **L4,945,709,825.60** que representan el **76.99%** del presupuesto global. El presupuesto está consignado en **42.66%** (**L 2,740,099,467.00**) a las transferencias que la SAG realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, el **38.48%** (**L.2,471,647,753.00**) a los programas regulares y el **18.87%** (**L.1,212,013,116.00**) a los proyectos de inversión. Asimismo, está compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**56.25%**), Fondos Propios (**0.33%**), Crédito Externo (**40.06%**), Donaciones Externas (**3.04%**) y Donaciones Internas (**0.32%**).
- Del monto total ejecutado **L.4,945,709,825.60** al IV Trimestre, corresponden **L. 2,740,099,466.42** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo ejecutando el **100%** de su presupuesto, que representa un **55.40%** del presupuesto total ejecutado, **L.1,595,554,083.14** (**64.55%**) a los programas regulares con una participación de **55.40%** del presupuesto total ejecutado, y **L. 610,056,276.07** (**50.33%**) a los proyectos de inversión, equivalente al **12.34%** del presupuesto total ejecutado.
- La ejecución financiera de los programas regulares no se alcanzó en su totalidad debido a que de los recursos propios destinados para sueldos y salarios del personal que laboraba como contrato y que se trasladaría a personal permanente (acuerdo), en base al artículo 85 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2024 y la Circular No. DGP-002-2024, no se concluyó el proceso de nombramiento del personal ante la Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC). Así mismo, algunos de estos ingresos se incorporaron a finales del mes de noviembre, con los cuales se había programado realizar compras que requerían procesos de licitación, pero no se disponía del tiempo para realizar el proceso.
- La ejecución física de los programas se vio afectada en menor medida, debido al recorte presupuestario realizado por la SEFIN, en cumplimiento del artículo 6 del PCM-35-2024, publicado el 15 de noviembre de 2024. Dicho artículo instruye que, debido a las afectaciones ocasionadas por la tormenta SARA, "se gestionen, reorienten y asignen los recursos identificados entre las distintas instituciones del Gobierno", afectando los grupos 200 y 300 que son los necesarios para la operatividad del programa.
- En lo que respecta a los proyectos de inversión, la no ejecución física y financiera se debe a que existen procesos en estado de aprobación de No Objeción por los organismos financiadores, procesos de licitación, así como la selección, revisión, evaluación, adjudicación para la contratación de empresas consultoras, constructoras, supervisoras e implementadoras.
- El presupuesto asignado por la SEFIN al programa Actividades Centrales, fondos del organismo AIF/BM destinados como recursos adicionales para los proyectos de inversión, no fueron ejecutados debido a que los proyectos no requirieron de presupuesto adicional.
