



INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO III TRIMESTRE 2024



Contenido

I. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.....	5
II. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA SAG	8
2.1 Ejecución Financiera Institucional al III Trimestre 2024.....	8
2.1.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:	8
2.1.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional	9
2.1.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios	9
2.1.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo.....	9
2.1.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas	10
2.1.6 Ejecución Financiera por Grupo del Gasto	10
2.2 Programas y proyectos adscritos a la SAG	11
2.3 Ejecución Financiera todos los Fondos, por Programas y Proyectos	12
2.4 Ejecución física por Programa y Proyecto.	16
2.4.1 Programa 01: Actividades Centrales.....	16
2.4.2 Programa 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)	16
2.4.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07	19
2.4.3 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura.....	21
2.4.4 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)	24
2.4.5 Programa 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO).....	32
2.4.6 Programa 22 – Competitividad Rural	34
2.4.6.1. Proyecto de inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13	34
2.4.6.2. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad Pro-Occidente 22.14.....	35
2.4.6.3. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) 22.15	37
2.4.6.4. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III) 22.16	39
2.4.7 Programa de Seguridad Alimentaria – 23.00.....	40
2.4.7.1 Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional – 23 – A/O 02	40
2.4.7.2 Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores – 23.00-002	42
2.4.7.3 Bono Tecnológico Productivo	43
2.4.7.4 Bono Ganadero.....	44
2.4.7.5 Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01.....	45
2.4.7.6 Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02	46
2.4.7.7 Proyecto Alianza para Corredor Seco (GAFSP PROSASUR) – 23.03	47
2.4.8 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.	49
III. GÉNERO.....	50
IV. CONCLUSIONES:	51

Presentación

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), es la institución responsable de normar y coordinar el Sector Agroalimentario Hondureño en el contexto de las políticas y lineamientos del Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026; y en base a las funciones conferidas por ley en el Decreto Legislativo número 218-96 y la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector agrícola.

En el marco de lo antes referido y cumpliendo con las normas establecidas en el Artículo 253 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes, esta secretaria de Estado tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual y Presupuesto correspondiente al III Trimestre del Año 2024.

El presente informe muestra el avance físico y financiero alcanzado por las Unidades Ejecutoras de los programas y proyectos de la SAG, además de presentar la rendición de cuentas con transparencia de las acciones realizadas a través de los recursos asignados, tanto nacionales como externos y la contribución de esta Secretaría de Estado a la implementación del Plan de Gobierno 2022-2026, en contribución de la Seguridad Alimentaria, promoviendo el desarrollo del sector Agroalimentario.

El informe consta de dos segmentos: el primero, que hace referencia al marco legal y normativo de la SAG y el segundo que refleja la ejecución financiera y física a nivel de cada Programa, Proyecto y Servicio adscrito a esta Secretaría de Estado, así como las transferencias realizadas a diferentes Instituciones del Sector Público, Privado y Externo del Sector Agroalimentario.

La fuente de información financiera para la elaboración del presente documento proviene del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI-GES); por otra parte, los avances en la ejecución física fueron proporcionados por cada una de las Unidades Ejecutoras: Programas y Proyectos adscritos a la SAG.



Glenda Mendoza
Directora Interina UPEG

Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de la Máxima Autoridad, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, con relación a la ejecución de los fondos nacionales como externos y los logros obtenidos por los programas y proyectos. Este informe contiene el avance físico y financiero del Plan Operativo Anual y presupuesto, correspondientes al III Trimestre del año 2024.

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto de **L.6,435,689,736.00**: el cual al cierre del III Trimestre 2024 tiene un presupuesto vigente de **L.6,431,997,397.00** este presupuesto está consignado en **42.62% (L 2,741,769.00)** a las transferencias que la SAG realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, el **38.47% (L.2,474,601,908.00)** a los programas regulares y el **18.9% (L.1,215,940,720.00)** a los proyectos de inversión. Asimismo, está compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**56.36%**), Fondos Propios (**0.29%**), Crédito Externo (**40.01%**), Donaciones Externas (**3.02%**) y **Donaciones Internas (0.32%)**.

Al tercer trimestre del año 2024 el presupuesto vigente es de **L. 6,431,997,397.00** de los cuales se ejecutaron **L.3,368,768,269.42** lo que representa el **52.38%** del presupuesto total. Por Grupo del Gasto la ejecución refleja que el Grupo 500 Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje con **68.41%**, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con **59.51%**. Grupo 300 Materiales y Suministros con **44.97%**, Grupo 200 Servicios No Personales con **32.06%** y Grupo 400 Bienes Capitalizables con **1.51%**

Al desglosar la ejecución por tipo de fondo, se observa que los Fondos Nacionales alcanzaron un **84.74%** de ejecución, con una participación del **91.20%** del presupuesto ejecutado. Por otro lado, los Fondos Propios representan el **41.16%** de la ejecución, con un **0.23%** de participación en el presupuesto ejecutado. En cuanto al Crédito Externo, se ejecutó un **8.26%**, contribuyendo con el **6.31%** del presupuesto total ejecutado. Finalmente, las Donaciones externas registraron una ejecución del **39.29%**, contribuyendo con el **2.27%** del presupuesto ejecutado.

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 8 proyectos que se detallan a continuación:

- El Programa Nacional de Agricultura bajo Riego: Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (**PDABR**)
- Programa de Competitividad Rural con los proyectos: Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (**PROINORTE**), Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (**Pro-Occidente**) y los proyectos Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (**ComRural II** y **ComRural III**).
- El Programa de Seguridad Alimentaria: incluye el Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras (**Seguridad Hídrica**); Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana (**Agua Urbana**) y Alianza para el Corredor Seco (**PROSASUR**).

Estos proyectos son financiados con fondos de los organismos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de España a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID. Las acciones de estos proyectos están focalizadas en distintos departamentos del país para atender pequeños productores y productoras, organizaciones, cajas rurales entre otras; y en su conjunto cuentan con un presupuesto de crédito y donaciones externas de **L 1,203,881,449.00** que representa un **18.72%** del presupuesto vigente total de la institución.

I. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de diciembre de 1996, de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

Misión:

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos de la población.

Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

Objetivos Estratégicos:

1. Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios.
2. Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas.
3. Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.

Funciones de la SAG:

- a) La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.

- El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
 - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
 - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
 - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
 - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b) El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c) La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d) La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.
- e) La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.
- f) El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
- g) La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
- h) La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
- i) La promoción del crédito agrícola.
- j) La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

Ámbito del accionar de la SAG:

A Nivel Regional: La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A Nivel Sectorial: La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.

A Nivel Institucional: A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.

Política Presupuestaria


La Secretaría de Finanzas (SEFIN), como institución rectora del sistema SIAFI-GES, dicta los lineamientos que rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y Artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En ese contexto, se definió la política presupuestaria que rige el presupuesto del año 2024 de acuerdo con el Decreto 62-2023 del Presupuesto y sus disposiciones generales para el ejercicio fiscal 2024.

II. Análisis de la ejecución física y financiera de la SAG

2.1 Ejecución Financiera Institucional al III Trimestre 2024

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el Ejercicio Fiscal 2024, un presupuesto de L.6,435,689,736.00, el cual al III trimestre 2024 tiene un presupuesto vigente de L. 6,431,997,397.00

Este presupuesto está distribuido en un **42.62% (L.2,741,454,769.00)** a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, el **38.47% (L.2,474,601,908.00)** a los programas regulares y el **18.9% (L.1,215,940,720.00)** a los proyectos de inversión.



2.1.1 Ejecución Financiera todos los Fondos:

El presupuesto de la SAG está compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales **56.36%**, Fondos Propios (**0.29%**), Crédito Externo (**40.01%**), Donaciones Externas (**3.02%**) y Donaciones Internas (**0.32%**).

Del monto total ejecutado en el III Trimestre, corresponden **L. 1,611,285,253.42** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo que representa un **47.83%** del presupuesto total ejecutado, **L.1,463,092,054.72 (43.43%)** a los programas regulares, y **L. 294,390,961.28 (8.73%)** a los proyectos de inversión.

En el siguiente cuadro, se detalla el presupuesto vigente y la ejecución financiera de la SAG, al III trimestre de 2024:

Ejecución Financiera Todos los Fondos por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre		
	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución
Programas Regulares SAG	2,474,601,908.00	1,463,092,054.72	59.12
Proyectos de inversión	1,215,940,720.00	294,390,961.28	24.21
Transferencias	2,741,454,769.00	1,611,285,253.42	58.77
Total	6,431,997,397.00	3,368,768,269.42	52.38

Fuente SIAFI

2.1.2 Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional

El presupuesto vigente del Tesoro Nacional al III trimestre, se muestra en **L. 3,625,306,542.00** los cuales representan el **56.04%** del presupuesto total de la Institución, de estos fondos se ejecutaron **L.3,072,175,807.60** que representa el **84.74%** del presupuesto vigente de dichos fondos; de los cuales las Transferencias al sector público ejecutaron **L 1,611,285,253.4**, equivalentes a un **79.47%** de su presupuesto vigente, los programas regulares de la SAG, alcanzaron una ejecución de **L1,455,458,802.89**, es decir un **91.79%** y los proyectos de inversión **L. 5.431.751.32 (45.04%)**.

Ejecución Financiera Fondos 11 Tesoro Nacional por Institución (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	1,609,827,341.00	1,585,635,002.00	1,455,458,802.89	91.79	111,908,591.91
Proyectos de Inversión	12,059,271.00	12,059,271.00	5,431,751.32	45.04	6,627,519.68
Transferencias	2,027,612,269.00	2,027,612,269.00	1,611,285,253.42	79.47	416,327,015.58
Total	3,649,498,881.00	3,625,306,542.00	3,072,175,807.63	84.74	534,863,127.17

Fuente: SIAFI

2.1.3 Ejecución Financiera Fondos 12 Recursos Propios

La SAG a través de los programas regulares: Actividades Centrales, PRONAGRI, Pesca y Fomento a la Acuicultura, genera ingresos por cobros en la prestación de servicios de diferente índole: Arrendamiento de tierras para cultivo de camarón "Canon", licencias para ejercer actividades pesqueras y acuícolas. Al III trimestre cerró con un presupuesto vigente de **L. 18,544,028.00** de estos fondos se ejecutaron **L.7,633,251.83** equivalente a un **41.16%** del presupuesto vigente de los recursos propios.

Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	210,399.00	615,399.00	-	0.00	615,399.00
PRONAGRI	231,700.00	231,700.00	100,683.18	43.45	131,016.82
DIGEPESCA	18,101,929.00	17,696,929.00	7,532,568.65	42.56	5,920,064.21
Total	18,544,028.00	18,544,028.00	7,633,251.83	41.16	6,666,480.03

Fuente: SIAFI

2.1.4 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo

El presupuesto vigente proveniente de crédito externo (préstamo) al III trimestre del año se refleja en **L.2,573,242,098.00**, que representa un **39.98%** del presupuesto total de la Institución, estos recursos financian los programas que incluyen los proyectos de inversión pública y los programas de apoyo como las Actividades Centrales y Transferencias; dichos fondos alcanzaron una ejecución de **L.212,575,758.78** es decir un **8.26%** en relación con el presupuesto vigente de los mismos.

Los Organismos financiadores son: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) bajo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) / Banco Mundial (BM).

Ejecución Financiera Fondos 21 - Crédito Externo (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas y Proyectos	1,933,024,598.00	1,879,899,598.00	212,575,758.78	30.66	1,503,152,362.58
Transferencias	693,342,500.00	693,342,500.00	-	0.00	693,342,500.00
Total	2,626,367,098.00	2,573,242,098.00	212,575,758.78	8.26	2,196,494,862.58

Fuente: SIAFI

2.1.5 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas

Las Donaciones Externas (Fuente 22) refleja un presupuesto vigente de **L.194,404,729.00** correspondientes a los programas regulares SAG, recursos que provienen de los siguientes organismos la Asociación Internacional de Fomento (AIF)/Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al III trimestre se alcanzó una ejecución de un **39.29%** del presupuesto vigente para estos fondos.

Ejecución Financiera Fuente 22, Donaciones Externas por Organismo Financiero

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Proyectos SAG	141,279,729.00	194,404,729.00	76,383,451.18	39.29	116,057,213.14
Proyectos SAG	141,279,729.00	194,404,729.00	76,383,451.18	39.29	116,057,213.14

Fuente: SIAFI

2.1.6 Ejecución Financiera por Grupo del Gasto

En lo que respecta al presupuesto vigente por grupo del Gasto, el mayor porcentaje de participación corresponde al Grupo 500 Transferencias y Donaciones con **68.87%**, seguido del Grupo 400 Bienes Capitalizables con **18.46%**, Grupo 300 Materiales y Suministros un **0.73%**. Grupo 200 Servicios No Personales **8.94%**, 100 Servicios Personales con **2.99%**.

En el siguiente cuadro, se presenta el presupuesto vigente y ejecutado por Grupo del Gasto:


**Ejecución Financiera por Grupo del Gasto SAG
(En Lempiras)**

Grupo Del Gasto	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
100-Servicios Personales	228,873,994.00	192,111,684.00	114,329,162.62	59.51	77,277,561.38
200-Servicios No Personales	493,185,717.00	575,213,388.00	184,414,530.95	32.06	322,702,646.96
300-Materiales y Suministros	61,521,893.00	47,265,021.00	21,257,004.34	44.97	22,827,601.13
400-Bienes Capitalizables	1,139,793,569.00	1,187,392,741.00	17,984,388.8	1.51	1,052,542,493.17
500-Transferencias y Donaciones	4,512,314,563.00	4,430,014,563.00	3,030,783,182.7	68.41	1,399,231,380.28
Total	6,435,689,736.00	6,431,997,397.00	3,368,768,269.42	52.38	2,874,581,682.92

Fuente: SIAFI

2.2 Programas y proyectos adscritos a la SAG


La Secretaría de Agricultura y Ganadería ejecuta 8 programas los cuales están orientados a la entrega de bienes y servicios a la población, un programa de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público en la institución, además 2 que incluyen los proyectos de inversión y una de las prioridades del Plan de Gobierno 2022-2026 como ser la Seguridad Alimentaria y Nutricional, a continuación, se muestra la estructura de los programas:

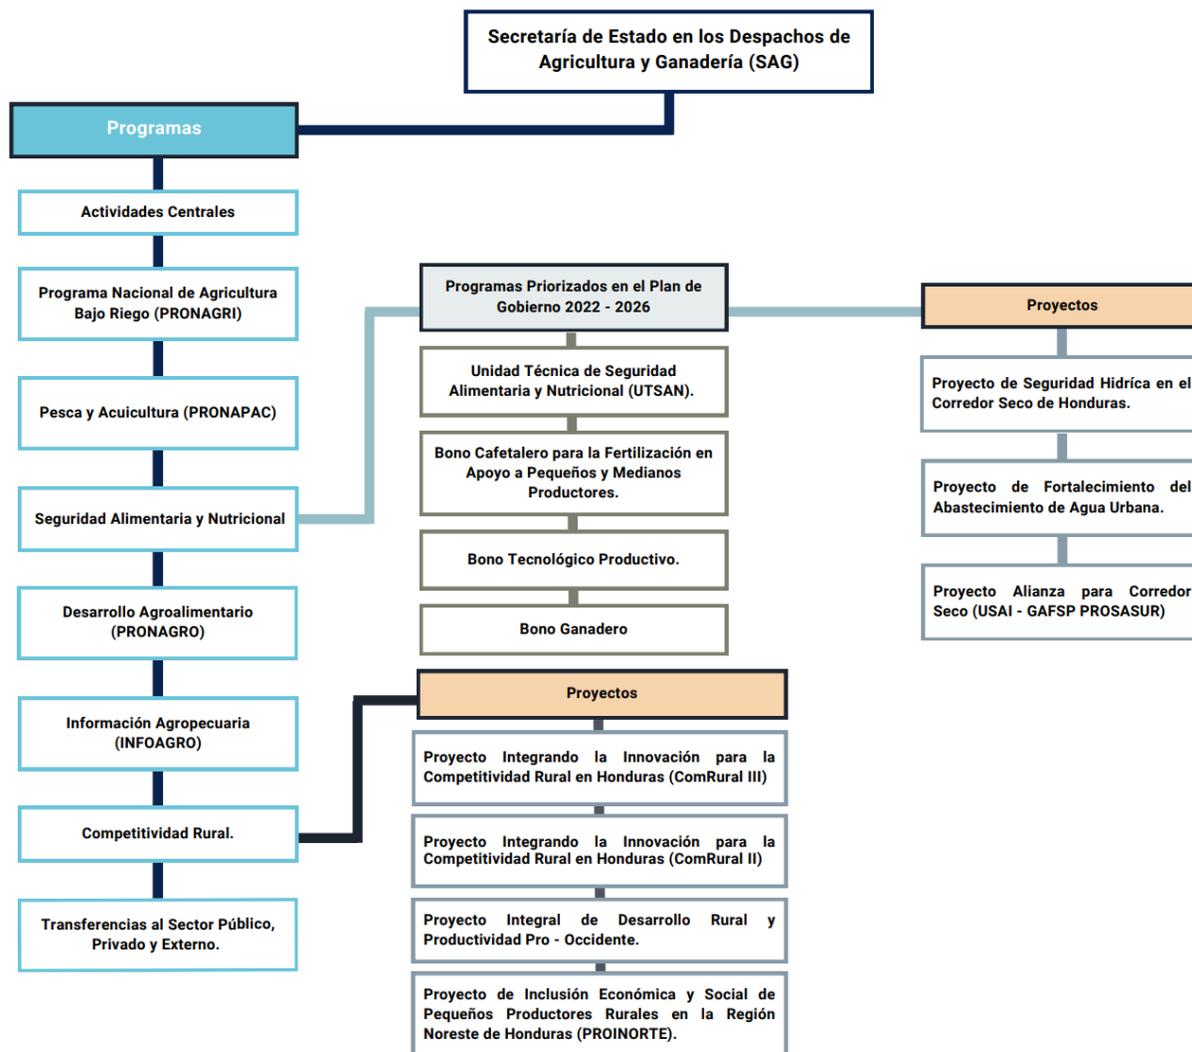

2.3 Ejecución Financiera todos los Fondos, por Programas y Proyectos


La SAG al cierre del III trimestre 2024, refleja un presupuesto vigente de L.6,431,997,397.00 los cuales se destinan al financiamiento de los 8 programas presupuestarios; de estos el mayor porcentaje le corresponde al programa 99 Transferencias al Sector Público, Privado y Externo un 42.62%, seguido del programa Seguridad Alimentaria y Nutricional con 26.39% que incluye los proyectos: Seguridad Hídrica, Agua Urbana, PROSASUR , además UTSAN y los bonos Cafetalero, Tecnológico Productivo y Ganadero, el programa Actividades Centrales con 15.64%, el programa de Competitividad Rural con 11.46%, incluye los proyectos (PROINORTE, ProOccidente, ComRural II y ComRural III), el PRONAGRI que incluye el proyecto PBADR 2.01% y el resto de los programas (Pesca y Fomento a la Acuicultura, PRONAGRO, INFOAGRO) con un porcentaje menor al 2%.

Porcentaje de Distribución del Presupuesto Vigente por Programa Presupuestario

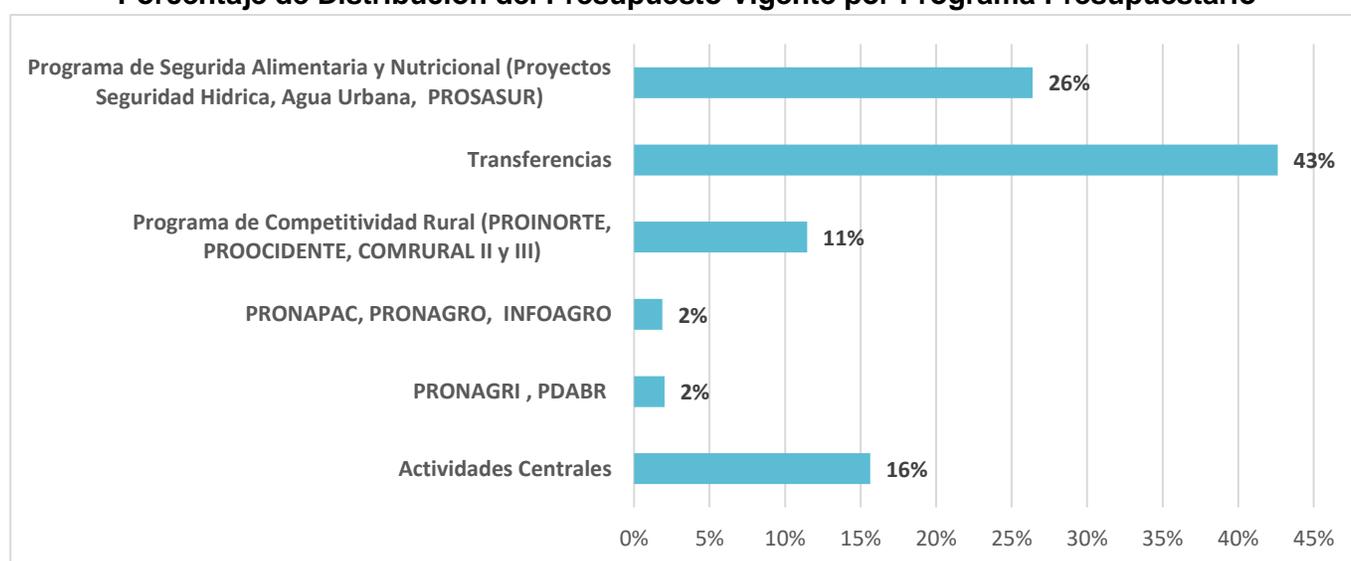

El presupuesto vigente de la SAG está compuesto por cinco fuentes de financiamiento distribuido en: Fondos Nacionales (56.36%), y Fondos Propios (0.29%), Créditos Externos (40.01%), Donación externas (3.02%) y donaciones internas (0.32%). En cuanto al presupuesto total ejecutado L. 3,368,768,269.40 corresponde L. **3,072,175,807.60 (84.74%)** a la fuente 11 Tesoro Nacional, seguido de Fondos Externos (Crédito) con L. **212,575,758.78 (8.26%)** corresponde a la fuente 22 Donaciones Externas L.**76,383,451.18 (39.28%)** y la fuente 12 Recursos Propios con L. **7,633,251.80 (41.16%)**. En el gráfico se puede observar el presupuesto vigente y ejecutado por tipo de Fondo.

Presupuesto Vigente y Ejecutado por Tipo de Fondo al III Trimestre de 2024 (En Millones de Lempiras)

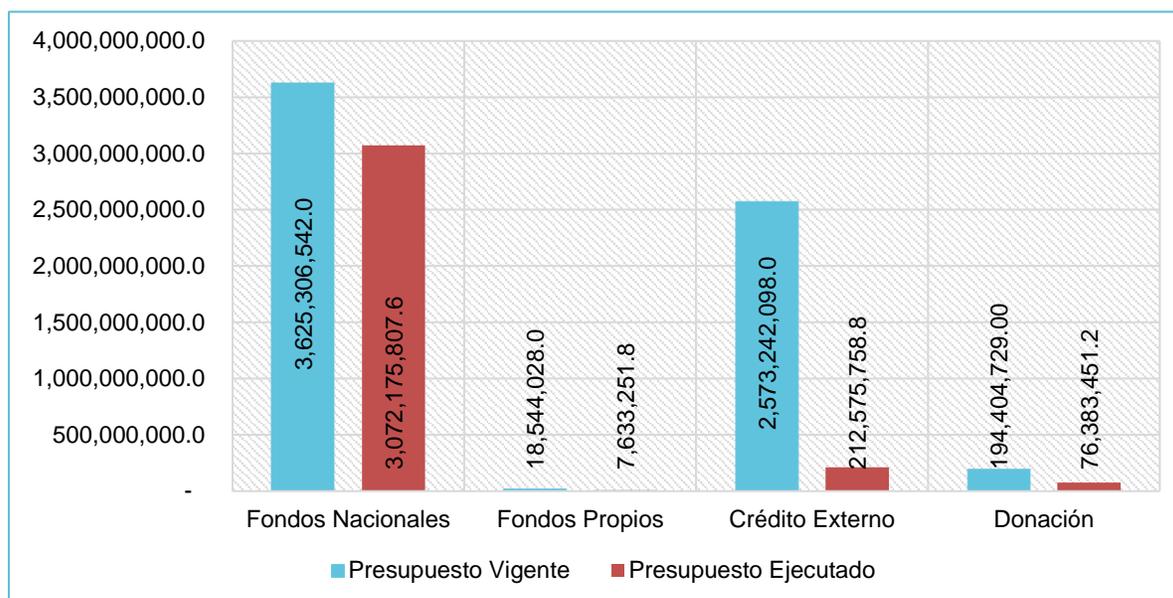

Al III trimestre 2024 la ejecución financiera fue de L 3,368,768,269.42 que representan el 52.38% del presupuesto total vigente de L. 6,431,997,397.00. En el siguiente cuadro se puede observar la ejecución financiera por programas y proyectos de la SAG

Ejecución Financiera Todos los Fondos por Programas y Servicios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	1,010,325,854.00	1,005,877,302.00	84,284,253.28	8.38	816,528,173.98
PRONAGRI	43,957,934.00	34,025,678.00	13,241,932.38	38.92	8,358,405.25
PDABR	0.00	95,551,284.00	5,406,759.90	5.66	90,144,524.10
DIGEPESCA	55,561,571.00	54,833,888.00	28,768,187.86	52.46	21,802,304.00
PRONAGRO	52,649,038.00	49,333,215.00	19,261,537.28	39.04	30,039,021.47
INFOAGRO	20,431,650.00	16,248,307.00	10,198,294.14	62.77	4,333,459.02
Proyecto PROINORTE	123,788,094.00	120,236,810.00	23,286,203.34	19.37	92,543,443.91
Proyecto ProOccidente	220,801,170.00	220,801,170.00	74,074,989.15	33.55	103,546,014.68
Proyecto ComRural II	147,358,209.00	220,978,549.00	83,660,999.96	37.86	134,156,533.65
Proyecto ComRural III	248,744,582.00	175,124,242.00	514,166.92	0.29	174,604,739.08
Unidad Técnica Seguridad Alimentaria Y Nutricional (UTSAN)	15,868,200.00	14,283,518.00	7,337,849.78	51.37	6,870,069.22
Bono Cafetalero	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-
Bono Tecnológico	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
Bono Ganadero	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-
Proyecto Seguridad Hídrica	220,718,928.00	128,718,928.00	8,689,394.15	6.75	112,212,646.33
Proyecto Agua Urbana	117,500,008.00	117,500,008.00	22,374,996.68	19.04	90,590,619.51
Proyecto Alianza Corredor Seco (USAID-GAFSP) PROSASUR	137,029,729.00	137,029,729.00	76,383,451.18	55.74	58,682,213.14
Transferencias	2,720,954,769.00	2,741,454,769.00	1,611,285,253.42	58.77	1,130,169,515.58
Total	6,435,689,736.00	6,431,997,397.00	3,368,768,269.42	52.38	2,874,581,682.92

Fuente: SIAFI

2.3.1. Ejecución Financiera por Fuente 11 Tesoro Nacional, Programa y Proyecto

La ejecución de los fondos 11 tesoro nacional muestra un presupuesto vigente de **L 3,625,306,542.00**, de los cuales se ejecutó el **84.74% (L. 3,072,175,807.63)**, en el siguiente cuadro se detalla la ejecución por cada uno de los programas y proyectos que son financiados por estos fondos:

**Ejecución Financiera Fuente 11 Tesoro Nacional de la Institución por Programas y Proyecto
(En Lempiras)**

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	1,621,886,612.00	1,597,694,273.00	1,460,890,554.21	91.44	118,536,111.59
Actividades Centrales	139,692,577.00	134,839,025.00	84,284,253.28	62.51	46,556,413.98
PRONAGRI	43,726,234.00	33,793,978.00	13,141,249.20	38.89	8,227,388.43
DIGEPESCA	37,459,642.00	37,136,959.00	21,235,619.21	57.18	15,882,239.79
PRONAGRO	52,649,038.00	49,333,215.00	19,261,537.28	39.04	30,039,021.47
INFOAGRO	20,431,650.00	16,248,307.00	10,198,294.14	62.77	4,333,459.02
PROINORTE	12,059,271.00	12,059,271.00	5,431,751.32	45.04	6,627,519.68
Unidad Técnica Seguridad Alimentaria y Nutricional	15,868,200.00	14,283,518.00	7,337,849.78	51.37	6,870,069.22
Bono Cafetalero	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-
Bono Tecnológico Productivo	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
Bono Ganadero	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
Transferencias al Sector Público	2,027,612,269.00	2,027,612,269.00	1,611,285,253.42	79.47	416,327,015.58
Transferencias	2,027,612,269.00	2,027,612,269.00	1,611,285,253.42	79.47	416,327,015.58
Total	3,649,498,881.00	3,625,306,542.00	3,072,175,807.63	84.74	534,863,127.17

Fuente SIAFI

2.3.2. Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios, por Programa:

El presupuesto vigente de estos recursos fue de **L 18,544,028.00** que corresponden a los programas: Actividades Centrales, PRONAGRI, y Pesca y Fomento a la Acuicultura, estos recursos son generados por cobros en la prestación de servicios como arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), pesca industrial (Buzos), pesca deportiva, compra venta mayorista, pesca artesanal, embarcación artesanal básica, venta de productos, renta de alquileres de casetas y las casas de habitación en las Acacias, Juticalpa, Olancho entre otros, En el siguiente cuadro se puede observar que la ejecución al III Trimestre fue de **L 7,633,251.83** que representa un **41.16%** del presupuesto vigente.

Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	210,399.00	615,399.00	-	0.00	615,399.00
PRONAGRI	231,700.00	231,700.00	100,683.18	43.45	131,016.82
DIGEPESCA	18,101,929.00	17,696,929.00	7,532,568.65	42.56	5,920,064.21
Total	18,544,028.00	18,544,028.00	7,633,251.83	41.16	6,666,480.03

Fuente: SIAFI

2.3.3. Ejecución Financiera Fuente 21 Crédito Externo, Programa y Proyecto:

Los recursos provenientes de crédito externo (préstamo) reflejan un presupuesto vigente de **L.2,573,242,098.00** y una ejecución de **8.26%** que equivale a **L. 212,575,758.78** estos recursos están destinados para financiar los proyectos de inversión pública, el programa Actividades Centrales que tiene fondos del organismo AIF/BM que corresponde a la compra de maquinaria y equipo de producción agropecuaria y forestal. La ejecución de los recursos de crédito externo, durante este trimestre no se cumplió ya que están en proceso trámites administrativos, procesos de licitación, contrataciones, entre otros.

Ejecución Financiera Fuente 21 Crédito Externo de la Institución y por Programa y Proyecto (En Lempiras)

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	870,422,878.00	870,422,878.00	-	0.00	769,356,361.00
PROINORTE	111,728,823.00	108,177,539.00	17,854,452.02	16.50	85,915,924.23
PDABR	-	95,551,284.00	5,406,759.90	5.66	90,144,524.10
PROOCCIDENTE	216,551,170.00	216,551,170.00	74,074,989.15	34.21	99,296,014.68
COMRURAL II	147,358,209.00	220,978,549.00	83,660,999.96	37.86	134,156,533.65
COMRURAL III	248,744,582.00	121,999,242.00	514,166.92	0.42	121,479,739.08
Seguridad Hídrica	220,718,928.00	128,718,928.00	8,689,394.15	6.75	112,212,646.33
Agua Urbana	117,500,008.00	117,500,008.00	22,374,996.68	19.04	90,590,619.51
Transferencias	693,342,500.00	693,342,500.00			693,342,500.00
Proyectos Regulares SAG	2,626,367,098.00	2,573,242,098.00	212,575,758.78	8.26	2,196,494,862.58

Fuente: SIAFI

2.3.4. Ejecución Financiera Fuente 22 Donaciones Externas, Programa y Proyecto:

Las donaciones externas reflejan un presupuesto vigente de **L.194,404,729.00**, de los cuales se han ejecutado al III trimestre **L. 76,383,451.18 (39.29%)** en apoyo a los proyectos de inversión PROOCCIDENTE, PROSASUR y al programa Actividades Centrales; este último los fondos aprobados corresponden a la donación del proyecto ComRural III, los cuales están en proceso de aprobación de la modificación presupuestaria para el traslado al proyecto. A continuación, el detalle:

Ejecución Financiera Fuente 22, Donaciones Externas por Organismo Financiero

DEPENDENCIAS	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
POOCCIDENTE	4,250,000.00	4,250,000.00	-	0.00	4,250,000.00
BID	4,250,000.00	4,250,000.00	-	0.00	4,250,000.00
COMRURAL III	-	53,125,000.00	-	0.00	53,125,000.00
AIF		53,125,000.00			53,125,000.00
PROSASUR	137,029,729.00	137,029,729.00	76,383,451.18	55.74	58,682,213.14
AIF	137,029,729.00	137,029,729.00	76,383,451.18	55.74	58,682,213.14
Programas Regulares SAG	141,279,729.00	194,404,729.00	76,383,451.18	39.29	116,057,213.14

Fuente: SIAFI

2.4 Ejecución física por Programa y Proyecto.

Al III trimestre del presente año, los programas y proyectos alcanzaron los siguientes avances:

2.4.1 Programa 01: Actividades Centrales

Este programa sirve de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público en la institución a través de las siguientes actividades: 1) Dirección y Coordinación Superior, 2) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, 3) Servicios Administrativos y Financieros, 4) Servicios de Secretaría General, 5) Auditoría Interna, 6) Coordinaciones Regionales, 7) Fomento a la Equidad de Género, 8) Unidad de Agro Ambiente y Cambio Climático.

La ejecución financiera del programa al III trimestre 2024 alcanzo un 8.38% (L.84,284,253.28), que corresponde a los fondos nacionales. En el caso de los recursos de crédito externo corresponden a presupuesto aprobado a la SAG como espacio fiscal para ejecutar nuevos proyectos de inversión. En el caso de los recursos de crédito externo L.870,422,878 corresponden a presupuesto aprobado a la SAG como espacio fiscal para ejecutar nuevos proyectos de inversión.

Ejecución Financiera Actividades Centrales (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	139,692,577.00	134,839,025.00	84,284,253.28	62.51	46,556,413.98
Fuente 12: Recursos Propios	210,399.00	615,399.00	-	0.00	615,399.00
Fuente 21: Crédito Externo AIF	870,422,878.00	870,422,878.00	-	0.00	769,356,361.00
Total	1,010,325,854.00	1,005,877,302.00	84,284,253.28	8.38	816,528,173.98

Fuente: SIAFI

2.4.2 Programa 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI)

Es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (PRONAGRI)							
Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre 2024					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a microriego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras	Hectárea	705	225	225.4	100%	443.4	62%

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (PRONAGRI)							
Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre 2024					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Inventario de producción agrícola por rubros de las parcelas de los productores y productoras en los distritos de riego con acceso al mercado local y nacional	Reporte	4	1	1	100%	3	75%
Capacitación brindada en temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión de riesgo, uso de suelo, pruebas en los laboratorios entre otros, a estudiantes de la academia y productores(as).	Capacitación	63	13	13	100%	44	70%
Estudios de prefactibilidad para construcción, modernización, Rehabilitación y ampliación de sistemas de riego para gestión de recursos financieros realizados, en beneficio de los pequeños y medianos productores(as).	Estudio de Prefactibilidad	2	1	1	100%	2	100%
Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en el enfoque de género.	Capacitación	19	6	5	83%	15	79%
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
A/O- 02: Gestión de Distritos de Riego							
Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	50	-	-	-	25	50%
Recopilación de información de datos de volumen de producción por rubro en los distritos de riego.	Informe	4	1	1	100%	3	75%
A/O-03: Capacitación y Asistencia Técnica en Agricultura Irrigada							
Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lote Demostrativo	12	2	2	100%	8	67%
Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia Técnica	64	12	12	100%	50	78%
A/O-04: Gestión de Áreas para Riego							

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (PRONAGRI)							
Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre 2024					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Kit de sistema de micro riego (tubería, accesorios, cinta de goteo, filtro) instalado en hectáreas de tierra agrícola.	Kit de Riego	302	47	47	100%	266	88%
Diseño y presupuesto de sistema de riego elaborado.	Diseño	12	3	3	100%	9	75%
Áreas identificadas de riego para banco de proyectos.	Área	2	1	1	100%	2	100%
A/O-05: Fomento de la Equidad e Igualdad de Género en las Actividades de Riego y Drenaje							
Plan de capacitación Elaborado	Plan	4	1	1	100%	3	75%

Fuente SIAFI

Descripción de los logros:

Beneficiados un total de 470 productores y estudiantes (321 hombres y 149 mujeres) durante el III Trimestre.

- Brindadas 12 asistencias técnicas en diversos temas de riego como: Manejo de cultivo de sorgo Sudán y sorgo forrajero con riego por goteo como ensayo de validación, mantenimiento y limpieza de tubería, en la regional de Nacaome y técnicos a nivel central del Tular, Nacaome, Valle, apoyo para diseño e instalación de sistema de riego por aspersion a productores de la Trinidad de quebradas y Jiriguare, aldeas de Vallecillo y Ojojona, Francisco Morazán, aforamiento de fuentes de agua en el municipio de San Francisco de Coray, Valle, limpieza de sistema de riego de cosechadora en la comunidad del Tamarindo Nacaome, Valle, instalación de sistema de riego por aspersion en San Antonio de oriente el Zamorano, Francisco Morazán, diseño e instalación de sistema de riego por goteo en las Crucitas Potrerillos, el Paraíso, beneficiando a 83 productores (17 mujeres y 66 hombres).
- Impartidas 13 capacitaciones a 212 productores y estudiantes (137 hombres y 75 mujeres) en las regionales de los departamentos de Valle, Comayagua y Francisco Morazán en los temas de: Curva de retención de humedad del suelo (laboratorio de Suelos), manejo de sistemas de riego y uso adecuado del agua, instalación y manejo de operación de sistema de riego por goteo, Infiltración densidad en el sitio, contenido de humedad del suelo y densidad aparente y diseño e instalación de sistema de riego por goteo
- Brindadas 5 capacitaciones a 126 (72 hombres y 54 mujeres) productores y productoras en temas de sensibilización de género; Fortalecimiento de las capacidades productivas; diagnóstico y socialización programa de empoderamiento a mujeres rurales Lencas; fortalecimiento organizacional y socialización de convenio de cooperación; administración y mantenimiento de distritos de riego, revisión de convenio sobre administración, operación y mantenimiento de los distritos de riego de Comayagua con enfoque de género y empoderamiento de la mujer.
- Establecidos 2 nuevos lotes de cultivo de maíz en las comunidades del Destino y la esmeralda en Guaimaca, Francisco Morazán., beneficiándose un total de 2 productores (2 hombres).
- Con el apoyo del proyecto Nuevo Jamastrán, se entregaron 47 kits de riego por goteo para 0.25 has y 0.5 has logrando incorporar 13 has y 214 has con la entrega de cinta, haciendo un total de 225.4 has incorporadas con acceso a riego por goteo, beneficiando a 44 productores (37 hombres y 7 mujeres)

- Elaborados 3 diseños de sistemas de riego por microaspersión para producción de cultivo de cítricos en Sonaguera, Colón a 2 productores independientes (hombres), asimismo, se elaboró el diseño del lote N° 5 de Centro experimental la Concepción en Juticalpa Olancho.

Ejecución Financiera

La ejecución financiera acumulada fue de L 13,241,932.38, equivalente a 38.92%, cabe recalcar que la ejecución financiera se vio afectada debido al recorte del presupuesto, lo que impidió cumplir con los procesos de compra y adquisición de materiales y suministros como ser la adquisición de nuevos kits de riego y el fondo operativo para la distribución e instalación de los sistemas de riego.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego PRONAGRI (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	43,726,234.00	33,793,978.00	13,141,249.20	38.89	8,227,388.43
Fuente 12: Recursos Propios	231,700.00	231,700.00	100,683.18	43.45	131,016.82
Total	43,957,934.00	34,025,678.00	13,241,932.38	38.92	8,358,405.25

Fuente: SIAFI

2.4.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

Este programa tiene como objetivo contribuir a reducir pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Programa. De acuerdo con la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo con los valores que se encuentren en la línea de base. Se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. También tiene como objetivo contribuir a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo con las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base que se realice.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (PDABR)

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución acumulada	% de ejecución
Capacitación en manejo y uso del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente, protección de microcuencas impartidos a los usuarios de los sistemas de riego de san Sebastián, Lamaní, Comayagua, Lauterique, Lejamani, La Paz, Marcala, San Jose, Chinacla, Cantarranas	Número de Capacitaciones Impartidas	8	5	5	100%	5	63%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución acumulada	% de ejecución
Eventos de socialización de planes de ordenamiento de los Recursos Naturales en los municipios de: Comayagua, El Rosario, Siguatepeque, Jesús de Otoro, Santiago de Pringa, La Paz, Lauterique, Lamaní, San Sebastián, Lepaterique y la Villa de San Antonio.	Número de eventos de socialización realizada	12	6	3	50%	3	25%
Plan de capacitación en temas ambientales	Documento de plan de capacitaciones	1	1	1	100%	100%	100%
Plan de desarrollo del taller de medidas ambiental y social elaborado	Número de plan de medidas ambientales y sociales elaborados	1	1	1	100%	100%	100%
Planes de ordenamiento de los Recursos Naturales aprobados.	Plan	2	1	-	-	-	50%

Fuente: SIAFI

Avances:

- Realizados 3 eventos de socialización de planes de ordenamiento de los Recursos Naturales de la subcuenca Río Jupwara, en los Municipios de San Sebastian, Lamani y La Vila de San Antonio, Departamento de Comayagua, beneficiando a 56 productores y estudiantes (28 mujeres, 28 hombres y 13 jóvenes).
- Impartidas 5 capacitaciones en temas de manejo del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente, protección de microcuencas, beneficiando a 141 usuarios y estudiantes (70 mujeres, 71 hombres y 136 jóvenes) de los sistemas de riego de Lamani, Ajuterique, Comayagua y La Paz.
- Taller en temas de educación ambiental y cambio climático en centros educativos aledaños a los canales de Selguapa y San Sebastián, beneficiando a 141 estudiantes (71 hombres y 70 mujeres).
- Elaborado el plan de capacitación en temas ambientales.
- Formulado el plan de desarrollo del taller en medidas ambientales y sociales.

La ejecución financiera se presenta a continuación:

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto PDABR

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BCIE		95,551,284.00	5,406,759.90	5.66	90,144,524.10
Total	-	95,551,284.00	5,406,759.90	5.66	90,144,524.10

Fuente: SIAFI

Limitantes:

La ejecución financiera acumulada fue de L 5,406,759.90, lo que equivale al 5.66% y está relacionada con los gastos operativos y administrativos del proyecto. Por otro lado, la baja ejecución se debe a que el proyecto acordó en conjunto con BCIE, SEFIN y SAG comenzar el proceso de cierre de la etapa del proyecto, y, se está trabajando en una nueva propuesta para la segunda fase del proyecto. Asimismo, está pendiente la No Objeción para la firma del contrato para realizar el estudio de optimización y diseño de obras complementarias del sistema de riego Selguapa, también, el Proyecto San Sebastián, continua con acta de suspensión y pendiente de la No Objeción de la cuarta adenda para continuar con los trabajos de construcción.

2.4.3 Programa 13: Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura

El Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura, es el responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiológicas y la política pesquera nacional. Este programa, tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura. La ejecución física del programa se muestra en el siguiente cuadro:

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 (DIGEPESCA)

Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros.	Licencia	11,272	3,693	2,843	77%	8,054	71%
Licencias de pesca emitidos a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	242	94	96	102%	202	83%
Evaluaciones de la estructura poblacional de las especies marinas Pepino de Mar (Holothuria mexicana), camarones y peces teleósteo en aguas nacionales para establecimiento de cuotas de captura en beneficio de pescadores industriales y artesanales.	Informe	6	2	2	100%	4	67%
Asistencia técnica brindada a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	723	225	225	100%	563	78%
Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas.	Alevines	1,500,000	530,000	210,200	40%	727,950	49%
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	

	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
A/O-02: Investigación Pesquera y Acuícola							
Recolección de datos biológicos en campo.	Informe	6	2	2	100%	4	67%
A/O-03: Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola							
Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Reporte	2896	741	741	100%	2,269	62%
Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	1,173	290	290	100%	866	49%
A/O-04: Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola							
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas en temas (cultivos de tilapia, artes de pesca, importancia de estar documentado, diferentes tipos de veda entre otras.	Capacitación	96	20	20	100%	66	64%
Validación del Plan de Manejo Pesquero con equipo técnico multidisciplinario del Programa.	Reunión	5	2	2	100%	4	80%
A/O-05: Fomento a la Acuicultura							
Producción de alevines de tilapia.	Alevines	2,720,462	1,665,462	1,665,462	100%	2,430,462	152%
A/O-06: Fomento de la equidad e igualdad de género en el sector pesquero y Acuícola							
Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico en las comunidades de Marcovia, Choluteca y Amapala, Valle.	Capacitación	6	2	2	100%	2	33%

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros

- Producidos **1,665,462,000** alevines de tilapia, en el Centro Nacional de Investigación Piscícola El Carao, ubicado en la comunidad de Playitas, departamento de Comayagua, de los cuales se distribuyeron **210,200** alevines, beneficiando directamente a 56 productores en los departamentos de Comayagua, Choluteca y Francisco Morazán e indirectamente a 280 beneficiarios indirectos en los departamentos de Comayagua, El Paraíso, Olancho, La Paz, Intibucá, Cortes y Francisco Morazán.
- Realizadas 741 vigilancias a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas en plantas procesadoras, restaurantes, supermercados, pescaderías, puestos de venta, comunidades pesqueras y comercializadores en los departamentos de Atlántida, Cortés, Colón, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Francisco Morazán.
- Inspecciones realizadas a 290 embarcaciones artesanales e industriales en los departamentos de Atlántida e Islas de la Bahía. con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.

- Capacitados 57 pescadores entre ellas 40 mujeres en la Región 13 Golfo de Fonseca en Pesca Artesanal Básica Sostenible o Responsable, en el Municipio de Amapala en coordinación con FUNDER.
- Emitidas 2,843 licencias de operación beneficiando a 2,631 hombres y 212 mujeres naturales y jurídicas, que intervienen en la actividad pesquera (Pescadores artesanales, empresas procesadoras, comercializadores de productos pesqueros, etc.) en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Choluteca y Francisco Morazán.
- Capacitados y asistidos 558 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales (372 hombres y 186 mujeres) en temas tales como: técnicas pesqueras, cultivo de tilapia en Geomembrana, importancia de estar documentado, normativas pesqueras, protocolo de la Ley de pesca, artes de pesca, importancia de las vedas, cultivo de tilapia, funciones de la DIGEPESCA y manipulación de productos pesqueros; en los departamentos de Atlántida, Colon, Choluteca, Valle y Francisco Morazán, mediante el desarrollo de capacidades de los productores se contribuye al incremento en la producción pesquera y acuícola, permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos de los mismos.
- Generados L. 4,700,995.00 millones en ingresos por diferentes conceptos como ser: arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), Pesca industrial (Buzos), licencias y permisos para ejercer actividades pesqueras y acuícolas, pesca industrial, venta de alevines, y otros).
- Generados 703 nuevos empleos beneficiando a 633 hombres y 70 mujeres, entre los cuáles se encuentran 342 jóvenes; por medio de la emisión de carnets en los departamentos de Atlántida, Colon, Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y valle.
- Capacitadas 76 mujeres en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico en las comunidades de Marcovia, Choluteca y Amapala, Valle.
- En coordinación con FUNDER se capacitaron 57 pescadores (40 mujeres y 17 hombres) en temas relacionados con la pesca artesanal básica sostenible o responsable. Esta actividad se llevó a cabo en el Municipio de Amapala, Valle.
- Capacitados 9 técnicos de la DIGEPESCA para el fortalecimiento de sus capacidades en temas de Tráfico Ilegal de Madera, Vida Silvestre y Pesca Ilegal, actuación de campo, verificación de infracciones contra el ambiente en áreas protegidas, dispositivos excluidores de tortuga (TEDs), entre otros.

Ejecución Financiera

La ejecución financiera fue de L 28,768,187.86 equivalente a 52.46% debido a que a la fecha quedaron procesos pendientes de pagos.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos DIGEPESCA (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	37,459,642.00	37,136,959.00	21,235,619.21	57.18	15,882,239.79
Fuente 12: Recursos Propios	18,101,929.00	17,696,929.00	7,532,568.65	42.56	5,920,064.21
Total	55,561,571.00	54,833,888.00	28,768,187.86	52.46	21,802,304.00

Fuente: SIAFI

2.4.4 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad. La ejecución física del programa se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 PRONAGRO

Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Comité	12	4	4	100%	9	75%
Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes de los productos agroalimentarios.	Evento	3	1	1	100%	2	67%
Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	9	4	4	100%	7	78%
Ferias agropecuarias nacionales, municipales realizadas, en apoyo a la comercialización de la producción de los pequeños y medianos productores(as).	Feria	11	4	4	100%	9	82%

Fuente: SIAFI

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias							
Análisis situacional de las cadenas agroalimentarias.	Análisis	8	2	2	100%	8	100%
Mapeo de los actores de las cadenas agroalimentarias.	Informe	8	2	2	100%	8	100%
Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	16	6	6	100%	14	88%
Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	29	12	12	100%	27	93%
Reuniones de cadenas agroalimentarias con los actores de los diferentes eslabones.	Reunión	45	19	19	100%	39	87%

Agronegocios							
Plan de trabajo de las ferias elaborados.	Plan de Trabajo	11	4	4	100%	10	91%
Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnostico	4	1	1	100%	3	75%
Talleres de capacitación impartido.	Talleres de Capacitación	5	3	3	100%	4	80%
Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	3	1	1	100%	3	100%
Plan de Negocios elaborado.	Plan de Negocio	6	3	3	100%	3	17%

Fuente: SIAFI

Logros alcanzados/ Cadenas agroalimentarias:

Cacao

Mediante reuniones con el Comité Nacional de la Cadena de Cacao, desarrolladas en los departamentos de Cortes, Olancho con la participación de 113 actores, 31 mujeres y 82 hombres, se llegó a los acuerdos siguientes:

- Socializado el costo de la certificación orgánica representando un monto de L.788,472.08, lo que representa un costo por productor de L1,837.93. Algunos de estos costos son cubiertos por algunas instituciones de apoyo como Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER). En dicha socialización participaron 27 (Hombres: 20, Mujeres 7, Jóvenes:1).
- Realizada reunión con el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC), con la participación de las siguientes Instituciones: Federación Nacional de Productores de Cacao de Honduras (FENAPROCAHAO), CHH, ANFACCH, Rikolto, FUNDER, LWR, ComRural, Heifer y SAG-PRONAGRO, un equipo de actores/técnicos representantes de productores, transformadores, mercado, instituciones de apoyo y marco regulatorio del Comité Nacional de la Cadena de Cacao se comprometieron a revisar las tablas de legalidad que le competen a esta cadena en el marco del cumplimiento del reglamento de la Unión Europea 1115/2023 Libre de Deforestación (UEDR), contando con 47 participantes (29 hombres y 14 mujeres).
- Coordinada las mesas temáticas y generación de compromisos en 3 jardines clonales de la región de Catacamas o Culmí, así como la identificación de posibles mercados para la venta de varetas, beneficiando 27 participantes (20 hombres y 7 mujeres).
- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se comprometió a socializar el enlace para el registro e identificación de negocios interesados en participar en la Ruta Gastronómica y Turística de Cacao y Chocolate.

Frijol

A través de reuniones realizada con el Comité Nacional de la Cadena de Frijol con la participación de 47 actores, 12 mujeres y 35 hombres

- Con la participación de 22 actores de la cadena (Hombres: 11, Mujeres: 11), se realizó reunión de seguimiento a la construcción del Convenio de Triangulación entre la Cámara Nacional de Frijol (AMPBC-FRIJOL) BANADESA (ente financiero) IHMA (comprador de grano) RED PASH (productor y comercializador de semilla) DICTA (proveedor de semilla) IICA (administrador de fondos paga pagos de contratos de venta de semilla a RED PASH) SAG-PRONAGRO (acompañamiento y apoyo en el proceso). Este convenio permitirá el acceso a recursos financieros a organizaciones de productores de frijol integrados en la Cámara de Frijol, mismo que vendrá a fortalecer el eslabón de producción

(grano y semilla) y el proceso de post cosecha que incluye las labores de acopio y acondicionamiento para cumplir con la normativa que exigen el IHMA y DICTA.

- Se realizó reunión en Yorito, Yoro con la participación de 15 productores (Hombres: 12, Mujeres: 3), acordando lo siguiente: Conformar la organización y proceder a la elección de la junta directiva correspondiente y gestionar para que a través de la Red de Productores Agrícolas de Semillas de Honduras (RED PASH) se imparta un taller inductivo referente a la producción de semilla de frijol y el proceso de comercialización.
- Las organizaciones “Acción y futuro” de Orica y “Triunfo y Esperanza” de Marale acordaron coordinar con SAG/DICTA reunión para definir el cumplimiento de requisitos y áreas a cultivar como multiplicadores de semilla. (8 hombres).
- Asistidos 10 productores del municipio de Danlí, El Paraiso

Marañón

A través del Comité Nacional de la Cadena de Marañón se realizó reunión con la participación de 26 actores, 8 mujeres y 18 hombres en el Departamento de Choluteca.

- Elaborar un programa de capacitación en conjunto con Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE).
- Coordinar con personal técnico del Instituto de Conservación Forestal (ICF) para abordar el tema de resepa de marañón.
- Los miembros de la cadena de marañón conocen los diferentes proyectos que maneja el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) y CRS para recibir apoyo financiero y asistencia técnica para diversificación de productos.

Porcina

Realizada la reunión del Comité Nacional de la Cadena de Porcina con la participación de 17 actores, 3 mujeres y 14 hombres en el Departamento de Atlántida.

- Explicar los mecanismos para acceder a los fondos de competitividad y sobre el proceso de negociación con FENACSA y el Fondo Nacional para la Competitividad del Sector Agropecuario de Honduras (FONACSA).

Vegetales Orientales

Con la participación de 35 productores (Hombres: 30, Mujeres: 5, Jóvenes: 8) se realizó reunión en la regional de Comayagua, acordando lo siguiente:

- Se envió listado de Productores a AGROSUPRO ya que este permitirá una mejor coordinación y consolidación de la información entre los productores y el mismo.
- Enviada la nota a Exportadora Honduproduce, este documento formalizará los términos de colaboración y facilitará acuerdos claros entre los productores y el exportador.

Críticos

Se desarrollo reunión con la asistencia de 57 productores (Hombres: 44, Mujeres: 13, Jóvenes: 9), quienes se dedican al cultivo de diversas variedades de cítricos, incluyendo limón persa, naranja agria y naranja dulce, entre otros, llegando a los siguientes acuerdos.

- Se realizo intercambio de experiencias para la adopción de mejores prácticas y estrategias que permitan enfrentar de manera conjunta los desafíos del sector. Además, de identificar soluciones efectivas y colaborativas, fortaleciendo así la resiliencia y sostenibilidad de la cadena. o Con el apoyo de OIRSA, se avanza en la recopilación de información para la certificación de viveros, dado el

impacto de la enfermedad HLB en los cultivos de cítricos, que representa un paso significativo hacia la producción de plantas sanas y libres de enfermedades.

Rambután

- Realizado el primer acercamiento con 3 productores de rambután de la zona de Santa Cruz de Yojoa, Cortes para iniciar el censo de productores de rambután, mismo que se realizara en con el proyecto CREA de Rainforest Alliance con el propósito de formar una organización de productores.

Cardamomo

Con la participación de 35 productores (Hombres: 25, Mujeres: 10) se realizó reunión acordando lo siguiente:

- Realizado un plan de acción para darle paso al Acuerdo Marco de Competitividad de la Cadena de Valor de Cardamomo
- Se articulará con las universidades para generar procesos de investigación en el rubro del cardamomo.
- ICF Noroccidente realizará la primera visita técnica, a dos grupos de productores con el fin de iniciar con los procesos forestería comunitaria.
- Se realizó la elección de los coordinadores de la Cadena de Cardamomo en las áreas de: alianzas estratégicas, mercado y asistencia técnica.

Papa

Con la participación de 61 actores (Hombres: 56, Mujeres: 5; Jóvenes: 4) en reunión de cadena se desarrollada en La Esperanza, Intibucá se logró lo siguiente:

- Realizada la asignación mensual de 81 contenedores de importación de semilla de papa con la aprobación del pleno de la reunión de cadena de papa, con el objetivo de disminuir el desabastecimiento en el mercado nacional para la temporada 2024-2025.
- Aprobada la distribución mensual de la cuota de contenedores para la importación de semilla para la temporada 2024-2025

Pimienta Gorda

Con la participación de 3 productores de la comunidad de Chivana, Omoa; y Agua Caliente, Puerto Cortés, Cortés:

- Registrados 16 nuevos productores y 4 compradores de pimienta gorda en el directorio de esta cadena y se acordó que los exportadores y operadores utilizarán los sistemas que ya poseen y usan en cuanto a la detección de la deforestación y la trazabilidad de la materia prima y sus derivados.

Apícola

Desarrollada reunión en la regional de Danlí, El Paraíso con la asistencia de 14 productores (Hombres: 10; Mujeres: 4) en el marco de la Mesa Sectorial Apícola, se logró lo siguiente.

- Formulación y consenso del Plan de Acción, en el que se describen las estrategias, actividades y cronogramas destinados a fortalecer y desarrollar el sector apícola a nivel nacional. Este plan es producto de un proceso colaborativo entre productores, representantes gubernamentales, actores claves de la cadena productiva, con el objetivo de mejorar la producción, comercialización, calidad, y sostenibilidad del sector.

- Realizar encuentro regional de productores apícolas para fortalecer la organización regional y elaborar el censo de productores.
- Gestionar un convenio de compra y venta entre productores apícolas región El Paraíso y los comercializadores nacionales.

Cadena de Aguacate

En reunión desarrollada con la participación de 38 actores (Hombres: 30; Mujeres: 8, se acordó lo siguiente:

- Conformar el comité técnico para la elaboración y revisión del Acuerdo Marco de Competitividad del rubro de Aguacate.
- La Asociación de Productores de Aguacate de Honduras (ASPAH) deberá presentar informe de liquidación de los fondos entregados.
- Presentar informe de recaudación de la producción nacional.
- Capacitaciones en temas de nutrición del cultivo de aguacates y técnicas de poda, en el departamento de Santa Barbara, beneficiando a 15 productores (11 hombre y 4 mujeres)

Cadena de Fresa

En reunión realizada con la participaron de 49 actores de la cadena de fresa (Hombres: 35; Mujeres: 14):

- 4 asociaciones de productores se articularán con el proyecto ProOccidente para recibir apoyo financiero y asistencia técnica para poner en marcha proyectos de inversión. Cabe mencionar que el proyecto ProOccidente se incorporara como actor de la cadena para brindar mejor apoyo.
- Actualizado el plan de inversión para el cultivo de fresa, el cual será entregado a BANADESA de manera oficial a través de la SAG.

PITAHAYA

Con la participación de 3 productores (Hombres: 2; Mujeres: 1) en reunión se acordó:

- Realizar capacitaciones en buenas prácticas agrícolas y manejo integrado de plagas a fin de capacitar a productores del cultivo buscando nuevos mercados.
- Convocar a los productores de pitahaya de la zona sur a una reunión para el llenado de formularios para ingresar al proyecto de capital semilla de SENPRENDE

Guayaba

En reunión realizada en la estación Experimental La Tabacalera, DICTA, Comayagua, Comayagua con la participación de: 17 personas (Hombres: 16; Mujeres: 1; Jóvenes: 0)

- Se socializará el Acuerdo Marco de Competitividad del rubro de Guayaba con productores.
- Se coordinará con el proyecto COMRURAL realizar una reunión para dar a conocer los beneficios del del proyecto y como pueden aplicar.
- Llenar formulario para participar en el programa capital semilla para las personas que deseen acceder al programa y el gestor de cadena de SAG-PRONAGRO será el intermediario para el acceso del programa.

Capacitaciones

Impartidas 6 capacitaciones a 314 productores y productoras (209 hombres y 105 mujeres) en diversos temas como:

- Manejo y Nutrición de Suelo don énfasis en Rambután y Cultivos de Diversificación, logrando el enlace de productores con organizaciones que brindan servicios técnicos, hubo intercambio de experiencias entre productores y técnicos y se fortalecieron técnicamente los rubros agrícolas del rambután, cacao y cardamomo.
- Nutrición de Aguacate y técnicas de Poda, para identificar plantas con problemas radiculares y con problemas de nutrición lo que ayudará a obtener mejores resultados en cosecha, identificar diferentes variedades de aguacate y a conocer las deficiencias en las raíces para realizar aireación de suelos y así evitar pérdidas en el cultivo.
- Con el objetivo de formalizar y legalizar a Organizaciones del Sector Social de la Economía, se benefició a la Caja Rural de Ahorro y Crédito Las Flores Los Anises en Santa Barbara
- Se emitió la Resolución de Personería Jurídica o Aprobado el informe de denominación por el órgano competente. o Recopilada documentación Personería Jurídica, Carta Poder, Certificación de Acta de Constitución, Certificación de Estatutos, Declaración Jurada y Listado de Asistencia de Socios a Asamblea Constitutiva para dicho proceso.

Asistencia Técnica

Se brindo asistencia técnica a 36 productores y productoras (5 mujeres y 31 hombres) para brindar conocimientos teóricos y prácticos de las diferentes Cadenas Agroalimentarias: Aguacate, Tilapia, Frijol, Rambután y Guayaba entre otros.

- 3 productores asistidos en temas de aguacate, Los Encinos, Intibucá, para mejorar la calidad de la fruta haciendo uso del manejo integrado de plagas (MIP), selección de plantas para evitar la pérdida a futuro, e identificar los métodos de siembra adecuados para el cultivo.
- 5 productor asistido en el manejo adecuado de cultivo de tilapia en tanques de geomembrana, mejoramiento de calidad de agua y manejo de los tanques de geomembrana para aumentar la producción de tilapia, obtener una mejor genética de los alevines de tilapia roja (red florida), mejorar el sistema de aireación de los tanques y disminuir la mortalidad por la baja de oxígeno disuelto en el agua.
- 5 personas asistidas para reducir las pérdidas de plantas haciendo uso de nuevas prácticas en el proceso de siembra, identificar plantas sanas de aguacate que provean una mejor genética Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión / Monitoreo y Seguimiento productiva, promover la aceptación del aguacate Hass en los mercados locales con la producción de frutas inocuas y rendimiento.
- Definir el volumen de frijol para comercializar con el IHMA para los ciclos de primera y postrera 2024. Asimismo, se realizaron visitas a parcelas cultivadas de frijol para evaluar la etapa fenológica y cálculos de cosecha para etapa de primera, en El Altiplano, Danlí, El Paraíso beneficiando 10 productores (Hombres: 5; Mujeres: 5; Jóvenes: 1).
- En el rubro de aguacate se asistió en manejo adecuado, selección de plantas, identificar métodos de siembra y plantas con deficiencias para ser reemplazadas con el propósito de evitar pérdidas. Beneficiando a 3 productores Ojojona y la Tigra en Francisco Morazán.
- 2 productores de la aldea de Guamiles, Silca, Olancho asistidos en el manejo adecuado de cultivo de tilapia en tanques, bajar los índices de mortalidad por Saprolegnia(hongos), Amonio (NH3), y Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión / Monitoreo y Seguimiento bajas de oxígeno utilizando de manera eficiente la calidad del agua de los estanques. Asimismo, se indicó adquirir alevines de alta calidad genética, inocuos y libres de enfermedades en los Centros de producción de tilapia Certificados por El SENASA y La DIGEPESCA.
- Asistidos 4 productores hombres de guayaba, de Playitas, Ajuterique, Comayagua en temas como: instrucción en el manejo adecuado de cultivo, selección de plantas para evitar la pérdidas a futuro, identificar los tipos de suelo para buscar soluciones técnicas como la preparación adecuada y nutrición e identificar plantas con deficiencias para ser reemplazados.

Fortalecimiento agroempresarial A PYMES

Se fortaleció a 4 MYPES del sector Agroempresarial a través de Agronegocios de los rubros de Café, Miel, Aguacate, Hortalizas, Sal, Camarón, Pitahaya, Cacao, Lácteos y Cajas Rurales, beneficiando a 104 participantes 63 mujeres y 41 hombres.

- Como parte del proceso de formalización y legalización de las organizaciones del sector social de la economía se apoyó a las cajas rurales siguientes en: Emisión de resolución de la personería jurídica a favor de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Brisas del Zapotal, Santa Bárbara, beneficiando a 21 productores (8 mujeres y 13 hombres).
- Emisión de Resolución de Personería Jurídica a favor de la Caja Rural de Ahorro y Crédito las Flores, Los Anises, Santa Barbara beneficiando a 22 productores (15 mujeres y 7 hombres).
- La “EMPRESA TIERRA INDIA, de Teupasenti, El Paraíso, integrada por 24 personas (1 Hombre. 23 mujeres, 8 jóvenes, se acordó gestionar nuevos mercados potenciales para vender el producto y llevara cabo reunión con BANADESA para identificar acceso a financiamiento.
- Se fortaleció a 37 pequeños y medianos productores (PYMES), cooperativas y grandes empresas en el marco de la FeriSAG, en el que tuvieron la oportunidad de promocionar sus productos primarios y con valor agregado de las siguientes cadenas agroalimentarias: Café, Cacao, Miel, Aguacate, Lácteos, Pitahaya, Hortalizas, Sal y Camarón.
- Se tuvo la participación de PYMES, de diferentes regiones del país, que participaron en la exponencia del Sr. Máximo Torero jefe economista de la FAO en temas de “Comercio, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible: oportunidades de mercado para pequeños y medianos productores en un entorno dinámico y de multicrisis”; en el que lograron adquirir nuevas herramientas con el fin de volverse más competitivo en el sector agroalimentario.

Talleres de Capacitación Impartido

Beneficiados 72 (Hombres 27 y Mujeres 45) a través de los talleres desarrollados en los temas de:

- Taller artesanal de vino de fruta para fomentar un valor agregado del vino.
- Elaboración de vino artesanal, incluyendo técnicas de fermentación, refinado y embotellado.
- Aplicación y dosificación de Nico Insect 6L (Insecticida botánico a base de nicotina) como alternativa para control de Megaleurothrips usitatus y otras plagas, por su efecto y bajo costo ya que se produce en el país.
- Socialización con productores de frijol del municipio de Sulaco integrados en (CRAC, CIALES, Asociaciones) que forman parte del comité regional de cadena para evaluar y revisar las propuestas de ideas de negocios a presentar al proyecto ComRural III.

Rueda de negocios

Desarrollada en El Progreso, Yoro representando una oportunidad única para impulsar el desarrollo agroalimentario de la zona, promoviendo la creación de empleo, la diversificación económica y el bienestar de la ciudadanía, buscando también la mejora en la seguridad alimentaria, con el objetivo que productores, compradores e instituciones gubernamentales que ofrecen sus servicios para los procesos de comercialización de los productos.

Plan de Negocio

- Elaborado el Plan de Negocio del cultivo de Malanga, a productores y productoras del municipio de Patuca, Olancho, beneficiando a 25 productores (12 hombres y 13 mujeres; 10 jóvenes). Se espera sembrar 50 MZ de malanga de la variedad coco/badu y la construcción de planta de procesamiento y comercialización internacional de 1,500,000 libras de tubérculo fresco durante 48 meses de producción.

- Plan de Negocio Mejoramiento Genético, a la “Caja Rural La Bendición” Los Lirios, Trojes, El Paraíso, con la participación de Productores: 20 personas (Hombres:11, Mujeres: 9,), a través del que se propone inversiones en la adquisición de pie de cría, en equipo de almacenamiento (yogos de acero inoxidable con capacidad de 40 litros), compra de semilla de pasto Brachiaria decumben,(L. 250 kilo) sorgo forrajero para elaborar silo(7 kg), picadora de pastos 3HP, Bomba de agua 6.5 hp, suplementos alimenticios (sales minerales, concentrado bovino), productos veterinarios vacunas y asistencia técnica para implementar dicho PN.
- Plan de Negocio Hortalizas, en la Finca Biodinámica Probando Ideas” **Santa Cruz, Marcala, La Paz**, para inversión en adecuación de áreas de siembra, adquisición e instalación de Sistema de riego por goteo, insumos agrícolas, asistencia técnica y acceso a mercado especializado.

FeriSAG

Realizadas 4 Ferias con la participación de 245 expositores entre jóvenes productores, emprendedores y alumnos de Institutos, Escuelas Agrícolas y Universidades

- FeriSAG Choloma se desarrolló en el Parque Central de Choloma, Cortés de 8:00 am a 4:00 pm, el sábado 20 de julio del 2024 y asistieron 88 personas, 35 mujeres, 53 hombres: lo conformaban 13 jóvenes.
- FeriSAG Sonaguera conto con la participación de 70 expositores: entre productores, procesadores y emprendedores del departamento Colon, haciendo un total de más de 1,411 expositores que han participado en las FeriSAG desarrolladas hasta la fecha, en donde han logrado comercializar sus productos y crear una relación comercial con compradores potenciales.
- FeriSAG, Marcala Se conto con la participación de 45 expositores: entre productores, procesadores y emprendedores, haciendo un total de más de 1,456 expositores que han participado en las FeriSAG desarrolladas hasta la fecha, en donde tienen un espacio para exponer y comercializar sus productos o servicios y crear una relación comercial con compradores potenciales.
- FeriSAG, El Progreso Se conto con la participación de 39 expositores: entre productores, procesadores y emprendedores del departamento, haciendo un total de más de 1,495 expositores que han participado en las FeriSAG desarrolladas hasta la fecha, en donde tienen un espacio para exponer y comercializar sus productos o servicios y crear una relación comercial con compradores potenciales.

Ejecución financiera:

La ejecución financiera al III Trimestre fue de 39.04% del presupuesto vigente, que equivale a L.19,261,537.28. No se logró completar la ejecución debido a que quedaron en proceso de pago algunos gastos administrativos y operativos

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Programa de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	52,649,038.00	49,333,215.00	19,261,537.28	39.04	30,039,021.47
Total	52,649,038.00	49,333,215.00	19,261,537.28	39.04	30,039,021.47

Fuente: SIAFI

2.4.5 Programa 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)

INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país. La ejecución física se muestra a continuación:

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 INFOAGRO

Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y pronóstico diario, disponible a la población en general.	Actualización	12	3	3	100%	9	75%
Recursos bibliográficos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de las cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible a la población en general en la biblioteca digital/ página web.	Documento	400	105	75	71%	245	61%
Publicación de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas de los rubros maíz, frijol y sorgo difundida en la página web de la SAG, en beneficio de los productores/as.	Publicación	2	1	1	100%	3	150%
Módulo de desempeño de Recursos humanos creado, que facilite la automatización de los servicios a los usuarios de SAG	Cantidad	1				1	100%
Talleres de capacitación de las herramientas ofimáticas impartidas.	Talleres de Capacitación	1	1	1	100%	1	100%
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Dirección en Tecnologías de la Información							
Información agrometeorológica seleccionada.	Reporte	32	9	9	100%	20	63%
Actualizada la plataforma del pronóstico diario del tiempo (días laborables) en la página web.	Actualización	196	54	61	113%	156	80%
Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados	Documento	220	60	49	82%	142	65%
Eventos desarrollados en la socialización de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas.	Evento de Capacitación	5	2	2	100%	4	80%
Plan de capacitación elaborado.	Plan	1	-	-	-	-	-

Descripción de los logros

- Actualizado el reporte Agro-Meteorológico, el cual tiene como objetivo presentar las condiciones meteorológicas en las principales zonas productoras de granos básicos de Honduras.
- Actualizada la página web de la SAG, con información agrometeorológica, suelos e información del sector agroalimentario en los enlaces <https://infoagro.sag.gob.hn/agrometereologia/>, <https://sag.gob.hn/soilfer/>, <https://sag.gob.hn/suelos-de-honduras/> alcanzando en agosto 2024 un total de visitas de 33,156 usuarios.
- Recopilación de recursos bibliográficos en temas de frutales, agrometeorología, porcicultura, leyes agropecuarias, café, riego y drenaje, vegetales orientales. Las visitas por los usuarios a estos recursos fueron de 41,423 vistas, los temas de mayor interés los siguientes:

Recursos bibliográficos	Visitas
Introducción a la agronomía (Borja Vivero, Juan)	80
Manual como Organizar Cajas de Ahorro y Crédito Rural	54
Manual técnico del cultivo del aguacate Hass (Persea americana L.) (Alfonso Bartoli, José Angel).	56
Manual de Administración y Contabilidad en Las Cajas De Ahorro y Crédito Rural.	54
Cosecha de Agua: Para producir y enfrentar las sequías.	32
Listado de plaguicidas y sustancias a fines registrados en Honduras.	59
Organización y Funcionamiento de la Caja Rural (FAO et al).	31
Acuerdo N° 018-93 Reglamento general de la Ley de Municipalidades (Republica de Honduras).	30
Manual de producción de cebolla (Arias, Salvador et al).	29
Manual de Normas Básicas de Bioseguridad de una Granja Avícola (Federico, Francisco J.).	69
Los temas más consultados son Abonos orgánicos (Gómez, David et al).	116
Abonos orgánicos (Gómez, David et al).	61
LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (Republica de Honduras).	51
Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y Sequía (PAN-LCD) 2014-2022.	49
Manual como Organizar Cajas de Ahorro y Crédito Rural.	54
Manual técnico del cultivo del aguacate Hass (Persea americana L.) (Alfonso Bartoli, José Angel).	56
Manual de Administración y Contabilidad en Las Cajas De Ahorro y Crédito Rural.	54
Cosecha de Agua: Para producir y enfrentar las sequías.	32
Listado de plaguicidas y sustancias a fines registrados en Honduras.	59
Organización y Funcionamiento de la Caja Rural (FAO et al).	31
Acuerdo N° 018-93 Reglamento general de la Ley de Municipalidades (Republica de Honduras).	30
Manual de producción de cebolla (Arias, Salvador et al).	29
Manual de Normas Básicas de Bioseguridad de una Granja Avícola (Federico, Francisco J.).	69

Ejecución Financiera

La ejecución financiera acumulada al III trimestre fue de 62.77% (L 10,198,294.14) como se muestra en el cuadro siguiente, cabe mencionar que la transferencia a FHIA fue realizada en el mes de agosto, sin embargo, FHIA recibió los fondos el 20 de septiembre en vista que procuraduría según reglamento tiene hasta 45 días para efectuar los depósitos.

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos INFOTECNOLOGÍA
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	20,431,650.00	16,248,307.00	10,198,294.14	62.77	4,333,459.02
Total	20,431,650.00	16,248,307.00	10,198,294.14	62.77	4,333,459.02

Fuente: SIAFI

2.4.6 Programa 22 – Competitividad Rural

2.4.6.1. Proyecto de inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático. Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia.

Ejecución Física

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROINORTE

Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Campañas de difusión con información Agroclimática articulada y difundida a los productores y productoras.	Cantidad	2	-	-	-	2	100%
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e Innovación.							
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados	Plan	50	32	32	100%	50	100%
Desarrollo Productivo y Resiliencia							
Mesas Agroclimáticas regionales Conformadas (mancomunidades, productores).	Cantidad	2	1	1	100%	3	150%

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros

- Formulados 32 Planes de Fortalecimiento Organizacional (PFO) por el equipo técnico multidisciplinario y las organizaciones de productores usuarios los planes de fortalecimiento organizacional (PFO) para las organizaciones de productores, los grupos de jóvenes y mujeres y los grupos ambientales seleccionados.

- Conformadas 1 mesa agroclimática Regional en del Departamento de Olancho, en los municipios, La Unión, Jano, Yocón, El Rosario, Mangulile, y Guata, con el objetivo de realizar análisis permanente, elaborar alertas tempranas mediante recomendaciones técnicas sobre la perspectiva climática de la temporada de siembra.
- Elaboración de diagnósticos territoriales para priorización de cadenas de valor y organizaciones productivas en la evaluación de expresiones de interés de los oferentes que participaron en esta etapa y se tiene planificado próximamente lanzar la solicitud de propuesta.
- En proceso de conformación de 2 plataformas sectoriales atendidas: 1 comité regional de la cadena de frijol en el departamento de Olancho y 2 comité de cadena de cacao de la zona atlántica; con ambas organizaciones se están discutiendo los temas de coordinación con PROINORTE.
- En seguimiento a las 84 organizaciones de productores(as) que presentaron solicitud al proyecto, se encuentra en proceso de aprobación para fortalecer las capacidades y seleccionar a cuáles se les formulara un Plan de Negocio.
- En procesos de revisión los términos de referencia para la contratación de la consultoría para la ejecución del desarrollo de fondo concursable de innovación estratégica.
- Identificadas las necesitadas de talento para algunas de las organizaciones atendidas por el proyecto y con candidatos para optar a las becas.
- Firmado memorándum de entendimiento con las 22 municipalidades de intervención del proyecto como paso previo a la adquisición y dotación del kit de herramientas tecnológicas para las UMAs, asimismo se han realizado reuniones con el ICF y SERNA para la provisión de servicios de capacitación técnicas, ambiental y climática.

Ejecución Financiera

La ejecución financiera del Proyecto fue de 19.37% equivalente a L 23,286,203.34 el cual corresponde a gastos operativos. La meta financiera no se logró debido a que se está en proceso de contratación de la empresa consultora que formularan los planes de negocio, de esto depende la identificación de los caminos rurales a rehabilitar, con la implementación de los planes de negocios.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales (PROINORTE)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	12,059,271.00	12,059,271.00	5,431,751.32	45.04	6,627,519.68
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	59,975,307.00	56,424,023.00	17,854,452.02	31.64	34,162,408.23
Fuente 21: Crédito Externo OFID	51,753,516.00	51,753,516.00	-	0.00	51,753,516.00
Total	123,788,094.00	120,236,810.00	23,286,203.34	19.37	92,543,443.91

Fuente: SIAFI

2.4.6.2. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad Pro-Occidente 22.14

El proyecto objetivo de incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria. La zona de intervención del Proyecto son los 88 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz.

Ejecución Física

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROOCCIDENTE

Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Desembolso para créditos y garantías otorgados a productores/as rurales a través de BANHPROVI.	Lempira	50,000,000	20,000	-	-	-	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Fortalecimiento del Desarrollo Productivo							
Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto.	Plan de Inversión	50	25	-	-	25	50%
Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición.	Asistencia Técnica	100	40	-	-	30	30%
Acceso a Financiamiento							
Monto de créditos y garantías trasferido a BANHPROVI.	Lempira	50,000,000	20,000,000	-	-	-	-

Descripción de los logros:

- Identificados y evaluados preliminarmente 9,848 productores en 74 municipios de intervención que podrían cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en el ROP.
- Priorizadas cinco (5) microcuencas que serán intervenidas por la firma sub implementadora. A nivel de borrador el formato de convenio de cooperación, con las mancomunidades COLOSUCA y CAFEG en el departamento de Lempira, incluyendo la identificación de las formas de fortalecimiento y dotación de equipo para cada Mancomunidad. Asimismo, se brindó asistencia y capacitación en manejo y conservación de microcuencas a 309 beneficiarios de los cuales 217 son hombres (70%), 46 son mujeres (30%), 37 hombres jóvenes y 9 mujeres jóvenes (14%)
- Visitados y evaluados 213 grupos de productores con sistemas de riego que fueron atendidos preliminarmente por ACS-USAID y MERCADO, de los cuales se preseleccionaron 163 grupos integrados por 5,349 productores que cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en el ROP.
- Realizados 297 eventos de asistencia técnica y capacitación en las áreas de producción, acceso a financiamiento y mercados, en los 6 departamentos con la asistencia de 3,641 productores, de los cuales el 77.8% fueron hombres y el 22.2% mujeres. Del total de productores, el 13.0% fueron jóvenes.
- Realizados 23 eventos de asistencia técnica y capacitación en los 6 departamentos en el área de acceso a financiamiento con la participación de 473 productores que integran 16 grupos de beneficiarios del proyecto, de los cuales 342 (72.3%) son hombres y 131 (27.7%) mujeres.
- Asistencia Técnica en Desarrollo Productivo y MiPyMEs: 2,889 productores de los cuales 1,944 son hombres (67%) y 945 son mujeres (33%), la participación de los jóvenes es 14% (251 hombres jóvenes y 147 mujeres jóvenes); o Asistencia Técnica en Gestión de Crédito brindada a 409 productores de los cuales 291 son hombres (71%), 118 son mujeres (29%), La participación de los jóvenes es del 15% (43 hombres jóvenes y 18 mujeres jóvenes); o En Asistencia Técnica en Nutrición, se ha brindado capacitación a 1,685 beneficiarios de los cuales 1,137 son hombres (67%), 548 son

mujeres (33%), la participación de los jóvenes es del 12% (106 hombres jóvenes y 95 mujeres jóvenes).

- Revisados los datos obtenidos en la visita de campo a la línea de conducción del sistema de riego de Otolaca, La Campa, Lempira, con 46 socios, 40 hombres y 6 mujeres, los cuales producen granos básicos, hortalizas en estructuras protegidas, aguacate, café, plátano y cebolla.

Limitantes

Se ha continuado con el proceso de formulación de la nueva propuesta de implementación del componente No 1, de forma conjunta con la especialista en formulación del proyecto del BID, se han evaluado al menos cuatro (4) escenarios, que han sido revisados y están en proceso de evaluación por parte del BID/UAP y SEFIN.

Ejecución Financiera

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad Pro-Occidente (PROOCCIDENTE) (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo ICO	29,598,300.00	25,548,300.00	-	0.00	25,548,300.00
Fuente 21: Crédito Externo BID	186,952,870.00	191,002,870.00	74,074,989.15	38.78	73,747,714.68
Fuente 22: Donaciones Externas BID	4,250,000.00	4,250,000.00	-	0.00	4,250,000.00
Total	220,801,170.00	220,801,170.00	74,074,989.15	33.55	103,546,014.68

Fuente: SIAFI

La meta financiera no se ejecutó en su totalidad debido a que se está en proceso de la elaboración de los términos de referencia TdR para lanzamiento de los servicios de consultoría, asimismo, se está a la espera de la firma del contrato entre SAG y BANPROVI.

2.4.6.3. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) 22.15

Con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados/as para incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras. El área de influencia será en los departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

El ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA- 6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020. El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 COMRURAL II

Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	112	42	-	-	8	7%
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales							
Planes de Negocios orientados a la Agricultura de Subsistencia aprobados en acuerdos de subvención	Plan de Negocio	90	30	-	-	-	-
Planes de negocios orientados a la Agricultura en transición aprobados por Comité Directivo	Plan de Negocio	20	10	-	-	8	40%
Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Asistencia Técnica	60	20	-	-	20	33%

Fuente: SIAFI

Avances

- Revisión de productos y solicitudes de desembolsos de las Organizaciones de Productores Rurales (OPRs),
- Seguimiento a las Transferencias No Reembolsables (TNRs) correspondientes a los Planes de Negocios (PNs) ratificados y aprobados,
- Realización de la Misión de Supervisión y apoyo en la implementación del proyecto, llevada en conjunto con Banco Mundial (BM) y Secretaría de Finanzas (SEFIN),
- Reuniones de Trabajo con SERNA y SENPRENDE para levantamiento de Línea base de indicadores referente al Componente 2 del proyecto apoyo a la modernización del entorno propicio a los agronegocios de Honduras,

Ejecución Financiera

Como se puede observar en el cuadro siguiente la ejecución financiera al III trimestre fue de 37.86% equivalente a L 83,660,999.96, esto se debe a que aún se encuentra en proceso de contratación de la Firma Consultora Implementadora (FCI); dividida en 2 subregiones Occidente y Sur. Así mismo se encuentra en proceso la contratación de la FCI en función de la ampliación de alcance geográfico de la Ventana 1 Agricultura en subsistencia. El comité directivo reprogramó la reunión para el mes de octubre 2024, para la aprobación y ratificación de 12 nuevos planes de negocios bajo la ventana 2, agricultura en transición

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto Integrado la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL II) (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM	147,358,209.00	220,978,549.00	83,660,999.96	37.86	134,156,533.65
Total	147,358,209.00	220,978,549.00	83,660,999.96	37.86	134,156,533.65

Fuente: SIAFI

2.4.6.4. Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III) 22.16

El proyecto contribuirá el acceso a mercados, la adopción a prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, la creación de empleos para apoyar a beneficiarios del proyecto en cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas; y en caso de una crisis o emergencia elegible responder efectivamente a ello. El ComRural III apoya a las iniciativas agroindustriales competitivas, innovadoras, con resiliencia climática y nutricionalmente inteligentes (subproyectos o planes de negocios) en cadenas de valor agroalimentarias prioritarias bajo un modelo de alianzas productivas.

Este proyecto se focaliza en 17 Departamentos de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Valle y Yoro cubriendo casi la totalidad del territorio nacional. Y el Financiamiento Adicional se enfoca exclusivamente en el Departamento de Gracias a Dios.

Avances

- Identificación de Iniciativas de Negocio: Evaluación y selección de iniciativas de negocios viables para ser financiadas bajo los criterios establecidos del proyecto.
- Plan Operativo Anual (POA), Plan de Adquisiciones (PAC) y Estrategia de Adquisiciones 2024 No Objetado,
- En proceso de contratación de las Firms Consultoras Implementadoras (FCI) para ventana 1 Agricultura de subsistencia y ventana 4 Financiar servicios Agrologísticos y agropecuarios complementarios a pequeña escala, en la región del proyecto y una firma consultora para la región de la Moskitia, asegurando que cumplan con los estándares técnicos y operativos requeridos.
- Establecimiento de Mecanismos de Monitoreo y Evaluación: Creación de sistemas de seguimiento y evaluación para medir el impacto y progreso de las actividades del proyecto, garantizando la alineación con los objetivos estratégicos
- Fortalecimiento de Alianzas Estratégicas: Colaboración con entidades locales para optimizar la implementación de las actividades del proyecto y maximizar el impacto en las comunidades beneficiarias.
- Se lanzó una convocatoria de empresa consultora para la ventana 2 Agricultura en transición, la cual a la fecha se han recibido dos perfiles de negocios para su evaluación.
- En cuanto a la Ventana 4. Financiar servicios Agro logísticos y agropecuarios complementarios a pequeña escala, se encuentran en proceso de revisión en conjunto con el BM sobre la definición del concepto que orientara al fortalecimiento de las cadenas locales de suministro de alimentos, promoviendo la seguridad alimentaria y la inclusión de las comunidades en las zonas de intervención;
- En el componente II Fortalecimiento Institucional para Mejorar el Entorno de los Agronegocios, se ha continuado en reuniones mensuales en Comité Habilitador de Ambiente de Agronegocios (CHAA) y

en misión de implementación el avance que se ha tenido por las instituciones son las propuestas de inversión.

- Reuniones realizadas en seguimiento a la discusión de los estándares ambientales y sociales aplicados a las actividades que implementara el PMA, para proceder a la firma del Convenio PMA.
- Se está llevando a cabo el proceso de la contratación para la selección de la firma implementadora en la región de la Moskitia.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos COMRURAL III
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM	195,619,582.00	121,999,242.00	514,166.92	0.42	121,479,739.08
Fuente 22: Donación Externas AIF		53,125,000.00		0.00	53,125,000.00
Total	195,619,582.00	175,124,242.00	514,166.92	0.29	174,604,739.08

Fuente: SIAFI

2.4.7 Programa de Seguridad Alimentaria – 23.00

2.4.7.1 Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional – 23 – A/O 02

Garantizar la implementación de acciones de la Política y Estrategia Nacional de Seguridad alimentaria y Nutricional para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de la población.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)							
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) funcionando para acciones estratégicas de vigilancia y promoción de la SAN a nivel nacional.	Informe	2	-	-	-	1	50%
Instituciones gubernamentales incorporando acciones de la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional (SAN).	Informe	2	-	-	-	1	50%
Seguimiento a la Implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISAN.	Informe	4	1	1	100%	2	50%

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)							
Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de dialogo y coordinación (Golfo de Fonseca, Valles de Olancho, Comayagua, Región Lempa) y reactivadas (Valle de Sula, Región Valle de Aguan, Región 11 el Paraíso, Región 03 Santa Rosa de Copan).	Informe	11	3	2	67%	6	55%
Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISESAN), operando.	Informe	2	-	-	-	1	50%
Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN Desarrollo Local.	Informe	2	-	-	-	1	50%
Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras.	Informe	1	-	-	-	1	100%
Coordinación de la Ejecución del IX Censo de Talla en Escolares.	Informe	1	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

Descripción de logros:

- Realizada la primera reunión preparatoria para la reactivación del Comité Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), donde se acordó enviar a la Presidencia de la República la propuesta de decreto PCM para la readecuación del Sistema de Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) que incluye el CONASAN, COTISAN Y COVISAN.
- Participación en la reunión de la mesa Regional de seguridad alimentaria y nutricional y agroclimática de la Región Golfo de Fonseca en el marco de su plan de trabajo.
- En coordinación con el proyecto PROINORTE, se brindó acompañamiento a las mesas agroclimáticas del Paraíso con apoyo técnico en jornadas de capacitación de seguridad alimentaria nutricional, de manera virtual y presencial en la formación de las mesas agroclimáticas de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Olancho (MAMNO).
- Presentado a la Máxima Autoridad SAG, gobierno y actores SAN el proceso de realización del IX Censo de Talla en escolares, presentando la metodología validada por la Secretaría de Educación y realizada la prueba piloto.
- Realizado en lanzamiento del diplomado en seguridad alimentaria y nutricional en conjunto con la Mancomunidad Trinacional Lempa.
- Remitido el informe del tramo variable de EUROSAN DEL a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Externa para remisión a la delegación de la Unión Europea.
- Realizado el segundo taller y seguimiento al cronograma de trabajo del diseño de las guías alimentarias en Honduras con el apoyo del INCAP y otras instituciones de gobierno.

- En coordinación con el observatorio de Seguridad Alimentaria (OBSAN) de la UNAH, mancomunidad MANCEPPAZ y Rikolto se realizó el levantamiento de 125 encuestas en los municipios de Santiago de Puringla, Santa María, San Pedro de Tutule, Marcala, Chinacla y San José para la elaboración del diagnóstico alimentario y plan de capacitación en nutrición.
- Participación en la presentación al comité de Seguridad Alimentaria de los resultados del análisis CIF y la actualización del Plan SAN CELAC.

Ejecución Financiera

La ejecución financiera fue de 51.37% (L.7,337,849.78) del presupuesto vigente, dicha ejecución no se cumple en vista que existen plazas pendientes de contratación.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	15,868,200.00	14,283,518.00	7,337,849.78	51.37	6,870,069.22
Total	15,868,200.00	14,283,518.00	7,337,849.78	51.37	6,870,069.22

Fuente: SIAFI

2.4.7.2 Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores – 23.00-002

El Programa Bono Cafetalero, con el objetivo de mejorar los ingresos de las familias cafetaleras pequeñas y medianas, mediante el mantenimiento de la productividad del área cultivada de café, mediante el apoyo a la fertilización de las fincas y el acompañamiento con asistencia técnica y capacitación.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Café

Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Bono Cafetalero entregado a pequeños y medianos productores y productoras de café	Bono	90,000	6,000	6,000	100%	6,000	7%
Kit bono cafetalero comprados.	Kit	90,000	-	-	-	-	-
Capacitación brindada a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Evento de Capacitación	500	300	-	-	500	100%
Diagnósticos productivos en fincas de Pequeños y Medianos Productores y productoras de café.	Finca	2,500	500	500	100%	500	20%
Kit para estructura de vivero de café entregado a Alcaldías y organizaciones de productores (malla, alambre, bolsa).	Kit	100	-	-	-	185	185%

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Café

Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Kit de podas para café entregado a grupos de productores y productoras (motosierra, bomba motorizada, corta seto, chapeadora).	Kit	1000	-	-	-	973	97%
Kit para secadora solar de café entregado a productores y productoras. (tubería, plástico UV, tornillos, zaran, varilla).	Kit	300	-	-	-	300	100%

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros:

- Entregados 6,000 bonos cafetaleros a pequeños productores y productoras, beneficiando a 1,417 mujeres y 4,583 hombres.
- Realizados 500 diagnósticos productivos en fincas, beneficiando a 500 pequeños y medianos productores y productoras de café.

Ejecución Financiera

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Bono Cafetalero (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-
Total	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	-

Fuente: SIAFI

2.4.7.3 Bono Tecnológico Productivo

El BTP brinda un incentivo económico al pequeño productor(a) de granos básicos, que beneficia particularmente aquellos pequeños productores de subsistencia que no tienen acceso al financiamiento bancario, ni a la asistencia técnica. Para este III Trimestre se presentan la siguiente ejecución física y financiera.

Descripción de los logros

- Entregados 96,855 Bonos Tecnológicos Productivos, los cuales beneficiaron a 47,458 mujeres y 49,397 hombres, brindando insumos agrícolas como semilla de frijol, maíz, sorgo, fertilizantes, entre otros elementos necesarios para mejorar la productividad del sector agrícola.
- Brindadas 1,793 asistencias técnicas, beneficiando a 914 mujeres y 879 hombres.
- Entregadas 34,170 plántulas de frutales, beneficiando a 17,426 mujeres y 16,744 hombres

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Tecnológico Productivo (BTP)

Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	350000	-	96,855	101%	223,355	64%
Quintales de fertilizantes de formula comprados.	Quintal	400000	-	-	-	240,000	60%
Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	4000	1,800	1,793	99.6%	2,781	70%
Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	88000	-	-	-	50,800	58%
Kits fitosanitarios entregados (fungicida, insecticida, foliar).	Kit	252500	-	-	-	176,000	70%
Plántulas de frutales entregados.	Plántula	80000	20,000	34,170	171%	52,530	66%

Fuente: SIAFI

Ejecución Financiera

Para el III Trimestre la ejecución financiera fue de 50% del presupuesto vigente, el cual equivale a L 500,000,000.00., completando la ejecución de lo programado anual en un 100%.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Bono Tecnológico Productivo (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-
Total	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	-

Fuente: SIAFI

2.4.7.4 Bono Ganadero

Con el fin de optimizar los hatos ganaderos mediante el mejoramiento genético de alta calidad y alimentación del ganado de carne y leche, para el incremento de la producción y productividad y generar valor agregado a las unidades de producción de leche de pequeños productores organizados para el acceso a nuevos mercados y generación de ingresos.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Ganadero

Descripción Producto Final	Avance Físico en el III trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Bono de semilla de pasto entregado a pequeños productores y productoras de ganado.	Bono	9,000	5,000	5,000	100%	5,000	56%
Escuelas de Campo Formadas con Pequeños Productores y Productoras de Ganado.	Cantidad	125	50	50	100%	50	40%

Descripción Producto Final	Avance Físico en el III trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Paquetes de 4 kilos de semilla de pasto comprados.	Paquete	9,000	5,000	5,000	100%	5,000	56%
Asistencia técnica brindada a Productores y productoras de ganado.	Asistencia Técnica	500	500	500	100%	500	100%

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros

- Entregados 5,000 Bonos de Semilla de Pasto, beneficiando la misma cantidad de pequeños productores y productoras siendo 964 mujeres y 4,036 hombres, brindando insumos agrícolas como semilla de frijol, maíz, sorgo, fertilizantes, entre otros elementos necesarios para mejorar la productividad del sector agrícola.
- Brindadas 500 asistencias técnicas, beneficiando a 500 pequeños productores y productoras (65 mujeres y 435 hombres).
- Formadas 50 escuelas de campo beneficiando a 1,212 (255 mujeres y 957 hombres) pequeños productores y productoras de ganado en los Departamentos de: Comayagua, Colon, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá y La Paz.
- Comprados 5,000 Paquetes de 4 kilos de semilla de pasto para la entrega de bonos se semilla de pasto.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Bono Ganadero (En Lempiras)					
FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-
Total	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-

Fuente: SIAFI

2.4.7.5 Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

El proyecto se ejecuta con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras, como ser los municipios de La Venta y Curaren, departamento de Francisco Morazán; Intibucá, departamento de Intibucá; La Paz, departamento de La Paz; Nacaome, departamento de Valle.

Principales Logros:

- Aprobada la reestructuración del Proyecto por el Banco Mundial, mediante la segunda enmienda al acuerdo de crédito, que incluye la ampliación de tiempo de 23 meses, con la fecha de cierre al 30 de noviembre del 2027.
- El Banco Mundial dio la No Objeción el 23 de septiembre a los TdR para la contratación de un consultor que realizará el diagnóstico para la rehabilitación del radar que brindar información hidroclimática.
- Elaborado el Diagnóstico del Estado Actual de la Red de Estaciones Hidroclimatológicas en la Cuenca Nacaome.

- Avance en la contratación del personal del proyecto. En el tercer trimestre se logró la contratación de tres personas más. A la fecha el proyecto ha contratado a 8 personas en lo que va del año.
- Se logró la firma de los convenios entre la SAG, Alcaldías y juntas de agua/ juntas de regantes de los municipios Intibucá, La Paz y La Venta con lo que espera beneficiar a 36,760 personas con acceso a agua potable y riego.
- Actualización de los diseños y estudios de evaluación de impacto de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS). En este momento, se recibieron propuestas de tres empresas consultoras para las actualizaciones de los diseños de los de los SIAS. Actualmente se están realizando las evaluaciones. Se espera adjudicar el contrato a la firma seleccionada para finales de NOV2024. Para el proceso de actualización de los estudios de impacto ambiental, se recibieron 8 expresiones de interés, también en proceso de evaluación.

Ejecución Financiera

Para el III Trimestre del 2024 la ejecución financiera fue de 6.75%, en vista que el proceso de contratación de la empresa que desarrollará la consultoría se encuentra en evaluación de propuestas técnicas. Asimismo, no se logró efectuar el pago de la compra de tres vehículos ya que la empresa se ha tardado en realizar la entrega y se encuentra en proceso de contratación del consultor que elaborará el plan de capacitación, ya se evaluaron los CV y la consultoría está por iniciar en octubre.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM	220,718,928.00	128,718,928.00	8,689,394.15	6.75	112,212,646.33
Total	220,718,928.00	128,718,928.00	8,689,394.15	6.75	112,212,646.33

Fuente: SIAFI

2.4.7.6 Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

El Proyecto tiene por objetivo de desarrollo mejorar la calidad y eficiencia de prestación de los servicios provistos por los Prestadores Urbanos de Servicios de Agua Potable (PUSAPs) y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19 en sus cabeceras municipales.

Avance de procesos:

- Contratación de 4 especialistas, un asistente técnico para la UGP y 3 Asistentes Técnicos Municipales para apoyar al ERSAPS con el objetivo de acelerar la ejecución del Proyecto. Se contrató el conductor para el ERSAPS.
- Se lanzaron los procesos de licitación para la rehabilitación de agua urbana de los proyectos: Puerto Cortés y la Paz, este último lanzado por segunda vez.
- Se lanzó la Licitación Pública Nacional del proceso de compra de “Adquisición de Radares de Penetración de Suelo y Servicios de Capacitación”.
- Realizada la entrega de insumos de bioseguridad: gel, mascarillas, alcohol, cloro, amoniaco, guantes latex, trajes de bioseguridad, liquido desinfectante para piso, escobas, entre otros, a las Municipalidades de: Comayagua, Las Lajas, San Esteban, San Francisco de La Paz, Juticalpa, Teupasenti, Trujillo y La Ceiba, en cumplimiento del Subcomponente 1.5, actividades descritas en los

ítems 1.5.1 y 1.5.7; indicador de Objetivo de Desarrollo OD-5 e Indicador Intermedio en la Mejora de la Prestación de abastecimiento de agua en zonas urbana RI-09 de la Matriz de Resultados.

- Firmado el convenio para Fortalecimiento de Agua Urbana con el ERSAPS para beneficiar a más de 125,000 familias.

Ejecución Financiera

- La ejecución física y financiera no se alcanzó debido a que aún se encuentra en proceso de licitación de las obras de rehabilitación de sistema de agua potable en zonas urbanas de La Paz y Danlí, se tiene en proceso de licitación las obras de Puerto Cortes y La Paz.
- Asimismo, el mercado local ha demostrado limitaciones financieras para participar en licitaciones de proyectos significativos, especialmente en municipios como La Paz, Danlí y Puerto Cortés. Se ha adaptado la estrategia de licitación para facilitar la participación de empresas locales mediante la separación de contratos de obra civil y equipamiento.

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento del Agua Urbana (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo BM	117,500,008.00	117,500,008.00	22,374,996.68	19.04	90,590,619.51
Total	117,500,008.00	117,500,008.00	22,374,996.68	19.04	90,590,619.51

Fuente: SIAFI

2.4.7.7 Proyecto Alianza para Corredor Seco (GAFSP PROSASUR) – 23.03

Proyecto orientado a promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y fortalecimiento de centros comunales de salud y el fortalecimiento de grupos de productores, que pueden escalar a temas de competitividad y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo de corredor seco.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) PROSASUR							
Descripción Producto Final	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), Planes de Negocios Agrícolas (PNA) y Planes de Negocio No Agrícolas (PNNA) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	339	339	278	82%	278	82%
Planes comunitarios de Higiene en el Hogar (PHH) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema con niños menores de 5 y 2 años y/o madres embarazadas del corredor seco.	Plan	11	10	-	-	-	0%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el III Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Producción de alimentos y generación de ingresos, sub-proyectos, clúster 1.							
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FA, Clúster 1	Kit	500	250	250	100%	250	50%
Producción de alimentos y generación de ingresos, sub-proyectos, clúster 2.							
Kit de bienes productivos (Bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PSAN. FO Clúster 2	Kit de Riego	313	312	276	88%	276	88%
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PNNA. FO Clúster 2	Kit	16	16	2	13%	2	13%
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PNA. FO Clúster 2.	Kit	500	250	250	100%	250	50%
Educación nutricional e higiene del hogar, asistencia técnica, clúster 2.							
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Cluster 2	Asistencia Técnica	2,500	625	1,243	199%	1,875	75%
Producción de alimentos y generación de ingresos asistencia técnicas clúster 1.							
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FA, Cluster 1	Asistencia Técnica	1,000	500	500	100%	500	50%
Educación nutricional e higiene del hogar, sub-proyectos, clúster 1.							
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Clúster 1	Asistencia Técnica	2,500	625	1,243	199%	1,875	75%
Producción de alimentos y generación de ingresos, asistencias técnicas, clúster 2							
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FA, Cluster 2	Asistencia Técnica	1,000	500	500	100%	500	50%

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros

- Entrega de kit de bienes productivos Kits con Bomba de Mochila, Cal Dolomita, Fertilizante Foliar granular 20-20-20, Fertilizante Granulado 12-24-12, Fertilizante Granulado 18-46-00, Fungicida, Insecticida y Semilla de Mejorada maíz.
- 278 planes de negocios que incluye Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), Planes de Negocios Agrícolas (PNA) y Planes de Negocio No Agrícolas (PNNA) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.

Ejecución Financiera

La ejecución financiera al III trimestre fue de **55.74%** del Presupuesto Vigente, equivalente a L 76,83,451.18 sin embargo, la misma se vio afectada debido a que algunas propuestas no cumplieron con los criterios del Manual de Subproyectos. Asimismo, el Consultor Implementador reprogramó la meta física para el IV trimestre y el pago se realizará una vez finalizado el entregable

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos Alianza Corredor Seco (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donación GASFP/BM	137,029,729.00	137,029,729.00	76,383,451.18	55.74	58,682,213.14
Total	137,029,729.00	137,029,729.00	76,383,451.18	55.74	58,682,213.14

Fuente: SIAFI

2.4.8 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo.

Este programa realiza las transferencias que, a través de la SAG, se asigna a instituciones y organismos del sector público, privado y externo, de acuerdo con los convenios en vigencia. Estos fondos se destinan para el fortalecimiento institucional y para ejecutar programas y proyectos de las instituciones a las cuales se les realizan las transferencias.

Ejecución Financiera por el Tipo de Fondo de las Transferencias (En Lempiras)

Beneficiario	Transferencias	Ejecución Presupuestaria al III Trimestre				
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al III Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
500	Instituto Nacional Agrario	515,387,802.00	515,387,802.00	372,140,469.42	72.21	143,247,332.58
511	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	186,599,482.00	186,599,482.00	113,863,833.00	61.02	72,735,649.00
703	Universidad Nacional de Agricultura	594,096,025.00	614,596,025.00	400,528,504.00	65.17	214,067,521.00
901	Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	6,776,513.00	6,776,513.00	-	0.00	6,776,513.00
903	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	1,418,094,947.00	1,418,094,947.00	724,752,447.00	51.11	693,342,500.00
TOTALES		2,720,954,769.00	2,741,454,769.00	1,611,285,253.42	58.77	1,130,169,515.58

Al III Trimestre el programa de Transferencias ejecutó el **58.77%** de su presupuesto vigente; cabe mencionar que se le transfirieron fondos a un total de 4 instituciones públicas como: Instituto Nacional Agrario, Universidad Nacional de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) y a Banco Nacional de Desarrollo Agrícola.

Del presupuesto vigente de la transferencia que se realiza al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) L.693,342,500.00 a la fecha la Tesorería General de la Republica no ha identificado los fondos para que se realice el pago.

III. GÉNERO

Considerando lo establecido en el III Plan de Igualdad y Justicia de Género (PIJGH), el Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2023-2033, instrumento que contiene las principales necesidades y demandas de las mujeres como titulares de derechos, para reforzar los logros y avanzar en forma sostenida hacia la igualdad plena entre mujeres y hombres, en el cual insta a todas las instituciones de la Administración Pública a coordinar esfuerzos y asignar recursos técnicos y financieros, en respeto a los compromisos internacionales adquiridos por el estado en materia de derechos humanos de las mujeres.

Adicional, en cumplimiento al Artículo 261 de las Disposiciones Generales del presupuesto 2024; El Presupuesto de Género es una herramienta democrática de acción afirmativa en la asignación de recursos destinados para poner en marcha acciones para cerrar la brecha de discriminación entre hombres y mujeres, garantizando que los fondos sean empleados de manera ecuánime desde la óptica de género.

A continuación, se presenta un cuadro de beneficiarios a través de las acciones que realizan los programas y proyectos SAG, durante el III trimestre 2024 se atendieron un total 252,366 productoras y productores del sector agroalimentario, de los cuales 121,343 son mujeres y 131,023 hombres.

Productores y productoras beneficiadas año 2024						
Programas y Proyectos	III Trimestre 2024			Acumulado 2024		
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
PRONAGRI	149	321	470	464	1,183	1,647
PDABR	98	99	197	98	99	197
Pesca y Fomento a la Acuicultura	399	3,023	3,422	954	8,559	9,513
PRONAGRO	596	843	1,439	1,119	2,098	3,217
ComRural	-	-	-	219	432	651
Bono Tecnológico productivo	110,297	113,058	223,355	174,555	175,300	349,855
Bono Cafetalero	1,418	4,582	6,000	3,711	12,132	15,843
Bono Ganadero	964	4,036	5,000	964	4,036	5,000
INFOTECNOLOGIA	40	112	152	105	328	433
PROINORTE	933	1,446	2,379	933	1,446	2,379
PROSASUR	6,449	3,503	9,952	6,996	4,220	11,216
TOTAL	121,343	131,023	252,366	190,118	209,833	399,951

IV. Conclusiones:

- El presupuesto vigente al III trimestre fue de L. 6,431,997,397.00 de los cuales se ejecutaron L. 3,368,768,269.42 que representan el 52.38% del presupuesto global. El presupuesto está consignado en **42.62% (L. 2,741,769.00)** a las transferencias que la SAG realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, el **38.47% (L.2,474,601,908.00)** a los programas regulares y el **18.9% (L.1,215,940,720.00)** a los proyectos de inversión. Asimismo, está compuesto por cuatro fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales (**56.36%**), Fondos Propios (**0.29%**), Crédito Externo (**40.01%**), Donaciones Externas (**3.02%**) y **Donaciones Internas (0.32%)**.
- El presupuesto de la SAG está compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales **56.36%**, Fondos Propios (**0.29%**), Crédito Externo (**40.01%**), Donaciones Externas (**3.02%**) y Donaciones Internas (**0.32%**). Del monto total ejecutado en el III Trimestre, corresponden **L. 1,611,285,253.42** a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo que representa un **47.83%** del presupuesto total ejecutado, **L.1,463,092,054.72 (43.43%)** a los programas regulares, y **L. 294,390,961.28 (8.73%)** a los proyectos de inversión.
- La ejecución financiera de los programas se vio afectada debido al recorte presupuestario el cual retrasó algunos procesos de licitación que estaban por realizarse, así como pagos pendientes que se verán reflejados en el IV trimestre. Por otro lado, la Transferencias que se realiza al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) por L.693,342,500.00 no se ha realizado el pago a la fecha, debido a que la Tesorería General de la Republica no ha identificado los fondos para que se realice el pago.
- En lo que respecta a los proyectos de inversión, se presenta una baja ejecución porque existen procesos en estado de selección, revisión, evaluación, adjudicación para la contratación de consultorías y de las empresas implementadoras.
