




Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos SAG

Octubre, 2024

Unidad de Planeamiento y
Evaluación de la Gestión



Índice

ÍNDICE.....	2
I. PRESENTACIÓN	3
II. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
III. GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	5
IV. EJECUCIÓN FINANCIERA.....	8
V. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS	9
PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO (PRONAGRI) – 11.00.....	9
PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR) – 11.07.....	10
PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA -13.00.....	12
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO) – 15.00.....	14
SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA (INFOAGRO) – 17.00.....	17
PROYECTO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LA REGIÓN NORESTE DE HONDURAS (PROINORTE) – 22.13	18
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD (PROOCCIDENTE) - 22.14	19
PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL II) – 22.15	20
PROYECTO INTEGRANDO LA INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL (COMRURAL III) – 22.16	21
UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 23.00	22
BONO CAFETALERO PARA FERTILIZACIÓN EN APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES- 23.00.000.003	24
BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO – 23.00-000-004	25
BONO GANADERO – 23.00-000-005	25
PROYECTO SEGURIDAD HÍDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS – 23.01.....	26
PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA – 23.02	27
ALIANZA PARA CORREDOR SECO (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03.....	28

I. Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas, Proyectos y Servicios adscritos a SAG, correspondiente al mes de octubre del año 2024.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2024, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia la Reducción de la Pobreza (ERP); disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la para planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Programas, Proyectos y Servicios.


Glenda Mendoza
Directora Interina UPEG

II. Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de la Máxima Autoridad, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, con relación a la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos y el avance físico del Plan Operativo Anual de los programas y proyectos durante el mes de octubre del año 2024.

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto de L.6,435,689,736.00, el cual al 31 de octubre la SAG muestra un presupuesto vigente de L.6,431,997,397.00 Este presupuesto vigente está consignado en 42.62% (L. 2,741,454,769.00) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, seguido de 38.47% (L.2,474,601,908.00) a los programas regulares y el 18.9% (L.1,215,940,720.00) a los proyectos de inversión.

La ejecución al 31 de octubre fue de L.4,281,423,305.12 de estos corresponde L. 2,445,027,607.68 a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo que representa un 57.10% del presupuesto total ejecutado, L.1,475,301,740.24 (34.45%) a los programas regulares, y L. 361,093,957.20 (8.43%) a los proyectos de inversión.

La SAG ejecuta 8 programas los cuales están orientados a la entrega de bienes y servicios a la población; de estos, un programa de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público y 2 programas que incluyen los proyectos de inversión y una de las prioridades del Plan de Gobierno 2022-2026 como ser la Seguridad Alimentaria y Nutricional. A continuación, se describen:

Programa	Proyecto	Nombre del Proyecto
11	00	Programa Nacional de Agricultura Bajo Rego (PRONAGRI)
11	07	Programa Nacional de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
13	00	Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura
15	00	Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
17	00	Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO)
22	00	Programa Competitividad Rural
22	13	Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)
22	14	Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PROOCCIDENTE)
22	15	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)
22	16	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III)
23	00	Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional
23	00-001	Dirección Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
23	00-002	Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a Productores/as
23	00-003	Bono Tecnológico Productivo
23	00-004	Bono Ganadero
23	01	Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
23	02	Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana
23	03	Proyecto Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)
99	00	Transferencias

III. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de enero de 1996, de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

Misión:

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario; para impulsar mediante alianzas público-privadas el fortalecimiento de encadenamientos productivos y la inversión en agro negocios, la exportación de productos agroalimentarios, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnología, el mejoramiento y certificación de la infraestructura productiva; generando las condiciones para el desarrollo de los actores del sector con igualdad, y equidad de género, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y las oportunidades de generación de ingresos de la población.

Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario y medio rural, que presta bienes y servicios de calidad de manera competitiva y eficiente, que contribuye a mejorar la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios, la diversificación mediante encadenamientos productivos bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, adaptación a los efectos del cambio climático, sustentabilidad ambiental con participación comunitaria y equidad de género, en coordinación con el sector privado, la generación de empleo y el desarrollo productivo del país.

Objetivos Estratégicos:

1. Incrementar la producción del sector agroalimentario para contribuir a la disponibilidad de alimentos y la exportación de productos agroalimentarios.
2. Diversificar la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo con las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de divisas.
3. Fortalecer el Liderazgo Institucional de la SAG en su Rol de Ente Rector del Sector Agroalimentario y el Medio Rural.

Funciones de la SAG:

- a. La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:

- La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.
 - El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
 - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
 - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
 - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
 - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b. El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c. La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d. La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.

- e. La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.
 - f. El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
 - g. La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
 - h. La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
 - i. La promoción del crédito agrícola.
- La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

Ámbito del Accionar de la SAG

A Nivel Regional: La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A Nivel Sectorial: La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.

A Nivel Institucional: A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.


IV. Ejecución Financiera

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto de L.6,435,689,736.00, al 31 de octubre del presente año la SAG muestra un presupuesto vigente de L.6,431,997,397.00, el cual está consignado en 42.62% (L. 2,741,454,769.00) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, seguido de 38.47% (L.2,474,601,908.00) a los programas regulares y el 18.9% (L.1,215,940,720.00) a los proyectos de inversión.

El presupuesto de la SAG está compuesto por cinco fuentes de financiamiento: Fondos Nacionales 56.36%, Fondos Propios (0.29%), Crédito Externo (40.01%), Donaciones Externas (3.02%) y Donaciones Internas (0.32%). Este financiamiento proviene de los organismos financiadores: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) bajo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) / Banco Mundial (BM).

La SAG al 31 de octubre del año 2024 refleja una ejecución de L. 4,281,423,305.12 (66.56%) del monto total ejecutado, corresponde L. 2,741,454,769.00 a las Transferencias que se realizan al Sector Público, L. 1,475,301,740.24 a los programas regulares y L. 361,093,957.20 los proyectos de inversión pública.

Distribución del Presupuesto Ejecutado al 31 de octubre 2024
(En millones de lempiras)

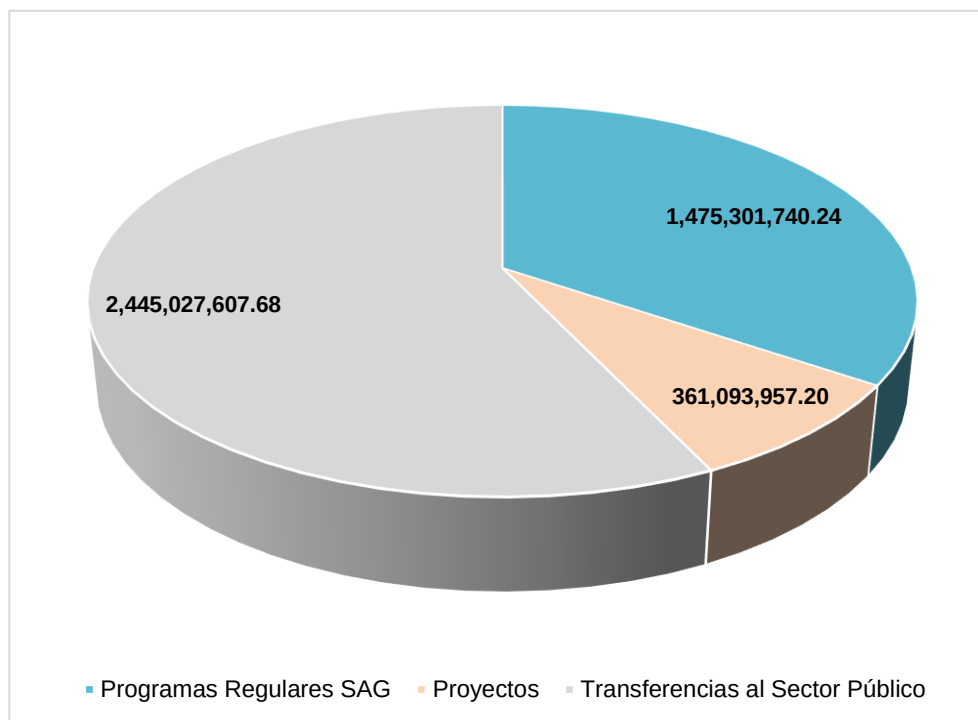

V. Ejecución Física de los Programas y Proyectos

Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) – 11.00

El PRONAGRI es responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a microriego intrafinca en parcelas de pequeños productores y productoras.	Hectárea	705	443	63%	-
Estudios de prefactibilidad para construcción, modernización, Rehabilitación y ampliación de sistemas de riego para gestión de recursos financieros realizados, en beneficio de los pequeños y medianos productores(as).	Estudio de Prefactibilidad	2	2	100%	-
Inventario de producción agrícola por rubros de las parcelas de los productores y productoras en los distritos de riego con acceso al mercado local y nacional	Reporte	4	3	75%	-
Capacitación brindada en temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión de riesgo, uso de suelo, pruebas en los laboratorios entre otros, a estudiantes de la academia y productores(as)	Capacitación	50	46	92%	2
Capacitación brindada a productores y productoras para la sensibilización en el enfoque de género.	Capacitación	19	15	79%	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O- 02: Gestión de Distritos de Riego					
Inventario de nueva área de tierra agrícola con acceso a riego en parcelas de productores y productoras.	Porcentaje	50%	25%	50%	-
Recopilación de información de datos de volumen de producción por rubro en los distritos de riego.	Informe	4	3	75%	-
A/O-03: Capacitación y Asistencia Técnica en Agricultura Irrigada					
Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lote Demostrativo	12	10	83%	2
Asistencias técnicas brindadas.	Asistencia Técnica	64	54	84%	4

A/O-04: Gestión de Áreas para Riego					
Kit de sistema de micro riego (tubería, accesorios, cinta de goteo, filtro) instalado en hectáreas de tierra agrícola	Kit de Riego	302	266	88%	-
Áreas identificadas de riego para banco de proyectos.	Área	2	2	100%	-
Diseño y presupuesto de sistema de riego elaborado.	Diseño	12	9	75%	-
A/O-05: Fomento de la Equidad e Igualdad de Género en las Actividades de Riego y Drenaje					
Plan de capacitación Elaborado	Plan	4	3	75%	-

Descripción de los logros:

Beneficiados 68 productores (51 hombres y 17 mujeres) a través de la entrega de bienes y servicios siguientes:

- Brindadas 4 asistencias técnicas a 27 productores (20 hombres y 7 mujeres) en temas relacionados con el Manejo y limpieza de tubería de riego por goteo, cosecha y empaque de plátano; Instalación de sistema de riego por goteo y en manejo y uso de sistema de riego por goteo en los municipios de Nacaome, Valle, Jobos, Guaimaca F.M. y Yuscarán Ojo de Agua, El Paraíso.
- Establecidos 2 nuevos lotes de maíz beneficiando a 2 productores en las comunidades del Ojo de Agua, el Paraíso, Guaimaca, Francisco Morazán.
- Se impartieron dos capacitaciones a 39 productores y estudiantes del SCITA (29 hombres y 10 mujeres) en el DDTRD y en la regional de Nacaome, abordando los temas relacionados con las pruebas realizadas en el laboratorio de suelos en Comayagua.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

Este programa tiene como objetivo contribuir a reducir pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Programa. De acuerdo con la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo con los valores que se encuentren en la línea de base. Se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. También tiene como objetivo contribuir a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo con las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base que se realice.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Eventos de socialización de planes de ordenamiento de los Recursos Naturales en los municipios de: Comayagua, El Rosario, Siguatepeque, Jesús de Otoro, Santiago de Pringa, La Paz, Lauterique, Lamaní, San Sebastián, Lepaterique y la Villa de San Antonio desarrollados.	Evento	12	3	25%	-
Capacitación en manejo y uso del agua, mantenimiento del sistema de riego, prácticas amigables con el medio ambiente, protección de microcuencas impartidos a los usuarios de los sistemas de riego de san Sebastián, Lamaní, Comayagua, Lauterique, Lejamani, La Paz, Marcala, San José, Chinacla, Cantarranas.	Capacitación	8	5	100%	3
Talleres impartidos sobre medidas de control ambiental y social a los productores y productoras organizados, usuarios de los sistemas de riego de los municipios de Yoro, Victoria, Distrito Central, Jacaleapa, Azacualpa y Marita	Numero de talleres impartidos	6	1	17%	1
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O-04: Gestión Ambiental					
Planes de ordenamiento de los Recursos Naturales aprobados.	Plan	2	1	50%	-
Plan de capacitación en temas ambientales elaborado.	Documento	1	1	100%	-
Plan de desarrollo del taller de medidas ambiental y social elaborado.	Plan	1	1	100%	-

Avances:

- Se realizó capacitación sobre las medidas de control ambiental y social que se deben observar en los predios de cultivo donde se han instalado sistemas de riego individuales, con el objetivo de apoyar en la Gestión Ambiental y Social a productores beneficiarios del Proyecto de Riego Alto Aguan.
- Se desarrollaron tres talleres de educación ambiental, cambio climático y conservación de microcuencas en el municipio de San Sebastián, en el cual participaron 98 personas (38 hombres y 60 mujeres) entre los que figuran 94 jóvenes estudiantes y 4 docentes de los centros educativos: Escuela Minerva Infantil, Instituto San Sebastián, del municipio de San Sebastián y, Escuela Mercedes Castillo, de la comunidad de Agua Salada. La actividad incluyó el apoyo a la municipalidad de San Sebastián en el transporte y diseño de una plantación ornamental en la Escuela Minerva Infantil y en otros predios municipales.

Limitantes de la ejecución física y financiera:

Durante el mes de octubre, la baja ejecución se debe a que el proyecto acordó en conjunto con BCIE, SEFIN y SAG comenzar el proceso de cierre de la etapa del proyecto, y, se está trabajando en una nueva propuesta para la segunda fase del proyecto. Asimismo, está pendiente la No Objeción para la firma del contrato para realizar el estudio de optimización y diseño de obras complementarias del sistema de riego Selguapa, también, el Proyecto San Sebastián, continua con acta de suspensión y pendiente de la No Objeción de la cuarta adenda para continuar con los trabajos de construcción.

Programa Nacional de Pesca y Fomento a la Acuicultura -13.00

El programa tiene el objetivo de fortalecer el ejercicio de responsabilidad del estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura, en sus diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la investigación multidisciplinaria con el propósito de conocer la real disponibilidad de los recursos para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los mejores beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que ofrecen los recursos y las condiciones económicas y sociales del país.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Licencias de pesca emitidos a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	242	215	89%	13
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros	Licencia	11,272	8,656	77%	602
Evaluaciones de la estructura poblacional de las especies marinas Pepino de Mar (Holothuria mexicana), camarones y peces teleósteo en aguas nacionales para establecimiento de cuotas de captura en beneficio de pescadores industriales y artesanales.	Informe	6	5	83%	1
Asistencia técnica brindada a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	723	600	83%	37
Distribución de alevines de tilapia a productores y productoras acuícolas	Alevines	1,500,000	1,135,160	76%	407,210
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O-02: Investigación Pesquera y Acuícola					
Recolección de datos biológicos en campo.	Informe	6	5	83%	1
A/O-03: Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola					
Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Reporte	2,896	2,519	87%	250
Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales con el fin de garantizar el	Reporte	1,173	1,012	86%	146

aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.					
A/O-04: Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola					
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas en temas (cultivos de tilapia, artes de pesca, importancia de estar documentado, diferentes tipos de veda entre otras.	Capacitación	96	70	73%	4
Validación del Plan de Manejo Pesquero con equipo técnico multidisciplinario del Programa.	Reunión	5	4	80%	-
A/O-05: Fomento a la Acuicultura					
Producción de alevines de tilapia.	Alevines	2,720,462	2,596,423	95%	165,961
A/O-06: Fomento de la Equidad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola					
Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico en las comunidades de Marcovia, Choluteca, Amapala y valle.	Capacitación	6	2	33%	-

Descripción de los logros

- Producidos 165,961 alevines de tilapia, en el Centro Nacional de Investigación Piscícola El Carao, y distribuidos 407,210 alevines beneficiando a 44 productores de los departamentos de Comayagua, El Paraíso, La Paz, Copan y Olancho.
- 250 inspecciones realizadas a plantas procesadoras, restaurantes, supermercados, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras y comercializadores en los departamentos de Atlántida, Cortes, Colon, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Francisco Morazán.
- 146 inspecciones realizadas a embarcaciones artesanales e industriales en los departamentos de Atlántida e Islas de la Bahía para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
- Emitidas 602 licencias de operación y permisos para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción, beneficiando a 538 hombres y 64 mujeres productores/as, comercializadores y personas particulares.
- Capacitados y asistidos 100 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales (61 hombres y 39 mujeres) en temas relacionados con la evaluación de la frescura del pescado, moluscos y crustáceos; incentivo al cultivo de tilapia; cultivo de tilapia, en los departamentos de Atlántida, Colon y Comayagua, desarrollando las capacidades de los productores y contribuyendo al incremento en la producción pesquera y acuícola.
- Generados 134 nuevos empleos, beneficiando a (114 hombres y 20 mujeres) entre ellos 59 jóvenes por medio de la emisión de licencias en los departamentos de Colon, Atlántida, Cortes, Islas de la Bahía, Valle, Comayagua, Choluteca, Yoro y Olancho.
- Generados L. 1,741,431.12 en ingresos propios por diferentes conceptos como ser: Canon, venta de alevines el CARAO, canon contributivo, compra venta mayorista, pesca industrial (buzos), pesca deportiva, comercialización, entre otros.

- Inaugurada remodelación de la oficina regional de Omoa, con una inversión de L. 973,330.95 lempiras a través de esta oficina, se espera atender a un aproximado de 1,100 pescadores y brindarles servicios de capacitación, asistencia técnica y licenciamiento.
- Desarrollado Taller de Aporte de Harina de Pescado en Honduras, con el apoyo del Gobierno de Turkia y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), en el cual se presentaron los aportes nutricionales que tiene la harina de pescado en la dieta de las personas y las diversas formas de preparación en la que puede ser incluida para enriquecer el alimento, así como de los desafíos de país para promover la comercialización de este producto.

Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) – 15.00

El programa tiene el objetivo de desarrollar capacidades de los actores del subsector agroalimentario en materia de producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad, generación y transferencia de tecnología agropecuaria, para impulsar la creación de agronegocios competitivos que satisfagan la demanda nacional e internacional, y promuevan la creación de empleos.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 PRONAGRO					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Comités de cadenas agroalimentarias autosostenibles, con la participación de los actores de los diferentes eslabones.	Comité	12	10	83%	1
Evento de Ruedas de Negocio entre demandantes y ofertantes de los productos agroalimentarios.	Evento	3	2	67%	-
Ferias agropecuarias nacionales, municipales realizadas, en apoyo a la comercialización de la producción de los pequeños y medianos productores(as).	Feria	11	7	64%	-
Fortalecimiento Agroempresarial a PYMES del sector Agroalimentario.	Informe	9	9	100%	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias					
Análisis situacional de las cadenas agroalimentarias.	Análisis	8	8	100%	-
Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo, aplicando medidas de bioseguridad	Capacitación	16	15	94%	1

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2024 PRONAGRO					
Mapeo de los actores de las cadenas agroalimentarias.	Informe	8	8	100%	-
Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	29	28	97%	1
Reuniones de cadenas agroalimentarias con los actores de los diferentes eslabones.	Reunión	45	42	93%	3
Agronegocios					
Plan de trabajo de las ferias elaborados.	Plan de Trabajo	11	10	91%	-
Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	3	3	100%	-
Plan de Negocio elaborado.	Plan de Negocio	6	2	33%	1
Diagnostico situacional de las PYMES.	Diagnóstico	4	4	100%	1
Talleres de capacitación impartido.	Taller de Capacitación	5	5	100%	1

Descripción de los logros:

Reunión de Cadenas Agroalimentarias:

Cadena de Pitahaya

Realizada reunión en Regional SAG-Choloteca, Choloteca, sostenida con 11 productores (9 hombres y 2 mujeres; 3 jóvenes) en la cual se acordó:

- Se identificaron productores, comercializadores y empresas de servicios para la implementación de un acuerdo marco orientado a fomentar la competitividad.
- Se establecieron vínculos entre diversas instituciones con el objetivo de crear un acuerdo marco que impulse el crecimiento de la cadena agroalimentaria de pitahaya, como el caso de Pitahaya y Más y Michoacanas. Además, se conocieron otras empresas, como Agroindustria Nase (AGRONASE) e Inversiones del Trópico Seco (INTROS), así como instituciones de apoyo como: Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), Cooperativa de Productores de Pitahaya del Sur (COOPISUR) y Sur en Acción.
- Se promoverá la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) de fincas, para lo cual se llevará a cabo una capacitación en colaboración con SENASA.

Cadena de Guayaba

Mediante reunión con 64 productores (50 hombres y 11 mujer; 11 jóvenes) de la cadena de Guayaba se acordó:

- Convocar a una reunión del comité de cadena durante la última semana de noviembre con el fin de revisar el acuerdo marco de Competitividad y establecer un comité técnico.
- Realizar un diálogo con la junta directiva con el objetivo de convocar a la asamblea para la renovación de esta. Además, Asociación de Productores de Guayaba de Comayagua (APGC) y la Asociación de Agricultores y Agrónomos de Ajuterique (ASAGRAJ) unirán esfuerzos para la recuperación del centro de acopio.

Cadena de Frijol

Realizada reunión con 11 productores (Hombres: 8, Mujeres: 3) de la cadena de Frijol, en la cual se acordó lo siguiente:

- Iniciar en la producción de semillas como multiplicadores de material genético, para su comercialización a través de DICTA, lo que contribuirá a incrementar los ingresos de los productores.
- Se brindará apoyo logístico a la directiva del comité para diversificar la producción, incorporando cultivos como ajonjolí y cardamomo, a través de dos organizaciones de Francisco Morazán.
- Se determinará el número de familias que se beneficiarán con la mejora de su dieta e ingresos, a través de la entrega de especies frutales y aves de traspatio a los productores de frijol.

Cadena Rambután

Reunión con 18 productores (Hombres: 16, Mujeres: 2) de la cadena de Rambután:

- Se logró, por primera vez, el acercamiento de los comercializadores regionales y locales con la cadena de valor del rambután.
- Se logró la creación de una comisión compuesta por dos representantes de cada organización de productores (un representante de los comercializadores y uno de Rainforest Alliance), con el objetivo de realizar visitas a las municipalidades y promover la creación de centros de acopio.
- Se incorporó a la cadena de valor del rambután a la Cooperativa Agroforestal Las Camelias (COACAL).

Capacitaciones:

Realizadas 1 capacitaciones en la que participaron 15 personas (11 hombres y 4 mujeres) en los temas siguientes:

- Con el objetivo de fortalecer el manejo adecuado y mejoramiento de la producción de aguacate en el departamento de Santa Bárbara, se brindaron capacitaciones en temas de Nutrición de Aguacate y Técnicas de Poda, técnicas para mejorar el cuidado de sus árboles y prevenir la caída prematura de frutas, época adecuada de cosecha y el proceso necesario para garantizar una recolección de calidad, aceptada por el mercado.

Asistencia Técnica brindada en temas de:

- Realizada 1 asistencia técnica beneficiando a 9 productores (Hombres 9) en las parcelas de cacao (mejorada, tradicional mejorada y testigo) establecidas en la estación experimental La Omonita, con el apoyo de un equipo de productores socios de APROFIGUA, estas fueron: Control de malezas en las parcelas y sus alrededores, poda del cacao, Fertilización del cacao, Deschuponado del cacao, Corte de brotones de madreado, Cosecha de cacao.

Unidad de Agronegocios

- Elaborado el Plan de Negocio: “Asociación de Mujeres Avícola la Guadalupe (AMAGU)” en San Esteban, Olancho. participaron 7 persona (Mujeres 7, Jóvenes 3), La empresa avícola cuenta con un equipo de trabajo conformado por 7 personas que se han constituido en una junta directiva; cada uno se han distribuido las actividades en tres áreas; producción, procesos y de comercialización. Se espera mejorar el nivel de vida de 7 mujeres cabeza de familia mediante el engorde de 200 pollos en el periodo de 60 días y su comercialización local entero fresco durante 4 ciclos de cultivo en el municipio de San Esteban departamento de Olancho durante un año de ejecución del proyecto.

Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO) – 17.00

Brindar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los elementos informáticos necesarios para la realización de los trabajos, lo que implica el mantenimiento, supervisión, actualización, control y seguridad de los equipos, sistemas e información gestionada dentro de la institución.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 INFOAGRO					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Página WEB de la SAG actualizada, con información agrometeorológica y pronostico diario, disponible a la población en general.	Actualización	12	10	83%	1
Recursos bibliográficos con información de Buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, control de plagas y enfermedades, de las cadenas agroalimentaria y cambio Climático publicados y disponible a la población en general en la biblioteca digital/ página web	Documento	400	275	69%	30
Módulo de desempeño de Recursos humanos creado, que facilite la automatización de los servicios a los usuarios de SAG	Cantidad	1	1	100%	-
Publicación de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas de los rubros maíz, frijol y sorgo difundida en la página web de la SAG, en beneficio de los productores/as.	Publicación	2	3	150%	-
Talleres de capacitaciones de las herramientas ofimáticas impartidas	Talleres de capacitación	1	1	100%	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Dirección en Tecnologías de la Información					
Información agrometeorológica seleccionada	Reporte	32	22	69%	2

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 INFOAGRO					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Actualización de la plataforma del pronóstico diario del tiempo (días laborables) en la página web	Actualización	196	169	86%	13
Recursos bibliográficos con información del sector agroalimentario seleccionados	Documento	220	157	71%	15
Eventos desarrollados en la socialización de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas.	Evento de Capacitación	5	5	100%	1

Avance:

- Actualizada la página web de la SAG, con información agrometeorológica, suelos e información del sector agroalimentario en los enlaces <https://sag.gob.hn/publicaciones/centro-de-documentos/sag/2024/resumen-vi-concurso-nacional-de-cacao-de-calidad-2024/>, <https://proinorte.sag.gob.hn/> <https://infoagro.sag.gob.hn/agrometereologia/>, alcanzando en octubre 2024 un total de visitas de 14,198 usuarios.
- Recopilación de recursos bibliográficos en temas de cambio climático, boletines de alerta temprana y pronóstico diario. En el mes de octubre se contó 17,354 vistas a los recursos bibliográficos siendo los temas de mayor interés los siguientes: Abonos orgánicos, Introducción a la agronomía, Manual Como Organizar Cajas de Ahorro y Crédito Rural, Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras, entre otros.
- Realizado el evento informando al sector sobre la perspectiva para los meses de noviembre 2024 a marzo 2025 que publicó el CENAOS/COPECO y las recomendaciones técnicas para el ciclo de postrera, en el cual se contó con la participación de 127 personas (98 hombres y 32 mujeres), de mayor origen participativo de los municipios de Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca, Danlí, Comayagua, Santa Rosa Copan, Juticalpa, Santa Barbara, Intibucá.

Proyecto Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático. Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia, Tocoa, Olanchito Yoro.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROINORTE

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Campañas de difusión con información Agroclimática articulada y difundida a los productores /as.	Cantidad	2	2	100%	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento, Organizacional e innovación.					
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	50	50	100%	-
Desarrollo Productivo y Resiliencia					
Mesas Agroclimáticas regionales Conformadas (mancomunidades, productores).	Cantidad	3	3	100%	-
Planes de negocio aprobados por el Comité de Aprobación de Inversiones (CAI)	Plan de Negocio	30	5	63%	5

Avance del proyecto:

- Aprobados 5 planes de inversión por el Comité de Aprobación de Inversiones (CAI), conformado por representantes de DICTA, SENASA y PRONAGRO.
- Identificadas dos iniciativas de jóvenes para desarrollar Planes de Inversión orientadas a Servicios de apoyo a las cadenas de valor.
- Recibido taller de capacitación en temas relacionados con género, juventud, población indígena, seguridad alimentaria y nutricional y ambiente, con los objetivos de fortalecer los conocimientos al equipo del proyecto sobre la inclusión social, enfoque de género, juventudes, SAN y Ambiente para su transversalización en las acciones de PROINORTE.

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14

Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

El proyecto opera a partir de los convenios financieros de préstamo BID-4936HN y BID-4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M USD; un fondo de préstamo de 35 M USD del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID del Gobierno de España; y un fondo de donación WE-FI de 1.4 M USD. Estas operaciones obtuvieron una ampliación de 23 meses por parte de SEFIN, por lo cual, serán concluidas el 21 de abril del 2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto son los 88 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La PAZ.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROOCCIDENTE					
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Fortalecimiento del Desarrollo Productivo					
Planes de inversión aprobados por el equipo técnico del proyecto	Plan de Inversión	50	25	50%	-
Asistencia técnica brindada en tecnologías Climáticamente Inteligentes, producción, mercado y/o nutrición.	Asistencia Técnica	100	30	30%	-

Principales avances:

- Firmado el Contrato de Fondo de Inversión Para La Administración de Recursos Financieros y de Garantías del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) /SAG – BANHPROVI.
- Se incorporaron los fondos que estaban en la Tesorería General de la Republica a la libreta operativa en lempiras del préstamo 4936/BL-HO.
- Recibida la no objeción por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la publicación del segundo proceso de las plazas pendientes de contratar de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP).
- Se entregó el estudio del proyecto de riego de Otolaca, La Campa, Lempira, para su respectiva revisión.
- Remitido al BID el borrador de los TdR para la contratación de la firma responsable del diseño y desarrollo del Sistema de Monitoreo y Evaluación SAG.
- Se continua con las actividades de asistencia técnica en campo en los temas de gestión de crédito, mercadeo, nutrición, manejo de microcuencas y fortalecimiento productivo.
- Se continua con la revisión de planes de inversión en tecnologías climáticamente inteligentes (TCI), que deberán iniciar su implementación en el próximo trimestre.

Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (ComRural II) – 22.15

Mejorar la productividad y competitividad de pequeños productores organizados/as para incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, mediante su participación en cadenas de valor y alianzas productivas, comerciales y financieras. El ComRural II opera a partir del convenio financiero de préstamo IDA- 6448-HN, suscrito el 11 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial por USD 75.0 millones, publicado en Gaceta el 25 de abril de 2020 mediante Decreto Legislativo No. 35-2020. El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor seleccionadas.

Localización: Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 COMRURAL II					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Transferencias No Reembolsables (TNR) realizadas a cuenta primaria de las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Cantidad	112	8	7%	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Apoyo para Mejorar la Competitividad, la Resiliencia y la Innovación de las Iniciativas Agroindustriales					
Planes de negocios orientados a la Agricultura en transición aprobados por Comité Directivo.	Plan de Negocio	20	13	65%	5
Asistencias Técnicas brindadas a las Organizaciones de Productores y productoras Rurales (OPRs).	Asistencia Técnica	60	20	33%	-

Avances:

- En proceso de contratación de la Firma Consultora Implementadora (FCI); dividida en 2 subregiones Occidente y Sur por el monto de US\$ 5.2 millones en la cual se espera beneficiar alrededor de 6,700 beneficiarios.
- Se encuentra en proceso la contratación de la FCI en función de la ampliación de alcance geográfico de la Ventana 1, para apoyar a los agricultores de subsistencia garífunas en la Costa Atlántica beneficiando a un aproximado de 1,300 beneficiarios.
- Realizadas reuniones Interinstitucionales con Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), Agencia de regulación Sanitaria (ARSA), SAG y Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), con el objetivo de preparar los documentos que contiene especificaciones técnicas para poder lanzar los procesos de adquisiciones de acuerdo con las líneas de inversión presentadas en el marco del convenio firmado por cada Institución, de los cuales este mes, se ha entregado 28 documentos al área de adquisiciones del proyecto; por el monto de L. 4.82 millones.

Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (ComRural III) – 22.16

El proyecto contribuye al acceso a mercados, la adopción a prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, la creación de empleos para apoyar a beneficiarios del proyecto en cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas; y en caso de una crisis o emergencia elegible responder efectivamente a ello. El ComRural III apoya a las iniciativas agroindustriales competitivas, innovadoras, con resiliencia climática y nutricionalmente inteligentes (subproyectos o planes de negocios) en cadenas de valor agroalimentarias prioritarias bajo un modelo de alianzas productivas.

Inversión del Proyecto: El proyecto tiene una inversión total de US\$ 108.5 millones.

Localización: El Proyecto ComRural III se focaliza en 17 Departamentos de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Valle y Yoro cubriendo casi la totalidad del territorio nacional. y el Financiamiento Adicional se enfoca exclusivamente en el Departamento de Gracias a Dios.

Avances:

- En proceso de contratación de la firma consultora implementadora (FCI) Moskitia.
- Se han consolidados alianzas con instituciones locales para apoyar la implementación de actividades y maximizar el impacto del proyecto, facilitando el acceso a recursos adicionales y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas.

Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional 23.00

Realizar la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante la coordinación de intervenciones con el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, impulsando estrategias, procesos metodológicos y la articulación entre los diversos sectores, para optimizar los esfuerzos y recursos que conllevan a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 UTSAN					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)					
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) funcionando para acciones estratégicas de vigilancia y promoción de la SAN a nivel nacional.	Informe	2	1	50%	-
Instituciones gubernamentales incorporando acciones de la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional (SAN)	Informe	2	1	50%	-
Seguimiento a la implementación de los acuerdos y resoluciones tomadas en el CONASAN, COTISAN Y COVISAN	Informe	4	3	75%	1

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 UTSAN					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)					
Mesas de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) regionales funcionando como instancias de dialogo y coordinación (Golfo de Fonseca, Valles de Olancho, Comayagua, Región Lempa) y reactivadas (Valle de Sula, Región Valle de Aguan, Región 11 el Paraíso, Región 03 Santa Rosa de Copan)	Informe	11	6	36%	-
Sistema de información y Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISESAN), operando.	Informe	2	1	50%	-
Seguimiento a la implementación del programa EUROSAN, Desarrollo Local.	Informe	2	1	50%	-
Seguimiento en la implementación de la iniciativa Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) en Honduras	Informe	1	1	100%	-

Avances:

- Desarrollado el Taller de Actualización de la Política Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN) y su Plan de Acción (PAR-POLSAN).
- Participación en el Taller de Nivel 2 de la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) en San Salvador, por Invitación de la Unidad de Soporte Global de la CIF.
- Se participó en el Lanzamiento Oficial del Censo Agropecuario Nacional, realizado en el municipio de Ajuterique, en el departamento de Comayagua.
- Se participó en el Taller sobre Necesidades Humanitarias y el Plan de Respuesta, organizado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas.
- En coordinación con SESAL, se realizó un taller para conocer los avances del censo en talla escolares en el cual se ajustó el cronograma y el plan de contingencia.

**Bono Cafetalero para Fertilización en Apoyo a Pequeños y Medianos Productores-
23.00.000.003**

El Programa Bono Cafetalero, con el objetivo de mejorar los ingresos de las familias cafetaleras pequeñas y medianas, mediante el mantenimiento de la productividad del área cultivada de café, mediante el apoyo a la fertilización de las fincas y el acompañamiento con asistencia técnica y capacitación.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Cafetalero					
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Bono Cafetalero					
Bono Cafetalero entregado a pequeños y medianos productores y productoras de café	Bono	90,000	8,000	9%	2,000
Capacitación brindada a pequeños y medianos productores y productoras de café.	Evento de Capacitación	500	500	100%	-
Kit para estructura de vivero de café entregado a Alcaldías y organizaciones de productores (malla, alambre, bolsa).	Kit	100	185	185%	-
Kit de podas para café entregado a grupos de productores y productoras (motosierra, bomba motorizada, corta seto, chapeadora).	Kit	1,000	973	97%	-
Kit para secadora solar de café entregado a productores y productoras. (tubería, plástico UV, tornillos, zaran, varilla).	Kit	300	300	100%	-
Diagnósticos productivos en fincas de Pequeños y Medianos Productores y productoras de café.	Finca	2,500	1500	60%	1000

- Entregados 2,000 bonos cafetaleros a pequeños productores y productoras.
- Se realizaron 1000 Diagnósticos productivo en Fincas de Pequeños y Medianos productores y productoras de café.

Bono Tecnológico Productivo – 23.00-000-004

El Bono Tecnológico Productivo (BTP) es un incentivo económico dirigido al pequeño productor de granos básicos, que beneficia particularmente aquellos pequeños productores de subsistencia que no tienen acceso al financiamiento bancario, ni a la asistencia técnica.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Bono Tecnológico Productivo

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Bono Tecnológico Productivo					
Bono tecnológico productivo entregado a pequeños productores y productoras.	Bono	350,000	292,361	84%	69,006
Quintales de fertilizantes de formula comprados.	Quintal	400,000	240,000	60%	-
Asistencia técnica brindada a Pequeños Productores y productoras.	Asistencia Técnica	4,000	2,781	70%	-
Quintales de semillas de maíz, arroz, sorgo y frijol comprados.	Quintal	88,000	50,800	58%	-
Kits fitosanitarios entregados (fungicida, insecticida, foliar)	Kit	252,500	176,000	70%	-
Plántulas de frutales entregados.	Plántula	80,000	52,530	66%	-

Descripción de logros

- Entregados 69,006 bonos tecnológicos productivos, beneficiando a igual número de productores, (35,883 mujeres y 33,123 hombres).

Bono Ganadero – 23.00-000-005

El Programa Bono Ganadero, está dirigido a mejorar los ingresos de pequeños ganaderos por medio del mejoramiento de la alimentación del ganado, así como apoyo al proceso de construcción y equipamiento de plantas de procesamiento de leche; y fortalecimiento al centro de reproducción pecuaria.

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Bono Ganadero					
Bono de semilla de pasto entregado a pequeños productores y productoras de ganado.	Bono	9,000	5,000	56%	-
Paquetes de 4 kilos de semilla de pasto comprados.	Paquete	9,000	5,000	56%	-
Bono de aves ponedoras a pequeños productores y productoras avícolas	Bono	2,000	400	20%	400
Aves ponedoras para distribución compradas	Cantidad	50,000	-	0%	-

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Bono Ganadero					
Escuelas de campo formadas con pequeños productores y productoras de ganado.	Cantidad	125	100	80%	50
Equipo para la industrialización (descremadoras, pasteurizadoras, pilas de cuajo etc.) adquirido.	Cantidad	12	-	0%	-
Vaquillas inseminadas de pequeños productores y productoras de ganado	Cabeza de ganado	1,000	-	0%	-
Material genético (Pajillas) para inseminación adquirido	Cantidad	1,000	-	0%	-
Bono de pie de cría (cerdo) a pequeños productores y productoras de cerdos.	Bono	400	-	0%	
Pie de cría adquirido para distribución Comprados	cantidad	400	-	0%	-
Equipamiento a Plantas procesadoras de lácteos (descremadoras, pasteurizadoras, pilas de cuajo etc.) entregadas a organizaciones de productores y productoras	Cantidad	12	-	0%	-
Asistencia técnica brindada a Productores y productoras de ganado.	Asistencia técnica	500	500	100%	-

Descripción de los logros:

- 50 escuelas de campo (Escuelas Ganaderas) formadas con pequeños productores y productoras en 118 municipios a nivel nacional.
- Entregados 400 Bono de aves ponedoras a pequeños productores y productoras, en 17 departamentos.

Proyecto Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras, como ser los municipios de La Venta y Curaren, departamento de Francisco Morazán; Intibucá, departamento de Intibucá; La Paz, departamento de La Paz; Nacaome, departamento de Valle.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 Seguridad Hídrica					
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Fortalecimiento de los Sistemas de Información de Recursos Hídricos en la Cuenca de Nacaome					
Plan de capacitación elaborado	Plan	1	1	100%	1

Avances:

- Se envió a la SEFIN y a Banco Mundial el documento de reestructuración del proyecto indicando una reducción en los fondos externos y nacionales, actualmente el proyecto se encuentra revisando continuamente el MOP y corrigiendo las observaciones realizadas por el organismo financiador (Banco Mundial).
- Se está dando seguimiento a las actividades planteadas en el Plan de Acción para la aceleración de implementación para la ejecución tanto física como financiera.

Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

El proyecto tiene el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de los prestadores urbanos de servicios de agua potable y apoyar a los municipios a responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua y saneamiento generadas por la pandemia COVID-19, cuenta con recursos del crédito AIF-6696-HN del Banco Mundial por un monto de USD 45.0 millones y una contraparte municipal por USD 1.5 millones. La SEFIN aprobó una ampliación de 15 meses finalizando 30/03/2027 la cual está pendiente de la aprobación final del Banco Mundial.

El Proyecto tiene una inversión total de USD 45.0 Millones. Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todos los departamentos a nivel nacional

Avances:

- Concluida la línea base de los 13 municipios (Choloma, La Esperanza e Intibucá, Siguatepeque, Juticalpa, Copan Ruinas, San Marcos de Colón, Gracias y Ajuterique), de los cuales 5 fueron levantados por ERSAPS y los ocho municipios restantes se finalizaron bajo la supervisión del Jefe de Proyecto Especialista en Regulación y Control asignado al Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS). Se está solicitando al ERSAPS unos datos para posteriormente enviar los enlaces de las líneas base.
- Presentada la Estrategia de Monitoreo y Evaluación del Marco de Resultados de Proyecto de Agua Urbana – SAG – Banco Mundial, con los prestadores de servicios que participan en el Proyecto (ERSAPS y el Equipo Técnico de la Unidad Administradora de Proyectos UAPSAG) y con la participación de 6 prestadores de servicios y 36 participantes. Se presentaron los indicadores de la matriz de resultados, los cuales en un 95% estarán monitoreados por el ERSAPS y la Estrategia de Monitoreo y Evaluación que llevara a cabo el mismo.
- La baja ejecución corresponde a que las licitaciones de los proyectos de rehabilitación de agua potable de Danlí y La Paz fueron fracasados porque el oferente que participo en la licitación no reunía los requisitos exigidos por el Banco, esta erogación del gasto representaba alrededor del 38% del presupuesto; con la estrategia de reuniones sostenidas con la Cámara de Industrias de la Construcción de Tegucigalpa y San Pedro Sula y otras reuniones puntuales sostenidas con diversas empresas constructoras, se ha observado incremento en la participación de oferentes a los procesos de licitación, los que estarán en ejecución para el 2025.
- Así mismo, no se pudo llevar a cabo el pago de los camiones cisterna debido a que el contrato especifica que se pago es contra entrega del producto, asíéndose efectivo hasta en marzo del 2025. Para este mes se realizó la entrega para la rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias

en apoyo a la respuesta municipal por emergencia COVID-19, para los municipios de Trujillo, Colón y Puerto Lempira, Gracias a Dios.

Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR) – 23.03

Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables en áreas seleccionadas del Corredor Seco. El proyecto PROSASUR surge con el convenio financiero de donación TF 017904–HN, suscrito el 11 de noviembre de 2015 por 30M USD. El 19 de noviembre de 2021 se firmó un convenio de donación del fondo adicional TF–0B7211 por USD 5M, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y el fortalecimiento de centros comunales de salud y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

Localización: la zona de intervención del proyecto se localiza en todo el Corredor Seco del País.

Inversión del Proyecto: tiene una inversión total de USD 35.0 Millones.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROSASUR					
Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Alianza para el corredor seco (USAID-GAFSP)					
Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), Planes de Negocios Agrícolas (PNA) y Planes de Negocio No Agrícolas (PNNA) implementados en hogares de pobreza y pobreza extrema del corredor seco.	Plan	339	278	82%	-
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al IV Trimestre				Ejecución Octubre
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Producción de alimentos y generación de ingresos, sub-proyectos, cluster 1.					
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados. FA, Clúster 1	Kit	500	250	50%	-
Producción de alimentos y generación de ingresos, sub-proyectos, cluster 2.					
Kit de bienes productivos (Bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PSAN. FO Clúster 2	Kit de Riego	313	276	88%	-
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PNNA. FO Clúster 2	Kit	16	2	13%	-
Kit de bienes productivos (bombas, mochila, semilla, fertilizantes, accesorios para riego) entregados a hogares beneficiados a través de PNA. FO Clúster 2.	Kit	500	250	50%	-
Educación nutricional e higiene del hogar, asistencia técnica, cluster 2.					

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2024 PROSASUR					
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FO, Clúster 2	Asistencia Técnica	1	-	0%	-
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Clúster 2	Asistencia Técnica	2,500	1,875	75%	-
Producción de alimentos y generación de ingresos asistencia técnicas cluster 1.					
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FA, Clúster 1	Asistencia Técnica	1,000	1,261	126%	-
Educación nutricional e higiene del hogar, sub-proyectos, cluster 1.					
Asistencia técnica brindada en nutrición e higiene en el hogar a través en PHH. FA, Clúster 1	Asistencia Técnica	2,500	1,875	75%	-
Producción de alimentos y generación de ingresos, asistencias técnicas, cluster 2					
Asistencia técnica brindada para mejorar la productividad y producción agropecuaria a través en PSAN-FA, Clúster 2	Asistencia Técnica	1,000	500	50%	-

Avance.

- Finalizada la negociación de la propuesta técnica y económica presentada por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, International Food Policy Research Institute) para la consultoría “Evaluación de Impacto del Proyecto de Seguridad Alimentaria Nutricional del Corredor Seco de Honduras PROSASUR (ACS-GAFSP)”, se espera la firma del contrato para mediados del mes de noviembre de 2024.
- Se continuó con las entregas de los Kits con Bomba de Mochila, Cal Dolomita, Fertilizante Foliar granular 20-20-20, Fertilizante Granulado 12-24-12, Fertilizante Granulado 18-46-00, Fungicida, Insecticida y Semilla de Mejorada maíz, lo que representa una inversión acumulada de 12.78 millones de lempiras.
- Se presentó solicitud de ampliación de la vigencia del convenio de donación, extendiendo la fecha de cierre del proyecto a SEFIN, actualmente se está en espera que la SEFIN remita dictamen de ampliación al Banco Mundial.

Elaborado por: Equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.
