

REPORTE DE PROYECTO

Institución: Instituto de la Propiedad

Sector: Social


Sub Sector: Forestal (*Titulación de derechos de propiedad de tierras forestales*)

Nombre del Proyecto: MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)-IP

Propósito: "Recepción, Validación e Inscripción de Catastro del Bosque Nacional en el Sistema Unificado (SURE)"

Entorno de los trabajos. - El proceso se desarrolla en siete (7) zonas de trabajo con un área total de 166.598 has, de acuerdo a la distribución espacial y en número de cada zona que se observa en el gráfico y relación:

Ubicación del Proyecto (Ámbito de Influencia territorial):

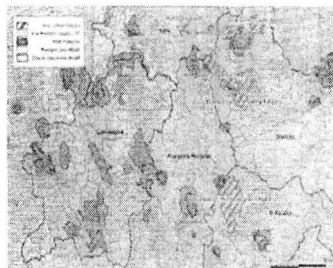

Zona	Nombre	Km2
1.	Motagua Yoro	7,073
2.	El Junco, La Unión y Mangulile	7,822
3.	El Encino, Esquipulas	11,001
4.	Mangulile, Jacón, El Rosario	22,803
5.	El Rosario, La Unión, Salamá	22,006
6.	Teupasenti, Moroceli y El Chile	51,946
7.	El Ilguero	43,947
	TOTAL	166, 598

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Gobierno de Honduras y la Unión Europea (UE), suscribieron un convenio de financiación No. DCI-ALA/2010/021-598 para la ejecución del proyecto MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF), enfocado a promover la gobernabilidad y la participación comunitaria en el sector forestal para el manejo sostenible de los bosques, áreas protegidas para reducir la pobreza rural, mediante una acción conjunta interinstitucional en el marco de la política de desarrollo productivo -social y de la descentralización del Estado.

En fecha 11 de abril de 2014, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD y el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), suscribieron un contrato de servicios para acciones exteriores de la Unión Europea No. DCI-ALA/2014/338-987 que tiene como título: "Estudios catastrales, regularización y titulación de los derechos de propiedad de las tierras forestales, nacionales y ejidos con número de identificación: EuropeAid/133999/D/SER/HN-MOSEF-SERV02,





2. ALCANCE DEL PROYECTO (RESULTADOS ESPERADOS)

- 1.- Densificación y modernización de la Red CORS, cinco (5) estaciones en operación y mantenimiento continuo produciendo información geodésica satelital a través de los servidores y sitio web IP para los trabajos del proceso Catastro, Regularización y Titulación de Predios (CRT).
- 2.- Desarrollo del proceso de Catastro, Registro y Titulación (CRT) en zonas forestales (166'600 Has) mediante acciones de acompañamiento, asesoría y veeduría en la aplicación del marco legal vigente de Honduras.

3. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto por ser de carácter social relacionado con titulación y usufructo de las tierras ejidales de vocación forestal fortalecerá la estrategia de gobernabilidad, involucramiento de municipalidades y participación comunitaria en la protección de recursos naturales y ambiente en la perspectiva de reducción de pobreza rural de familias del domiciliadas en zonas de vocación forestal mediante acciones de conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los bosques y áreas protegidas (166, 000 has de tierras) del Gobierno de Honduras.

4. IMPACTO EN EL TERRENO

El proyecto por ser de carácter social, implementará acciones de control de calidad en los procesos de regularización y titulación predial que incidirán en la calidad de vida de los beneficiarios.

5. Fuentes de Financiamiento

Comisión Europea:
Gov. Honduras, Instituto de la Propiedad:

6. Monto Total del Proyecto

Fondos externos: Euros 340, 000. 00
Fondos nacionales: Especies

7. FICHA PRESUPUESTO GLOBAL PROYECTO	Euros (miles)	Lempiras (miles)
Monto total del contrato de Servicios	340,000.00	8 830, 072. 00
Monto ejecutado acumulado al 30 mayo 2017	306, 000. 00	7 947, 064. 80
Monto disponible a la fecha al 30 mayo 2017	34, 000.00	883, 007. 20
Porcentaje ejecución financiera	90.0 %	
Porcentaje ejecución física	90.0%	
Fecha de Inicio	may-14	
Fecha de Cierre Ampliado	marzo-17	
Periodo vigente	(34 meses)	

(Tasa cambiaria BCH- Honduras 25.9708 de fecha 27 de mayo 2014).



9. LOGROS-RESULTADOS

9.1 ACTIVIDADES DEL CONTRATO. PARTE "A" INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED CORS

9.1.1. Densificación y Modernización de la Red CORS-Honduras.

La densificación y modernización de las estaciones CORS es de vital importancia para la determinación de coordenadas por métodos satelitales (equipo GNSS) garante de mantener el sistema y el marco geodésico de Honduras para disponer de información de Georreferenciación de los trabajos de levantamiento catastral y regularización de predios cuyos datos de medición diaria y de coordenadas estarán disponibles a través de vínculos en internet publicados en sitio Web del IP. RED DE ESTACIONES CORS EN HONDURAS fortalece los trabajos de levantamiento catastral del proyecto, instalándose 3 nuevas estaciones, operando 5 estaciones ubicadas en sitios estratégicos: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Siguatepeque, Catacamas y La Ceiba. También operando 3 Estaciones CORS administradas por el proyecto COCONet-UNAVCO ubicadas en San Lorenzo, Isla de Roatán y el Cisne (CN18-Isla Cisne, CN21- San Lorenzo y ROA0 Isla de Roatán).

9.2.- ACTIVIDADES DEL CONTRATO. PARTE "B"

ASESORAMIENTO, SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONTRATISTA EN EL PROCESO DE CATASTRO, REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE TIERRAS FORESTALES.

1. Asesoramiento Inicial.
 - 1.1. Participación Activa en las mesas de Coordinación Interinstitucional
 - 1.2. Asesoramiento en la preparación de Zonas de Trabajo
2. Asesoramiento, Supervisión y Acompañamiento al Contratista CRT en el Proceso de Catastro, Regularización y Titulación en Tierras Forestales
3. Supervisión y Asesoramiento sobre los procedimientos de campo del catastro
4. Ejecución Vistas Públicas Administrativas y Conciliación en las Zonas de Trabajo
5. Participación en la Fase de la Regularización especial en Áreas Forestales
6. Transferencia de los Datos al SURE y Registro de la Propiedad
7. Verificación de la Aplicación del Sistema de Gestión de Calidad del Contratista CRT
8. Control de Calidad y Validación del Catastro
9. Sistematización de las experiencias adquiridas

Conclusión

El proyecto llegó a su FIN. "Registro, Validación e Inscripción del Bosque en el Sistema Unificado de Registros (SURE)" (*Disponer de la infraestructura de base requerida para apoyar los procesos de levantamiento catastral y titulación de áreas forestales Asegurar que las actividades del contrato "Proceso de Catastro, Regularización y Titulación de Tierras Forestales Nacionales y Ejidales" corresponde al marco legal y normativo de Honduras, así como para lograr la amplia aceptación del proceso por parte de las autoridades locales.*

En el marco del POA-2017 probado y cargado en el sistema PENTAGON-IP se atenderá únicamente la fase de cierre y transición del contrato así como la ejecución financiera en tránsito.

Lic. Gloria Mendoza
Coordinadora de Proyectos



REPORTE DE PROYECTO DE EJECUCION

Institución:	Instituto de la Propiedad
Sector	Social
Sub Sector	Producción (Inmobiliaria)
Nombre del Proyecto:	PRODUCCION DE DATOS VECTORIALES DE ALTA RESOLUCION (HRVD/NGA)-IP
Propósito Proyecto:	Promover la cooperación mutua entre países, mediante el intercambio de asistencia técnica e información cartográfica y geodésica nacional.
Ubicación del Proyecto (Ámbito de Influencia territorial):	Se atienden actividades a nivel de gabinete de 12 zonas de departamentos de Gracias a Dios y 2 zonas del Departamento de Colón.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Los Gobiernos de Honduras y Estados Unidos a través del Instituto de la Propiedad y la National Geospatial Intelligence Agency del Departamento de Defensa de USA, suscribieron en el año 2013 un convenio de cooperación e intercambio básico amparado en el cambio 3 apéndice II anexo de ejecución D, para la ejecución del proyecto PRODUCCION DE DATOS VECTORIALES DE ALTA RESOLUCION (HRVD/NGA), enfocado a promover el intercambio y cooperación técnica para la producción de información cartográfica y geodésica del país mediante una acción conjunta entre países.

2. ALCANCE DEL PROYECTO (RESULTADOS ESPERADOS)

- 1.- Producción y entrega a la NGA once HRVD (14) hojas cartográficas a escala 1:50, 000 de la zona de influencia del proyecto.
- 2.- Fortalecimiento de capacidad institucional

3. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto por ser de carácter investigativo y de medición cartográfica nacional no incidirá en impactos sobre el medio ambiente.



4. IMPACTO EN EL TERRENO

El proyecto por ser de carácter investigativo y de medición cartográfica nacional no incidirá en impactos sobre el medio ambiente.

5. Fuentes de Financiamiento

NGA/ Estados Unidos:

Instituto de la Propiedad Honduras:

6. Monto Total del Proyecto

Fondos externos: US\$ 170, 500. 00

Fondos nacionales: Especies

7. FICHA PRESUPUESTO GLOBAL PROYECTO	US\$ (miles)	Lempiras (miles)
Monto total del proyecto	170, 500.00	3 483, 177. 59
Monto ejecutado acumulado 2014-2016	170, 500.00	3 483, 177. 59
Monto disponible a la fecha al 30 junio 2015	-0-	-0-
Porcentaje ejecución financiera	100 %	100 %
Porcentaje de ejecución física	100 %	100 %
Fecha de Inicio	Nov. -13 (14 meses)	
Fecha de Finalización ampliado	Diciembre -16	

(Tasa cambiaria BCH- Honduras 20.430 de fecha 27 de octubre 2013).

9. AVANCES-RESULTADOS

9.1 ACTIVIDADES DE CLASIFICACION CARTOGRAFICA EN CAMPO

- 9.1.1. Producción y Entrega de HRVD cuatro (4) hojas cartográficas a escala 1: 50, 000 Departamento Francisco Morazán.
- 9.1.2. Producción y Entrega de HRVD una (1) hoja cartográfica a escala 1: 50, 000 Del Departamento de Comayagua.
- 9.1.3. Producción y Entrega de HRVD dos (2) hojas cartográficas a escala 1: 50, 000 Del Departamento de Cortes.
- 9.1.4. Producción y Entrega de HRVD una (1) hoja cartográfica a escala 1: 50, 000 Del Departamento de Atlántida.
- 9.1.5. Producción y Entrega de HRVD dos (2) hojas cartográficas a escala 1: 50, 000 Del Departamento de Olancho.
- 9.1.6. Producción y Entrega de HRVD una (1) hoja cartográfica a escala 1: 50, 000 Del Departamento de Yoro.

Durante el año 2016 se desarrollaron actividades de gabinete subsanando la producción y entrega de servicios cartográficas a la NGA-USA.

9.2 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL IP

- 9.2.1. Fortalecida con asistencia técnica de acompañamiento y celeridad de los procesos de regularización y titulación predial en zonas de influencia del proyecto.


Lic. Gloria Mendoza
Coordinadora de Proyectos
Secretaria Ejecutiva
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

