



MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO  
DEPARTAMENTO DE COPAN, HONDURAS, C. A  
TEL.2651-11-03



## MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

Fecha 3 de diembre del 2023

Ingeniero: **DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA**  
Gerente G. Empresa: **CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA**  
Su Oficina

### LLAMADO A COTIZAR

Estimado Ing.

La Corporación Municipal de El Paraíso Copán por medio de la presente le invita a presentar oferta para la COTIZACION DE:

**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUEVIAS, CON EQUIPO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN**

El financiamiento para la ejecución del proyecto proviene exclusivamente de Fondos Municipales. La Cotización se llevará a cabo conforme al procedimiento de Cotización establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.


Los Documentos de la presente Cotización están disponibles a partir de la fecha en la Unidad Técnica de Gestión Municipal ubicado en el edificio municipal.

La cotizacion deberá ser entregadas en forma impresa en sobres sellados el día **5 de Diembre del 2023 de 10:00 am a 2:00 pm** hora oficial de la República de Honduras en la **Sala de Conferencias del Edificio Municipal de El Paraíso Copán.**

En la dirección siguiente: Barrio El Centro, Frente a Parque Central, Municipio de El Paraíso Copán Honduras, donde serán recibidas por la Comisión de Evaluación.

Las ofertas que se presenten después del plazo establecido serán rechazadas.

Le saluda cordialmente.

  
LIC: **NERY ORLANDO CHACON**  
ALCALDE MUNICIPAL  
EL PARAISO COPAN  
HONDURAS

C.C secretaria  
C.C Unidad de Presupuesto  
C.C Archivo



MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO  
DEPARTAMENTO DE COPAN, HONDURAS, C. A  
TEL.2651-11-03



## MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

Fecha 3 de diembre del 2023

Ingeniero: **RUDY NORMAN ALVARADO**

Gerente G. Empresa: **SERCO . SERVICIO DE CONSTRUCCION S DE RL**  
Su Oficina

### LLAMADO A COTIZAR

Estimado Ing.

La Corporación Municipal de El Paraíso Copán por medio de la presente le invita a presentar oferta para la COTIZACION DE:

**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUEVIAS, CON EQUIPO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN**

El financiamiento para la ejecución del proyecto proviene exclusivamente de Fondos Municipales. La Cotización se llevará a cabo conforme al procedimiento de Cotización establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los Documentos de la presente Cotización están disponibles a partir de la fecha en la Unidad Técnica de Gestión Municipal ubicado en el edificio municipal.

La cotizacion deberá ser entregadas en forma impresa en sobres sellados el día **5 de Diembre del 2023 de 10:00 am a 2:00 pm** hora oficial de la República de Honduras en la **Sala de Conferencias del Edificio Municipal de El Paraíso Copán.**

En la dirección siguiente: Barrio El Centro, Frente a Parque Central, Municipio de El Paraíso Copán Honduras, donde serán recibidas por la Comisión de Evaluación.

Las ofertas que se presenten después del plazo establecido serán rechazadas.

Le saluda cordialmente.

  
LIC: **NERY ORLANDO CHACON**  
ALCALDE MUNICIPAL  
EL PARAISO COPAN

C.C secretaria  
C.C Unidad de Presupuest  
C.C Archivo



MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO  
DEPARTAMENTO DE COPAN, HONDURAS, C. A  
TEL.2651-11-03



## MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

Fecha 3 de diembre del 2023

Ingeniero: **EMIN VARGAS**

Gerente G. Empresa: **DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCION S.DE R.L**

Su Oficina

### LLAMADO A COTIZAR

Estimado Ing.

La Corporación Municipal de El Paraíso Copán por medio de la presente le invita a presentar oferta para la COTIZACION DE:

**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUEVIAS, CON EQUIPO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN**

El financiamiento para la ejecución del proyecto proviene exclusivamente de Fondos Municipales. La Cotización se llevará a cabo conforme al procedimiento de Cotización establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los Documentos de la presente Cotización están disponibles a partir de la fecha en la Unidad Técnica de Gestión Municipal ubicado en el edificio municipal.

La cotizacion deberá ser entregadas en forma impresa en sobres sellados el día **5 de Diembre del 2023 de 10:00 am a 2:00 pm** hora oficial de la República de Honduras en la **Sala de Conferencias del Edificio Municipal de El Paraíso Copán.**

En la dirección siguiente: Barrio El Centro, Frente a Parque Central, Municipio de El Paraíso Copán Honduras, donde serán recibidas por la Comisión de Evaluación.

Las ofertas que se presenten después del plazo establecido serán rechazadas.

Le saluda cordialmente.

  
LIC: **NERY ORLANDO CHACON**  
ALCALDE MUNICIPAL  
EL PARAISO COPAN

C.C secretaria  
C.C Unidad de Presupuestc  
C.C Archivo



Bo. Barandillas, 7 y 8 Calle, 5 y 6 Ave., San Pedro Sula  
[delvin.pascua@gmail.com](mailto:delvin.pascua@gmail.com)  
Teléfono: (504) 9477-5336

FORMATO DE COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

LIC: NERY ORLANDO CHACON  
ALCALDE MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN

Después de haber examinado el Documentos de Cotización, incluyendo la(s) enmienda(s) [0], del Proyecto:

**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, DE EL MUNICIPIO EL PARAÍSO COPÁN.**


Nosotros: **CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA**  
RTN: 1607-1975-001007  
CORREO: [delvin.pascua@gmail.com](mailto:delvin.pascua@gmail.com)  
CELULAR: (504) 9477-5336

Ofrecemos ejecutar el proyecto con el siguiente presupuesto.

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	P.U	VALOR
TRACTOR	HORAS	70.00	3,000.00	L. 210,000.00
EXCAVADORA	HORAS	160.00	2,950.00	L. 472,000.00
MOTONIVELADORA	HORAS	30.00	2,850.00	L. 85,500.00
RETRO-EXCAVADORA	HORAS	60.00	1,500.00	L. 90,000.00
VIBRO-COMPACTADOR	HORAS	10.00	1,500.00	L. 15,000.00
VOLQUETA 12 M3 ( RELLENO Y ACARREO MATERIAL DE RIO TIPO CASCAJO )	VIAJES	20.00	2,690.00	L. 53,800.00
MOVILIZACION DE EQUIPO ( CONSIDERAR RECORIDO DE EQUIPO SIN LOWBOY A DIFERENTES COMUNIDADES )	GLOBAL	1.00	30,000.00	L. 30,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS.</b>				<b>L. 956,300.00</b>

Firma autorizada

Nombre:  
Cargo del Firmante:  
Nombre del Oferente:

  
DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA  
GERENTE GENERAL  
CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA





## COTIZACION

### MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

LIC: NERY ORLANDO CHACON  
ALCALDE MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN

Después de haber examinado el Documentos de Cotización, incluyendo la(s) enmienda(s) [0], del Proyecto:

**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN,  
REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN  
DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.**

Nosotros: **SERVICIOS DE CONSTRUCCION S DE R.L. (SERCO)**

RTN: 5019018992574

CORREO: [c\\_serco@yahoo.com](mailto:c_serco@yahoo.com)

CELULAR: (504) 9642-5153

Ofrecemos ejecutar el proyecto con el siguiente presupuesto.


ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	P.U	VALOR
TRACTOR	HORAS	70.00	3,000.00	L. 210,000.00
EXCAVADORA	HORAS	160.00	3,000.00	L. 480,000.00
MOTONIVELADORA	HORAS	30.00	2,800.00	L. 84,000.00
RETRO-EXCAVADORA	HORAS	60.00	1,500.00	L. 90,000.00
VIBRO-COMPACTADOR	HORAS	10.00	1,500.00	L. 15,000.00
VOLQUETA 12 M3 ( RELLENO Y ACARREO MATERIAL DE RIO TIPO CASCAJO )	VIAJES	20.00	3,000.00	L. 60,000.00
MOVILIZACION DE EQUIPO ( CONSIDERAR RECORIDO DE EQUIPO SIN LOWBOY A DIFERENTES COMUNIDADES )	GLOBAL	1.00	25,000.00	L. 25,000.00
<b>TOTAL DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO LPS.</b>				<b>L. 964,000.00</b>

Firma autorizada

Nombre:

Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:




**GERENTE GENERAL**

**SERVICIOS DE CONSTRUCCION S DE R.L.**



Bo. Guamilito, 4 y 5 Calle, 3 Ave. Edif. Ram, San Pedro Sula  
 E-Mail: dipco@yahoo.com  
 Teléfono: (504) 9627-9378

## FORMATO DE COTIZACION MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

LIC: NERY ORLANDO CHACON  
 ALCALDE MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN

Después de haber examinado el Documentos de Cotización, incluyendo la(s) enmienda(s) [0], del Proyecto:

**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBE:  
 CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL  
 PARAÍSO COPÁN.**

Nosotros: **DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L.**

RTN: 0501-902132-5919

CORREO: [dipco@yahoo.com](mailto:dipco@yahoo.com)


CELULAR: (504) 9627-9378

Ofrecemos ejecutar el proyecto con el siguiente presupuesto.

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	P.U	VALOR
TRACTOR	HORAS	70.00	3,000.00	L. 210,000.00
EXCAVADORA	HORAS	160.00	3,000.00	L. 480,000.00
MOTONIVELADORA	HORAS	30.00	2,850.00	L. 85,500.00
RETRO-EXCAVADORA	HORAS	60	1,500.00	L. 90,000.00
VIBRO-COMPACTADOR	HORAS	10.00	1,500.00	L. 15,000.00
VOLQUETA 12 M3 ( RELLENO Y ACARREO MATERIAL DE RIO TIPO CASCAJO )	VIAJES	20.00	2,700.00	L. 54,000.00
MOVILIZACION DE EQUIPO ( CONSIDERAR RECORIDO DE EQUIPO SIN LOWBOY A DIFERENTES COMUNIDADES )	GLOBAL	1.00	35000.00	L. 35,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS.</b>				<b>L. 969,500.00</b>

Firma autorizada

Nombre:  
 Cargo del Firmante:  
 Nombre del Oferente:

  
  
**EMIN VARGAS**  
**GERENTE GENERAL**  
**DISEÑOS PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L.**



MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO  
DEPARTAMENTO DE COPAN, HONDURAS, C. A  
TEL.2651-11-03



## MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

Fecha 7 de diembre de 2023

Ingeniero: **DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA**  
Gerente G. Empresa: **CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA**  
Su Oficina

### NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Estimado Ing.

**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUEVIAS, CON EQUIPO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN**

Le notificamos que según al dictamen de la comisión evaluada, su oferta presentada el 5 de diembre del 2023 fue seleccionada para la ejecución del proyecto en mención por un monto de:

**NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS ( 956,300**

Me dirijo a usted para notificarle que este proyecto fue adjudicado a su empresa:

Por el monto de :

**NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS (956,300.00)**

Por este medio le solicitamos presentarse a firmar el contrato y presentar dentro de los siguientes 10 días hábiles la garantía o cheque certificado de cumplimiento de contrato, por el 15% del valor del contrato y con vigencia de 3 meses posteriores a la fecha de finalización del contrato.

Le saluda cordialmente.

  
LIC: **NERY ORLANDO CHACON**  
2022-2025  
ALCALDE MUNICIPAL  
EL PARAISO COPAN

C.C secretaria  
C.C Unidad de Presupuest  
C.C Archivo



MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO  
DEPARTAMENTO DE COPAN, HONDURAS, C. A  
TEL.2651-11-03



## MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

Fecha: 8 de enero del 2024

Ingeniero: **DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA**  
Gerente G. Empresa: **CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA**  
Su Oficina


### ORDEN DE INICIO

**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUEVIAS, CON EQUIPO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN**

**Estimado Ing.**

Por este Medio La Municipalidad de EL PARAISO COPAN, le solicita dar inicio a los trabajos de construcción del proyecto en mención a partir de 8 de enero del 2024

Atentamente.

  
LIC: NERY ORLANDO CHACON  
ALCALDE MUNICIPAL  
EL PARAISO COPAN

C.C secretaria  
C.C Unidad de Presupuest  
C.C Archivo



*Municipalidad de El Paraíso*  
*Departamento de Copan, Honduras C.A*



Tel. 2651-11-03

MPC-0001-2024

**CONTRATO POR TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN**

En el municipio de el Paraíso Copán al primer día del mes de enero del año 2023, constituidos en el despacho municipal del alcalde, por **UNA PARTE**, el Licenciado Nery Orlando Chacón Rosa, en su condición de alcalde, con documento nacional de identificación No. 1414-1981-00073, casado, hondureño y vecino del municipio de el Paraíso Copán, actuando en representación de la Corporación Municipal y facultado en la Ley De Municipalidades en el artículo no. 43 donde le da las facultades para representar a la Municipalidad en todos estos actos contractuales, se llamará **LA MUNICIPALIDAD**, **LA OTRA PARTE**: El Ingeniero **DELVIN ADONIS MUNGUÍA PASCUA**, casado, con documento nacional de identificación No. 1607-1975-00100, RTN 16071975001007, quien actúa como persona natural, **GERENTE GENERAL DE EMPRESA CONSTRUCTORA MUNGUÍA PASCUA**, quien en lo sucesivo se llamara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato **POR TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN**, Ambas partes, se reconocen la suficiente capacidad legal para la formalización del presente contrato administrativo, que lo llevan a efecto con sujeción a los siguientes antecedentes y estipulaciones, este contrato se registrá bajo las clausulas siguientes

**ANTECEDENTES**

**PRIMERO:** En reunión sostenida con fecha 15 de diciembre con representantes de los patronatos de las aldeas beneficiadas con los proyectos, una vez tramitado el expediente de contratación, por el procedimiento de contratación directa, acordó adjudicar a la Empresa Constructora Munguía Pascua el proyecto de **TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN**.

**SEGUNDO:** El Ing. Delvin Adonis Munguía Pascua, Gerente General de Empresa Constructora Munguía Pascua, acepta la referida adjudicación y, en consecuencia fijan y aceptan las siguientes

**ESTIPULACIONES**

**PRIMERA.- Objeto del contrato:** El Ing. Delvin Adonis Munguía Pascua, Gerente General de Empresa Constructora Munguía Pascua se compromete a ejecutar los Trabajos De Emergencias Por Lluvias, Con Equipo Y Maquinaria De Construcción, Remoción De Derrumbes, Canalización, Relleno, Mejoramiento De Calzada En Diferentes Comunidades

**Presupuesto de costo de la obra:**

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	VALOR
Tractor	Horas	70	3,000.00	210,000.00



*Municipalidad de El Paraíso*  
*Departamento de Copan, Honduras C.A*



Tel. 2651-11-03

Excavadora	Horas	160	2,950.00	472,000.00
Motoniveladora	Horas	30	2,850.00	85,500.00
Retro-Excavadora	Horas	60	1,500.00	90,000.00
Vibro-Compactadora	Horas	10	1,500.00	15,000.00
Volqueta de 12 M3 relleno y acarreo de material de rio tipo cascajo	viajes	20	2,690.00	53,800.00
Movilización de equipo ( Considerar recorrido de equipo sin lowboy a diferentes comunidades	Global	1	30,000.00	30,000.00
Total				956,300.00

**SEGUNDA.- Precio del contrato:** El precio del contrato es de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRA (956,300.00)** y será cancelado de acuerdo a las estimaciones de avance de la obra de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, de conformidad con la propuesta de la adjudicataria.

**TERCERA.- Pago del precio:** El precio del contrato se hará efectivo o en cheque certificado mediante estimaciones de avance física de la obra, comprendiendo la obra ejecutada.

**CUARTA.- Plazo de ejecución:** El plazo de ejecución de la obra es de **DOS MESES**, a contar desde el día siguiente al de la suscripción del acta de comprobación de replanteo, la cual se efectuará en el plazo de cinco días calendario desde la fecha de formalización del contrato.

**QUINTA.- Plan de Seguridad y Salud:** El contratista elaborará el plan de seguridad y salud que desarrolle el estudio de seguridad y salud contenido en el proyecto y lo presentará, dentro del plazo de quince días naturales desde la fecha de formalización del contrato, al coordinador de seguridad y salud de las obras nombrado por el Ayuntamiento.

**SEXTA.- Obligaciones específicas fase de ejecución:** Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el contratista, en la fase de ejecución del contrato, está obligado a lo siguiente:

- A cumplir las condiciones salariales de sus trabajadores conforme al Código del trabajo y Convenio Colectivo Sectorial de aplicación y.
- Asimismo, a cumplir las condiciones de igualdad salarial de género con respecto a todo el personal de la empresa.

Las obligaciones detalladas anteriormente, cuyo cumplimiento se exige en la fase de ejecución del contrato, se establecen como obligaciones esenciales del contrato y su incumplimiento dará lugar a su resolución.

**SÉPTIMA.- Garantía definitiva:** Para responder del cumplimiento del contrato, la adjudicataria ha constituido ante la Tesorería Municipal, garantía de cumplimiento y calidad a través de la firma de un cheque certificado por el monto de Lps. 143,445.00 que corresponde a un 10% Lps. 95,630.00 garantía de cumplimiento y 5% Lps. 47,815.00 garantía de calidad.

**OCTAVA.- Cumplimiento Tributario:** A la Empresa Constructora Munguía Pascua no se le hace la retención del 12.5% del impuesto sobre la renta porque está incorporada al régimen de facturación y pagos a cuenta en la SAR.

El pago de impuesto sobre en volumen de ventas que debe pagar a la Municipalidad es de Lps.



*Municipalidad de El Paraíso*  
*Departamento de Copan, Honduras C.A*



Tel. 2651-11-03


El pago de impuesto sobre en volumen de ventas que debe pagar a la Municipalidad es de Lps. 3,990.24.

**OCTAVA: Régimen jurídico.-** El presente contrato tiene naturaleza administrativa,

formando parte del mismo el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación y la oferta de la adjudicataria, de lo que el contratista deja constancia, firmando en este acto, su conformidad en dos ejemplares del referido pliego y, en lo no previsto en los mismos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratación De Estado y Ley de Municipalidades.

Y en prueba de conformidad y aceptación se firma el presente documento a los 01 día del mes de enero del año 2024.

  
Ney Orlando Chacón Rosa  
Alcalde Municipal

  
Delvin Adonis Munguía Pascua  
Constructora Munguía Pascua  
Gerente General





Bo. Barandillas, 7 y 8 Calle, 5 y 6 Ave., San Pedro Sula  
delvin.pascua@gmail.com  
Teléfono: (504) 9477-5336



MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

## MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

Dr. NESTOR ANDRÉS CHAYÓN  
ALCALDE MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN

SEÑORADO AL CALDER:

### ESTIMACION UNICA

Se solicita la elaboración del presupuesto de proyecto para realizar trabajos de emergencia por lluvias, con equipo y maquinaria de construcción, remoción de derrumbes, canalización, relleno, mejoramiento de calzada en diferentes comunidades, en el municipio de El Paraíso Copán.

#### CONTRATO DE PROYECTO

TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.

Se otorga particular en sujeción de los datos antes mencionados.

Nombre:  
Cargo del Proyecto:  
Cargo del Cliente:

Nombre del contratista:

Nombre del contratista:  
Cargo del contratista:  
Cargo del contratista:



Bo. Barandillas, 7 y 8 Calle, 5 y 6 Ave., San Pedro Sula  
delvin.pascua@gmail.com  
Teléfono: (504) 9477-5336

## MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

LIC: NERY ORLANDO CHACON  
ALCALDE MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN

ESTIMADO ALCALDE:


Un cordial saludo, el motivo de la presente es para remitir a usted la Estimación Única del Proyecto:


**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.**

Sin otro particular se suscribe de usted atentamente.

Nombre:  
Cargo del Firmante:  
Nombre del Oferente:  
Cargo del Firmante:  
Nombre del Oferente:

Firma autorizada

  
  
**DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA**  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA**



Bo. Barandillas, 7 y 8 Calle, 5 y 6 Ave., San Pedro Sula  
delvin.pascua@gmail.com  
Teléfono: (504) 9477-5336

## MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

**RECIBO POR: L. 956,300.00**

Recibí de la Tesorería de la Municipalidad El Paraiso Copan, la cantidad de " NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, TRECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS ( LPS. 956,300.00 )". Valor que nos corresponde por el pago de la ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO:

**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, DE EL MUNICIPIO EL PARAÍSO COPÁN.**

Firma autorizada




Nombre:  
Cargo del Firmante:  
Nombre del Oferente:

**DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA**  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA**

Datos Personales del Representante  
IDENTIDAD: 1607-1975-00100  
R.T.N. : 16071975001007

Datos de la Empresa  
R.T.N. : 16071975001007



Bo. Barandillas, 7 y 8 Calle, 5 y 6 Ave., San Pedro Sula  
delvin.pascua@gmail.com  
Teléfono: (504) 9477-5336

## MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN CONCILIACION

**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, DE EL MUNICIPIO EL PARAÍSO COPÁN.**

Reunidos en el municipio de EL PARAISO, departamento de Copan, ambas partes CONTRATISTA Y AUTORIDADES DE ALCALDIA MUNICIPAL realizamos la medición del proyecto y llegamos a la siguiente conciliación de obra:

CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA

### Conciliación de Obra

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	P.U	VALOR
TRACTOR	HORAS	70.00	3,000.00	L 210,000.00
EXCAVADORA	HORAS	160.00	2,950.00	L 472,000.00
MOTONIVELADORA	HORAS	30.00	2,850.00	L 85,500.00
RETRO-EXCAVADORA	HORAS	60.00	1,500.00	L 90,000.00
VIBRO-COMPACTADOR	HORAS	10.00	1,500.00	L 15,000.00
VOLQUETA 12 M3 ( RELLENO Y ACARREO MATERIAL DE RIO TIPO CASCAJO )	VIAJES	20.00	2,690.00	L 53,800.00
MOVILIZACION DE EQUIPO ( CONSIDERAR RECORIDO DE EQUIPO SIN LOWBOY A DIFERENTES COMUNIDADES )	GLOBAL	1.00	30,000.00	L 30,000.00
<b>TOTAL DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO LPS.</b>				<b>L 956,300.00</b>

*Stefany Soriano*  
STEFANY MERARY SORIANO  
Unidad Técnica de Gestión Municipal



*Delvin Adonis Munguia Pascua*  
DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA  
GERENTE GENERAL  
CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA





Bo. Barandillas, 7 y 8 Calle, 5 y 6 Ave., San Pedro Sula  
delvin.pascua@gmail.com  
Teléfono: (504) 9477-5336

## FACTURACION MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN


CARGOS POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA EFECTUADOS DE ACUERDO AL PROYECTO


**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN,  
REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN  
DIFERENTES COMUNIDADES, DE EL MUNICIPIO EL PARAÍSO COPÁN.**

CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA


Descripción del trabajo Realizado:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	P.U	VALOR
TRACTOR	HORAS	70	3,000.00	L. 210,000.00
EXCAVADORA	HORAS	160	2,950.00	L. 472,000.00
MOTONIVELADORA	HORAS	30	2,850.00	L. 85,500.00
RETRO-EXCAVADORA	HORAS	60	1,500.00	L. 90,000.00
VIBRO-COMPACTADOR	HORAS	10	1,500.00	L. 15,000.00
VOLQUETA 12 M3 ( RELLENO Y ACARREO MATERIAL DE RIO TIPO CASCAJO )	VIAJES	20	2,690.00	L. 53,800.00
MOVILIZACION DE EQUIPO ( CONSIDERAR RECORIDO DE EQUIPO SIN LOWBOY A DIFERENTES COMUNIDADES )	GLOBAL	1	30,000.00	L. 30,000.00
TOTAL DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO LPS.				L. 956,300.00

  
STEFANY MERARY SORIANO  
Unidad Técnica de Gestión Municipal  
2022-2026

  
DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA  
GERENTE GENERAL  
CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA

  
LIC. NERY ORLANDO CHACON  
ALCALDE MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN



Bo. Barandillas, 7 y 8 Calle, 5 y 6 Ave., San Pedro Sula  
delvin.pascua@gmail.com  
Teléfono: (504) 9477-5336


**CERTIFICACION**  
**MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN**


**ESTIMACION L. 956,300.00**

Los suscritos, CERTIFICAN que el valor por los cargos anotados son correctos, que se han efectuado en la manera indicada en los términos del contrato con nombre:

**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN,  
REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES  
COMUNIDADES, DE EL MUNICIPIO EL PARAÍSO COPÁN.**

Que no ha recibido pago por los mismos ni será reclamado en el futuro de este o cualquier otro contrato y que los materiales o servicios cubiertos por dichos cargos fueron recibidos.

  
\_\_\_\_\_  
**STEFANY MERABY SORIANO**  
Unidad Técnica de Gestión Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA**  
GERENTE GENERAL  
CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. NERY ORDANDO CHACON**  
ALCALDE MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN



Bo. Barandillas, 7 y 8 Calle, 5 y 6 Ave., San Pedro Sula  
delvin.pascua@gmail.com  
Teléfono: (504) 9477-5336

## MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

### ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN,  
REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN  
DIFERENTES COMUNIDADES, DE EL MUNICIPIO EL PARAÍSO COPÁN.**

Contratista: **CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA**

MONTO DEL CONTRATO Lps.	ESTIMACIONES ACUMULADAS Lps.	ESTIMACION ESTE PERIODO Lps.	SALDO DEL CONTRATO. Lps.
956,300.00	0.00	956,300.00	0.00

*Stefany Merary Soriano*

**STEFANY MERARY SORIANO**  
U. T. G. M.  
Unidad Tecnica de Gestion Municipal



*Delvin Adonis Munguia Pascua*

**DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA**  
GERENTE GENERAL  
CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA



*Orlando Chacon*

**ORLANDO CHACON**  
ALCALDE MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN





## MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

### CUADRO DE ESTIMACION DEL PROYECTO

**TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, DE EL MUNICIPIO EL PARAÍSO COPÁN.**

No.	CONCEPTO	OBRA SEGÚN CONTRATO ORIGINAL				EJECUT. ANTERIOR		EJECUT. ESTE PERIODO		ACUMULADO A LA FECHA		%
		UNIDAD	P. U.	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
9	TRACTOR	HORAS	L. 3,000.00	70.00	210,000.00	0.00	0.00	70.00	210,000.00	70.00	210,000.00	100
10	EXCAVADORA	HORAS	L. 2,950.00	160.00	472,000.00	0.00	0.00	160.00	472,000.00	160.00	472,000.00	100
12	MOTONIVELADORA	HORAS	L. 2,850.00	30.00	85,500.00	0.00	0.00	30.00	85,500.00	30.00	85,500.00	100
13	RETRO-EXCAVADORA	HORAS	L. 1,500.00	60.00	90,000.00	0.00	0.00	60.00	90,000.00	60.00	90,000.00	100
9	VIBRO-COMPACTADOR	HORAS	L. 1,500.00	10.00	15,000.00	0.00	0.00	10.00	15,000.00	10.00	15,000.00	100
10	VOLQUETA 12 M3 ( RELLENO Y ACARREO MATERIAL DE RIO TIPO CASCAJO )	VIAJES	L. 2,690.00	20.00	53,800.00	0.00	0.00	20.00	53,800.00	20.00	53,800.00	100
11	MOVILIZACION DE EQUIPO ( CONSIDERAR RECORIDO DE EQUIPO SIN LOWBOY A DIFERENTES COMUNIDADES )	GLOBAL	L. 30,000.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	100
<b>TOTAL DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO LPS.</b>					<b>956,300.00</b>		<b>0.00</b>		<b>956,300.00</b>		<b>956,300.00</b>	

*Stefany Merary Soriano*  
 STEFANY MERARY SORIANO  
 Unidad Técnica de Gestión Municipal  
 U. T. G. M.  
 2022-2026  
 HOYURAS, C.A.

*Delvin Adonis Munguia Pasqua*  
 DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA  
 CONSTRUCTORA MUNGUIA PASCUA

*Nery Orlando Chacon*  
 LIC: NERY ORLANDO CHACON  
 ALCALDE MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN



Bo. Barandillas, 7 y 8 Calle, 5 y 6 Ave., San Pedro Sula

delvin.pascua@gmail.com

Teléfono: (504) 9477-5336

### FORMATO MEMORIA DE CALCULO

TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, DE EL MUNICIPIO EL PARAÍSO COPÁN.

#### HORAS MAQUINAS TRABAJADAS TRACTOR

Tramo, ubicación o Referencia	Actividad	Horómetro	Horómetro	Hrs/
		Inicial	Final	Día
Casco Urbano El Paraíso Copan	Canalización Rio	7654.2	7662.8	8.6
		7662.8	7670.7	7.9
		7670.7	7679.4	8.7
		7679.4	7687.9	8.5
		7687.9	7697.1	9.2
		7697.1	7706.0	8.9
		7706.0	7715.3	9.3
		7715.3	7724.2	8.9
		7724.2	7724.2	0.0
		7724.2	7724.2	0.0
		7724.2	7724.2	0.0
Total Horas			70.0	



#### HORAS MAQUINAS TRABAJADAS EXCAVADORA 320

Tramo, Ubicación o Referencia	Actividad	Horómetro	Horómetro	Hrs/
		Inicial	Final	Día
Casco Urbano. El Paraíso Copan	Canalización y Reforzamiento. de Borda Rio	7654.2	7664.1	9.9
		7664.1	7674.3	10.2
		7674.3	7684.0	9.7
		7684.0	7694.5	10.5
		7694.5	7704.3	9.8
		7704.3	7713.4	9.1
		7713.4	7722.7	9.3
		7722.7	7732.4	9.7
Basurero Municipal	Limpieza	7732.4	7742.0	9.6
Comunidad Las Flores	Acceso a Embalse y Tanque Agua	7742.0	7752.4	10.4
		7752.4	7762.2	9.8
Tramo Las Flores Nueva Esperanza	Remoción de Derrumbes	7762.2	7771.7	9.5
		7771.7	7781.5	9.8
Tramo La Laguna - Rio Lindo	Remoción y Habilitación de paso	7781.5	7789.8	8.3
		7789.8	7797.6	7.8
Tramo Paraíso - La Cumbre	Limpieza y Canalización en caja en el KM 2+100	7797.6	7805.8	8.2
		7805.8	7814.2	8.4
Total Horas			160.0	

*[Handwritten signature]*

**HORAS MAQUINAS TRABAJADAS RETRO-EXCAVADORA**

Tramo, Ubicación o Referencia	Actividad	Horómetro	Horómetro	Hrs/
		Inicial	Final	Día
Casco Urbano Paraíso Copan	Limpeza y Votado de Material	267.5	276.2	8.7
Comunidad Las Guamas	Remocion de Derrumbes	276.2	284.6	8.4
		284.6	292.7	8.1
Basurrero Municipal	Limpeza	292.7	301.4	8.7
		301.4	310.3	8.9
Carretera P. El Paraíso a San Antonio	Remocion de Derrumbes	310.3	317.8	7.5
		317.8	323	5.2
Comunidad San Cristobal	Reparacion de Paso	323	327.5	4.5
<b>Total Horas</b>				<b>60.0</b>

**HORAS MAQUINAS TRABAJADAS MOTONIVELADORA 140H**

Tramo, Ubicación o Referencia	Actividad	Horómetro	Horómetro	Hrs/
		Inicial	Final	Día
Casco Urbano Paraíso Copan	Mejoramiento de Calle Frente Iglesia	5012.3	5018.9	6.60
Tramo Paraíso - La Cumbre	Relleno y Afinado Accesos en caja en el KM 2+100	5018.9	5025.9	7.00
Comunidad Las Flores	Mejoramiento Calle Principales	5029.9	5038.8	8.90
		5038.8	5046.3	7.50
<b>Total Horas</b>				<b>30.0</b>

**HORAS MAQUINAS TRABAJADAS VIBROCOMPACTADOR**

Tramo, Ubicación o Referencia	Actividad	Horómetro	Horómetro	Hrs/
		Inicial	Final	Día
Casco Urbano Paraíso Copan	Mejoramiento de Calle Frente Iglesia	116.3	120	3.7
Tramo Paraíso - La Cumbre	Relleno y Afinado Accesos en caja en el KM 2+100	120	122.5	2.5
Comunidad Las Flores	Mejoramiento Calle Principal	122.5	126.3	3.8
<b>Total Horas</b>				<b>10.0</b>

**RELLENO CON MATERIAL DE RIO TIPO CASCAJO**

Tramo, Ubicación o Referencia	Actividad	Capacidad	Nunero
		M3	Viajes
Casco Urbano Paraíso Copan	Relleno Calle Frente Iglesia	12	9
Tramo Paraíso - La Cumbre	Relleno en paso dañado y Accesos en caja en el KM 2+100	12	11
<b>Total Horas</b>			<b>20.0</b>



FOTOS DE PROYECTO



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



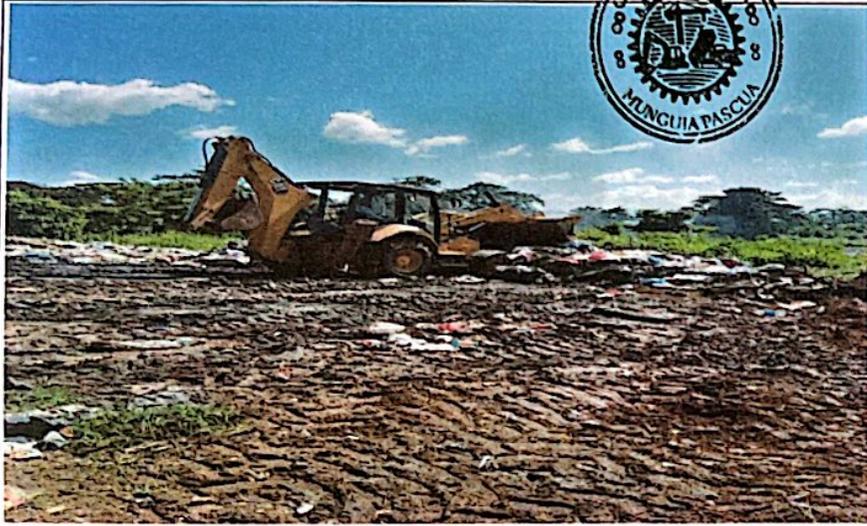
TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



FOTOS DE PROYECTO



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



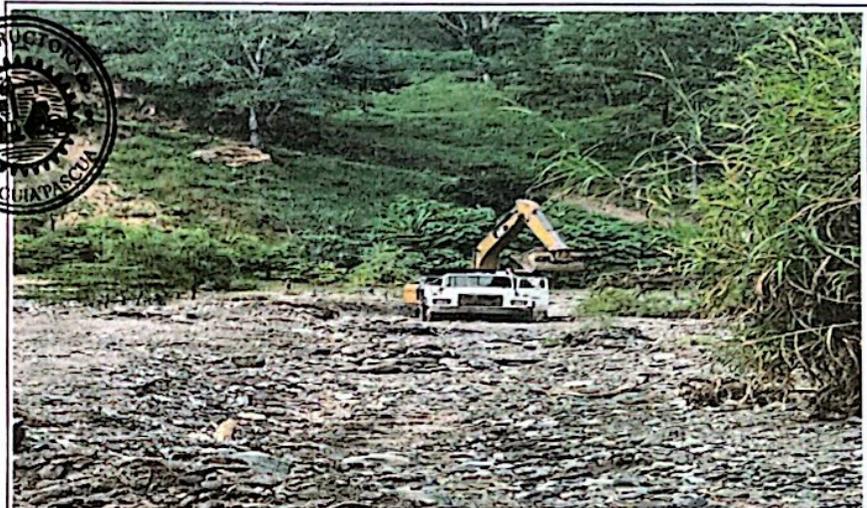
TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.

FOTOS DE PROYECTO

*Handwritten signature*



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.

FOTOS DE PROYECTO



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.

*Handwritten signature*



FOTOS DE PROYECTO



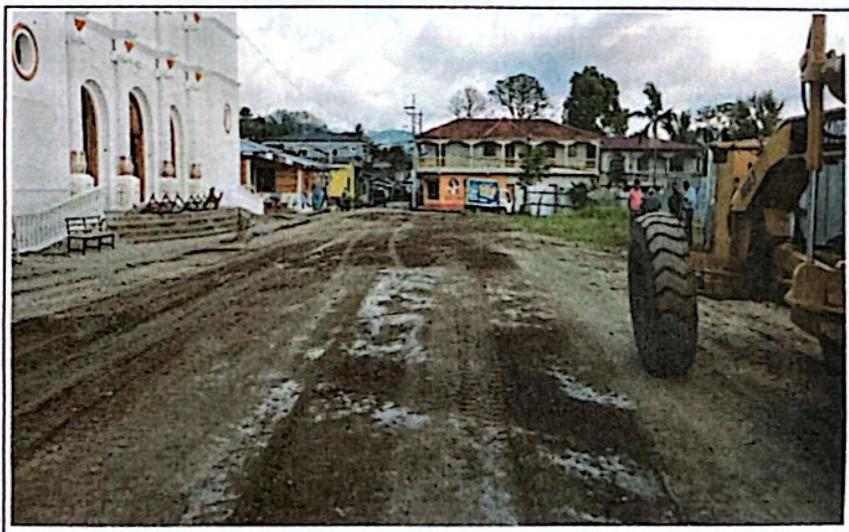
TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.

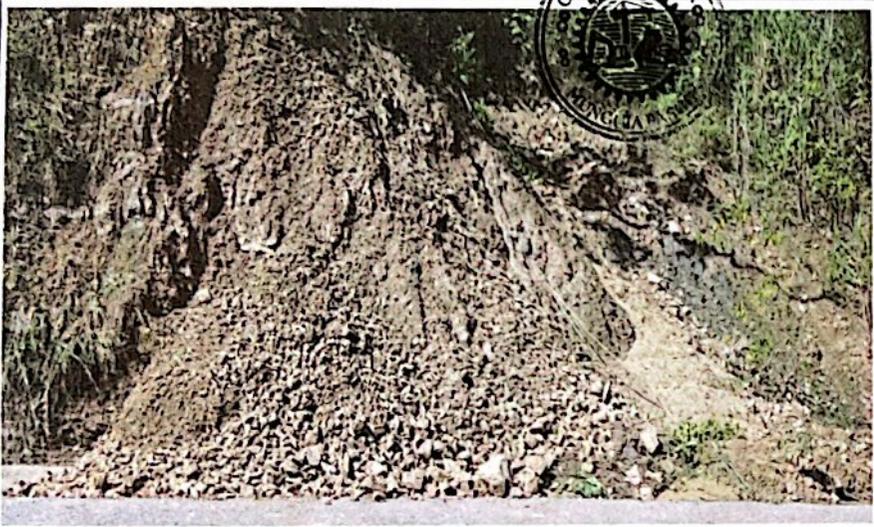


TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.

ISA



FOTOS DE PROYECTO



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.



TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARA DE CONSTRUCCIÓN, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENO, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN.
