



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

CONTRATO DE INVERSIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTO "AMPLIACIÓN INSTITUTO TÉCNICO FRANCISCO MORAZÁN" SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) Y MAURO MIGUEL RAMÍREZ MORENO.- FUENTE BCIE. MODALIDAD CENTRALIZADA.

Nosotros: **NASRY JUAN ASFURA ZABLAH**, mayor de edad, casado, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureño, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1958-03886, y de este domicilio actuando en condición de Director Ejecutivo con rango de Ministro del **FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada mediante Decreto Legislativo número doce guión noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del año mil novecientos noventa (1990), con **RTN 08019995292594**, nombrado según acuerdo Ejecutivo número ciento cuarenta y siete guión dos mil diez (147-2010), de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil diez (2010), en adelante denominado "**EL FHIS**", y por la otra el señor **MAURO MIGUEL RAMÍREZ MORENO**, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Civil, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1985-14091, RTN. 08011985140914 con domicilio en Lomas del Pinar, Santa Lucia, Departamento de Francisco Morazán, en adelante **EL CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. CONTRATANTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS); CONTRATO:** Significa el presente contrato entre FHIS y el CONTRATISTA, **CONTRATISTA:** La persona natural o jurídica debidamente calificada en el Banco de Contratistas de **EL FHIS. ORDEN DE INICIO:** Establece que el inicio del proyecto es quince días (15) después de la fecha de la recepción del anticipo por parte del Contratista; **BITACORA:** Libro en el cual se registran en orden cronológico los eventos relevantes que se suscitan durante la ejecución del proyecto; **AMPLIACION DE TIEMPO:** Tiempo adicional que se concede al contratista cuando el proyecto lo requiera en caso de ser necesaria obra adicional o por retraso en la ejecución por causas no imputables a él (condiciones climáticas, escasez de materiales, retraso en el pago de estimaciones o en la aprobación de órdenes de cambio); **LA SUPERVISION:** Es la actividad realizada por un profesional calificado y registrado en el banco de contratistas de **EL FHIS** que garantiza el cumplimiento del contrato por parte del contratista, y que aplica especificaciones técnicas y de calidad de obra, en el tiempo establecido;



Handwritten signature/initials

FHIS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FECHA: 08.09.2011
FIRMA: *[Handwritten Signature]*



GARANTÍA: Es la fianza o garantía bancaria mediante la cual el contratista garantiza el anticipo de fondos, cumplimiento del contrato y la calidad de obra del proyecto; **FISCALIA:** Es un proceso administrativo sistemático de revisión, documentación y actualización de datos durante las diferentes etapas de un proyecto, mediante la emisión de órdenes de pago por anticipos, estimaciones, órdenes de cambio, de inversión y supervisión; **EL INSPECTOR:** Es el Representante de **EL FHIS** encargado de administrar los contratos de supervisión y de infraestructura; y es el responsable de verificar en todo momento la presencia del Contratista y del Supervisor en el proyecto, verificar que se cumplan los términos de referencia y especificaciones, con el fin de garantizar la calidad de obra. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA** se compromete a construir y dejar listas para su uso, las obras que conforman el Proyecto: **"AMPLIACION INSTITUTO TÉCNICO FRANCISCO MORAZÁN"**, que incluirán: a) realizar la rehabilitación y reparación de aulas escolares que están deterioradas por falta de presupuestos; b) La ampliación de centros educativos a través de la construcción de nuevas aulas escolares, obedeciendo al crecimiento escolar reportado por la Secretaría de Educación, c) Incrementar los niveles de escolaridad y los valores culturales, en los municipios que se ejecuten las obras propuestas; d) Disminución de la tasa de analfabetismo, dicho proyecto se desprende del "Programa Multisectorial de emergencia Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social y que se encuentra ubicado en la **ALDEA SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**, código 100205, aprobado por el Comité de Operaciones de **EL FHIS** mediante Acta No. 1067 de fecha 31 de marzo del 2011, que será ejecutado conforme a la Ley de Contratación del Estado, financiado con fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través del Convenio de Préstamo 2045 suscrito el 27 de Septiembre del año 2010. **TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al contratista asciende a la cantidad de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 73/100 (L. 1,864,403.73)** **CUARTA: ANTICIPO. EL FHIS,** otorgará a **EL CONTRATISTA** un anticipo por un monto de **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 56/100 (L. 279,660.56)**, equivalente al quince por ciento (15%) del monto total de este contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de **EL FHIS**, las correspondientes garantías bancarias que rinda **EL CONTRATISTA**. Dicho valor será desembolsado en un plazo de diez (10) días una vez que el **FHIS** haya recibido y aceptado la garantía de anticipo. Previo al pago de la primera estimación, debe existir evidencia de que **EL CONTRATISTA** ha instalado el rótulo



Handwritten signature/initials

ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
FECHA:	08-09-2011
FIRMA:	<i>Handwritten signature</i>



de la obra de acuerdo al diseño que **EL FHIS** establece. **QUINTA: FORMA DE PAGO.** **EL FHIS** pagará al Contratista los montos que correspondan conforme a las estimaciones presentadas de acuerdo al avance físico del proyecto; dichos desembolsos se harán de acuerdo a las estimaciones presentadas por parte de **EL CONTRATISTA**, debidamente revisadas y autorizadas por **EL SUPERVISOR** y el Inspector. De cada estimación presentada por el ejecutor será deducido proporcionalmente a partir de la primera estimación, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance físico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%, a las estimaciones se les deducirá las retenciones establecidas por La Ley. **SEXTA: ORDEN DE INICIO:** Se considerará como tal quince días (15) después de la entrega del cheque de anticipo que equivale al quince por ciento (15%) por parte de **EL FHIS** y la recepción por parte de **EL CONTRATISTA.** **SEPTIMA: PLAZO Y MULTA PLAZO:** **EL CONTRATISTA** se compromete a construir la obra objeto de este Contrato dentro de **ciento veinte (120)** días calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; **MULTA:** En caso que **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a **EL FHIS** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad del cero punto ciento veinte y cinco por ciento (0.125%) sobre el monto del contrato por cada día de retraso que equivalente a **DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 50/100 (L. 2,330.50)** sobre el monto del contrato por cada día de retraso, hasta un máximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, pasado este período será causa de rescisión del contrato a menos que a consideración de **EL FHIS** sea contrario a sus intereses. **OCTAVA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA,** previo a la entrega del anticipo rendirá: a) Una Garantía de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir, que asciende a **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 56/100 (L. 279,660.56),** b) Una garantía de cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) sobre el valor del contrato; que asciende a **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 56/100 (L. 279,660.56),** ambas garantías tendrán una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de su emisión y podrán constituirse a través de una Garantía Bancaria o Fianza de una Institución Aseguradora. Si por causas imputables a **EL CONTRATISTA** no se constituyeren estas garantías en el plazo previsto, **EL FHIS** declarará resuelto el contrato. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato, por un término mayor de tres meses, **EL CONTRATISTA** deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación de la garantía de cumplimiento será sobre el monto pendiente de ejecución, siempre



Handwritten signature/initials.

FHIS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FECHA: 08-09-2014
FIRMA: [Signature]



que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente; **c)** Se establece una Garantía de Calidad de Obra equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, la cual deberá presentarse previo al pago del último desembolso y tendrá una vigencia de doce (12) meses, a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva. Todos los documentos de garantía deberán contener la siguiente cláusula obligatoria. **"LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".**

NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus cláusulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes. **DÉCIMA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL FHIS** podrá rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantías, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: **a)** Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y especiales del mismo; **b)** Por no iniciar la obra después de los quince (15) días calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; **c)** Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por **EL FHIS**, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** y/o **EL INSPECTOR** o con base a las visitas que **EL FHIS** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente Contrato; **d)** Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta días (80), salvo casos excepcionales determinados por **EL FHIS**; **e)** El incumplimiento en la ejecución del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; **f)** No cumplir con las instrucciones de la Supervisión o inspectoría de la Dirección de Control y Seguimiento de **EL FHIS** anotados en la bitácora o a través de correspondencia; **g)** En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, **EL FHIS** procederá a exigir a **EL CONTRATISTA** su devolución, caso contrario ejecutará la garantía rendida para tal efecto. **CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:** **a)** A requerimiento de **EL FHIS** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevaecientes no hicieran posible la terminación del proyecto, en cuyo caso la causal será de mutuo acuerdo; **b)** Por incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para continuar la ejecución el proyecto; **c)** Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; **d)** Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **EL FHIS**, en todo caso se hará una liquidación de los trabajos hechos




Handwritten initials/signature

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 FECHA: 08-09-2011
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*



a la fecha y de proceder, se hará a **EL CONTRATISTA** un pago justo y equitativo.

e) Por Muerte de **EL CONTRATISTA**; f) Por aplicación de lo establecido en el **Artículo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República)** el que literalmente dice: "En todo Contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del Contrato; g) Todas las causales establecidas en las bases de Licitación, en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **DÉCIMA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO:** Forman parte de este contrato los siguientes documentos: a) Planos y Diseños; b) Desglose y Análisis de Precios Unitarios; c) Memoria de cálculo; d) Orden de Inicio; e) Presupuesto; f) Especificaciones Técnicas; g) Cronograma de Actividades; h) Condiciones Generales y Especiales del Contrato; i) Desglose de Oferta; j) Nota de Adjudicación k) Garantías; l) Bitácora; m) Adendum; n) Constancia para trámite de Garantía; ñ) Documentos de Licitación. **DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.** Cualquier controversia relacionada directa o indirectamente con la interpretación o implementación de este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarla en el menor tiempo posible, imperando sobre todo el ánimo por el bienestar de los beneficiarios.- No obstante, en caso de que las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes, ya sean estas de la naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, a cuyo efecto **EL CONTRATISTA** renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de **EL FHS**. **DECIMA TERCERA: ACEPTACIÓN.** Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas de este contrato. En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil once.


NASRY JUAN ASFURA ZABLAH
 DIRECTOR EJECUTIVO FHS
 RTN FHS 08019995292594





MAURO MIGUEL RAMÍREZ MORENO
 CONTRATISTA
 RTN: 08011985140914



F.H.I.S.
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FECHA: 08-09-2011

FIRMA: 



CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES GENERALES: PRIMERA: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a lo siguiente: **a)** En los proyectos que requieran un ingeniero civil residente, antes de dar inicio a la obra, EL CONTRATISTA solicitará por escrito a EL CONTRATANTE la no objeción del mismo, la que será otorgada a través de la Dirección de Control y Seguimiento; **b)** Utilizar los recursos del financiamiento único y exclusivamente para el propósito indicado en la Cláusula Segunda del Contrato de mérito; **c)** Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o más rótulos distintivos de EL CONTRATANTE con las indicaciones que el BCIE indique, de acuerdo al modelo y especificaciones del FHIS, la instalación de estos rótulos es condición previa al pago de la primera estimación, salvo casos imputables a EL CONTRATANTE; **d)** Reportar inmediatamente a EL CONTRATANTE sobre cualquier situación o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminación de la obra objeto del Contrato; **e)** Contratar el personal que trabajará en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; **f)** En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usará las fichas de rendimiento de EL CONTRATANTE, de no existir, EL CONTRATISTA propondrá la ficha y se remitirá a la unidad de costos a través de la Dirección de Control y Seguimiento para su revisión y aprobación.

SEGUNDA: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto, por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presenten durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL FHIS en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.

TERCERA: IMPACTO AMBIENTAL. Con el propósito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en áreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecución de la obra o al finalizar la misma; tampoco podrá incinerarlos o enterrarlos en áreas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie



F.H.I.S.
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 FECHA: 08.09.2011
 FIRMA: _____



polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes químicos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plástico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Además el Contratista estará en la obligación de reemplazar toda planta, mata o árbol que retire durante la ejecución de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podrá talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos árboles mayores de veinticinco años o que sean de las especies que están en peligro de extinción.- **EI CONTRATISTA** se compromete además a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Ambiente de **EL FHS**, las cuales formarán parte de las especificaciones técnicas del mismo. **CONDICIONES ESPECIALES. PRIMERA: OBLIGACIONES:** a) **EI CONTRATISTA** presentará un Cronograma de Ejecución de Actividades en la entrega de sitio; b) **EI CONTRATISTA** entregará a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmontó de la obra objeto de este contrato y obtendrá de los beneficiarios nota de descargo; c) **EI CONTRATISTA** mantendrá en el sitio de la obra la bitácora del proyecto, el incumplimiento dará lugar a una sanción equivalente a QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00) cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- **SEGUNDA: SUPERVISIÓN: EL CONTRATANTE** se reservará el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisión por parte de **EL CONTRATANTE** no libera de responsabilidad a las demás partes involucradas en el presente Contrato.- **TERCERA: CLÁUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS:** Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de materiales utilizados en el proyecto, así como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serán reconocidos al contratista del proyecto mediante la aplicación de una formula polinómica de ajuste y en forma simultánea con cada estimación de obra, sin que se requiera ningún trámite adicional. Los detalles sobre la aplicación de la formula polinómica de ajuste están contenidos en el documento denominado METODOLOGÍA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconocerán bajo las condiciones siguientes: 1) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 2) No se reconocerán ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecución. 3) El contratista al momento de solicitar el pago de la última estimación, además de acompañar los requisitos de Fiscalía y Cierre, presentará Acta de Recepción



F.H.I.S.
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 FECHA: 08.09.2011
 FIRMA: [Signature]



Definitiva. 4) Se reconocerá únicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocerá a través de órdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. **CUARTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Para los efectos de este Contrato, se entenderá como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, así calificado por **EL FHIS**, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, autoriza a **EL FHIS** a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminación.- **QUINTA: PROHIBICIONES.** a) **EL CONTRATISTA** no puede subcontratar más del veinte por ciento (20%) del contrato sin previa autorización por escrito por parte de **EL CONTRATANTE**; b) Se prohíbe el empleo de menores de edad. c) Se prohíbe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construcción; asimismo la apropiación de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato. **SEXTA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.** Los beneficiarios del proyecto podrán reportar vicios ocultos o desperfectos de la obra por un período de doce meses (12) a partir de la fecha de recepción provisional, por lo cual el Contratista deviene obligado a subsanar esas deficiencias. **SEPTIMA: COMPROMISORIA. EL CONTRATISTA** se compromete a darle seguimiento a la ejecución de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o período acordado; **OCTAVA: DEL SUPERVISOR:** a) Verificar el avance físico de la obra de conformidad con la documentación aprobada por **EL CONTRATANTE**; revisar y aprobar las solicitudes de estimaciones de pago, según el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendrá acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecución del Proyecto en consonancia con los planos y especificaciones así como a sus modificaciones previamente aprobadas por **EL CONTRATANTE** y autorizará el pago de las estimaciones del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecución de las mismas, y presentará los informes de avance de la obra.- **NOVENA: RECEPCIÓN DE LA OBRA. EL CONTRATISTA** con quince (15) días calendario de anticipación dará aviso al SUPERVISOR para la recepción de la obra terminada, en dicha fecha **EL INSPECTOR** elaborará el Acta de Recepción Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos señalados en el Acta de Recepción Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepción provisional y recepción definitiva serán por cuenta y riesgo de **EL CONTRATISTA**.- **DECIMA: CONDICIONES DE RIESGO. EL CONTRATANTE** será responsable de cualquier condición de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras.- **EL CONTRATANTE** no será responsable por materiales




F.H.I.S.
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 FECHA: 08.09.2011
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*



que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido llevadas al sitio por **EL CONTRATISTA**, Subcontratistas, Proveedores o cualquier otra persona por quien **EL CONTRATISTA** sea responsable.- **DECIMA PRIMERA: PROPIEDAD DE LOS MATERIALES.** Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por **EL CONTRATISTA**, son instrumentos de servicio en relación a la obra y serán propiedad del responsable del diseño.- **DECIMA SEGUNDA: PUNTOS DE REFERENCIA.** **EL CONTRATISTA** será responsable de la disposición de la construcción y deberá proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por la Municipalidad.- **DECIMA TERCERA: SANCIONES.** Si **EL CONTRATISTA** no presenta la documentación solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalía del FHIS dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del Acta de Recepción Provisional, el sistema lo inhabilitará automática y temporalmente del Banco de Ejecutores de **EL FHIS**, hasta que se cumpla con este requisito.




F.H.I.S.	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
FECHA:	08. 09. 2011
FIRMA:	



RECIBO POR: L. 279,660.56

RECIBI DEL "PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA: FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL" BCIE 2045, EJECUTADO A TRAVÉS DE LOS SUBCOMPONENTES REPARACIÓN DE ESCUELAS Y PISOS SALUDABLES PARA HOGARES EN EXTREMA POBREZA, EJECUTADO POR EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS); LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 16/100 (L. 279,660.56); VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO No. 100205 "AMPLIACIÓN INSTITUTO TÉCNICO FRANCISCO MORAZÁN" UBICADO EN LA ALDEA SABANAGRANDE, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011


MAURO MIGUEL RAMÍREZ MORENO
IDENTIDAD # 0801-1985-14091
R.T.N. # 08011985140914



 REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CARTILLA DE IDENTIDAD

MAURO MIGUEL / RAMIREZ MORENO




HONDURENO POR NACIMIENTO
NACIO EL 05 JULIO 1957
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 01 MARZO 1997

0801-1985-14091




02029563-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0001

MAURO MIGUEL / RAMIREZ MORENO
0801-1985-14091



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc 412-34872

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto No. 117 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No. 255 del 10 de agosto de 2002. Art. 10 del Decreto No. 25 de la Ley del Impuesto Sobre Venta.

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
MAURO MIGUEL RAMIREZ MORENO	08011985140914

INSCRIPCIONES	
Venta y/o Selectivo	<input type="checkbox"/> Máquina Tragamoneda <input type="checkbox"/>
Impostado:	<input type="checkbox"/> Imprentas <input type="checkbox"/>



Fecha Emisión: 20060720

[Handwritten Signature]

Director Ejecutivo



Fecha Vencimiento

[Handwritten Signature]

Departamento de Asistencia al Contribuyente

352600



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/02/2007

Número de Documento: 00007567 - 002

Tipo Operación: Modificación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MAURO MIGUEL RAMIREZ MORENO

Actividad Comercial: CONSULTOR VARIOS

Institución:

Código:

Clase: PERSONA NATURAL

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1985-14091

BIN: DCDZPHNYNY

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LOMAS DEL PINAR KILOMETRO#8 SANTA LUCIA ULTIMA CASA

Fax: Email: mauroram05@hotmail.com

Teléfono: 779-05-46

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MAURO MIGUEL RAMIREZ MORENO

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1985-14091

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1200475379	
ANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1200475349	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: XRODEZNO
Fecha: 02/02/2007 13:52:14

Aprobado por: XRODEZNO
Fecha: 02/02/2007 14:57:16



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL


RD/DIC 412-34572

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 de Decreto No. 107 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 2 del Decreto No. 255 del 10 de agosto de 2002. Art. 10 del Decreto No. 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas.

Nombre del Inscrito	R.T.N. 08011985140914
MAURO MIGUEL RAMIREZ MORENO	

INSCRIPCIONES	
Impuesto Selectivo	<input type="checkbox"/> Máquina Tragamoneda <input type="checkbox"/>
Impuesto sobre el Valor Agregado	<input checked="" type="checkbox"/> Imprentas <input type="checkbox"/>

 <p>Fecha Emisión: 20050720</p> <p>Director Ejecutivo</p>	 <p>Fecha Vencimiento</p> <p>Director de Asistencia al Contribuyente</p>
---	---



VALOR LPS. 500.00
SERIE "B"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad No. 398039

1 YO: ALFREDO BANEZAS CRUZ, Abogado y Notario Publico de este domicilio de Teguci-
 2 galpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, inscri-
 3 to en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet número cero mil seiscientos-
 4 (01600) y con Registro numero novecientos setenta y nueve (979) de la Honorable
 5 Corte Suprema de Justicia y con Dirección en el Edificio Rosa, segundo Nivel de
 6 Foto Francesa, calle Pálace en esta ciudad: CERTIFICA: Que la firma puesta por -
 7 el Ing. MAURO MIGUEL RAMIREZ MORENO, al pie de todas la documentación relaciona-
 8 da con la Licitación Privada, Promovida por el FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SO-
 9 CIAL THIS, para Desarrollar el Proyecto denominado AMPLIACION INSTITUTO TECNICO
 10 FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 100205, cuya firma es autentica y toda la documentaci-
 11 ón adjunta al mismo por ser de mi conocimiento, y por ser dichas copias coteja-
 12 das con sus originales con los cuales son conformes.- DOY FE,-

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de junio del 2011.-

=====ultima linea=====



Handwritten signature of Alfredo Banezas Cruz in black ink.

20
21
22
23
24
25

CARTA DE PROPUESTA

17 DE JUNIO DE 2011
LICITACION PRIVADA NO. LPR-FHIS-128-2011

A: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS

Nosotros los abajo firmantes declaramos que:

- a. Hemos examinado sin tener reservas al respecto, el documento de Licitación.
- b. Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el documento de licitación: Licitación Privada LPR-FHIS-128-2011, AMPLIACION INSTITUTO TECNICO FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 100205, y soy responsable de la veracidad los documentos e información que se presenta para efectos del proyecto.
- c. Nuestra propuesta será válida por un periodo de 120 días a partir de la fecha límite de presentación de las propuestas estipuladas en el documento de licitación; la propuesta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo.
- d. Si es aceptada nuestra propuesta, nosotros nos comprometemos a obtener una garantía de ejecución de conformidad con los documentos de licitación;
- e. Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 5.2 de las instrucciones de los oferente;
- f. No estamos participando como oferentes ni como subcontratistas, en más de una propuesta en este proceso de licitación, de conformidad a la clausula 5.2 de las instrucciones a los oferentes;
- g. Nosotros incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el banco.
- h. No somos una entidad propiedad del estado
- i. Ninguna
- j. Entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la propuesta evaluada como la más baja ni cualquier otra propuesta que reciban.
- k. Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actué por nosotros o en nuestro nombre participe en sobornos.

Mauro Miguel Ramírez Moreno
Oferente.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN BANCO DE CONTRATISTAS
CONTRATISTAS DE OBRA

El Infrascrito Sub-Director de Contrataciones del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), por este medio **HACE CONSTAR:** que el Ing. **MAURO MIGUEL RAMIREZ MORENO**, con Teléfonos N° 757-8967 / 9737-5191, domicilio en Col. Villas Del Rio, Cll. Principal, C #1616, en el Municipio de **DISTRITO CENTRAL**, Departamento de **FRANCISCO MORAZAN**, se encuentra inscrito y habilitado en el **Banco de Contratistas** del FHIS, con registro en el Sistema No. 0801198514091.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN** en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los los 15 días del mes de **JUNIO** del año 2011.



PIC. ROBERTO PINEDA
SUB-DIRECTOR DE CONTRATACIONES



ONCAE-OP 10/06

CONSTANCIA


La Suscrita, Secretaria General de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, **HACE CONSTAR:** Que se encuentra en trámite la solicitud de inscripción de la persona natural **MAURO MIGUEL RAMIREZ MORENO**. En el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, presentada en fecha quince de junio del año dos mil once. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes de que se le adjudique un contrato.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente Constancia en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el quince de junio del año dos mil once.



MARJORIE STEPHANIE ANTUNEZ MEJIA
SECRETARIA GENERAL AD-INTERIM

MSAM/LJAM*
Cc: Archivo



CONSTANCIA

Nº 2011 - 2243

El suscrito Secretario General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) hace constar que:

MAURO MIGUEL RAMIREZ MORENO

Se encuentra debidamente inscrito y activo en éste colegio como

INGENIERO CIVIL

bajo el Nº CICH

01761

encontrándose a la fecha solvente con sus obligaciones correspondientes; y de acuerdo a nuestro registro está facultado para ejercer su profesión.

TEGUCIGALPA, M.D.C. , 10 de Junio de 2011


SECRETARIO GENERAL




XHERNANDEZ
Colonia Florencia Norte, 3ª entrada
Nº 3802, Apartado Postal Nº 794
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 239-7246, 239-9275, 239-7754
239-8276, Fax: 232-1263

Col. El Pedregal, Ave. José Antonio Peraza, frente entrada
Emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: 566-0202, 566-0555, 566-0577
Fax: 566-0500

CONSTANCIA DE SOLVENCIA

La Suscrita Jefa del Departamento de Recaudación Región Centro Sur de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, **TRANSCRIBE EL INFORME QUE LITERALMENTE DICE: I N F O R M E:** En cumplimiento al auto que antecede y después de analizar la solicitud **301-11-10901-6816** de fecha 07-06-2011 presentada por **MAURO MIGUEL RAMIREZ MORENO**, actuando en su condición Personal, quien está solicitando **CONSTANCIA DE SOLVENCIA** a su favor; al respecto los suscritos **INFORMAN:** Que conforme a nuestros Registros: **MAURO MIGUEL RAMIREZ MORENO**, con R.T.N. **08011985140914**, Clasificado como **Pequeño Contribuyente**; se revisó en nuestra Base de Datos sus Obligaciones Tributarias (2010), encontrándose solvente. La emisión de esta **CONSTANCIA** no limita a la Dirección Ejecutiva de Ingresos para ejercer revisiones posteriores en su cuenta y en su caso, exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. La presente tiene vigencia de 90 días calendario. Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Junio, 2011. **(FIRMA) SUCY LUQUE ANALISTA (FIRMA) CONCEPCION NUÑEZ SUPERVISORA CTA.CTE. ARCS.- (SELLO Y FIRMA) MARIO VELASQUEZ PEREZ JEFE SECCION CTA. CTE. A.R.C.S.**

Se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio del año Dos Mil Once.

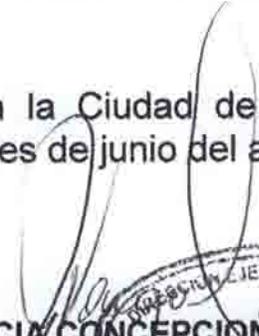

PATRICIA CONCEPCION VARGAS DIAZ
ACUERDO N° DEL SG 226-B-2010
DE FECHA 27 SEPTIEMBRE 2010

SL/ALC

"Tu Tributo a Honduras"

DECLARACION JURADA

Yo, **Mauro Miguel Ramírez Moreno**, Mayor de edad, casado, Ingeniero civil, con domicilio en **Lomas del Pinar, Santa Lucia, Francisco Morazan**, con Identidad No.0801-1985-14091, con registro tributario No 08011985140914 y actuando en mi condicion personal, por este medio HAGO DECLARACION JURADA: que no me encuentro comprendido en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los **artículos 15, y 16** de la actual **LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO**.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan, a los trece días del mes de Junio del 2011.



Ing. Mauro Miguel Ramírez
Contratista





BCIE

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Gerencia de País - Honduras

25 de julio de 2011
GREHON-0589/2011

SEFIN - U.A.P.

Ridia
2011 JUL 26 PM 3:18

ID- 08342

Licenciada
Gabriela Salgado
Coordinadora General
UAP-SEFIN

Estimada Licenciada Salgado:

Hacemos referencia a su oficio No.UAP-2495-2011 de fecha 20 de julio del año en curso, mediante el cual solicita el pronunciamiento del BCIE a la recomendación de adjudicación de los procesos realizados por el FHIS, bajo la modalidad de Licitación Privada para la contratación de Obras y de Supervisión para el Componente No.2 Proyecto de Generación de Empleo, subcategorías 2.1 Reparación de Escuelas y 2.2 Pisos Saludables para Hogares en Extrema Pobreza, descritos en el Anexo No.1, adjunto al presente oficio, en el marco del Convenio de Préstamo No.2045 suscrito entre el BCIE y el Gobierno de Honduras, hasta por US\$ 280.0 millones, para financiar el **"Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social"**.

Después de revisar la información remitida, en virtud que el procedimiento de adquisición utilizado que fue previamente autorizado por "el Banco", el cual resulta apropiado en este caso para contratos de menor cuantía, no tenemos objeción a lo solicitado. La Unidad Administradora de Proyectos de SEFIN (UAP-SEFIN), como organismo coordinador del préstamo en referencia, es directamente responsable por los criterios técnicos y legales en los cuales fundamenta su solicitud, así como, de la concordancia y cumplimiento del ordenamiento jurídico de la República de Honduras, al cual está sujeto.

Este pronunciamiento, no implica responsabilidad para el Banco en aspectos de tipo financiero o de cualquier índole incluidos en la documentación presentada o derivados de la misma, diferentes a lo expresamente contemplados en el Contrato de Préstamo, particularmente los montos y rubros a financiar contenidos en el Plan Global de Inversiones (PGI) del mismo.

Tomando en consideración la Normativa del Banco que establece que todo Convenio firmado con el BCIE está exento del pago de toda clase de impuestos, en virtud del Convenio Constitutivo del BCIE y que en los casos que procediere o que se estuviere obligado a ello, todos los impuestos y derechos establecidos por la Ley Aplicable, relacionados con los bienes y servicios contratados bajo el Convenio de Préstamo No.2045, serán pagados con recursos distintos a los provenientes del referido Préstamo.

Es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,

Enrique Chirchilla
Gerente de País

cc DIRHON.FHIS
RMP/vdd

ANEXO No.1

PISOS SALUDABLES	CONTRATISTA	MONTO L.	US\$	SUPERVISOR	MONTO L.	US\$
Construc. 150 viviendas. Col Vía Campesina y otras	Yarlin Escobar Guffari	1,128,130.95	59,704.95	Gustavo Adolfo González Pavón	112,813.10	5,970.49
Construcción 52 viviendas. Col Mirador Oriente	Ryan Ariel Cruz Cruz	378,999.26	20,058.07	Juan Antonio Núñez Hernández	37,899.83	2,005.81
Construcción 50 viviendas. Aldea Zambrano	Herindo Estrada Barahona	360,282.54	19,058.05	Gustavo Adolfo González Pavón	36,029.26	1,906.80
Construcción 84 viviendas. Col Las Terras y otras	María Elena Rodríguez Pigoaga	634,245.39	34,625.13	Ciro Barahona Vindel	63,424.54	3,462.51
Const. 73 viviendas. Col Nueva Jerusalén y Cataluña	Carlos Humberto Hernández R	520,952.19	27,570.78	Carla Hernán Medina de León	52,095.22	2,757.08
Const. 68 viviendas. Municip. Valle de Ángel y otras	Walterio Romero Valledares	483,402.87	25,583.50	Nidia Odalys Durán Fuentes	48,340.28	2,558.25
Const. 60 viviendas. Aldea Granada y otras	Johan Alexander Meza Velásquez	450,784.04	23,857.19	Luis Rolando Muñoz Piz	45,078.40	2,385.72
Const. 101 viviendas. Col Monte Fresco y otras	Eba Inera Fernández Velásquez	843,952.53	44,885.15	Nidia Odalys Durán Fuentes	84,395.25	4,466.52
Const. 101 viviendas. Aldea Valle Bonto y otras	Rolando Julián Castro	841,504.74	44,535.81	Nidia Odalys Durán Fuentes	84,150.47	4,453.56
Construcción 38 viviendas. Aldea Las Flores	Ángel Muñoz Rayna	254,378.29	13,482.58	Sakutio Javier Castro González	25,437.83	1,348.27
Construcción 70 viviendas. Col. Villa Nueva y otras	Edi Alberto Cruz Estrada	409,125.33	21,852.46	Juan Antonio Núñez Hernández	40,912.53	2,155.25
Construcción 33 viviendas. Col. Vía Nueva Sector B	Carlos Rolando Revira Castillo	161,532.64	8,531.55	Juan Antonio Núñez Hernández	16,158.26	855.19
SUBTOTAL			343,335.09			34,333.61
REPARACIÓN DE ESCUELAS	CONTRATISTA	MONTO L.	US\$	SUPERVISOR	MONTO L.	US\$
Reparación Escuela Emma Romero de Calayas	Santiago Tronconi Castillo	835,917.23	44,239.89	Hector Orlando Pavón López	83,591.72	4,423.99
Ampliación Instituto Técnico Mateo Molina	Abraham J. C. Portio Urquiza	1,407,088.81	74,458.50	Shirley Yadra Orelana García	140,708.86	7,448.85
Reparación Escuela Rural Monte TIMHANS	Isaac F. Calderón Lathiez	1,500,067.54	79,389.24	Gilbert Omar Bonavides Coello	150,008.76	7,938.92
Ampliación C.E.B. Luz Oroco Casco	Fernando E. Ramírez Martínez	1,447,601.63	76,612.54	Edwin Amado Cárcamo	144,760.16	7,561.25
Reparación Jardín de Niños Alameda	Elvis Antonio Herrera Vásquez	511,413.11	27,055.91	Hector Orlando Pavón López	51,141.31	2,706.59
Construcción C.E.B. Carlos Zelaya	Juan Carlos Aguilar Mazzoni	1,499,180.24	79,341.22	Nidia Roxana García Canter	149,918.02	7,934.12
Reposición kinder Profesora Norma Maldonado	Jorge Marcial Núñez Morales	614,889.05	32,547.54	Shirley Yadra Orelana García	61,488.91	3,254.75
Ampliación Escuela Rafael Coello Ramos	Maynor Miguel Bautista Poniño	1,458,184.95	77,172.65	Gilbert Omar Bonavides Coello	145,818.50	7,717.27
Reposición Jardín de Niños Atargracia de Vargas	Hermenegildo García Cruz	774,651.82	40,998.03	Hector Orlando Pavón López	77,466.18	4,099.60
Reposición Escuela Erin Adulme	Sam Kunkar Kafati	2,058,571.51	108,947.37	René Giovanni Mejía Barahona	205,857.15	10,894.74
Ampliación Escuela Rural José Cañío del Valle	Hector Castro Baca Ojeda	843,218.04	44,626.28	Delmer Ramos Castillo	84,321.80	4,462.63
Ampliación Instituto Técnico Francisco Morazán	Mauro Miguel Ramírez	1,884,403.73	98,671.25	Armando J. Hernández Méjica	188,440.37	9,867.13
Ampliación Escuela Donato de Herrera	Mario Andrés Matamoros Lanza	495,944.28	26,247.24	Gabriel Matamoros Silva	49,594.43	2,524.72
Ampliación Escuela San Ramón	Sam Kunkar Kafati	1,043,042.40	55,201.74	Gabriel Matamoros Silva	104,304.24	5,520.17
Reposición kinder Rocío del Saber	Mario Andrés Matamoros Lanza	258,646.79	13,582.72	Gabriel Matamoros Silva	25,664.68	1,356.27
SUBTOTAL			879,112.16			87,911.22
TOTAL GENERAL			1,222,447.25			122,244.72
