



*Municipalidad de San Marcos de Colón,  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*



**CONTRATOS MES DE NOVIEMBRE 2018**

Unidad Administrativa contratante	Responsable	Tipo de Contrato	Número de firmas licitantes o cotizantes	Estimación del costo	Entidad administradora del contrato	Título del contrato	Firmas del contrato	Persona natural o jurídica al que se asignó el contrato	Inicio	Duración en días	Objeto	Monto	Plazo de cumplimiento de contrato	Comentarios de modificación
Administración General Municipal (Alcalde)	José Douglas Carrasco (alcalde) María Lourdes Valladares (Jefa Unidad Técnica Municipal, Asistente unicial Técnica).	Contrato de obra	3	L.13,000.00	Alcaldía municipal de San Marcos de Colón	Contrato de mano de obra, Proyecto pavimentación de calle con concreto White Topping	José Douglas Carrasco, Freddy Antonio Gonzales Ruz	Fredy Antonio Gonzales Ruz	29-10-2018	16	Construcción de pavimento White Topping en Barrio el Catedral de Pollo Landia hasta panadería labora. (Obra en ejecución)	L.1,065,023.01	13-11-2018	N/A
Administración General Municipal (Alcalde)	José Douglas Carrasco (alcalde) María Lourdes Valladares (Jefa Unidad Técnica Municipal, Asistente unicial Técnica).	Contrato de obra	3	L.6,325.00	Alcaldía municipal de San Marcos de Colón	Contrato de servicio de Mano de obra de reparaciones varias. En edificio Municipal	José Douglas Carrasco, Freddy Antonio Gonzales Ruz	Fredy Antonio Gonzales Ruz	05-11-2018	3	Contrato de Servicio de Mano de Obra, Reparación de obras Varias en alcaldía Municipal. Levantamiento de pared Instalación Eléctrica y reparación e instalación de línea telefónica.	L.6,325.00	07-11-2018	N/A




# Municipalidad de San Marcos de Colón.


## Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



Administración General Municipal (Alcalde)	José Ortiz Carrasco (alcalde) Lourdes Valladares (jefa Unidad Técnica Municipal, Angel Leonardo Diaz (Asistente Unidad Técnica).	Contrato de obra	3	L.76,799.79	Alcaldía municipal de San Marcos de Colón	Contrato de servicio de mano de obra, Proyecto Pavimentación de calle con concreto White Topping	José Douglas Ortiz Carrasco, Freddy Antonio González Ruiz	Freddy Antonio González Ruiz	29-10-2018	16	Construcción de pavimento White Topping con concreto 15cms en barrio el Cafetal de Pollolanda hasta panadería labora. (obra Finalizada)	L.106,023.01	13-11-2018	N/A
Administración General Municipal (Alcalde)	José Ortiz Carrasco (alcalde) Lourdes Valladares (jefa Unidad Técnica Municipal, Angel Leonardo Diaz (Asistente Unidad Técnica).	Contrato de Obra	3	L.13,948.06	Alcaldía municipal de San Marcos de Colón	Contrato de Servicio Mano de Obra para construcción de acera peatonal	José Douglas Ortiz Carrasco, Freddy Antonio González Ruiz	Freddy Antonio González Ruiz	15-11-2018	3	Proyecto de Construcción de aceras peatonales en Barrio El Cafetal Frente Agropecuaria Porfijo a Farfada VIVER.	L.13,948.06	17-11-2018	N/A

  
 María Lourdes Valladares  
 Jefe de Unidad Técnica de Planificación  
 Y desarrollo Comunitario



  
 Angel Leonardo Diaz  
 Asistente de Unidad Técnica de Planificación  
 Y desarrollo Comunitario

# San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

**ORDEN DE PAGO No. 39691**

Fecha: 1 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES

Sírvase pagar a la Orden de: Fredy Antonio Gonzales Ruiz

La suma de: TRECE MIL EXACTOS

**Concepto de Gasto:**

Primer pago según contrato de mano de obra por la reparación de calle empedrada en el Bo. El Cafetal que conduce desde "Pollolandia" hacia la panadería "Tábora". (Documentacion anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
06011240046046639	Reparacion de Calles, San Marcos de Colon (Centro)	13,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,000.00</b>

*[Firma]*  
Firma y Sello Alcalde(a)



*[Firma]*  
Firma y Sello de Tesorero(a)



*[Firma]*  
V.B. Contabilidad y Presupuesto  
Firma y Sello



**Elaborado por Firma y Sello**

**Firma y Sello Administración**

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe  
Occidente 11-513-000035-8

Cheque No. **71105363**

*[Firma]*  
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. \_\_\_\_\_

Identidad/RTN No. 0615-1974-00637

Impuesto sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 01 11 2018  
DIA MES AÑO



Informe de Actividades

Proyecto: Reparación de Calle. pololandia panadero Tabora  
 Ubicación: B. Cafetal.  
 Responsable de la Obra: Fredy A. Gonzales.  
 Supervisor: \_\_\_\_\_

N°	Fecha	Actividades Realizadas
1	1/27/10/2018/	Demolicion de 20 mts de pavimento
2	1/28/10/2018/	Demolicion de 30 mts de pavimento
3	1/29/10/2018/	Demolicion de 35 mts de pavimento
4	1/31/10/2018/	Demolicion de 30 mts de pavimento
5	1/1/11/2018/	Demolicion y Aprovecho de Desperdicio 30mts <sup>2</sup>
6		
7		

Fecha de Informe: 1 de Noviembre del 2018.

Avance de la Obra: 15 %

Observaciones: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Fredy Gonzales  
 Responsable de la Obra



[Signature]  
 Supervisor

[Signature]  
 Alcaldе Municipal



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ




HONORERO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL 19 SEPTIEMBRE 1974  
SEXO MASCULINO  
EMISIDA EL 12 ENERO 2000



0615-1974-00637 02102040-02






ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0615  
FREDY ANTONIO / GONZALES RUIZ  
0615-1974-00637

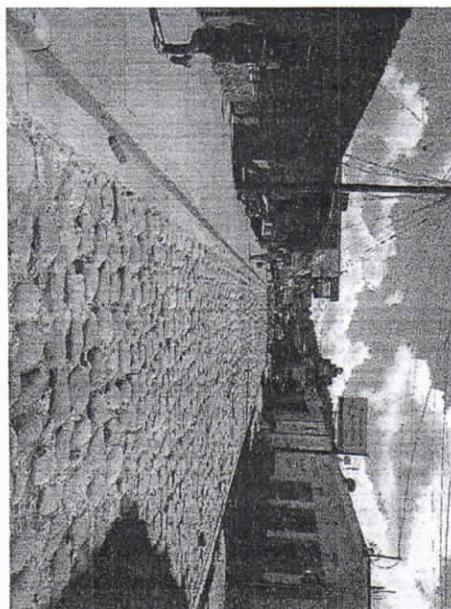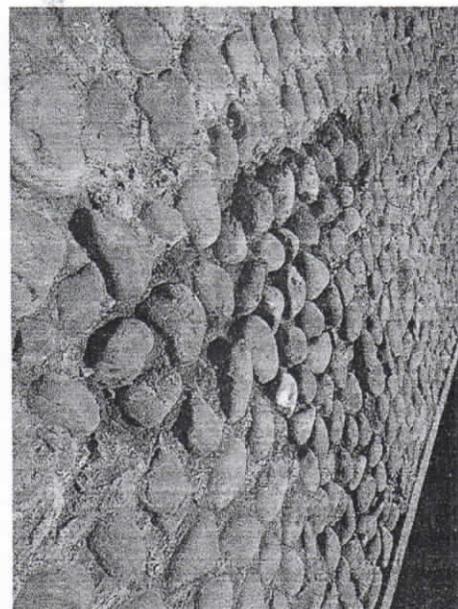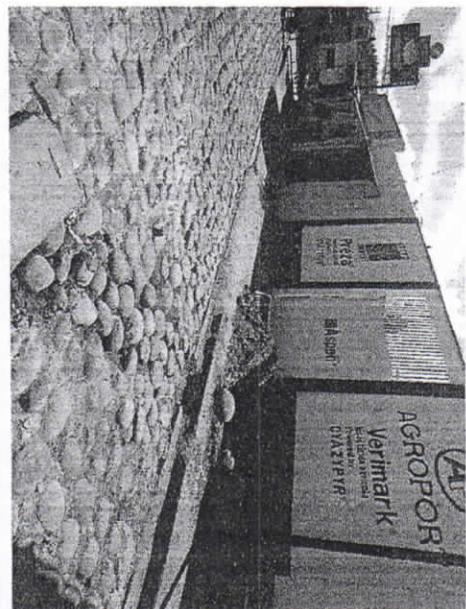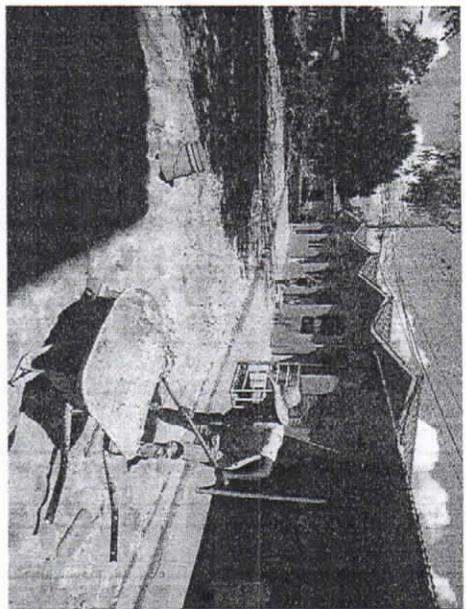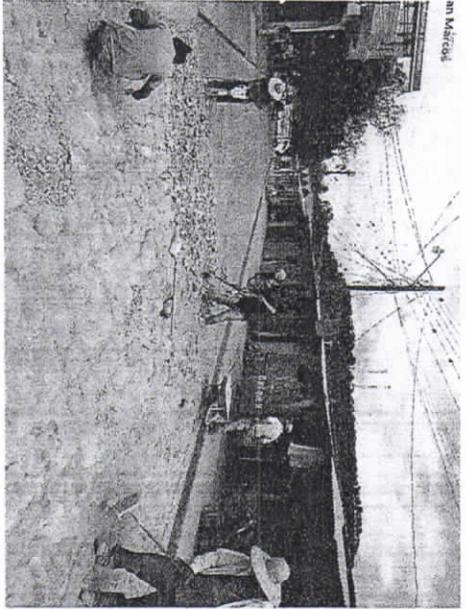

# San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39849

Fecha: 8 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES

Sírvase pagar a la Orden de: Fredy Antonio Gonzales Ruiz

La suma de: TRECE MIL EXACTOS

**Concepto de Gasto:**

Segundo pago según contrato de mano de obra por la reparación de calle empedrada en el Bo. El Cafetal que conduce desde "Pollolandia" hacia la panadería "Tabora". (Documentacion anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
06011240046046639	Reparacion de Calles, San Marcos de Colon (Centro)	13,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,000.00</b>

*[Firma]*  
Firma y Sello Alcalde



Firma y Sello de Tesorero(a)



*[Firma]*  
V.B. Contabilidad y Presupuesto Firma y Sello



Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

<p>Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe <b>Occidente 11-513-000035-8</b></p> <p style="text-align: center;">Cheque No. <b>71105410</b></p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA INTERESADO</p>	<p>Orden de pedido No. _____</p> <p>Identidad/RTN No. <u>0615-1974-00637</u></p> <p>Impuesto sobre la Renta No. _____</p> <p>Impuesto Vecinal _____</p> <p>Fecha de Pago <u>08</u> <u>11</u> <u>2018</u> DIA MES AÑO</p>
---	--



Informe de Actividades

Proyecto: Construcción de Pavimento  
 Ubicación: Frente al mercado municipal.  
 Responsable de la Obra: Fredy Antonio González  
 Supervisor: \_\_\_\_\_

N°	Fecha	Actividades Realizadas
1	4/11/2018/	Fundido de pavimento 30 mts Lineal
2	5/11/2018/	Fundido de Pavimento 60 mts Lineal
3	6/11/2018/	Fundido de Pavimento 35 mts Lineal.
4	7/11/2018/	Enmarcado de 40 mts Lineal Pavimento.
5	8/11/2018/	Fundido. de 35 mts Lineal.
6		Enmarcado. de 40 mts Lineal
7		


Fecha de Informe: 8/11/2018/

Avance de la Obra: \_\_\_\_\_

Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Fredy Antonio González  
 Responsable de la Obra

[Signature]  
 Alcalde Municipal.



[Signature]  
 Supervisor

06.01.12.46639 No hay presupuesto.

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP  
FREDY ANTONIO / GONZALES RUIZ



HONDURANO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL 19 SEPTIEMBRE 1954  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 12 ENERO 2005

0615-1974-00637




02102040-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo, dará lugar a la sanción penal correspondiente.












DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0615

FREDY ANTONIO / GONZALES RUIZ  
0615-1974-00637

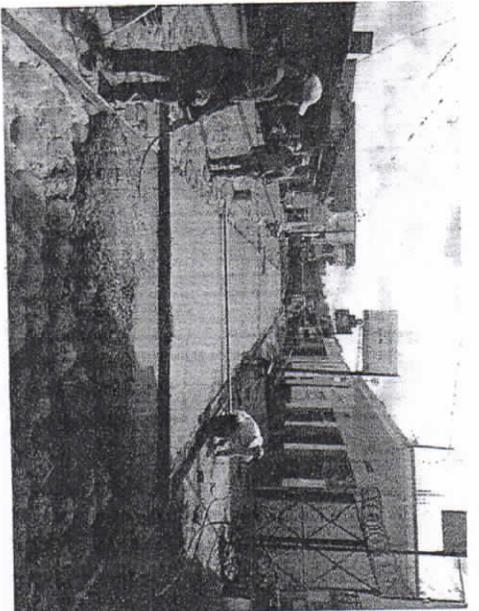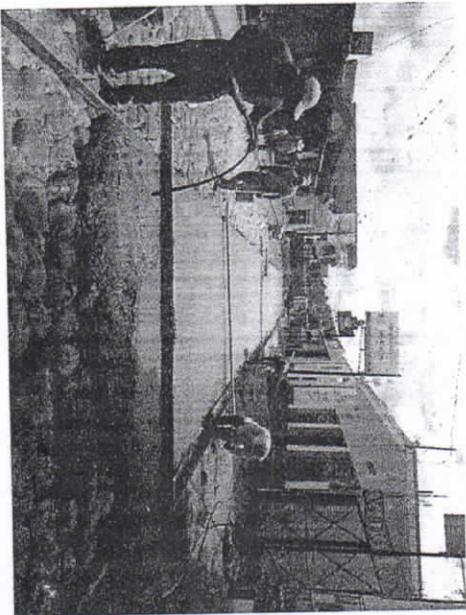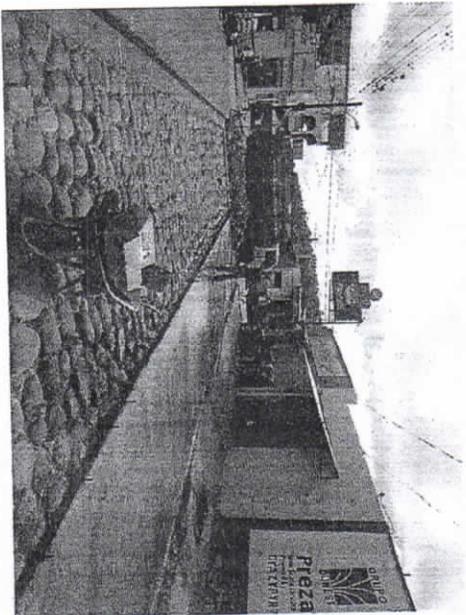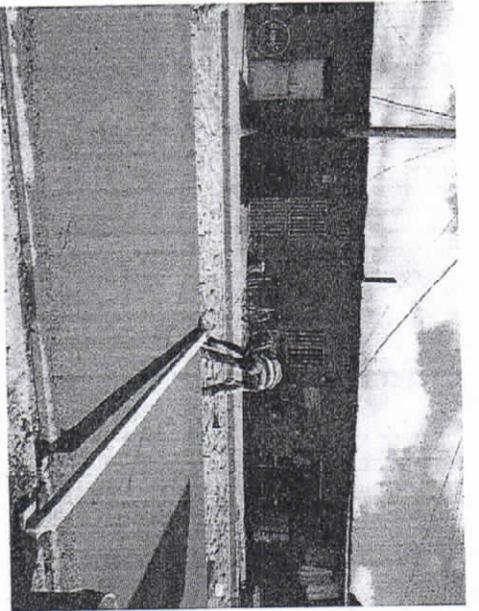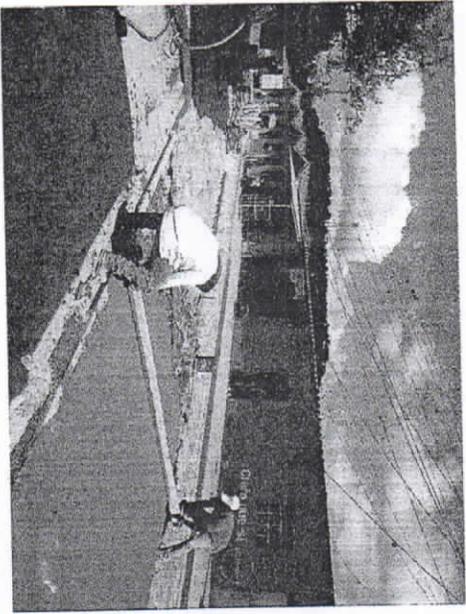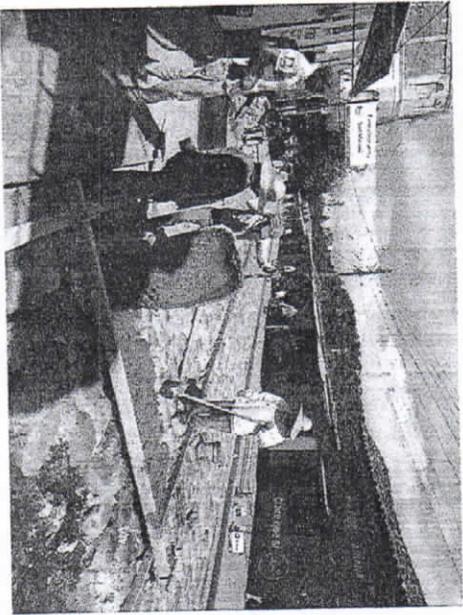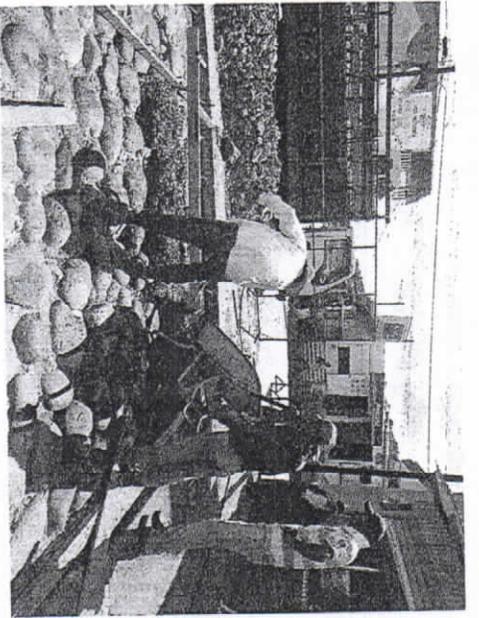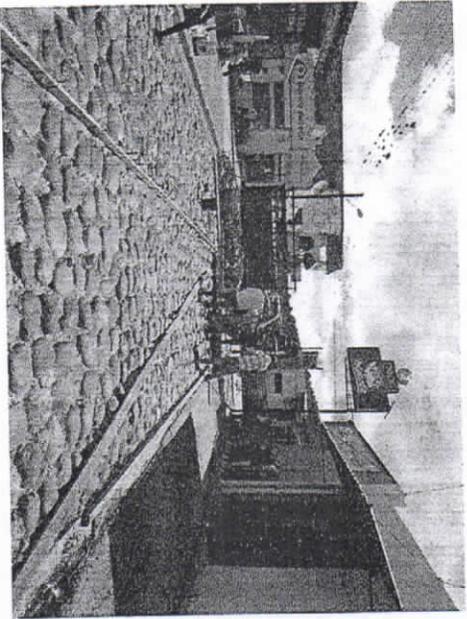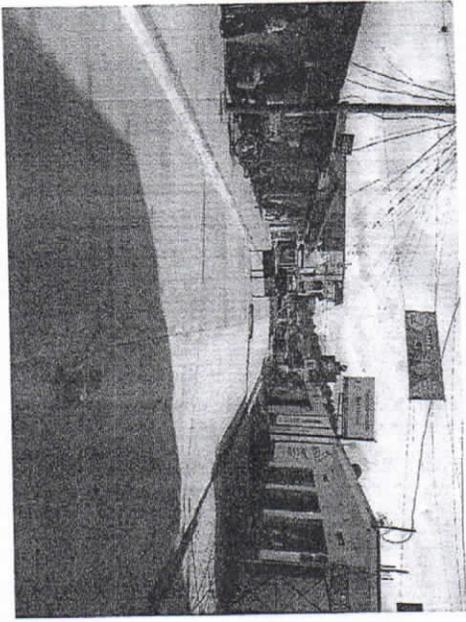

# San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39852

Fecha: 9 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES

Sírvase pagar a la Orden de: Fredy Antonio Gonzales Ruiz

La suma de: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS

**Concepto de Gasto:**

Cancelación de contrato por brindar los servicios de mano de obra en reparación de obras varias como ser: Levantamiento de paredes, instalación eléctrica de toma corrientes y lámparas y reparación e instalación de líneas telefónicas en edificio municipal del barrio El Centro. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
06011240046046954	Proy. Varios, Elaboracion de PDM y Supervicion de Proy.	6,325.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,325.00</b>

*[Firma]*  
Firma y Sello Alcalde (sa)



*[Firma]*  
Firma y Sello de Tesorero



*[Firma]*  
V.B. Contabilidad y Presupuesto  
Firma y Sello



Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe  
**Occidente 11-513-000035-8**

Cheque No. **71105414**

*[Firma]*  
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. \_\_\_\_\_

Identidad/RTN No. 0615-1974-00637

Impuesto sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 09 11 2018  
DIA MES AÑO



**Municipalidad de San Marcos de Colón.**  
**Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.**



**CONTRATO DE SERVICIOS MANO DE OBRA, MUNICIPALIDAD SAN MARCOS DE COLON,**  
**PROYECTO: "REPARACIÓN DE OBRAS VARIAS EN ALCALDIA MUNICIPAL"**

Yo **JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO**, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. **0615-1967-00606**, actuando en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON**, Departamento de Choluteca, quien para los efectos de este contrato se denominará el **CONTRATANTE**; y por otra parte del Señor, **FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ**, con tarjeta de identidad N° **0615-1974-00637** Mayor de edad, Casado, de nacionalidad hondureña, vecino y residente en el Barrio el campo, Jurisdicción de San Marcos de Colon, Departamento de Choluteca, quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, ambos en el pleno goce y ejercicio de sus deberes civiles, libre y espontáneamente celebran el presente Contrato de conformidad con las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERO: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** La Municipalidad de San Marcos de Colon, Choluteca, contrata los servicios de **EL CONTRATISTA** para que ejecute la obra de **PROYECTO: "REPARACIÓN DE OBRAS VARIAS EN ALCALDIA MUNICIPAL"**

, de acuerdo a las especificaciones técnicas elaboradas para los mismos.-

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
	<b>REPARACIÓN DE OBRAS VARIAS</b>				
1	Levantamiento de paredes	Unidad	2	1,725.00	L. 3,450.00
2	Instalación Eléctrica Toma Corrientes y Lámparas	Global	1	1,150.00	1,150.00
3	Reparación e Instalación de Línea de Teléfono	Global	1	1,725.00	1,725.00
6	<b>TOTAL</b>				<b>Lps.6,325.00</b>


**SEGUNDO: VALOR Y FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO.-** El valor del presente Contrato asciende a la Cantidad de **Lps.6, 325.00 Seis Mil Treientos Veinticinco con 00 /100**); el cual será financiado con fondos propios o provenientes de trasferencias municipales. **TERCERA: SUPERVISION.-** La Alcaldía a través de la Unidad Técnica de la mancomunidad supervisara el avance de la obra e emitirá informe técnico;.- **CUARTA: FORMAS DE PAGO.-** La Alcaldía efectuará pagos según avance de la obra al contratista el cual será deducido del monto total de este contrato al finalizar la obra será recibida por la Municipalidad a entera satisfacción mediante acta de recepción extendida por el Alcalde Municipal y el Presidente del Patronato si existiera en esa zona, la Alcaldía no tendrá responsabilidad alguna por sueldos, jornales, prestaciones sociales, indemnizaciones, tanto del Contratista Como del Personal Subalterno que el Contratante a su cuenta y riesgo para la ejecución del Contrato, por consiguiente queda exenta de toda responsabilidad laboral y Legal de estos actos que se deriven.- **QUINTA: GARANTIA DE ANTICIPO.-** El Contratista hará efectiva una garantía de letra de cambio del 15% como garantía de calidad de obra para garantizar que se ejecutara la obra de manera eficiente conforme a las Cláusulas establecidas en este Contrato la cual equivale a **Lps.948.75(novecientos cuarenta y ocho lempiras con 75/100)**, cuya vigencia por el tiempo de ejecución de la obra a partir de la orden de inicio de la misma.- el pago de la D.E.I lo realizara el contratista el cual presentara su comprobante de pagos a cuenta al departamento de contabilidad, de lo contrario se hará retención del mismo- **SEXTA: TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA.-** El Contratista se obliga a iniciar las obras a partir del 05 de Noviembre del 2018 y finalizarlas el 07 de Noviembre del 2018.-**SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO.-** En caso de incumplimiento en la entrega de la obra el contratista pagara una multa de **LPS. 300.00 (TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, por cada día de atraso hasta la entrega de la misma, cantidad que le será descontada del saldo que tenga a su favor y si este fuese insuficiente el Contratista siempre se obliga a pagar lo que




*Municipalidad de San Marcos de Colón.*  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*



falte.- **OCTAVA: OBRAS MAL EJECUTADAS.-** Los Gastos causados por las obras que a juicio el Supervisor de Obras, necesitan ser ratificadas, como consecuencia de la mala ejecución será por cuenta del Contratista.- **NOVENA: MODIFICACIONES.-** La Alcaldía podrá en cualquier momento ordenar obras extras, variaciones, alterando, agregando o suprimiendo el total o parte de la obra, en el entendido que si tales modificaciones no sobrepasan el 10% del valor del contrato se hará mediante una orden de cambio y si sobre pasa este porcentaje hasta un máximo del 25% se realizara un ampliación al Contrato Original ambos casos deberán ser aprobados por la Alcaldía.- **DECIMO: SOLUCION DE CONFLICTOS Y LEY APLICABLE.-** Si Existiere alguna desavenencia con motivo o en ocasión de la ejecución e interpretación de este contrato y la misma no fuere solucionada por el buen entendido extrajudicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de este término municipal, por lo tanto se prohíbe el arbitraje, para todo lo no previsto en el presente Contrato se aplicaran las disposiciones legales del ordenamiento jurídico vigente de la República de Honduras que les sean aplicables.- este Contrato no se regirá con las normas contenidas en la legislación laboral, ya que su carácter es de naturaleza enteramente civil así lo pactan y acuerdan ambas partes contratantes.- Y para constancia firma manifestando su conformidad con todas las disposiciones incluidas en las Cláusulas anteriores y se obligan a su fiel cumplimiento.- Dado en el Municipio de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca, a los un día del mes de noviembre, del presente año dos mil dieciocho

  
JOSE DOUGLAS ORDÓÑEZ  
Alcalde Municipal



  
FREDY ANTONIO GONZALES,  
Contratista



**COTIZACION DE MATEIRALES**

LUGAR San Marcos de Colón  
NOMBRE DEL PROVEEDOR Fredy Antonio Goizal  
RTN/IDN 0615-1974-006370 DIRECCION B: Flor de Mayo.  
TELEFONO 97427969.

Nº	MATERIALES	Unidad	Cantidad	P/U	TOTAL
1	Levantamiento de paredes	Unidad	2	1725.00	3450.00
2	Instalación Eléctrica Toma Corrientes y Lámparas	Global	1	1,150.00	1,150.00
3	Reparación e Instalación de Línea de Teléfono	Global	1	1725.00	1,725.00
					6,325.00

Fredy A. Goizal  
Firma del proveedor  
Identidad N° 0615-1974-00637.



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD



FREDY ANTONIO / GONZALES RUIZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIDO EL 19 SEPTIEMBRE 1974  
SEXO MASCULINO  
EMISIÓN EL 12 ENERO 2000




0615-1974-00637



02102040-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar, a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0615

FREDY ANTONIO / GONZALES RUIZ

0615-1974-00637





REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS ANTONIO / DIAZ DEL VALLE HERNANDEZ



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO  
NACIO EL : 12 ABRIL 1984  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 17 AGOSTO 2013




0615-1984-00437




04344869-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona que no sea hondureña o que no sea una persona de la tarjeta de identidad, la violación de la disposición de este artículo será castigada con la sanción correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0615

CARLOS ANTONIO / DIAZ DEL VALLE HERNANDEZ

0615-1984-00437



**COTIZACION DE MATEIRALES**

LUGAR S.m.c  
NOMBRE DEL PROVEEDOR Barrio Flor de mayo Edwin Ramon Vargas  
RTN/IDN \_\_\_\_\_ DIRECCION Bº Flor de mayo.  
TELEFONO 95219739.

Nº	MATERIALES	Unidad	Cantidad	P/U	TOTAL
1	Levantamiento de paredes	Unidad	2	1,725.00	1,725.00
2	Instalación Eléctrica Toma Corrientes y Lámparas	Global	1	1,850.00	3,700.00
3	Reparación e Instalación de Línea de Teléfono	Global	1	1,900	1,900.00
				}	7,325.00

Edwin Ramon Vargas.  
Firma del proveedor  
Identidad N° 95219739.



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

EDWIN RAMON / VASQUEZ LAGOS



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 20 OCTUBRE 1987  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 14 NOVIEMBRE 2009




0615-1987-00714



11140809-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.





*[Signature]*  
DIRECTOR EJECUTIVO



SOLICITADA EN 0615

EDWIN RAMON / VASQUEZ LAGOS

0615-1987-00714

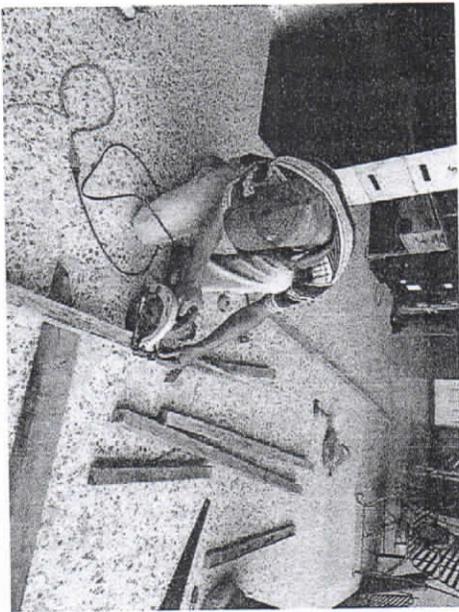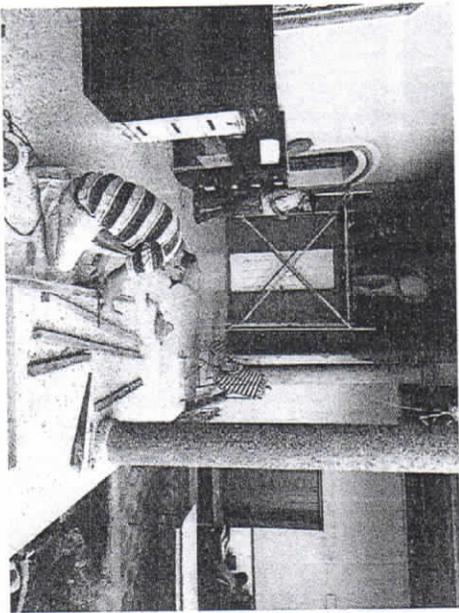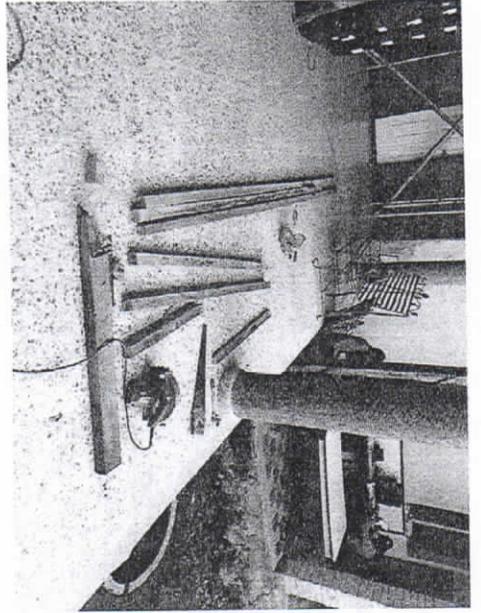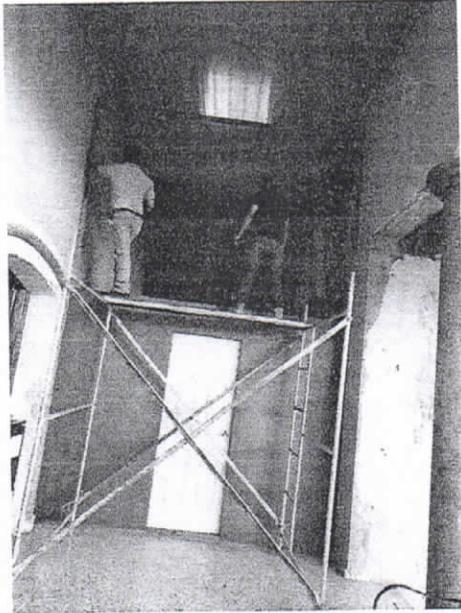

# San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39902

Fecha: 15 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES


Sírvase pagar a la Orden de: Fredy Antonio Gonzales Ruiz


La suma de: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 79/100


**Concepto de Gasto:**

Cancelación de contrato de mano de obra por la reparación de calle empedrada en el Bo. El Cafetal que conduce desde "Pollolandia" hacia la panadería "Tabora"; total contrato L. 106,023.01 menos anticipos L. 26,000.00 menos 12.5% ISR L. 3,313.22, utilidad reportada L. 26,505.75. (Documentación anexa). (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
06011240046046639	Reparacion de Calles, San Marcos de Colon (Centro)	76,709.79
<b>TOTAL</b>		<b>76,709.79</b>

  
Firma y Sello Alcalde(sa)

  
Firma y Sello de Tesorero(a)

  
V.B. Contabilidad y Presupuesto  
Firma y Sello



Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe  
Occidente 11-513-000035-8

Cheque No. **71105450**

  
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. \_\_\_\_\_

Identidad/RTN No. 0615-1974-00637

Impuesto sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 15 11 2018  
DIA MES AÑO



*Municipalidad de San Marcos de Colón.*  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*



**CONTRATO DE SERVICIOS MANO DE OBRA, PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO WITHE TOPPIN = 15CMS. BARRIO CAFETAL DE POLLOLANDIA HASTA PANADERIA TABORA,**

Yo JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. 0615-1967-00606, actuando en su condición de ALCALDE MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON, Departamento de Choluteca, quien para los efectos de este contrato se denominará el CONTRATANTE; y por otra parte del Señor, FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ, con tarjeta de identidad N° 0615-1974-00637 Mayor de edad, Casado, de nacionalidad hondureña, vecino y residente en el Barrio el campo, Jurisdicción de San Marcos de Colon, Departamento de Choluteca, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, ambos en el pleno goce y ejercicio de sus deberes civiles, libre y espontáneamente celebran el presente Contrato de conformidad con las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERO: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** La Municipalidad de San Marcos de Colon, Choluteca, contrata los servicios de EL CONTRATISTA para que ejecute la obra de **PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO WITHE TOPPIN 15 CMS, BARRIO CAFETAL DE POLLOLANDIA HASTA PANADERIA TABORA,** de acuerdo a las especificaciones técnicas elaboradas para los mismos.-

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
	<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE POLLOLANDIA - PANADERIA TABORA</b>				
	<b>INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO</b>				
1.0.0	TRAZADO Y MARCADO	M.L	18.00	20.00	360.00
2.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON BARRENO ELECTRICO	M3	2.16	262.00	565.92
3.00	EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO II (SEMI - DURO)	M3	4.32	273.00	1,179.36
4.00	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 8"	M.L	18.00	36.00	648.00
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO</b>				
	<b>DEMOLICIONES Y ACARRERO MATERIAL DE DESPERDICIO</b>				
5.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON BARRENO ELECTRICO	M3	31.38	262.00	8,221.56
6.00	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	37.66	100	3,766.00
	<b>SUB-TOTAL DEMOLICIONES Y ACARREO MATERIAL DE DESPERDICIO</b>				
	<b>OBRA GRIS</b>				
7.00	TRAZADO Y MARCADO	M.L	153.90	20.00	3,078.00
8.00	CONCRETO DE 185 KG/CM3, DOSIFICACIÓN 1:2:3	M3	67.25	1206.50	81,137.12
9.00	CORTADO DE CONCRETO	M.L	248.40	9.50	2359.80
10.00	CURADO DE LOSA	M2	448.31	10.50	4,707.25
	<b>SUB-TOTAL OBRA GRIS</b>				91,282.17
	<b>GRAN TOTAL</b>				106,023.01


**SEGUNDO: VALOR Y, FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO.-** El valor del presente Contrato asciende a la Cantidad de Lps.106, 023.01 Ciento seis mil veinte y tres lempiras con 01 /100); el cual será financiado con fondos propios o provenientes de transferencias municipales. **TERCERA: SUPERVISION.-** La Alcaldía a través de la Unidad Técnica de la mancomunidad supervisara el avance de la obra e emitirá informe técnico;.- **CUARTA: FORMAS DE PAGO.-** La Alcaldía efectuará pagos según avance de la obra al contratista el cual será deducido del monto total de este contrato al finalizar la obra será recibida por la Municipalidad a entera satisfacción




*Municipalidad de San Marcos de Colón.*  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*



mediante acta de recepción extendida por el Alcalde Municipal y el Presidente del Patronato si existiera en esa zona, la Alcaldía no tendrá responsabilidad alguna por sueldos, jornales, prestaciones sociales, indemnizaciones, tanto del Contratista Como del Personal Subalterno que el Contratante a su cuenta y riesgo para la ejecución del Contrato, por consiguiente queda exenta de toda responsabilidad laboral y Legal de estos actos que se deriven.- **QUINTA: GARANTIA DE ANTICIPO.-** El Contratista hará efectiva una garantía de letra de cambio del 15% como garantía de calidad de obra para garantizar que se ejecutara la obra de manera eficiente conforme a las Cláusulas establecidas en este Contrato la cual equivale a Lps.15,903.45 (quince mil novecientos tres LEMPIRAS 45/100), cuya vigencia por el tiempo de ejecución de la obra a partir de la orden de inicio de la misma.- el pago de la D.E.I lo realizara el contratista el cual presentara su comprobante de pagos a cuenta al departamento de contabilidad, de lo contrario se hará retención del mismo- **SEXTA: TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA.-** El Contratista se obliga a iniciar las obras a partir del 29 de octubre del 2018 y finalizarlas el 13 de Noviembre 2018-**SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO.-** En caso de incumplimiento en la entrega de la obra el contratista pagara una multa de LPS. 300.00 (TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), por cada día de atraso hasta la entrega de la misma, cantidad que le será descontada del saldo que tenga a su favor y si este fuese insuficiente el Contratista siempre se obliga a pagar lo que falte.- **OCTAVA: OBRAS MAL EJECUTADAS.-** Los Gastos causados por las obras que a juicio el Supervisor de Obras, necesitan ser ratificadas, como consecuencia de la mala ejecución será por cuenta del Contratista.-**NOVENA: MODIFICACIONES.-** La Alcaldía podrá en cualquier momento ordenar obras extras, variaciones, alterando, agregando o suprimiendo el total o parte de la obra, en el entendido que si tales modificaciones no sobrepasan el 10% del valor del contrato se hará mediante una orden de cambio y si sobre pasa este porcentaje hasta un máximo del 25% se realizara un ampliación al Contrato Original ambos casos deberán ser aprobados por la Alcaldía.- **DECIMO: SOLUCION DE CONFLICTOS Y LEY APLICABLE.-** Si Existiere alguna desavenencia con motivo o en ocasión de la ejecución e interpretación de este contrato y la misma no fuere solucionada por el buen entendido extrajudicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de este término municipal, por lo tanto se prohíbe el arbitraje, para todo lo no previsto en el presente Contrato se aplicaran las disposiciones legales del ordenamiento jurídico vigente de la República de Honduras que les sean aplicables.- este Contrato no se registrá con las normas contenidas en la legislación laboral, ya que su carácter es de naturaleza enteramente civil así lo pactan y acuerdan ambas partes contratantes.- Y para constancia firma manifestando su conformidad con todas las disposiciones incluidas en las Cláusulas anteriores y se obligan a su fiel cumplimiento.- Dado en el Municipio de San Marcos de Colon, Departamento de Choluteca, a los veintiséis días del mes de Octubre, del presente año dos mil dieciocho

  
JOSE DOUGLAS ORDONEZ  
Alcalde Municipal



  
FREDY ANTONIO GONZALES,  
Contratista



**ANTICIPOS A CONTRATO**

Código: 0615








Municipalidad: SAN MARCOS DE COLON.

Departamento: CHOLUTECA, HONDURAS









Fecha	Documento	Orden de Pago	Cheque	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
11/01/2018	OP	39691	71105363	Fredy Antonio Gonzales Ruiz	L. 13,000.00	Primer pago según contrato de mano de obra por la reparación de calle empedrada en el Bo. El Cafetal que conduce desde "Pollolandia" hacia la panadería "Tábor". (Documentación anexa)
11/08/2018	OP	39849	71105410	Fredy Antonio Gonzales Ruiz	L. 13,000.00	Segundo pago según contrato de mano de obra por la reparación de calle empedrada en el Bo. El Cafetal que conduce desde "Pollolandia" hacia la panadería "Tabor". (Documentación anexa)
<b>TOTAL</b>					<b>L. 26,000.00</b>	

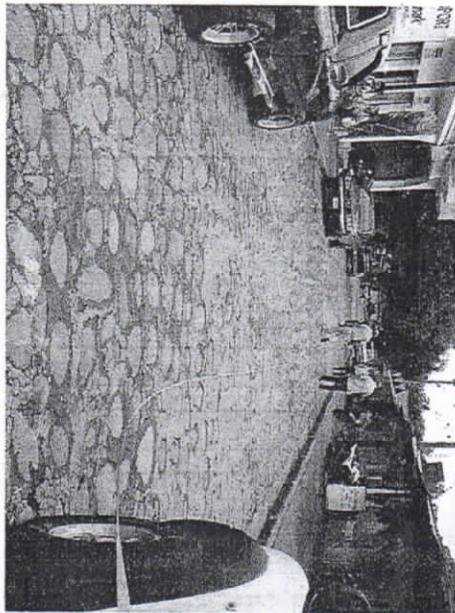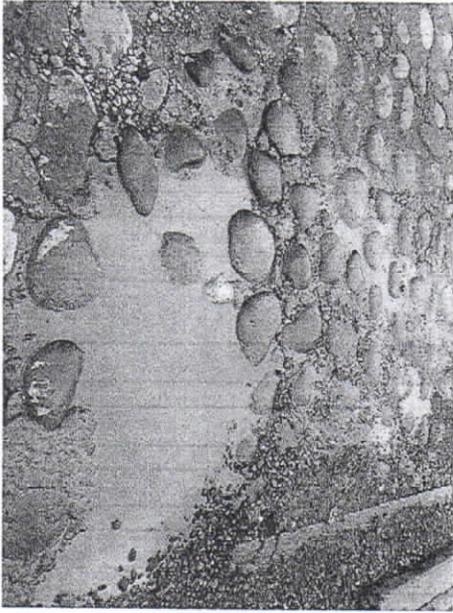

Antes

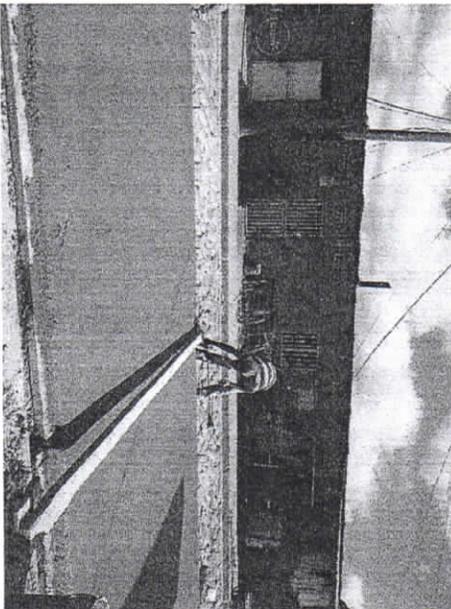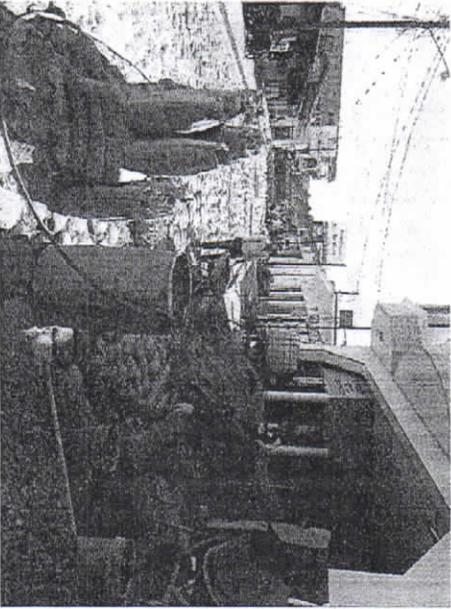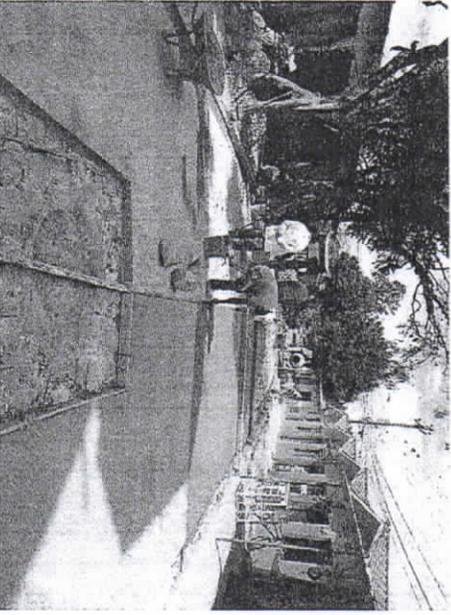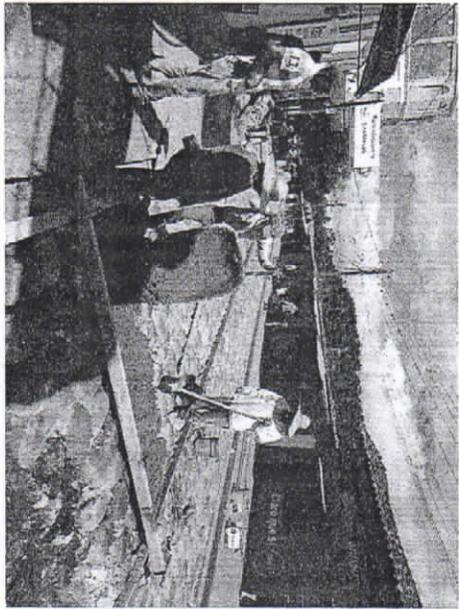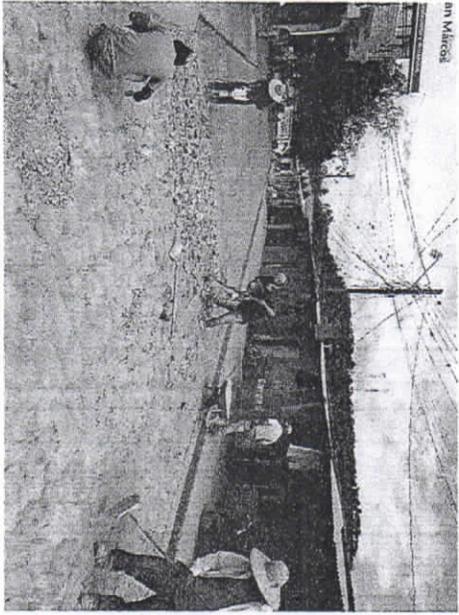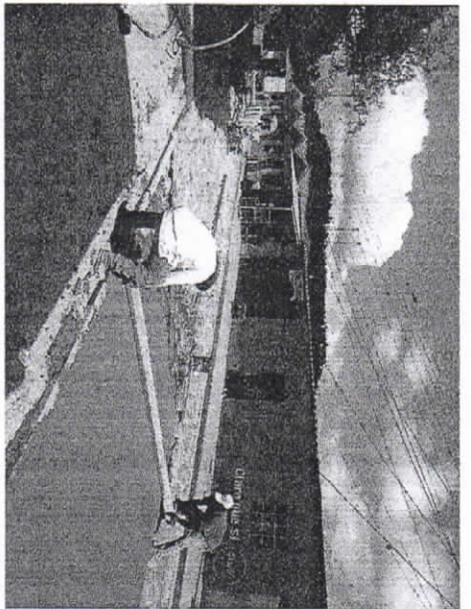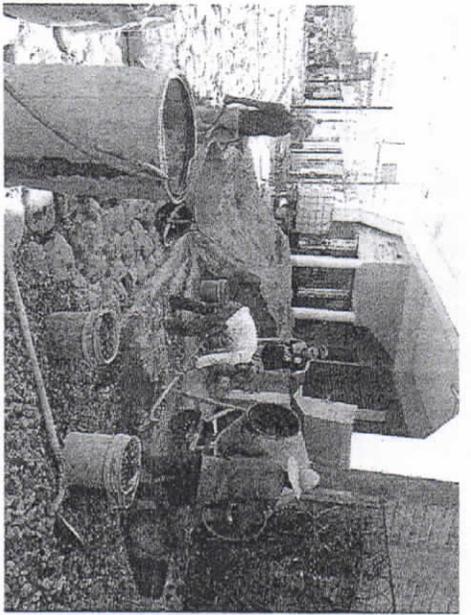

Down to

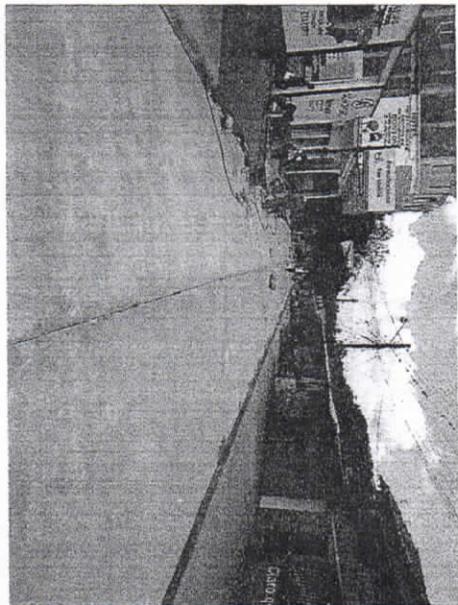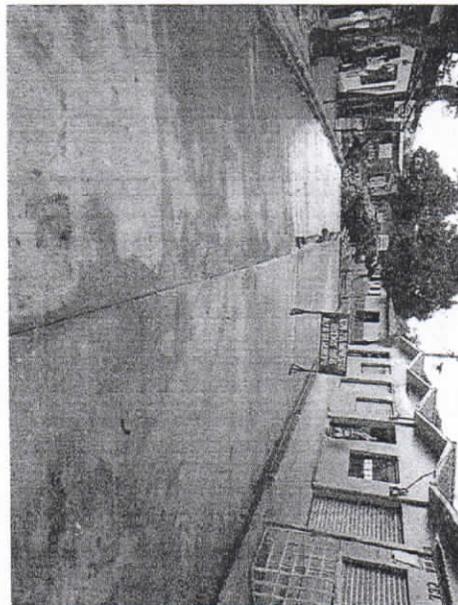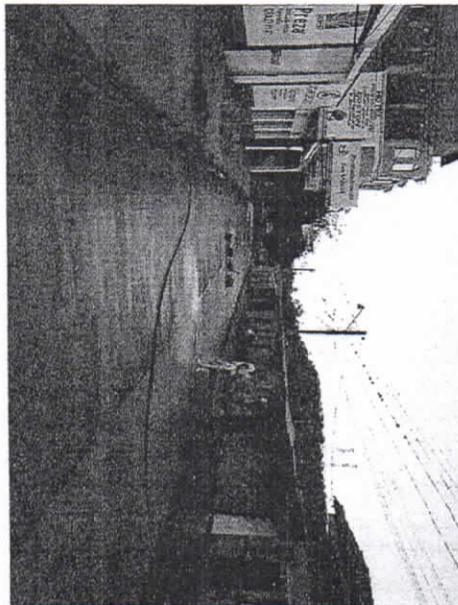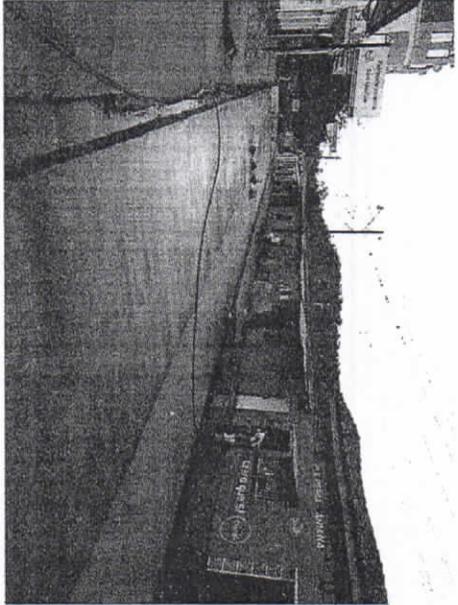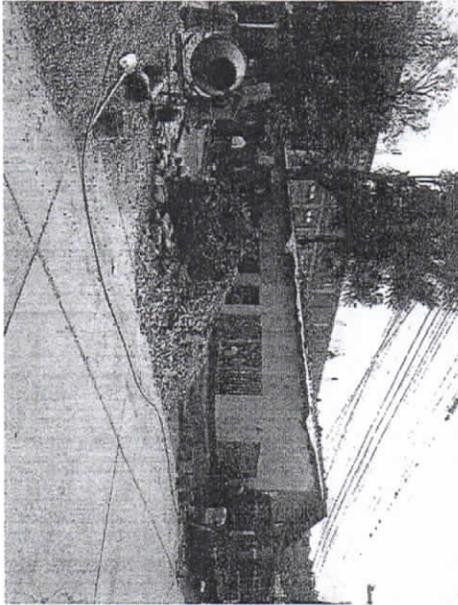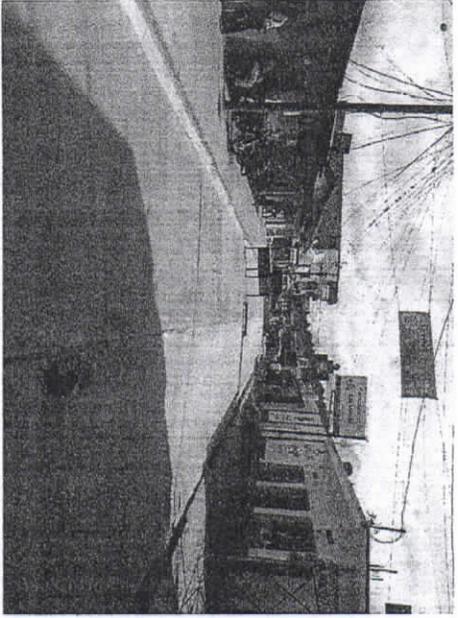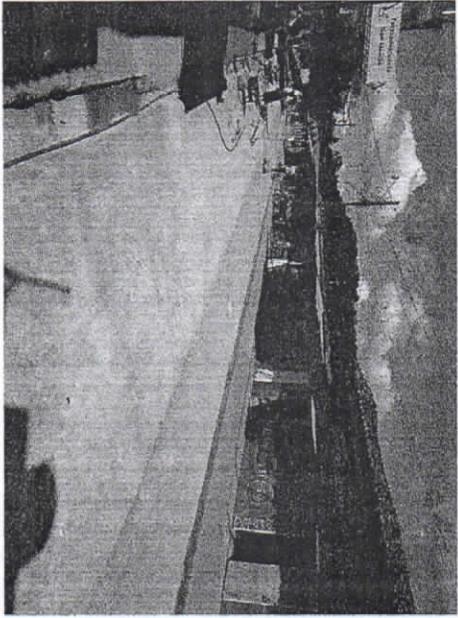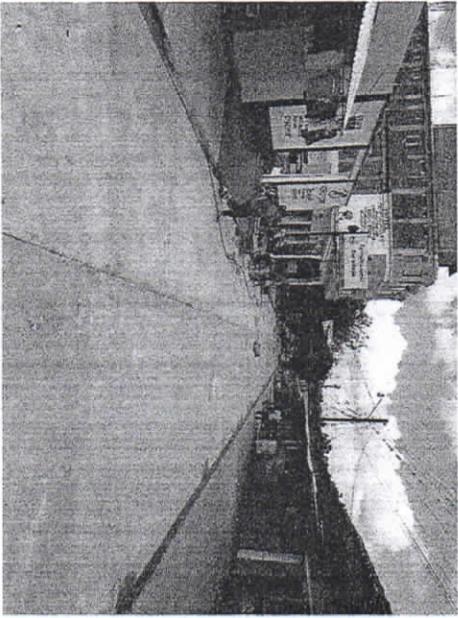



Municipalidad de San Marcos de Colón.  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



**COTIZACION DE SERVICIOS " CONTRATO DE SERVICIOS MANO DE OBRA,**  
**PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO WITHE TOPPIN =**  
**15CMS. BARRIO CAFETAL DE POLLOLANDIA HASTA PANADERIA TABORA.**

LUGAR BARRIO EL CAFETAL

FECHA: 18 Octubre 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR Fredy Antonio Goizals

RTN/IDN 0615-1974-00637 DIRECCION R=Campo SMC

TELEFONO 97427969


N°	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE POLLOLANDIA - PANADERIA TABORA				
	INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO				
1.0.0	TRAZADO Y MARCADO	M.L	18.00	20.00	360.00
2.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON BARRENO ELECTRICO	M3	2.16	262.00	565.92
3.00	EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO II (SEMI - DURO)	M3	4.32	273.00	1,179.36
4.00	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 8"	M.L	18.00	36.00	648.00
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO				
	DEMOLICIONES Y ACARRERO MATERIAL DE DESPERDICIO				
5.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON BARRENO ELECTRICO	M3	31.38	262.00	8221.56
6.00	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	37.66	100	3,766.00
	SUB-TOTAL DEMOLICIONES Y ACARREO MATERIAL DE DESPERDICIO				
	OBRA GRIS				
7.00	TRAZADO Y MARCADO	M.L	153.90	20.00	3078.00
8.00	CONCRETO DE 185 KG/CM3, DOSIFICACIÓN 1:2:3	M3	67.25	1206.50	81137.10
9.00	CORTADO DE CONCRETO	M.L	248.40	9.50	2359.80
10.00	CURADO DE LOSA	M2	448.31	10.50	4,707.25
	SUB-TOTAL OBRA GRIS				91282.17
	GRAN TOTAL				106023.01


Fredy A. Goizals:

Firma del proveedor

Identidad N° 0615-1974-00637.

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0615

FREDY ANTONIO / GONZALES RUIZ  
0615-1974-00637



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

FREDY ANTONIO / GONZALES RUIZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL :19 SEPTIEMBRE 1974  
SEXO :MASCULINO  
EMITIDA EL :04 MARZO 2017



0615-1974-00637



14381282-02



Municipalidad de San Marcos de Colón.  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



**COTIZACION DE SERVICIOS "CONTRATO DE SERVICIOS MANO DE OBRA,**  
**PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO WITHE TOPPIN =**  
**15CMS. BARRIO CAFETAL DE POLLOLANDIA HASTA PANADERIA TABORA.**

LUGAR BARRIO EL CAFETAL

FECHA: 18 Octubre 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR Edwin Ramon Vasquez.

RTN/IDN 0615-1987-00714 DIRECCION Rta Flor de mayo.

TELEFONO 95219739.

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE POLLOLANDIA - PANADERIA TABORA				
	INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO				
1.0.0	TRAZADO Y MARGADO	M.L	18.00	22.00	396.00
2.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON BARRENO ELECTRICO	M3	2.16	263.00	568.08
3.00	EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO II (SEMI - DURO)	M3	4.32	275.00	1,188.00
4.00	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 8"	M.L	18.00	38.00	684.00
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO				
	DEMOLICIONES Y ACARRERO MATERIAL DE DESPERDICIO				
5.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON BARRENO ELECTRICO	M3	31.38	265.00	8315.7
6.00	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	37.66	105.00	3954.3
	SUB-TOTAL DEMOLICIONES Y ACARREO MATERIAL DE DESPERDICIO				
	OBRA GRIS				
7.00	TRAZADO Y MARGADO	M.L	153.90	22.00	3385.8
8.00	CONCRETO DE 185 KG/CM3, DOSIFICACIÓN 1:2:3	M3	67.25	1206.50	8137.12
9.00	CORTADO DE CONCRETO	M.L	248.40	10.00	2484.00
10.00	CURADO DE LOSA	M2	448.31	11.00	4931.41
	SUB-TOTAL OBRA GRIS				
	GRAN TOTAL				107,044.41

Edwin Ramon Vasquez:

Firma del proveedor

Identidad N° 0615-1987-00714.



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

EDWIN RAMON / VASQUEZ LAGOS



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 20 OCTUBRE 1987  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 14 NOVIEMBRE 2009




0615-1987-00714



11140809-02

ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

*[Signature]*  
DIRECCION RNP



SOLICITADA EN 0615

EDWIN RAMON / VASQUEZ LAGOS  
0615-1987-00714



Municipalidad de San Marcos de Colón.  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



**COTIZACION DE SERVICIOS " CONTRATO DE SERVICIOS MANO DE OBRA,**  
**PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO WITHE TOPPIN =**  
**15CMS. BARRIO CAFETAL DE POLLOLANDIA HASTA PANADERIA TABORA.**

LUGAR BARRIO EL CAFETAL FECHA: 18 Octubre 2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR Carlos Antonio Diaz del Valle Hernandez.  
RTN/IDN 0615-1984-004377 DIRECCION B° La Providencia  
TELEFONO 8972-4873

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE POLLOLANDIA - PANADERIA TABORA				
	INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO				
1.0.0	TRAZADO Y MARCADO	M.L	18.00	21,00	378.00
2.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON BARRENO ELECTRICO	M3	2.16	263.00	568.08
3.00	EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO II (SEMI - DURO)	M3	4.32	274.00	1183.00
4.00	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 8"	M.L	18.00	36.00	648.00
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO				
	DEMOLICIONES Y ACARRERO MATERIAL DE DESPERDICIO				
5.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON BARRENO ELECTRICO	M3	31.38	263.00	8252.94
6.00	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	37.66	101.00	3803.66
	SUB-TOTAL DEMOLICIONES Y ACARREO MATERIAL DE DESPERDICIO				
	OBRA GRIS				
7.00	TRAZADO Y MARCADO	M.L	153.90	21,00	3231.90
8.00	CONCRETO DE 185 KG/CM3, DOSIFICACIÓN 1:2:3	M3	67.25	1206.50	81137.10
9.00	CORTADO DE CONCRETO	M.L	248.40	9.80	2434.32
10.00	CURADO DE LOSA	M2	448.31	10.80	4841.748
	SUB-TOTAL OBRA GRIS				94282.16
	GRAN TOTAL				108,323.00

Carlos Antonio D. Hernandez.

Firma del proveedor  
Identidad N° 0615-1984-00437



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS ANTONIO / DIAZ DEL VALLE HERNANDEZ



HONDUREÑO POR: NACIMIENTO  
NACIO EL: 12 ABRIL 1984  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 17 AGOSTO 2013




0615-1984-00437



04344869-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podra privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infraccion de la disposicion de este articulo dara lugar a la sancion de ley correspondiente.

  
DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0615

CARLOS ANTONIO / DIAZ DEL VALLE HERNANDEZ

0615-1984-00437



PRESUPUESTO BASE MANO DE OBRA Y EQUIPO

NOMBRE DEL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO WHITE TOPPING e= 15 CMS,  
DE POLLOLANDIA-PANADERIA TABORA, BARRIO CAFETAL"

UBICACIÓN: BARRIO EL CAFETAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE POLLOLANDIA-PANADERIA TABORA</b>					
<b>INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO</b>					
1.00	TRAZADO Y MARCADO	M.L	18.00	20.48	368.64
2.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON BARRENO ELÉCTRICO	M3	2.16	262.22	566.40
3.00	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	4.32	275.00	1,188.00
4.00	INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE 8"	M.L	18.00	37.79	680.22
<b>SUB-TOTAL INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO</b>					<b>2,803.26</b>
<b>DEMOLICIONES Y ACARREO MATERIAL DE DESPERDICIO</b>					
5.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON BARRENO ELÉCTRICO	M3	31.38	262.22	8,228.46
6.00	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	37.66	101.00	3,803.66
<b>SUB-TOTAL DEMOLICIONES Y ACARREO MATERIAL DE DESPERDICIO</b>					<b>12,032.12</b>
<b>OBRA GRIS</b>					
7.00	TRAZADO Y MARCADO	M.L	153.90	20.48	3,151.87
8.00	CONCRETO DE 185 KG/CM <sup>2</sup> , DOSIFICACION 1:2:3	M3	67.25	1,207.74	81,220.52
9.00	CORTADO DE CONCRETO	M.L	248.40	9.80	2,434.32
10.00	CURADO DE LOSA	M2	448.31	10.50	4,707.26
<b>SUB-TOTAL OBRA GRIS</b>					<b>91,513.96</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>106,349.34</b>

GENERALIDADES DEL PROYECTO

- 1.- LONGITUD TOTAL DE CALLE = 70.60 METROS LINEALES  
ANCHO PROMEDIO DE CALZADA = 6.35 METROS
- 2.- USAR CONCRETO HIDRÁULICO 185 KG/CM<sup>2</sup> (WHITE TOPPING) e= 15 CMS, DOSIFICACIÓN 1:2:3
- 3.- EN LAS PASA JUNTAS (LONGITUDINAL) UTILIZAR VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1/2" A CADA 50 CMS Y LA LONGITUD DE CADA BASTÓN SERÁ DE 60 CMS. UTILIZAR VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1/2" EN CORTES TRANSVERSALES
- 4.- NO SE CONSTRUIRAN BORDILLOS
- 5.- UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA
- 6.- UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE 3/4"-1"
- 7.- UTILIZAR MEZCLADORA, PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO
- 8.- UTILIZAR VIBRADOR DESPUES DE COLOCAR EL CONCRETO
- 9.- EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.50 METROS X EL ANCHO DE LA CALZADA
- 10.- EL CONCRETO SE COLOCARÁ SOBRE UNA BASE DE EMPEDRADO EXISTENTE
- 11.- ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO SOBRE EL EMPEDRADO, SE DEBE HUMEDECER DICHA SECCIÓN, HASTA SU SATURACIÓN
- 12.- DEMOLER EL CONCRETO EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA FRACTURADO Ó EN MAL ESTADO, PARA EVITAR FALLAS EN EL CONCRETO NUEVO.

NOTA: EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLAMENTE INCLUYE EL COSTO DIRECTO  
DE CADA ACTIVIDAD, NO SE INCLUYE EL SOBRECOSTO (UTILIDAD)

Ing. Leonel Antonio Martínez Reyes  
Coordinador OTI  
MANCOMUNIDAD MAMBOCAURE



FECHA DE EVALUACIÓN: OCTUBRE DE 2018



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
**EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)**  
TEL. 2780-2024



**INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO**












MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
**EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)**  
TEL. 2780-2024



**DEMOLICIONES Y ACARREO MATERIAL DE DESPERDICIO**

  
  
INGENIERO  
CIVIL  
04-02-91  
10-08-97  
C.I.C.H. N° 7729







MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
**EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)**  
TEL. 2780-2024

---



OBRA GRIS

  
  
INGENIERO  
CIVIL  
04-02-91  
10-08-97  
C.O.H. N° 7729



PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO WHITE TOPPING e=15 CM,  
DE POLLOLANDIA-PANADERIA TABORA, BARRIO CAFETAL"

UBICACIÓN: BARRIO EL CAFETAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTEGA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS  
MANO DE OBRA Y EQUIPO

CODIGO

UNIDAD: M3

**CONCRETO DE 185 KG/CM<sup>2</sup>, DOSIFICACIÓN 1:2:3**

No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
SUB-TOTAL MATERIALES					-
<b>MANO DE OBRA</b>					
OC-F01001	1 Albañil	jrd	1.3330	400.00	533.20
OC-F01004	2 Carpintero	jrd	0.1430	350.00	50.05
ON-F01001	3 Ayudante	jrd	1.3330	250.00	333.25
SUB-TOTAL MANO DE OBRA					<u>916.50</u>
<b>HERRAMIENTA Y EQUIPO</b>					
HM-F06002	1 Herramienta menor	%	0.0500	916.50	45.83
	2 Mezcladora	dia	0.2231	800.00	133.86
	3 Vibrador	dia	0.2231	500.00	111.55
SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO					<u>291.24</u>
SUB TOTAL MATERIALES (LPS):					-
SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS):					916.50
SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS):					<u>291.24</u>
TOTAL ACTIVIDAD (LPS):					<b>1,207.74</b>

*[Handwritten Signature]*







PRESUPUESTO BASE

NOMBRE DEL PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO WHITE TOPPING e= 15 CMS,  
DE POLLOLANDIA-PANADERIA TABORA, BARRIO CAFETAL"

UBICACIÓN: BARRIO EL CAFETAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	P/Unitario	TOTAL
<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE POLLOLANDIA-PANADERIA TABORA</b>					
<b>INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO *</b>					
1.00	TRAZADO Y MARCADO	M.L	18.00	28.04	504.72
2.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON BARRENO ELÉCTRICO	M3	2.16	262.22	566.40
3.00	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	4.32	275.00	1,188.00
4.00	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 8" RD-41	M.L	18.00	601.20	10,821.60
5.00	INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE 8"	M.L	18.00	46.02	828.36
<b>SUB-TOTAL INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO</b>					<b>13,909.08</b>
<b>DEMOLICIONES Y ACARREO MATERIAL DE DESPERDICIO</b>					
6.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON BARRENO ELÉCTRICO	M3	31.38	262.22	8,228.46
7.00	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	37.66	101.00	3,803.66
<b>SUB-TOTAL DEMOLICIONES Y ACARREO MATERIAL DE DESPERDICIO</b>					<b>12,032.12</b>
<b>OBRA GRIS</b>					
8.00	TRAZADO Y MARCADO	M.L	153.90	28.04	4,315.36
9.00	CONCRETO DE 185 KG/CM <sup>2</sup> , DOSIFICACIÓN 1:2:3	M3	67.25	4,101.33	275,814.44
10.00	CORTADO DE CONCRETO	M.L	248.40	9.80	2,434.32
11.00	CURADO DE LOSA	M2	448.31	25.50	11,431.91
<b>SUB-TOTAL OBRA GRIS</b>					<b>293,996.02</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>319,937.22</b>

GENERALIDADES DEL PROYECTO

- 1.- LONGITUD TOTAL DE CALLE = 70.60 METROS LINEALES  
ANCHO PROMEDIO DE CALZADA = 6.35 METROS
- 2.- USAR CONCRETO HIDRÁULICO 185 KG/CM<sup>2</sup> (WHITE TOPPING) e= 15 CMS, DOSIFICACIÓN 1:2:3
- 3.- EN LAS PASA JUNTAS (LONGITUDINAL) UTILIZAR VARILLA CORRUGADA LEGÍTIMA DE 1/2" A CADA 50 CMS Y LA LONGITUD DE CADA BASTÓN SERÁ DE 60 CMS. UTILIZAR VARILLA CORRUGADA LEGÍTIMA DE 1/2" EN CORTES TRANSVERSALES
- 4.- NO SE CONSTRUIRAN BORDILLOS
- 5.- UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA
- 6.- UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE 3/4"-1"
- 7.- UTILIZAR MEZCLADORA, PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO
- 8.- UTILIZAR VIBRADOR DESPUES DE COLOCAR EL CONCRETO
- 9.- EL CORTE DEL CONCRETO SE HARÁ EN SECCIONES DE 2.50 METROS X EL ANCHO DE LA CALZADA
- 10.- EL CONCRETO SE COLOCARÁ SOBRE UNA BASE DE EMPEDRADO EXISTENTE
- 11.- ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO SOBRE EL EMPEDRADO, SE DEBE HUMEDECER DICHA SECCIÓN, HASTA SU SATURACIÓN
- 12.- DEMOLER EL CONCRETO EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA FRACTURADO Ó EN MAL ESTADO, PARA EVITAR FALLAS EN EL CONCRETO NUEVO.

NOTA: EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLAMENTE INCLUYE EL COSTO DIRECTO  
DE CADA ACTIVIDAD, NO SE INCLUYE EL SOBRECOSTO (UTILIDAD)

  
Ing. Leonel Antonio Martínez Reyes  
Coordinador MTI  
MANCOMUNIDAD MAMBOCAURE



FECHA DE EVALUACIÓN: OCTUBRE DE 2018



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
**EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)**  
TEL. 2780-2024



**INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO**

  
  
INGENIERO  
CIVIL  
04-02-91  
10-08-97  
C.I.C.H. N° 7729

PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO WHITE TOPPING e=15 CM,  
DE POLLOLANDIA-PANADERIA TABORA, BARRIO CAFETAL"

UBICACIÓN: BARRIO EL CAFETAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO

UNIDAD: ML

**F013003 TRAZADO Y MARCADO**

No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
MI-F3803001	1 Crayolas	Unidad	0.0500	25.00	1.25
MI-F3901001	2 Cuerda de nylon	Yarda	1.0940	0.40	0.44
MN-F2301001	3 Clavos	Lb	0.0140	18.00	0.25
MN-F2901001	4 Madera rustica de pino	Pie T	0.3510	16.00	5.62
					-
					-
					-
					-

SUB-TOTAL MATERIALES **7.56**

**MANO DE OBRA**

OC-F01001	1 Albañil	jrd	0.0300	400.00	12.00
ON-F01001	2 Ayudante	jrd	0.0300	250.00	7.50
					-
					-
					-

SUB-TOTAL MANO DE OBRA **19.50**

**HERRAMIENTA Y EQUIPO**

HM-F08002	1 Herramienta menor	%	0.0500	19.50	0.98
					-
					-
					-

SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO **0.98**

SUB TOTAL MATERIALES (LPS): 7.56  
 SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS): 19.50  
 SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS): 0.98

TOTAL ACTIVIDAD (LPS): **28.04**

  
 LEONEL ANTONIO MARTINEZ  
 INGENIERO CIVIL  
 04-02-91  
 10-08-97  
 C.H. N° 7729











MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
**EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)**  
TEL. 2780-2024



**DEMOLICIONES Y ACARREO MATERIAL DE DESPERDICIO**

  
ANTONIO MARINEZ  
INGENIERO  
CIVIL  
04-02-91  
10-08-97  
C.I.C.H. N° 1789







MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CERRO DE LA BOTIJA Y  
**EL GUANACAURE (MAMBOCAURE)**  
TEL. 2780-2024



OBRA GRIS

  
  
INGENIERO  
CIVIL  
04-02-91  
10-08-97  
C.I.C.H. N° 1729

PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO WHITE TOPPING e=15 CM,  
DE POLLOLANDIA-PANADERIA TABORA, BARRIO CAFETAL"

UBICACIÓN: BARRIO EL CAFETAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO

UNIDAD: M.L

**F013003 TRAZADO Y MARCADO**

No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
MI-F3803001	1 Crayolas	Unidad	0.0500	25.00	1.25
MI-F3901001	2 Cuerda de nylon	Yarda	1.0940	0.40	0.44
MN-F2301001	3 Clavos	Lb	0.0140	18.00	0.25
MN-F2901001	4 Madera rustica de pinc	Pie T	0.3510	16.00	5.62

SUB-TOTAL MATERIALES 7.56

**MANO DE OBRA**

OC-F01001	1 Albañil	jrd	0.0300	400.00	12.00
ON-F01001	2 Ayudante	jrd	0.0300	250.00	7.50

SUB-TOTAL MANO DE OBRA 19.50

**HERRAMIENTA Y EQUIPO**

HM-F06002	1 Herramienta menor	%	0.0500	19.50	0.98
-----------	---------------------	---	--------	-------	------

SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO 0.98

SUB TOTAL MATERIALES (LPS):	7.56
SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS):	19.50
SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS):	0.98
<b>TOTAL ACTIVIDAD (LPS):</b>	<b>28.04</b>

*[Handwritten Signature]*

PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO WHITE TOPPING e=15 CM,  
DE POLLOLANDIA-PANADERIA TABORA, BARRIO CAFETAL"

UBICACIÓN: BARRIO EL CAFETAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CODIGO

UNIDAD: **M3**

**CONCRETO DE 185 KG/CM<sup>2</sup>, DOSIFICACIÓN 1:2:3**

No.	MATERIALES	UNIDAD	REND.	P. U.	IMPORTE
MN-F0101001	1 Cemento gris tipo portland	bolsa	8.7560	205.00	1,794.78
MN-F0201002	2 Arena de río lavada	m3	0.5115	500.00	255.75
MN-F0301001	3 Grava triturada de 3/4"	m3	0.7672	600.00	460.32
MN-F0601001	4 Agua	m3	0.2713	200.00	54.26
MN-F1902003	5 Varilla de hierro corrugada de 1/2"x30' legitima	lance	0.2231	185.00	41.27
MN-F1902002	6 Varilla de hierro corrugada de 3/8"x30' legitima	lance	0.1190	135.00	16.07
MN-F2301001	7 Clavos de 2 1/2"	libra	0.1487	18.00	2.68
MN-F1801001	8 Alambre de amarre	libra	0.2231	18.00	4.02
	9 Clavos de acero de 2 1/2"	unidad	4.4610	1.00	4.46
	10 Regla de 1"x4"x14'	unidad	0.2974	74.72	22.22
	11 Palos de 2"x4"x14'	unidad	0.1487	149.28	22.20
	12 Tabla de 1"x6"x14'	unidad	0.1190	112.00	13.33
	13 Aderente para concreto, adecon	galón	0.5948	340.00	202.23

SUB-TOTAL MATERIALES

**2,893.59**

**MANO DE OBRA**

OC-F01001	1 Albañil	jrd	1.3330	400.00	533.20
OC-F01004	2 Carpintero	jrd	0.1430	350.00	50.05
ON-F01001	3 Ayudante	jrd	1.3330	250.00	333.25

SUB-TOTAL MANO DE OBRA

**916.50**

**HERRAMIENTA Y EQUIPO**

HM-F06002	1 Herramienta menor	%	0.0500	916.50	45.83
	2 Mezcladora	día	0.2231	600.00	133.86
	3 Vibrador	día	0.2231	500.00	111.55

SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO

**291.24**

SUB TOTAL MATERIALES (LPS): 2,893.59  
 SUB TOTAL MANO DE OBRA (LPS): 916.50  
 SUB TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO (LPS): 291.24

TOTAL ACTIVIDAD (LPS): **4,101.33**

*[Handwritten Signature]*

**INGENIERO CIVIL**  
 04-02-91  
 10-08-97  
 C.I.G.H. N° 7729





# San Marcos de Colon CHOLUTECA, HONDURAS

ORDEN DE PAGO No. 39903

Fecha: 15 de Noviembre del 2018 Unidad Ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL

Señor(a) Tesorero(a) Municipal: ELVIN ALBERTO REYES


Sírvase pagar a la Orden de: Fredy Antonio Gonzales Ruiz

La suma de: TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 06/100


**Concepto de Gasto:**

Cancelación de contrato por brindar los servicios de construcción de aceras peatonales en el barrio El Cafetal, desde la agropecuaria "Portillo" hacia farmacia VAVER en el barrio El Cafetal. (Documentación anexa)

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
06011240046046639	Reparacion de Calles, San Marcos de Colon (Centro)	13,948.06
<b>TOTAL</b>		<b>13,948.06</b>

  
Firma y Sello Alcalde(sa)

  
Firma y Sello de Tesorero(a)

  
V.B. Contabilidad y Presupuesto  
Firma y Sello




Elaborado por Firma y Sello

Firma y Sello Administración

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe  
**Occidente 11-513-000035-8**

Cheque No. **71105451**

  
FIRMA INTERESADO

Orden de pedido No. \_\_\_\_\_

Identidad/RTN No. 0615-1974-00637

Impuesto sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 15 11 2018  
DIA MES AÑO



*Municipalidad de San Marcos de Colón.*  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*



**CONTRATO DE SERVICIOS MANO DE OBRA, PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN BARRIO EL CAFETAL FRENTE AGROPECUARIA PORTILLO A FARMACIA VAVER".**

Yo **JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO**, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. 0615-1967-00606, actuando en su condición de **ALCALDE MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON**, Departamento de Choluteca, quien para los efectos de este contrato se denominará el **CONTRATANTE**; y por otra parte del Señor, **FREDY ANTONIO GONZALES RUIZ**, con tarjeta de identidad N° 0615-1974-00637 Mayor de edad, Casado, de nacionalidad hondureña, vecino y residente en el Barrio el campo, Jurisdicción de San Marcos de Colon, Departamento de Choluteca, quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, ambos en el pleno goce y ejercicio de sus deberes civiles, libre y espontáneamente celebran el presente Contrato de conformidad con las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERO: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** La Municipalidad de San Marcos de Colon, Choluteca, contrata los servicios de **EL CONTRATISTA** para que ejecute la obra de **PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALE EN BARRIO EL CAFETAL FRENTE AGROPECUARIA PORTILLO A FARMACIA VAVER**, de acuerdo a las especificaciones técnicas elaboradas para los mismos.-

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
	<b>CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL</b>				
	<b>INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO</b>				
1.0	DEMOLICIÓN DE CONCRETO	M2	21.00	172.50	3,622.50
2.0	MEJORAMIENTO DE CAJA DE REGISTRO (AGUAS NEGRAS)	Global	2	1,437.50	2,875.00
3.0	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE	Global	1	1,380.00	1,380.00
4.0	FUNDICIÓN CON CONCRETO	M2	21.00	310.50	6,520.50
	<b>GRAN TOTAL</b>				14,398.00


**SEGUNDO: VALOR Y FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO.-** El valor del presente Contrato asciende a la Cantidad de **Lps.2, 159.70.00 Dos mil ciento cincuenta y nueve lempiras con 70 /100**; el cual será financiado con fondos propios o provenientes de transferencias municipales. **TERCERA: SUPERVISION.-** La Alcaldía a través de la Unidad Técnica de la mancomunidad supervisara el avance de la obra e emitirá informe técnico;.- **CUARTA: FORMAS DE PAGO.-** La Alcaldía efectuará pagos según avance de la obra al contratista el cual será deducido del monto total de este contrato al finalizar la obra será recibida por la Municipalidad a entera satisfacción mediante acta de recepción extendida por el Alcalde Municipal y el Presidente del Patronato si existiera en esa zona, la Alcaldía no tendrá responsabilidad alguna por sueldos, jornales, prestaciones sociales, indemnizaciones, tanto del Contratista Como del Personal Subalterno que el Contratante a su cuenta y riesgo para la ejecución del Contrato, por consiguiente queda exenta de toda responsabilidad laboral y Legal de estos actos que se deriven.- **QUINTA: GARANTIA DE ANTICIPO.-** El Contratista hará efectiva una garantía de letra de cambio del 15% como garantía de calidad de obra para garantizar que se ejecutara la obra de manera eficiente conforme a las Cláusulas establecidas en este Contrato la cual equivale a **Lps.15,903.45 (quince mil novecientos tres LEMPIRAS 45/100)**, cuya vigencia por el tiempo de ejecución de la obra a partir de la orden de inicio de la misma.- el pago de la D.E.I lo realizara el contratista el cual presentara su comprobante de pagos a cuenta al departamento de contabilidad, de lo contrario se hará retención del mismo- **SEXTA: TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA.-** El Contratista se obliga a iniciar las obras a partir del 15 de Noviembre del 2018 y finalizarlas el 17 de Noviembre 2018-**SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO.-** En caso de




*Municipalidad de San Marcos de Colón.*  
*Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.*





incumplimiento en la entrega de la obra el contratista pagara una multa de **LPS. 300.00 (TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, por cada día de atraso hasta la entrega de la misma, cantidad que le será descontada del saldo que tenga a su favor y si este fuese insuficiente el Contratista siempre se obliga a pagar lo que falte.- **OCTAVA: OBRAS MAL EJECUTADAS.**- Los Gastos causados por las obras que a juicio el Supervisor de Obras, necesitan ser ratificadas, como consecuencia de la mala ejecución será por cuenta del Contratista.- **NOVENA: MODIFICACIONES.**- La Alcaldía podrá en cualquier momento ordenar obras extras, variaciones, alterando, agregando o suprimiendo el total o parte de la obra, en el entendido que si tales modificaciones no sobrepasan el 10% del valor del contrato se hará mediante una orden de cambio y si sobre pasa este porcentaje hasta un máximo del 25% se realizara un ampliación al Contrato Original ambos casos deberán ser aprobados por la Alcaldía.- **DECIMO: SOLUCION DE CONFLICTOS Y LEY APLICABLE.**- Si Existiere alguna desavenencia con motivo o en ocasión de la ejecución e interpretación de este contrato y la misma no fuere solucionada por el buen entendido extrajudicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de este término municipal, por lo tanto se prohíbe el arbitraje, para todo lo no previsto en el presente Contrato se aplicaran las disposiciones legales del ordenamiento jurídico vigente de la República de Honduras que les sean aplicables.- este Contrato no se registrá con las normas contenidas en la legislación laboral, ya que su carácter es de naturaleza enteramente civil así lo pactan y acuerdan ambas partes contratantes.- Y para constancia firma manifestando su conformidad con todas las disposiciones incluidas en las Cláusulas anteriores y se obligan a su fiel cumplimiento.- Dado en el Municipio de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca, a los catorce días del mes de Noviembre, del año dos mil dieciocho

  
JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ  
Alcalde Municipal



  
FREDY ANTONIO GONZALES,  
Contratista

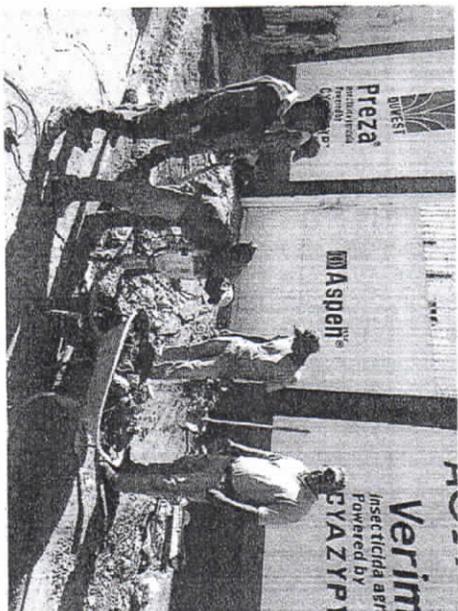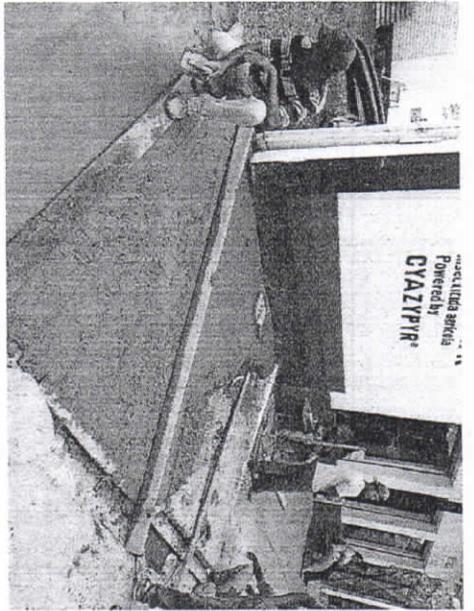



Municipalidad de San Marcos de Colón.  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



**COTIZACION DE SERVICIOS " CONTRATO DE SERVICIOS MANO DE OBRA  
PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN BARRIO EL  
CAFETAL FRETNE AGROPECUARIA PORTILLO HASTA FARMACIA VAVER"**

LUGAR BARRIO EL CAFETAL

FECHA: 12 Octubre 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR Andry Gonzalez

RTN/IDN 0615-1974-00637-0

DIRECCION B: Campo Sma.

TELEFONO 97427469

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL				
	INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO				
1.0	DEMOLICIÓN DE CONCRETO	M2	21.00	172.50	3622.50
2.0	MEJORAMIENTO DE CAJA DE REGISTRO (AGUAS NEGRAS)	Global	2	1,437.50	2875.00
3.0	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE	Global	1	1380.00	1380.00
4.0	FUNDICIÓN CON CONCRETO	M2	21.00	310.50	6520.00
	GRAN TOTAL				14398.00


Andry A. Gonzalez

Firma del proveedor

Identidad N° 0615-1974-00637-

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0615

FREDY ANTONIO / GONZALES RUIZ

0615-1974-00637



REPÚBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

FREDY ANTONIO / GONZALES RUIZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL: 19 SEPTIEMBRE 1974  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 04 MARZO 2017



0615-1974-00637



14381282-02



Municipalidad de San Marcos de Colón.  
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



**COTIZACION DE SERVICIOS "CONTRATO DE SERVICIOS MANO DE OBRA  
PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN BARRIO EL  
CAFETAL FRETNE AGROPECUARIA PORTILLO HASTA FARMACIA VAVER".**

LUGAR BARRIO EL CAFETAL

FECHA: 12 Octubre 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR Edwin Ramón Vasquez.

RTN/IDN 0615-1987-00714 DIRECCION B: Pto de Mayo.

TELEFONO \_\_\_\_\_

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PIU	TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL				
	INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO				
1.0	DEMOLICIÓN DE CONCRETO	M2	21.00	175.50	3685.5.
2.0	MEJORAMIENTO DE CAJA DE REGISTRO (AGUAS NEGRAS)	Global	2	1440.50	2881.10
3.0	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE	Global	1	1390.00	1390.00
4.0	FUNDICIÓN CON CONCRETO	M2	21.00	320.50	6730.50
	GRAN TOTAL				14687.10.

Edwin Ramón Vasquez.

Firma del proveedor

Identidad N° 0615-1987-00714.



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

EDWIN RAMON / VASQUEZ LAGOS




HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 20 OCTUBRE 1987  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 14 NOVIEMBRE 2009


0615-1987-00714



11140809-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo será sancionada a la jurisdicción penal correspondiente.

  
DIRECTOR GENERAL



SOLICITADA EN 0615

EDWIN RAMON / VASQUEZ LAGOS

0615-1987-00714



Municipalidad de San Marcos de Colón.  
Departamento de Choluteca, Honduras. C. A.



**COTIZACION DE SERVICIOS " CONTRATO DE SERVICIOS MANO DE OBRA  
PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN BARRIO EL  
CAFETAL FRETNE AGROPECUARIA PORTILLO HASTA FARMACIA VAVER".**

LUGAR BARRIO EL CAFETAL FECHA: 12 Octubre 2018  
NOMBRE DEL PROVEEDOR Carlos Antonio  
RTN/IDN 0615-1984-00437. DIRECCION R. Proximidad  
TELEFONO 89724813.

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL				
	INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE ALIVIO				
1.0	DEMOLICIÓN DE CONCRETO	M2	21.00	185.00	3,885.00
2.0	MEJORAMIENTO DE CAJA DE REGISTRO (AGUAS NEGRAS)	Global	2	1300.00	1600.00
3.0	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE	Global	1	1500.00	1500.00
4.0	FUNDICIÓN CON CONCRETO	M2	21.00	320.00	6,720.00
	GRAN TOTAL				14,700.00

Carlos Dios del Valle

Firma del proveedor

Identidad N° 0615-1984-00437.
